CLIENTE

CONSULTOR

AUDITORÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

INFORME DE AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA



13 DE ABRIL DE 2018

ÍNDICE

CAPÍTULO 0 Objeto y Alcance de la Auditoría 4

0.1 Identificación de partes intervinientes: Hospital, Sociedad Concesionara y Empresa Auditora 5

0.2 Periodo de Auditoría 6

CAPÍTULO 1 Documentación Revisada, Normativa que Aplica y Metodología para la Realización de la Auditoría 7

1.1 Documentación Revisada 7

1.2 Normativa que Aplica 9

1.3 Metodología Empleada para la Realización de la Auditoría 16

1.3.1 Metodología para la Realización de la Auditoría a las Instalaciones 16
1.3.2 Metodología para la realización de la auditoría de la Documentación Requerida según PPTE 17
1.3.3 Metodología para la Realización de la Auditoría de los planes de mantenimiento (Documentación Requerida según PPTE) 19
1.3.4 Metodología para la revisión del Plan de Reposición (Análisis de la Vida Útil de las Instalaciones) 20
1.3.5 Metodología para la Realización de la Auditoría a los Activos Físicos de Mobiliario del Anexo VI del PCAP. 21
1.3.6 Metodología para la Realización de la Auditoría a las Medidas de Mejora Energética Implantadas 22

CAPÍTULO 2 Resumen Ejecutivo de la Auditoría 23

2.1 Resumen de las Incidencias Detectadas en Instalaciones 24

2.2 Resumen del % cumplimiento en cuanto a la documentación Exigida a la S.C. Según PPTE 26

2.3 Resumen del % Cumplimiento de la Documentación Propia de los Planes de Mantenimiento 28

2.4 Resumen del análisis de la vida útil de las instalaciones 30

2.5 Resumen del Incumplimiento del Anexo VI del PCAP 31

2.6 Resumen de la Adecuación de las Medidas de Mejora de Eficiencia Energética (MAEE) Implantadas 39

CAPÍTULO 3 Resultados de la Auditoría de la Gestión del Mantenimiento 40

3.1 Resultados de la Auditoría al Estado de las Instalaciones 40

3.1.1 Instalación Eléctrica de Baja Tensión 42
3.1.2 Instalación Eléctrica de Media Tensión 44
3.1.3 Centrales Térmicas 44
3.1.4 Instalaciones de Acondicionamiento, Tratamiento y Distribución de Aire 46
3.1.5 Redes de Distribución de ACS 51

3.1.6 Instalación de Almacenamiento de Combustible 51
3.1.7 Instalación General de Fontanería y Tratamiento de Agua 51
3.1.8 Pararrayos 52
3.1.9 Aparatos Elevadores 52
3.1.10 Instalaciones Especiales: Quirófanos, UVIS… 53
3.1.11 Estado Constructivo del Edificio 55
3.1.12 Puertas Automáticas 57
3.1.13 Transporte Neumático 57
3.1.14 Instalación Solar Térmica 58

3.2 Resultados de la Auditoría al Estado de la Documentación (Cumplimiento Requisitos Contractuales) 59

3.3 Resultados de la Auditoría a la Documentación Exigida en los Planes de Mantenimiento según PPTE 60

3.3.1 Plan de Mantenimiento Conductivo 62
3.3.2 Plan de Mantenimiento Preventivo 72
3.3.3 Plan de Mantenimiento Correctivo 77
3.3.4 Plan de Mantenimiento Técnico-Legal 81
3.3.5 Informes Mensuales y Anuales de los Planes de Mantenimiento 90

3.4 Resultados del análisis de la vida útil de las instalaciones 92

3.5 Resultados de la Auditoría al Estado de los Activos Físicos 94

3.5.1 Informe Detallado del estado del Mobiliario de la S.C. (Anexo VI del PCAP) 94

3.6 Resultados de las Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética Implantadas 165

3.6.1 MMEE 1: Recuperador Humos-Agua 165
3.6.2 MMEE 1: Recuperación Térmica en Climatizadores 167
3.6.3 MMEE 1: Sistema de Control y Gestión Energética 169
3.6.4 MMEE 1: Optimización Energética en Iluminación Exterior 171
3.6.5 MMEE 1: Renovación de Rótulo de Cubierta por uno de Tecnología LED 172

CAPÍTULO 4 Cuadro de Mando (Parámetros de Desempeño) 173

CAPÍTULO 5 Propuestas de Mejora Catalogadas por Procesos (Plan de Acción) 175

5.1 Propuesta de mejoras Energéticas por parte de INCOSA 175

5.1.1 Ahorro de Energía para Mantener la Calidad del Aire 175
5.1.2 Mejora de la Iluminación 175

5.2 Propuestas de Mejora sobre la Gestión por Parte de Incosa 176

ANEJOS 179

CAPÍTULO 0 OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Se redacta el presente informe por parte de INCOSA (Investigación y Control de Calidad, S.A.) según lo acordado con el SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS), para exponer las conclusiones en relación al contrato de AUDITORÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO.

Con carácter general, el objeto del contrato es evaluar los resultados integrales de todo el alcance del Servicio de gestión de Mantenimiento en el Hospital Infanta Leonor, y específicamente en relación a todo lo que afecte o pueda afectar a:

- El uso y satisfacción de los usuarios (pacientes y personal) (seguridad, funcionalidad, confort, etc.).
- Cumplimiento de normativas.
- Conservación del valor del inmueble.
- Eficiencia energética.
- Cumplimiento de obligaciones medioambientales.
- La gestión del Inventario técnico de activos.
- La gestión de las Reposiciones.

La finalidad de la Auditoría es la de evaluar el servicio de Mantenimiento durante su desarrollo, por lo cual se ha establecido un calendario de actuaciones de control sistemáticas, para poder recoger una cantidad de información que permita hacer evaluaciones debidamente fundamentadas.

En general se trata, por una parte, de evaluar técnicamente el estado de conservación y funcionamiento de las instalaciones e infraestructuras objetos de concesión; y, por otra parte, la gestión del Mantenimiento de acuerdo con todos los aspectos que debe cumplir el servicio según:

- Lo establecido en los Pliegos de los contratos de concesión (PCAP y PPTE, en particular Apartado 5) y otros documentos contractuales.
- La normativa vigente.
- Lo que aconsejan las Buenas Prácticas.

En resumen, los objetivos generales de la Auditoría serán:

- Comprobación de la disponibilidad de espacios, edificios, instalaciones técnicas y tecnológicas, equipamientos de las instalaciones y el mobiliario.
- Comprobación del cumplimiento de los indicadores de calidad-disponibilidad establecidos en los PPTE para el Servicio de Mantenimiento.

- Comprobación del cumplimiento de los "Estándares de calidad del servicio de mantenimiento" definidos en el ANEXO A del Apartado 5 del Anexo III de los PPTE.
- Comprobación del cumplimiento de las obligaciones técnicas y documentales establecidas en los PCAP y PPTE que afectan al servicio de Mantenimiento*.
- Revisión y control de la existencia y cumplimiento de los Planes de Mantenimiento.
- Revisión de los Planes de Eficiencia Energética. Análisis de los consumos energéticos y del cumplimiento de las obligaciones contractuales al respecto.
- Comprobación de la existencia de un inventario exhaustivo de todos los edificios, sus elementos estructurales y auxiliares, los espacios, sus dimensiones, funcionalidad y características, las instalaciones y los equipos del Centro, así como el mobiliario del Anexo VI.
- Revisión de los Planes de Reposición de los elementos, instalaciones y equipamiento del hospital objetos del contrato de concesión.
- Evaluación de todos los elementos relativos al Tratamiento de Legionella.
- Verificar los parámetros de los diferentes sistemas que definen una buena explotación y garantizan las debidas prestaciones y confort.
- Seguimiento de las incidencias detectadas en auditorías anteriores.

0.1 IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERVINIENTES: HOSPITAL, SOCIEDAD CONCESIONARA Y EMPRESA AUDITORA

En el caso del Hospital Universitario Infanta Cristina, objeto del presente informe los datos de las partes intervinientes son los siguientes:

- HOSPITAL: Hospital Universitario Infanta Cristina
- SOCIEDAD CONCESIONARIA: Hospital de Parla S.A.
- EMPRESA MANTENIMIENTO: Valoriza Facilities S.A.U.
- EMPRESA AUDITORA: Investigación y Control de Calidad S.A. (INCOSA).

0.2 PERIODO DE AUDITORÍA

Las distintas partes en que ha consistido la auditoría se han realizado en distintos periodos, los cuales pueden verse a continuación:

- **Inspección Física.** Auditoría presencial para el control in situ del estado de las instalaciones y el funcionamiento del equipo humano de mantenimiento: 01/11/17 – 23/11/17.

- **Inspección documental.** Auditoría documental para el control de realización de inspecciones técnico legal y documentación de gestión de los recursos humanos en el departamento de instalaciones: 01/11/17 – 23/11/17.

- **Inspección de activos físicos de la concesionaria (Anexo VI del PCAP)**. Auditoría presencial para el control in situ de la existencia y estado del mobiliario perteneciente a la concesionaria: 23/11/2017- 11/12/2017.

- **Realización de la presente auditoría.** Realización del presente documento de auditoría de calidad del servicio de mantenimiento. 24/11/2017 – 13/04/2018.

CAPÍTULO 1 DOCUMENTACIÓN REVISADA, NORMATIVA QUE APLICA Y METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

1.1 DOCUMENTACIÓN REVISADA

Listado de Documentación analizada, tanto en formato digital como in situ:

- Libro del edificio con toda la documentación de las instalaciones del edificio y su funcionamiento.
    - Proyectos de climatización, fontanería y saneamiento, electricidad, gas, solar fotovoltaica, solar térmica, al menos en soporte informático. Programa de funcionamiento de las instalaciones.
- Proyectos de equipamiento y mobiliarios
- Documentación contractual de la concesión (PCAP, PPTE y PPTR).
- Informe Anual de Mantenimiento (2016-2017).
- Informes mensuales de Mantenimiento (2016-2017).
- Programa de Mantenimiento Preventivo (disponibles los dos últimos años).
    - Programa de mantenimiento a largo plazo (quinquenal)
    - Programa de mantenimiento a medio plazo (anual).
    - Programa de mantenimiento a corto plazo (mensual).
- Programa de Mantenimiento correctivo (2016-2017).
    - Registro del mantenimiento correctivo de los últimos dos años.
    - Registro de los SPS del último año.
- Programa de Mantenimiento conductivo. (2016-2017)
    - Órdenes de Trabajo y Check List para mantenimiento conductivo.
    - Documentación de control energético elaborada a partir de los Check List.
- Programa de Mantenimiento técnico-legal.
    - Registros de control para la realización de revisiones y comprobación de su cumplimiento (Normalmente se registra en el programa de mantenimiento preventivo). (Actualizado a 2017).
    - Informes y actas de revisiones técnico legales archivados en formato digital en las oficinas de mantenimiento del hospital y en formato papel. (Actualizado a 2017)

  - Registro de certificaciones y calibrados en los aparatos de medida utilizados. (Actualizado a 2017)

- Inventario de instalaciones sometidas a mantenimiento, mobiliario y equipamiento de los centros actualizado del último año, en soporte informático. (Actualizado a 2017). Ciclo de vida de las instalaciones.
- Registro de quejas y respuesta a las mismas. (2017)
- Documentación contractual de la concesión (oferta de las SSC).
- Nombre de la aplicación informática para la gestión del mantenimiento empleada. Bases de datos del programa GMAO empleado por el mantenedor del hospital, consultado sobre los propios ordenadores del mantenedor.
- Nombre de la aplicación informática para la gestión técnica de las instalaciones y equipos empleada.
- Plan de ahorro y eficiencia energética (2006). Ampliación al Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (actualizado en 2015).
- Plan de Emergencia/Contingencia (diciembre 2014).
- Libros de mantenimiento en soporte físico.
- Manual de procedimientos de servicio. (2011) aprobado por la Administración.

1.2 NORMATIVA QUE APLICA

La normativa empleada para la realización de la auditoría de mantenimiento es la que a continuación se indica:

INSTALACIONES TERMICAS

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.
- Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.
- Norma UNE 100713:2005 de Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales.
- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio
- Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
- Segunda corrección de errores del Real Decreto 1826/2009. de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
- CTE DB HS-3 Calidad del aire interior en garajes.
- Real Decreto 1792/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones de Producción de Calor y se fijan sus enseñanzas mínimas.
- Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero de 1995, Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 1992/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 1993/68/CEE del Consejo.
- Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se publica el modelo oficial de certificado de mantenimiento para instalaciones térmicas en edificios de la Comunidad de Madrid.
- Orden 9343/2003, de 1 de octubre, por la que se establece el procedimiento para el registro, puesta en servicio e inspección de instalaciones térmicas no industriales en los edificios, conforme a lo establecido en el Decreto 38/2002, de 28 de febrero.

- Directiva 92/42/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos.

- Normas une referenciadas en los RD anteriores, y en particular:

    - UNE 100713 Tratamiento de aire en hospitales.

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

- CTE DB SI Seguridad en caso de incendio.

- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo. Entrada en vigor el 25 de marzo de 2007. Por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección.

- Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se MODIFICA el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

- Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. Aprobado por el Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre. Entrada en vigor el 16 de enero de 2005.

- CORRECCIÓN de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

- Orden de 16 de abril de 1998, sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del mismo.

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios INSTALACIONES DE APARATOS A PRESION.

- Directiva 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa a los recipientes a presión simples.

- Real Decreto 2486/1994 por el que se modifica el Real Decreto 1495/1991, de aplicación de la Directiva 1987/404/CEE, sobre Recipientes a Presión Simples.

- Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE,

sobre recipientes a presión simples.

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

- Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid. Decreto 341/1991.

INSTALACIONES DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES

- CTE DB HS-5 Evacuación de aguas residuales.

- Normas une referenciadas la normativa de aplicación.

INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA

- CTE DB HS-4 Suministro de agua potable.

- CTE DB HE-4 Apoyo energía solar para producción de ACS.

- REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

- Normas une referenciadas la normativa de aplicación.

INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

- Normas une referenciadas la normativa de aplicación, y en particular:

    - UNE-EN 737-31999 sistemas de distribución canalizada de gases medicinales.

INSTALACIONES ELECTRICAS DE BT

- Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC BT. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. (BOE Nº: 224 de 18/09/2002)

- CTE DB HE-3 Eficiencia energética de la iluminación

- ORDEN 7955/2006, de 19 diciembre, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se regula el mantenimiento y la inspección periódica de las instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia y alumbrado público.

- Orden 968/2007, de 18 de abril, de corrección de errores de la Orden 7955/2006, de

19 de diciembre, por la que se regula el mantenimiento y la inspección periódica. de las Instalaciones Eléctricas en Locales de Pública Concurrencia y Alumbrado Público.

- Normas UNE en particular las siguientes:
    - UNE-EN 12464 Iluminación de los lugares de trabajo.
    - UNE 72 112 Tareas visuales. Clasificación
    - UNE 72 163 Niveles de iluminación. Asignación de tareas

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Además de las indicadas en el apartado de instalaciones eléctricas:

- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
- Orden de 25 de octubre de 1979, sobre la implantación del documento de calificación empresarial para instaladores eléctricos.

INSTALACIONES ELECTRICAS DE AT

- Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
- Orden 16 de abril de 1991, por el que se modifica el punto 3.6 de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 06 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
- Orden de 23 de junio de 1988, que por la que se actualizan diversas instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
- Orden de 27 de noviembre de 1987, que por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
- Orden 18 de octubre de 1984, complementaria de la de 6 de julio que aprueba las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.

- Orden 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

- La Dirección General de la Energía, por la que se establecen normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación.

- Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.

ASCENSORES

- Orden 31 de marzo de 1981, por la que se fijan las condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales periódicas de los mismos.

- Resolución de 17 de noviembre de 2008, por la que se establece el modelo de identificación oficial de reconocimiento de inspección periódica de los ascensores.

- Orden 3711/2007, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden 13235/2000, de 29 de diciembre, sobre inspecciones y corrección de deficiencias en ascensores.

- Resolución de 24 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se establecen los defectos a considerar en las inspecciones técnicas periódicas de los ascensores en aplicación del Real Decreto 57/2005, del 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el incremento de seguridad del parque de ascensores existentes, y apertura de período de información pública.

- Orden 1728/2002, de 29 de abril, por la que se modifican los anexos de la Orden 13235/2000, de 29 de diciembre, sobre inspecciones y corrección de deficiencias en ascensores.

- Orden 13235/2000, de 29 de diciembre, Sobre inspecciones y corrección de deficiencias en ascensores.

- Orden 2513/1999, 31 de mayo, Sobre la inspección técnica periódica de los aparatos elevadores.

- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

- Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.

- Resolución de 10 de septiembre de 1998, por la que se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso.

- Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores y elementos de seguridad.

- Resolución de 3 de abril de 1997, por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas.

- Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los Aparatos Elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores.

- Orden 11289/1998, de 23 de diciembre, por la que se modifica el artículo 5 de la Orden 2617/1998, de 1 de junio, por el que se establecen normas para la regulación del sistema de mantenimiento e inspección de aparatos elevadores

- Orden 2617/1998, de 1 de junio de 1998, por la que se establecen normas para la regulación del sistema de mantenimiento e inspección de aparatos elevadores.

- Orden 1140/1997, de 24 de abril, por la que se establece la obligatoriedad de instalar puertas en cabina para los que carezcan de ellas. (Ver resumen).

- Resolución de 27 de abril de 1992, por la que se aprueban prescripciones técnicas no previstas en la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM1, del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención y sus elementos de seguridad.

- Orden de 12 de septiembre de 1991, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención.

- Orden de 23 de septiembre de 1987, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos.

- Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención.

- Orden 16 de noviembre de 1981, por la que se modifica el capítulo primero del título segundo del Reglamento de Aparatos Elevadores.

- Orden de 20 de julio de 1976, por la que se modifican los artículos que se citan del Reglamento de Aparatos Elevadores.

- Orden de 20 de noviembre de 1973, por la que se modifican determinados artículos del Reglamento de Aparatos Elevadores

- Orden de 30 de junio de 1966, por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.

INSTALACIONES PETROLIFERAS

- Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio".

- Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03 aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.

APARATOS A PRESIÓN

- Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias (R.D. 1244/79 de 4 de Abril y R.D. 769/99 de 7 de Mayo, por el que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el R.D. 1244/79).

SEGURIDAD PLANTAS FRIGORÍFICAS

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (R.D. 3099/77 de 8 de Septiembre).

HIGIÉNICO-SANITARIO

- Criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis (R.D. 909/2001 de 27 de Julio).

SEGURIDAD Y SALUD

- Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (R.D. 485/1997 de 14 de Abril).

EDIFICACIÓN

- Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96 Condiciones de Protección contra Incendios (R.D. 2177/1996 de 4 de Octubre).

1.3 METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

La metodología empleada para la auditoría del Hospital Universitario Infanta Leonor es la siguiente:

1.3.1 METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA A LAS INSTALACIONES

La metodología empleada para la detección de incidencias en las instalaciones, es la siguiente:

Para realizar el control de la auditoría, tanto en su parte física, la cual se analiza en el presente apartado, como la auditoría documental, que se analizará posteriormente, se han empleado Programas de Puntos de Inspección (PPI). En los mismos ha quedado registrado el resultado de la revisión realizada de cada una de las instalaciones o partes de las mismas.

En el Anexo I pueden observarse los distintos PPI de las inspecciones físicas.

La revisión del estado de las zonas revisadas o del adecuado mantenimiento de los elementos de las instalaciones se ha realizado, en el caso de elementos poco numerosos, en el 100% de mismos. En el caso de elementos muy numerosos como puedan ser los equipos instalados en cada una de las habitaciones o los cuadros eléctricos, los cuales puedan superar el centenar, se ha realizado un control por muestreo. En dicho muestreo se ha tomado un número de elementos representativo del total, siguiendo la siguiente gráfica:

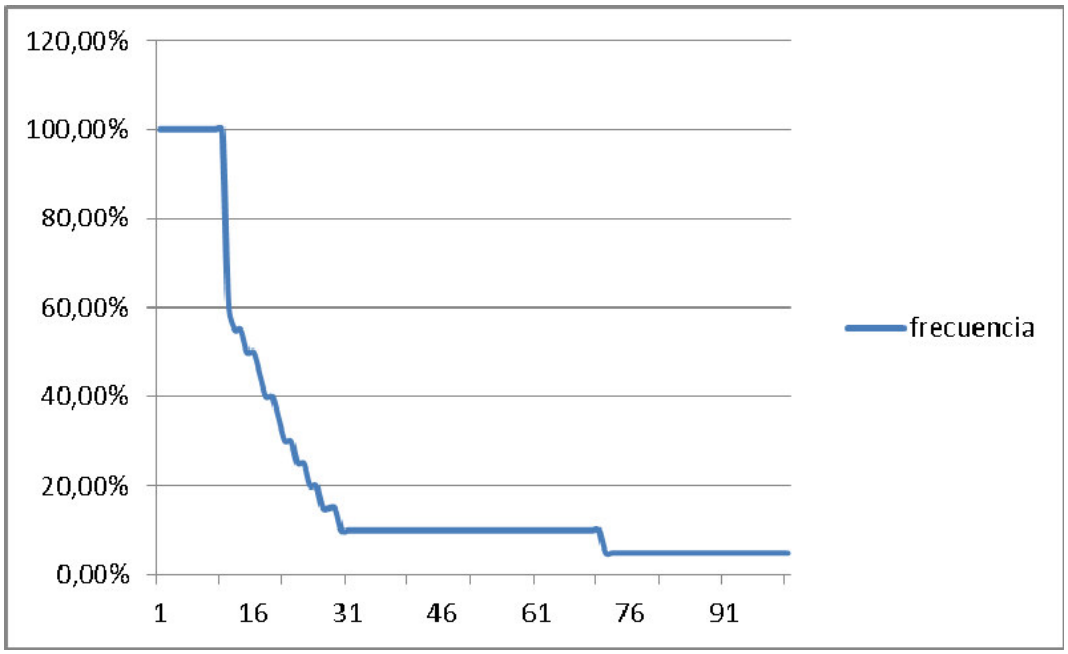

El número mínimo de instalaciones repetidas revisadas es de 10 unidades.

En cuanto al mobiliario presente en el hospital, se ha comprobado la existencia y estado de todos los elementos incluidos en el Anexo VI del PCAP de la documentación aportada “Equipamiento básico de mobiliario”.

Como criterio para la catalogación de las desviaciones, se han identificado las mismas con uno de los 3 niveles de criticidad que a continuación se indica:

- **Crítica**. Incumplimientos graves de la normativa. Que suponen un riesgo claro para las personas o el medio ambiente.

- **Media**. Incumplimientos de normativa. Estado de las instalaciones que supone un desgaste mucho mayor al normal de los equipos. Que puede derivar en un riesgo para las personas y/o medio ambiente.

- **Leve.** Que suponen un sobreconsumo energético, que dificultan el mantenimiento correcto de alguna instalación. Que puede derivar en una limitación de uso de salas y/o instalaciones y/o servicios.

Durante la auditoría se ha podido constatar que la empresa concesionaria se encuentra gestionando la resolución de parte de las incidencias en las instalaciones detectadas.

Para que la empresa auditora pueda evaluar que una incidencia se encuentran en proceso de subsanación, la Sociedad Concesionaria debe mostrar algún tipo de evidencia que acredite, al menos, haber comenzado las gestiones para la subsanación de estas. El tipo de documentos que se han considerado evidencia han sido:

- Ofertas emitidas por empresas externas.
- Pedidos internos de compra para contratación de servicios
- Comunicaciones de empresas externas indicando el comienzo de trabajos
- Trabajos de subsanación in situ.

1.3.2 METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA SEGÚN PPTE

La metodología empleada para el análisis y comprobación de la documentación obligatoria según PPTE ha sido la siguiente:

- Solicitud de documentación en formato digital por medio de la UTC. Se analiza y se estudia previo inicio de los chequeos a las instalaciones. La documentación que no se haya recibido se vuelve a solicitar.
- Ciertos aspectos se han chequeado in situ:
    - Libros de mantenimiento en formato físico.
    - Uso de las aplicaciones informáticas por parte del personal.
- La información obligatoria según el PPTE a aportar, y que no haya sido facilitada en el momento de emisión de la presente auditoría, se considera un incumplimiento del pliego de prescripciones técnicas.

- Si la documentación aportada no es lo suficientemente detallada a como establece el pliego de condiciones técnicas, se considera de igual manera un incumplimiento del mismo.

Se establece un criterio para evaluar la documentación que se exige en este punto. El criterio será el evaluar dicha documentación según el nivel de importancia en el PPTE. La documentación se clasifica en 3 niveles de importancia:

- Importancia Alta: 10%.
- Importancia Media: 5%.
- Importancia Baja: 2,5%.

La suma total de los porcentajes correspondientes debe alcanzar el 100%. En la tabla siguiente se enumera el listado de documentación a aportar, su grado de importancia y el aspecto a analizar sobre la misma.

DOCUMENTACIÓN Y MEDIOS	% IMPORTANCIA			ASPECTO A ANALIZAR	REFERENCIA AL PPTE/PCAP
	ALTA	MEDIA	BAJA		
1-Proyectos de equipamiento y mobiliarios. Relación del mobiliario y equipamiento del servicio.	10			Existencia de la documentación	PPTE Anexo III apartado 5 punto 4.1 B) / PCAP B8
2-Programa funcionamiento instalaciones (Libro del Edificio)	10			Existencia documentación Libro del Edificio: Esquemas de principio, planos de distribución, fichas técnicas, memorias descriptivas	PPTE Anexo III apartado 5 punto 4.1 A)
3-Inventario de instalaciones, mobiliario y equipos. Descripción detallada de cada equipo y número de unidades del mismo.	10			Existencia de documentación con los siguientes aspectos: características técnicas del equipo, número de unidades del mismo, ubicación, costes de adquisición, períodos de amortización	PPTE Anexo III apartado 5 punto 4.1B / PCAP B8
4-Registro de quejas y respuesta		5		Existencia de la documentación	PPTE Anexo III apartado 5 punto 4.3.7.3
5-Planes de ahorro y eficiencia energética					
Plan de ahorro y eficiencia energética (PAEE)	10			Existencia de la documentación	PCAP Cláusula 8 apartado j)
Estudios anuales de las medidas de mejora energética implantadas			5	Existencia de la documentación	
6-Plan de emergencia/contingencia o plan de autoprotección					
Plan de emergencia/contingencia	10			Existencia de la documentación	PPTE 2.3
Versión del Plan de emergencia/contingencia		5		Actualización de la documentación	PPTE 2.3
7-Libros de mantenimiento en soporte físico			2,5	Existencia de la documentación	
8-Manual de Procedimiento de Servicio					
Manual de Procedimiento del Servicio		5		Existencia de la documentación	PPTE 2.4
Aprobación del Manual de Procedimiento del Servicio			2,5	Aprobación de la documentación por parte de la Administración	PPTE 2.4
Versión del Manual de Procedimiento del Servicio			5	Actualización de la documentación	PPTE 2.4
9-Aplicación informática para gestión del mantenimiento			2,5	Existencia de la aplicación	PPTE Anexo III apartado 5 punto 4.2.4 a)
10-Aplicación informática para gestión técnica de instalaciones y equipos			2,5	Existencia de la aplicación	PPTE Anexo III apartado 5 punto 4.3
11-Capacidad, formación y organización de equipos de trabajo	10			Adecuación del personal	PPTE 2.2
12-Medios técnicos, gestión de almacenes y Stock		5		Adecuación de los medios logísticos	PPTE Anexo III apartado 5
TOTAL	**100**				

En cuanto al análisis de la documentación obligatoria según PPTE cabe mencionar que, la documentación perteneciente a los planes de mantenimiento se evaluará por separado debido a su importancia en la gestión del mantenimiento del Hospital Infanta Cristina.

1.3.3 METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO (DOCUMENTACIÓN REQUERIDA SEGÚN PPTE)

La metodología empleada para el análisis y comprobación de la elaboración de planes de mantenimiento según PPTE ha sido la siguiente:

- Solicitud de documentación en formato digital por medio de la UTC. Se analiza y se estudia previo inicio de los chequeos a las instalaciones. La documentación que no se ha recibido se vuelve a solicitar.
- Cierta documentación se ha chequeado in situ:
    - Planes de mantenimiento en formato digital (visualización del funcionamiento de los programas de mantenimiento y gestión de instalaciones. Exportación de datos para su análisis en la auditoría.
    - Registros de las OCAs en formato papel.
- La información obligatoria según el PPTE a aportar, y que no haya sido facilitada en el momento de emisión de la presente auditoría, se considera un incumplimiento del pliego de prescripciones técnicas.
- Si la documentación de los planes de mantenimiento aportada no es lo suficientemente detallada a como establece el pliego de condiciones técnicas, se considera de igual manera un incumplimiento del mismo.

Se establece un criterio para evaluar la documentación que se exige en este punto. El criterio será el evaluar dicha documentación según el nivel de importancia en el PPTE. La documentación se clasifica en 3 niveles de importancia:

- Importancia Alta: 10%.
- Importancia Media: 5%.
- Importancia Baja: 2,5%.

La suma total de los porcentajes correspondientes debe alcanzar el 100%. En la tabla siguiente se enumera el listado de documentación a aportar, su grado de importancia y el aspecto a analizar sobre la misma.

DOCUMENTACIÓN	% IMPORTANCIA			ASPECTO A ANALIZAR	REFERENCIA AL PPTE
	ALTA	MEDIA	BAJA		
1-Plan de Mantenimiento Conductivo					
Programa de necesidades		5		Existencia de la documentación	Apartado 5/Punto 4.2.1
Emisión de órdenes de trabajo, exportación y revisión de Check List		5		Existencia de la documentación	Apartado 5/Punto 4.2.1
Documentación de control de mantenimiento Conductivo			2,5	Existencia de la documentación	Apartado 5/Punto 4.2.1
Evolución de consumos energéticos de los últimos tres años			2,5	Existencia de la documentación	Apartado 5/Punto 4.2.1
Mediciones de confort		5		Adecuación de valores a Normativa correspondiente	
2-Plan de Mantenimiento Preventivo					
Plan de Reposición detallado (30 años, duración de la concesión).			2,5	Existencia y Adecuación de la documentación	
Ciclo de vida útil de las instalaciones			2,5	Existencia y Adecuación de la documentación	Apartado 5/4.1B (PPTE)
Planes a largo plazo (quinquenales)	10			Existencia y Adecuación de la documentación	Apartado 5/Punto 4.2.2
Planes a medio plazo(anuales)		5		Existencia y Adecuación de la documentación	Apartado 5/Punto 4.2.2
Planes a corto plazo (mensuales)		5		Existencia y Adecuación de la documentación	Apartado 5/Punto 4.2.2
Registro del mantenimiento preventivo realizado			2,5	Existencia y Adecuación de la documentación	Apartado 5/Punto 4.2.2
3-Plan de Mantenimiento Correctivo					
Registro de las OTs de mantenimiento correctivo de los últimos dos años		5		Existencia de la documentación	Apartado 5/Punto 4.2.3
Nivel cumplimentación de OTs (índice criticidad, medidas de seguridad, tiempos de respuesta, frecuencia de incidencias, etc)	10			Adecuación de la documentación	Apartado 5/Punto 4.2.3
Correspondencia de las SPS con las OTs en los últimos dos años	10			Existencia de la documentación	Apartado 5/Punto 4.2.3
4-Plan de Mantenimiento Técnico-Legal					
Informes técnico-legales: OCAs	10			Existencia de la documentación	Apartado 5/Punto 4.2.4
Registros para control de realización de las revisiones Técnico-legales			2,5	Existencia de la documentación	Apartado 5/Punto 4.2.4
Certificaciones y calibrados de los aparatos de medida utilizados			2,5	Existencia de la documentación	Apartado 5/Punto 4.2.4
5-Informes de resumen de mantenimiento					
Informe anual de mantenimiento 2017		5		Existencia de la documentación	Apartado 5/Punto 4.2.4
Informe anual de mantenimiento 2016		5		Existencia de la documentación	Apartado 5/Punto 4.2.4
Informe mensual de mantenimiento del último año			2,5	Existencia de la documentación	Apartado 5/Punto 4.2.4
TOTAL	**100**				

1.3.4 METODOLOGÍA PARA LA REVISIÓN DEL PLAN DE REPOSICIÓN (ANÁLISIS DE LA VIDA ÚTIL DE LAS INSTALACIONES)

La Sociedad Concesionaria debe elaborar un plan de reposición, el cual afecta tanto a obra civil como a instalaciones y mobiliario. En el PPTE se comenta de la siguiente manera:

"En concreto realizará y someterá a la Administración Sanitaria para su aprobación:

Planes a largo plazo.-Planes de 5 años para los edificios e instalaciones, incluyendo mantenimiento de ciclos de vida, sustituciones y mejoras previstas y programas de reposición y renovación".

La metodología empleada para la revisión del plan de reposición es la siguiente:

Primero, se solicita la documentación necesaria y se analiza si la misma tiene el grado de detalle necesario. Si está no cumple con los requisitos necesarios se vuelve a solicitar con más grado de detalle.

Si la información recibida es correcta se procede a comprobar si el plan de reposición ha sido llevado a cabo y se está cumpliendo, esta comprobación se puede realizar de dos formas:

- Mediante el aporte por parte de la concesionaria de documentación que confirme que las reposiciones previstas en dicho plan se está llevando a cabo. La documentación que se tiene en cuenta a la hora de validar el cumplimiento de dicho plan es.
    - Aporte de facturas que apoyen las reposiciones previstas en las distintas instalaciones.
    - Proyectos realizados por organismos externos en los que se refleje dicha sustitución.
    - Listado especificado de las instalaciones actuales (siempre que estas sean diferentes que las instalaciones iniciales reflejadas en el libro del edificio).
- Mediante la inspección visual de que dicha reposición ha sido realizada.

En caso de que la información recibida no sea la solicitada se presupone que no se está cumpliendo dicho plan y se procede a la estimación de la vida útil de los equipos y a su estado actual en cuanto a vida útil consumida según la fecha de inicio de funcionamiento del hospital. En función de esto se clasifica en cuatro estados que se describen a continuación:

- Plazo de reposición sobrepasado: Si en el momento de la revisión la instalación se debería haber cambiado.
- En plazo de reposición: Si el equipo ha de ser cambiado en el año en curso.
- Próximo fin vida útil: Si la instalación ha de ser repuesta en dos años o menos.
- Correcto: Si se dispone de tres años o más para la reposición de dicha instalación.

Una vez realizado este análisis, los resultados se muestran en el apartado 3.4 “Resultados del análisis de la vida útil de las instalaciones”.

1.3.5 METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA A LOS ACTIVOS FÍSICOS DE MOBILIARIO DEL ANEXO VI DEL PCAP.

La metodología de trabajo utilizada en la auditoria de activos del Hospital Infanta Cristina ha consistido en realizar un exhaustivo cuenteo de todos los ítems recogidos dentro del anexo VI del PCAP, prestando atención a la ubicación, al número de existencias y al estado de los activos, documentando las principales incidencias mediante fotografías.

A partir del cuenteo realizado se obtiene el **% de existencia** de activos físicos según el Anexo VI del PCAP.

El estado de los equipamientos de mobiliario se clasifica en tres niveles diferentes dependiendo del grado de conservación:

- **Bueno**, si el activo está acorde con las cualidades que cabe atribuirle por su naturaleza o destino.
- **Deteriorado**, si el activo no se encuentra en el estado óptimo de conservación, presenta un desgaste mayor del esperado pero todavía es funcional.
- **Roto**, el activo presenta fracturas evidentes o averías que impiden su correcto funcionamiento.

El procedimiento para identificar los equipamientos básicos de mobiliario de la concesionaria, es detectar las pegatinas que acreditan su propiedad. Estas pegatinas presentan un etiquetado con un código que es recogido para identificar el ítem dañado.

1.3.6 METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA A LAS MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA IMPLANTADAS

La metodología utilizada para la auditoría de las medidas de mejora energética implantadas sigue el siguiente proceso:

- Se analiza el PAEE (Plan de Ahorro y Eficiencia Energética) inicial y la ampliación al mismo (2012), en el cual se desarrollan Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética.
- Se solicitan los estudios o informes, en los cuales se desarrollan las medidas energéticas implantadas en los últimos años
- Se comprueban in situ las medidas energéticas realizadas en el hospital y se aportan fotos u otras pruebas de su correcta implantación

CAPÍTULO 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA

En dicho capítulo se muestra un resumen de las incidencias o % cumplimiento de los distintos parámetros a evaluar en la auditoría: estado de las instalaciones, estado de los activos físicos de mobiliario, documentación técnico-legal, documentación de mantenimiento según PPTe, mediciones de confort y planes o medidas para el ahorro y eficiencia energética.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de la adecuación de la gestión del mantenimiento por parte de la Sociedad Concesionaria.

La catalogación de los distintos aspectos a evaluar en la presente auditoría como adecuado o no adecuado se basa en el % incumplimiento con las obligaciones contractuales según PPTE. Dicha catalogación se establece en el "Capítulo 3: Resultados de la Auditoría".

Resumen ejecutivo de la Auditoría	
Aspectos a Auditar	**Adecuación**
1-Mantenimiento y conservación de las instalaciones físicas	ADECUADO
2-Documentación obligatoria según PPTE	ADECUADO
3-Planes de Mantenimiento según PPTE	
3.1-Plan de Mantenimiento Conductivo	NO ADECUADO
3.2-Plan de Mantenimiento Preventivo	NO ADECUADO
3.3-Plan de mantenimiento Correctivo	NO ADECUADO
3.4-Plan de Mantenimiento Técnico-Legal	ADECUADO
4-Existencia y Mantenimiento del Mobiliario del Anexo VI del PCAP	NO ADECUADO
5-Medidas de eficiencia energética implantadas	ADECUADO

2.1 RESUMEN DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS EN INSTALACIONES

En la siguiente tabla se puede observar las incidencias detectadas en cuanto al mantenimiento de las instalaciones y las que se han podido subsanar o está en ejecución su subsanación.

INSTALACIÓN	PPI´s ASOCIADOS	INCIDENCIAS ACTUALES				INCIDENCIAS DESPUÉS SOLUCIÓN IN SITU			
		CRÍTICAS	MEDIAS	LEVES	TOTAL	CRÍTICAS	MEDIAS	LEVES	TOTAL
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN	ID-ITL-01, IF-IE-01, IF-IE-02 e IF-IE-04	1	1	9	11	0	1	6	7
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN	ID-ITL-01 e IF-IE-03	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES TÉRMICAS	ID-ITL-04 e IF-CLI-01	0	0	4	4	0	0	3	3
CENTRALES FRIGORÍFICAS	ID-ITL-04 e IF-CLI-01	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE	ID-ITL-04, ID-ITL-05, IF-CL-03 y IF-CL-02	0	3	78	81	0	3	46	49
CÁMARAS FRIGORÍFICAS, FRIGORÍFICOS Y AIRE ACONDICIONADO AUTÓNOMO	ID-ITL-02, ID-ITL-03 e IF-FRG-01	0	0	0	0	0	0	0	0
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACS	ID-ITL-03, ID-ITL-06, ID-ITL-07 e IF-ACS-01	0	2	1	3	0	2	1	3
INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	ID-ITL-08 e IF-CMB-01	0	0	1	1	0	0	1	1
INSTALACIÓN GENERAL DE FONTANERÍA Y TRATAMIENTO DE AGUA	ID-ITL-02 e IF-IF-01	0	0	1	1	0	0	1	1
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y RED DE DATOS	IF-TLC-01 e IF-DTA-01	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS	ID-ITL-01, IF-PCI-01 e IF-PCI-02	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALACIONES DE VACÍO Y GASES MEDICINALES	ID-ITL-09 e IF-GM-01	0	0	0	0	0	0	0	0
PARARRAYOS	IF-IE-04	0	0	3	3	0	0	3	3
APARATOS ELEVADORES	ID-ITL-01 e IF-ASC- 01	0	4	1	5	0	2	1	3
INSTALACIONES ESPECIALES: QUIRÓFANOS, UVIS...	ID-ITL-01 e IF-QRF-01	0	0	9	9	0	0	9	9
SEÑALIZACIÓN, COMPLEMENTOS DE EDIFICACIÓN Y PINTURA Y COMPLEMENTOS	IF-EG-01 e IF-EG-02	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTADO CONSTRUCTIVO DEL EDIFICIO (*)	IF-EG-01 e IF-EG-02	0	0	7	7	0	0	7	7
PUERTAS AUTOMÁTICAS	IF-PAT-01	0	0	1	1	0	0	1	1
TRANSPORTE NEUMÁTICO	IF-TRN-01	0	0	3	3	0	0	3	3
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	IF-VIG-01	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA	IF-SO-01	0	0	1	1	0	0	1	1
DETECCIÓN DE CO Y EXTRACCIÓN EN APARCAMIENTOS	IF-VIG-01	0	0	0	0	0	0	0	0
ALUMBRADO EXTERIOR	IF-IE-04 e IF-EG-02	0	0	0	0	0	0	0	0
SANEAMIENTO	IF-SAN-01	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPACTADORES DE RESIDUOS CLASIFICADOS	IF-EG-01 e IF-EG-02	0	0	0	0	0	0	0	0
SISTEMA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES	IF-GMA-01	0	0	0	0	0	0	0	0
SISTEMA DE CONTROL ENERGÉTICO DE LAS INSTALACIONES	ID-ITL- 04, ID-ITL-05 e IF-GEN-01	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**1**	**10**	**119**	**130**	**0**	**8**	**83**	**91**

- Se ha encontrado una deficiencia crítica en las instalaciones revisadas. Esta incidencia ha sido subsanada al momento.
- Se han detectado 130 incidencias, de las cuales 39 fueron solucionadas al momento (30%).
- Sólo 10 de las incidencias encontradas son de un nivel medio o superior a leve (7,7%), de las cuales 2 fueron solucionadas al momento.

- En el Anexo II se aportan todos los Check List correspondientes a las evaluaciones realizadas.
- En el capítulo siguiente se analizan de manera más pormenorizada los resultados obtenidos y se catalogan dichos resultados.

2.2 RESUMEN DEL % CUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA A LA S.C. SEGÚN PPTE

En la siguiente tabla se puede observar el % cumplimiento con la documentación obligatoria según el PPTE.

DOCUMENTACIÓN Y MEDIOS	% IMPORTANCIA			% CUMPLIMIENTO
	ALTA	MEDIA	BAJA	
1-Proyectos de equipamiento y mobiliarios. Relación del mobiliario y equipamiento del servicio.	10			10
2-Programa funcionamiento instalaciones (Libro del Edificio)	10			10
3-Inventario de instalaciones, mobiliario y equipos. Descripción detallada de cada equipo y número de unidades del mismo.	10			5
4-Registro de quejas y respuesta		5		5
5-Planes de ahorro y eficiencia energética				
Plan de ahorro y eficiencia energética (PAEE)	10			10
Estudios anuales de las medidas de mejora energética implantadas		5		0
6-Plan de emergencia/contingencia o plan de autoprotección				
Plan de emergencia/contingencia	10			10
Versión del Plan de emergencia/contingencia		5		5
7-Libros de mantenimiento en soporte físico			2,5	2,5
8-Manual de Procedimiento de Servicio				
Manual de Procedimiento del Servicio		5		5
Aprobación del Manual de Procedimiento del Servicio			2,5	2,5
Versión del Manual de Procedimiento del Servicio		5		5
9-Aplicación informática para gestión del mantenimiento			2,5	2,5
10-Aplicación informática para gestión técnica de instalaciones y equipos			2,5	2,5
11-Capacidad, formación y organización de equipos de trabajo	10			10
12-Medios técnicos, gestión de almacenes y Stock		5		5
TOTAL	**100**			**90**

- ***El % de incumplimiento, por tanto, es de un 10,0%.***
- No se dispone de los siguientes documentos, lo cual supone un Incumplimiento del PPTE:

- Inventario de instalaciones, mobiliario y equipos.
- Estudios anuales de las medidas de mejora energética implantadas.

En el *Capítulo 3.2* se analizan de manera más pormenorizada los resultados obtenidos y se catalogan dichos resultados.

2.3 Resumen del % Cumplimiento de la Documentación Propia de los Planes de Mantenimiento

En la siguiente tabla se puede observar el % cumplimiento en cuanto a la documentación de los planes de mantenimiento existente y su adecuación.

DOCUMENTACIÓN	% IMPORTANCIA			% CUMPLIMIENTO
	ALTA	MEDIA	BAJA	
1-Plan de Mantenimiento Conductivo				
Programa de necesidades		5		0
Emisión de órdenes de trabajo, exportación y revisión de Check List		5		5
Documentación de control de mantenimiento Conductivo			2,5	2,5
Evolución de consumos energéticos de los últimos tres años			2,5	0
Mediciones de confort	10			4
2-Plan de Mantenimiento Preventivo				
Plan de Reposición detallado (30 años, duración de la concesión).			2,5	0
Ciclo de vida útil de las instalaciones			2,5	0
Planes a largo plazo (quinquenales)	10			10
Planes a medio plazo(anuales)		5		3
Planes a corto plazo (mensuales)		5		2
Registro del mantenimiento preventivo realizado			2,5	0
3-Plan de Mantenimiento Correctivo				
Registro de las OTs de mantenimiento correctivo de los últimos dos años		5		5
Nivel cumplimentación de OTs (índice criticidad, medidas de seguridad, tiempos de respuesta, frecuencia de incidencias, etc)	10			2
Correspondencia de las SPS con las OTs en los últimos dos años	10			8,4
4-Plan de Mantenimiento Técnico-Legal				
Informes técnico-legales: OCAs	10			10
Registros para control de realización de las revisiones Técnico-legales			2,5	2,5
Certificaciones y calibrados de los aparatos de medida utilizados			2,5	2,5
5-Informes de resumen de mantenimiento				
Informe anual de mantenimiento 2017		5		5
Informe anual de mantenimiento 2016		5		5
Informe mensual de mantenimiento del último año			2,5	2,5
TOTAL	**100**			**69,4**

- ***El % de incumplimiento, por tanto, es de un 30,6%.***
- No se dispone de los siguientes documentos o no son adecuados, lo cual supone un incumplimiento del PPTE.
    - Programa de necesidades.
    - Evolución de consumos energéticos de los últimos tres años.
    - Plan de Reposición Detallado (30 años duración de la concesión).
    - Ciclo de vida útil de las instalaciones.
    - Registro del mantenimiento preventivo realizado
    - Plan de mantenimiento preventivo a corto plazo.
    - Registro del mantenimiento preventivo realizado.
    - Nivel cumplimentación de OTs (índice criticidad, medidas de seguridad, tiempos de respuesta, frecuencia de incidencias, etc.)
- En el *Capítulo 3.3* se analizan de manera más pormenorizada el resultado de la auditoría.

2.4 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LA VIDA ÚTIL DE LAS INSTALACIONES

Una vez analizado el plan de reposiciones a 30 años podemos decir que este aunque existente carece del grado de detalle necesario para que sea posible su análisis. A continuación se muestra una tabla donde se incluyen todos los equipos cuya reposición debería haberse realizado.

Descripción	Vida Útil estimada concesionaria	Vida Útil INCOSA	Vida útil restante (años)	Nº Equipos	Estado
FAN-COIL	80%	6	-4	922	PLAZO DE REPOSICIÓN SOBREPASADO
BOMBA ACS	100%	6	-4	3	PLAZO DE REPOSICIÓN SOBREPASADO
BOMBA CLIMATIZACIÓN	160%	7	-3	18	PLAZO DE REPOSICIÓN SOBREPASADO
BOMBA JOCKEY	100%	5	-5	1	PLAZO DE REPOSICIÓN SOBREPASADO
BOMBA PCI	(100%-0%)	5	-5	2	PLAZO DE REPOSICIÓN SOBREPASADO
SAI	400%	7	-3	26	PLAZO DE REPOSICIÓN SOBREPASADO
ARMARIO FRIGORÍFICO	130%	10	0	2	EN PLAZO DE REPOSICIÓN

2.5 RESUMEN DEL INCUMPLIMIENTO DEL ANEXO VI DEL PCAP

En la siguiente tabla se puede comprobar el % de existencia de activos físicos del Anexo VI del PCAP y el estado de conservación de los mismos en todo el hospital.

Esta tabla se obtiene luego de unificar items que corresponden a un mismo elemento pero se encuentran escritos de diferente manera en el Anexo VI, éstos son:

- "Almohada" y "almohada para cama clínica" se han unificado con el nombre: "almohada para cama clínica".
- "Barra soporte lateral pared" y "Barra soporte lateral de pared" se han unificado como: "Barra soporte lateral pared".
- "Cama clínica eléctrica con accesorios", "cama clínica eléctrica" y "cama clínica con accesorios" se han unificado con el nombre: "Cama clínica eléctrica con accesorios".
- "Camilla de transporte de pacientes" y "camilla de transporte" se han unificado como: "Camilla de transporte de pacientes".
- "Colchón de látex para cama clínica", "colchones de látex para cama clínica" y "colchón de espuma para cama clínica", se han unificado con el nombre de: "Colchón de látex para cama clínica".
- "Cuña de acero inoxidable", "cuña de acero inoxidable con soporte", "cuña con soporte" y "cuña con portacuñas" se han unificado con el nombre: "Cuña de acero inoxidable".
- "Esfigmomanómetro de mercurio de pared" y "esfigmomanómetro de pared" se han unificado como: "Esfigmomanómetro de mercurio de pared".
- "Gavetas para material fungible" y "gavetas para fungible" se han unificado con el nombre: "Gavetas para material fungible".
- "Palangana de aseo metálica" y "palangana de baño metálica" se han unificado con el nombre: "Palangana de aseo metálica".
- "Sillón ergonómico para pacientes" y "sillones ergonómicos para paciente", se han unificado con el nombre: "Sillón ergonómico para pacientes".
- Se han eliminado los siguientes ítems ya que no corresponden a un mobiliario que auditar: "instalación fija", "instalación fija específica", "sin mobiliario clínico", "equipamiento médico específico", "equipamiento técnico específico", "equipamiento específico".

Cabe resaltar que en el análisis que se realiza posteriormente donde se muestran los resultados según la zona asistencial del hospital se muestran los ítems tal cual como aparecen en el Anexo VI del PCAP, es decir sin la unificación aquí mostrada.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL									
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.		INCOSA				TOTAL HOSPITAL			
	Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente			
Nº	Nombre	Anexo VI	Existencia	% Existenc	Faltan	% BUENO	% ROTO	% DETERIORADO	
1	"Tablilla" de Historia Clínica	390	0	0,0%	390	-	-	-	
2	Abrazadera en pared (elemento fijo)	182	175	96,2%	7	100,0%	0,0%	0,0%	
3	Accesorios de ducha (elemento fijo)	182	173	95,1%	9	100,0%	0,0%	0,0%	
4	Ala de 1 m. para mesa	14	6	42,9%	8	100,0%	0,0%	0,0%	
5	Almacenable en pales	1	1	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%	
6	Almohada para cama clínica	338	168	49,7%	170	100,0%	0,0%	0,0%	
7	Altar	1	1	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%	
8	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	28	13	46,4%	15	100,0%	0,0%	0,0%	
9	Armario altura 125 X 80 x 40 cm.	18	6	33,3%	12	100,0%	0,0%	0,0%	
10	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	206	190	92,2%	16	100,0%	0,0%	0,0%	
11	Armario altura 200 X 80 x 40 cm. Con estantería y archivador	8	7	87,5%	1	100,0%	0,0%	0,0%	
12	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	27	8	29,6%	19	100,0%	0,0%	0,0%	
13	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	49	12	24,5%	37	100,0%	0,0%	0,0%	
14	Armario de biblioteca de 200 x 80 x 40 cm de ancho	12	12	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%	
15	Armario endoscopia	5	2	40,0%	3	100,0%	0,0%	0,0%	
16	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm.	21	21	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%	
17	Armario modular 200x40x100 cms	3	1	33,3%	2	100,0%	0,0%	0,0%	
18	Armario oficio colgado 80 x 90 x 35 cm.	5	2	40,0%	3	100,0%	0,0%	0,0%	
19	Armario ropero modular	729	811	100,0%	0	92,2%	0,0%	7,8%	
20	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	318	167	52,5%	151	72,5%	21,6%	6,0%	
21	Asiento modular confortable	6	2	33,3%	4	100,0%	0,0%	0,0%	
22	Aspirador y contenedor	18	0	0,0%	18	-	-	-	
23	Balanza de 10 kilos	3	1	33,3%	2	100,0%	0,0%	0,0%	
24	Balas de oxígeno	6	0	0,0%	6	-	-	-	
25	Banco de vestidor	67	72	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%	
26	Banco para ducha	2	0	0,0%	2	-	-	-	
27	Banquillos elevadores	10	1	10,0%	9	100,0%	0,0%	0,0%	
28	Barra soporte lateral pared	20	15	75,0%	5	100,0%	0,0%	0,0%	
29	Báscula de pie con altímetro	75	39	52,0%	36	100,0%	0,0%	0,0%	
30	Báscula de suelo	1	2	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%	
31	Báscula pesa bebes con tallímetro	1	1	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%	
32	Biombos de 2-3 cuerpos	6	0	0,0%	6	-	-	-	
33	Botella	209	52	24,9%	157	100,0%	0,0%	0,0%	
34	Butaca de extracciones con sujeta brazos	8	1	12,5%	7	100,0%	0,0%	0,0%	
35	Butaca paciente/acompañante	186	0	0,0%	186	-	-	-	
36	Cafetera eléctrica	14	7	50,0%	7	100,0%	0,0%	0,0%	
37	Cafetera expres de una salida	1	0	0,0%	1	-	-	-	
38	Cajonera colgante de dos cajones	200	52	26,0%	148	100,0%	0,0%	0,0%	
39	Cajonera de mostrador	47	25	53,2%	22	100,0%	0,0%	0,0%	
40	Cajonera de tres cajones con ruedas	126	161	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%	
41	Calentador de biberones	4	2	50,0%	2	50,0%	0,0%	50,0%	
42	Cama clínica eléctrica con accesorios	346	221	63,9%	125	94,6%	2,3%	3,2%	
43	Cama especial UCI con accesorios	20	9	45,0%	11	100,0%	0,0%	0,0%	
44	Cama individual	21	21	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%	
45	Cama infantil con barandilla	8	1	12,5%	7	100,0%	0,0%	0,0%	
46	Cámara de cadáveres de 6 cuerpos	6	6	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%	
47	Camilla de exploración de tres cuerpos	2	2	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%	
48	Camilla de exploración ginecológica	2	4	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%	
49	Camilla de transporte de pacientes	6	2	33,3%	4	100,0%	0,0%	0,0%	
50	Camilla de urgencias con barandillas	30	18	60,0%	12	94,4%	5,6%	0,0%	
51	Camillas	2	2	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%	
52	Carro alto portapalanganas rodado	10	0	0,0%	10	-	-	-	
53	Carro auxiliar de yesos	4	4	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%	
54	Carro auxiliar pequeño 60 x 40 x 85	8	3	37,5%	5	100,0%	0,0%	0,0%	
55	Carro bajo portapalanganas	10	9	90,0%	1	100,0%	0,0%	0,0%	
56	Carro de curas	1	1	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%	
57	Carro de curas con cajones	120	102	85,0%	18	100,0%	0,0%	0,0%	
58	Carro de curas de 3 estantes con buzón de deshechos	10	3	30,0%	7	100,0%	0,0%	0,0%	
59	Carro de distribución material esteril tipo quirófano	18	10	55,6%	8	100,0%	0,0%	0,0%	
60	Carro de fungible	26	8	30,8%	18	100,0%	0,0%	0,0%	
61	Carro de historias clínicas	15	0	0,0%	15	-	-	-	
62	Carro de lencería	37	35	94,6%	2	100,0%	0,0%	0,0%	
63	Carro de limpieza	15	10	66,7%	5	100,0%	0,0%	0,0%	
64	Carro de parada	9	1	11,1%	8	100,0%	0,0%	0,0%	
65	Carro de suturas	10	9	90,0%	1	100,0%	0,0%	0,0%	

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL								
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.		INCOSA				TOTAL HOSPITAL		
	Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente		
Nº	Nombre	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	% BUENO	% ROTO	% DETERIORADO
66	Carro de transporte de ropa sucia	111	20	18,0%	91	100,0%	0,0%	0,0%
67	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	19	2	10,5%	17	100,0%	0,0%	0,0%
68	Carro infantil con ruedas 90 x 55 x 59 cm.	1	1	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
69	Carro medicación anestesia	10	9	90,0%	1	100,0%	0,0%	0,0%
70	Carro para material de tres estantes inoxidable	8	1	12,5%	7	100,0%	0,0%	0,0%
71	Carros nodriza	3	0	0,0%	3	-	-	-
72	Caudalímetro 02 con humidificador	49	42	85,7%	7	100,0%	0,0%	0,0%
73	Caudalímetro de oxígeno	325	179	55,1%	146	100,0%	0,0%	0,0%
74	Cesta de acero inoxidable 60 x 30 x 14	70	80	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
75	Cestas alámbricas	10	9	90,0%	1	100,0%	0,0%	0,0%
76	Colchón de cama especial UCI	20	9	45,0%	11	55,6%	0,0%	44,4%
77	Colchón de látex para cama clínica	330	201	60,9%	129	95,5%	0,5%	4,0%
78	Colgador mural individual	251	130	51,8%	121	90,0%	9,2%	0,8%
79	Colgador mural múltiple (módulo)	107	50	46,7%	57	98,0%	0,0%	2,0%
80	Colgador para ropero	2505	0	0,0%	2505	-	-	-
81	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	149	91	61,1%	58	98,9%	1,1%	0,0%
82	Conjunto encastrado de codina y fregadero (equipamiento fijo)	1	1	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
83	Conjunto encastrado de codina y fregadero (obra)	1	2	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
84	Conjunto lineal de asientos y mesitas	58	34	58,6%	24	100,0%	0,0%	0,0%
85	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	285	248	87,0%	37	100,0%	0,0%	0,0%
86	Contenedor de sondas de aspiración	8	7	87,5%	1	100,0%	0,0%	0,0%
87	Cortina para box de urgencias	22	27	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
88	Cortinaje de ducha	25	20	80,0%	5	90,0%	0,0%	10,0%
89	Cortinaje de exploración	150	75	50,0%	75	100,0%	0,0%	0,0%
90	Cortinaje de separación	24	0	0,0%	24	-	-	-
91	Cuadro decoración pared	358	253	70,7%	105	99,6%	0,4%	0,0%
92	Cubo alto con soporte giratorio	12	3	25,0%	9	100,0%	0,0%	0,0%
93	Cubo de basura 100L	6	5	83,3%	1	100,0%	0,0%	0,0%
94	Cubo de basura 50L	1	4	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
95	Cubo de basura con pedal 12L	544	67	12,3%	477	44,8%	35,8%	19,4%
96	Cubo de basura con pedal 50L	7	3	42,9%	4	100,0%	0,0%	0,0%
97	Cubo de basura con pedal 5L	373	123	33,0%	250	97,6%	0,0%	2,4%
98	Cubo de basura con tapa basculante de 50L	45	12	26,7%	33	100,0%	0,0%	0,0%
99	Cubo de basura de 25L	9	1	11,1%	8	100,0%	0,0%	0,0%
100	Cuna alta	11	6	54,5%	5	100,0%	0,0%	0,0%
101	Cunas neonato	18	4	22,2%	14	100,0%	0,0%	0,0%
102	Cuña de acero inoxidable	243	0	0,0%	243	-	-	-
103	Depósito de alcohol	1	0	0,0%	1	-	-	-
104	Dispensador de cepillos	5	0	0,0%	5	-	-	-
105	Dispensador de jabón	576	384	66,7%	192	99,0%	1,0%	0,0%
106	Dispensador de jabón para zona quirúrgica	5	5	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
107	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	420	376	89,5%	44	100,0%	0,0%	0,0%
108	Dispensador de toallas de papel	344	234	68,0%	110	99,6%	0,0%	0,4%
109	Escabel	185	106	57,3%	79	100,0%	0,0%	0,0%
110	Escalera 1 peldaño inoxidable	10	5	50,0%	5	100,0%	0,0%	0,0%
111	Escalera con cinco peldaños y pies aislantes	8	1	12,5%	7	100,0%	0,0%	0,0%
112	Escalera con tres peldaños y pies aislantes	8	2	25,0%	6	100,0%	0,0%	0,0%
113	Escobilla WC	195	175	89,7%	20	100,0%	0,0%	0,0%
114	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	533	85	15,9%	448	100,0%	0,0%	0,0%
115	Espejo encastrado (elemento fijo)	366	322	88,0%	44	99,4%	0,0%	0,6%
116	Estación de picking	1	1	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
117	Estantería de 180 x 100 cm. Y 8 estantes	79	98	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
118	Estantería de pared de 3 estantes	14	15	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
119	Estantería metálica 5/6 niveles ML	107	89	83,2%	18	100,0%	0,0%	0,0%
120	Expositor de folletos	35	4	11,4%	31	100,0%	0,0%	0,0%
121	Foco de exploración de pie	164	83	50,6%	81	100,0%	0,0%	0,0%
122	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	32	11	34,4%	21	100,0%	0,0%	0,0%
123	Fotocopiadoras	7	1	14,3%	6	100,0%	0,0%	0,0%
124	Frigorífico 300L	15	9	60,0%	6	100,0%	0,0%	0,0%
125	Frigorífico 80L	7	6	85,7%	1	100,0%	0,0%	0,0%
126	Gavetas para material fungible	98	86	87,8%	12	100,0%	0,0%	0,0%
127	Grúa para pacientes	1	0	0,0%	1	-	-	-
128	Horno microondas empotrado	17	16	94,1%	1	100,0%	0,0%	0,0%
129	Jardinera	58	1	1,7%	57	100,0%	0,0%	0,0%
130	Juego de bandejas	75	5	6,7%	70	100,0%	0,0%	0,0%
131	Juego de barandillas para cama clínica	181	159	87,8%	22	93,7%	3,1%	3,1%

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL								
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.		INCOSA				TOTAL HOSPITAL		
	Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente		
Nº	Nombre	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	% BUENO	% ROTO	% DETERIORADO
132	Juego estándar de curas	198	43	21,7%	155	100,0%	0,0%	0,0%
133	Lámpara de quirófano (elemento fijo)	10	17	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
134	Lavabo con repisa (elemento fijo)	378	368	97,4%	10	99,5%	0,3%	0,3%
135	Lavado medical de 2 plazas	5	1	20,0%	4	100,0%	0,0%	0,0%
136	Litera de exploración	76	70	92,1%	6	100,0%	0,0%	0,0%
137	Litera de exploración con cabecero abatible y ruedas	10	1	10,0%	9	100,0%	0,0%	0,0%
138	Litera de exploración de tres cuerpos	44	30	68,2%	14	96,7%	0,0%	3,3%
139	Litera de exploración fija de madera	4	0	0,0%	4	-	-	-
140	Litera de exploración ginecológica	3	2	66,7%	1	100,0%	0,0%	0,0%
141	Litera de exploración obstétrica	2	2	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
142	Litera de exploración urológica	3	3	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
143	Litera ginecológica convertible	2	2	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
144	Litera para transporte de cadáveres	3	0	0,0%	3	-	-	-
145	Luz para mesita de noche	21	21	100,0%	0	90,5%	0,0%	9,5%
146	Mamparas separadoras	3	0	0,0%	3	-	-	-
147	Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	10	7	70,0%	3	100,0%	0,0%	0,0%
148	Mesa auxiliar Mayo	12	4	33,3%	8	100,0%	0,0%	0,0%
149	Mesa cabecera aula 250 x 90 x 74 cm.	4	4	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
150	Mesa cigüeña para comer	312	197	63,1%	115	98,5%	0,5%	1,0%
151	Mesa comedor de 120 X 80 X 74 cm.	24	16	66,7%	8	100,0%	0,0%	0,0%
152	Mesa de autopsias	3	1	33,3%	2	100,0%	0,0%	0,0%
153	Mesa de biblioteca 160 x 120 x 74 cm. (4 personas)	6	0	0,0%	6	-	-	-
154	Mesa de exploración de bebés	2	1	50,0%	1	100,0%	0,0%	0,0%
155	Mesa de preparación 200 x 100 x 80 cm.	1	1	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
156	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	351	345	98,3%	6	100,0%	0,0%	0,0%
157	Mesa de trabajo de 160 x 80 x 74 cm.	24	22	91,7%	2	100,0%	0,0%	0,0%
158	Mesa de trabajo redonda de 120 cm.	2	2	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
159	Mesa desnudabebés	1	1	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
160	Mesa instrumental 120x60 cms.	10	6	60,0%	4	100,0%	0,0%	0,0%
161	Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	10	8	80,0%	2	100,0%	0,0%	0,0%
162	Mesa rectangular 120 x 60 y altura 53 cm.	2	0	0,0%	2	-	-	-
163	Mesa rectangular 120 x 60 y altura 59 cm.	2	0	0,0%	2	-	-	-
164	Mesa rectangular baja 120 x 60	1	0	0,0%	1	-	-	-
165	Mesa redonda, diámetro 120 y altura 40 cm.	2	1	50,0%	1	100,0%	0,0%	0,0%
166	Mesa redonda, diámetro 120 y altura 47 cm.	4	1	25,0%	3	100,0%	0,0%	0,0%
167	Mesa redonda, diámetro 120 y altura 54 cm.	2	1	50,0%	1	100,0%	0,0%	0,0%
168	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	52	27	51,9%	25	100,0%	0,0%	0,0%
169	Mesa reuniones 350 x 120 x 74 cm. (12 personas)	1	1	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
170	Mesa riñonera	10	8	80,0%	2	100,0%	0,0%	0,0%
171	Mesa telescopada	1	0	0,0%	1	-	-	-
172	Mesas trapezoidales	10	2	20,0%	8	100,0%	0,0%	0,0%
173	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	105	26	24,8%	79	100,0%	0,0%	0,0%
174	Mesita de noche	21	21	100,0%	0	90,5%	0,0%	9,5%
175	Mesita de noche clínica	240	207	86,3%	33	98,1%	0,0%	1,9%
176	Microondas de 20-25L	2	1	50,0%	1	100,0%	0,0%	0,0%
177	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	553	78	14,1%	475	100,0%	0,0%	0,0%
178	Módulo casillero guardería 90 x 75 x 40 cm.	1	1	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
179	Módulo cubetero guardería 90 x 75 x 40 cm.	2	1	50,0%	1	100,0%	0,0%	0,0%
180	Módulo estantería guardería 90 x 75 x 40 cm.	6	2	33,3%	4	100,0%	0,0%	0,0%
181	Modulos compactos de farmacia completos	8	13	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
182	Mostrador de control de 250 cm	1	2	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
183	Mostrador de información de 200-240 cm.	10	6	60,0%	4	100,0%	0,0%	0,0%
184	Mostrador de recepción de 120-140 cm.	7	7	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
185	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	16	13	81,3%	3	100,0%	0,0%	0,0%
186	Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	13	15	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
187	Mueble clínico con doble pila encastrado (elemento fijo)	3	2	66,7%	1	100,0%	0,0%	0,0%
188	Mueble clínico con pileta encastrada con grifo monomando	27	3	11,1%	24	100,0%	0,0%	0,0%
189	Mueble clínico encastrado con pilta dos cuerpos (elemento fijo)	8	3	37,5%	5	100,0%	0,0%	0,0%
190	Mueble para soporte de monitores	2	2	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
191	Negatoscopio de cuatro cuerpos	22	1	4,5%	21	100,0%	0,0%	0,0%
192	Negatoscopio de dos cuerpos	4	35	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
193	Negatoscopio de tres cuerpos	187	79	42,2%	108	100,0%	0,0%	0,0%
194	Nevera de 150 L	14	12	85,7%	2	100,0%	0,0%	0,0%
195	Oscilometro con brazal de pierna	66	27	40,9%	39	100,0%	0,0%	0,0%
196	Palangana con soporte y ruedas	7	0	0,0%	7	-	-	-

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL								
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.		INCOSA				TOTAL HOSPITAL		
Mobiliario		Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente		
Nº	Nombre	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	% BUENO	% ROTO	% DETERIORADO
197	Palangana de aseo metálica	196	0	0,0%	196	-	-	-
198	Panel separador	4	8	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
199	Pantalla proyección	1	1	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
200	Papelera	478	515	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
201	Papelera con tapa basculante de 25L	35	18	51,4%	17	77,8%	11,1%	11,1%
202	Papelera con tapa basculante de 50L	54	26	48,1%	28	76,9%	0,0%	23,1%
203	Papelera metálica	179	144	80,4%	35	100,0%	0,0%	0,0%
204	Papelera para sala de espera	5	1	20,0%	4	100,0%	0,0%	0,0%
205	Paragüero	1	0	0,0%	1	-	-	-
206	Perchero de pie	94	33	35,1%	61	100,0%	0,0%	0,0%
207	Perchero mural múltiple (módulo)	151	77	51,0%	74	100,0%	0,0%	0,0%
208	Pizarra blanca rotuladores	11	9	81,8%	2	100,0%	0,0%	0,0%
209	Pizarra para rotulador de pared	63	27	42,9%	36	100,0%	0,0%	0,0%
210	Plafón de avisos	15	23	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
211	Plafón de corcho	12	7	58,3%	5	100,0%	0,0%	0,0%
212	Planning para tarjetas	13	0	0,0%	13	-	-	-
213	Portasuero adaptable a la litera	46	40	87,0%	6	100,0%	0,0%	0,0%
214	Portasuero doble con ruedas	20	4	20,0%	16	100,0%	0,0%	0,0%
215	Portasueros para cama clínica	132	27	20,5%	105	100,0%	0,0%	0,0%
216	Porta-sueros para cama clínica	173	119	68,8%	54	99,2%	0,0%	0,8%
217	Portasueros rodado	187	126	67,4%	61	100,0%	0,0%	0,0%
218	Poyata construída en madera de alto 74 cm. y 65-70 cm. de ancho, perimetral a tres lados de la sala (Equipamiento fijo)	2	0	0,0%	2	-	-	-
219	Poyatas (Equipamiento fijo)	261	117	44,8%	144	100,0%	0,0%	0,0%
220	Presurizador de suero	8	0	0,0%	8	-	-	-
221	Racks almacenaje ML	14	0	0,0%	14	-	-	-
222	Regulador de vacío	223	173	77,6%	50	100,0%	0,0%	0,0%
223	Reloj	9	44	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
224	Reloj calendario	32	0	0,0%	32	-	-	-
225	Reloj de pared con fecha	40	3	7,5%	37	100,0%	0,0%	0,0%
226	Repisa de escritura de 70 x 35 cm.	9	1	11,1%	8	100,0%	0,0%	0,0%
227	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	350	1	0,3%	349	100,0%	0,0%	0,0%
228	Sacaleches	1	1	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
229	Secamanos eléctrico	150	104	69,3%	46	100,0%	0,0%	0,0%
230	Silla fija	645	566	87,8%	79	99,5%	0,2%	0,4%
231	Silla fija con brazos	803	381	47,4%	422	99,7%	0,0%	0,3%
232	Silla giratoria con brazos y ruedas	398	374	94,0%	24	100,0%	0,0%	0,0%
233	Silla giratoria con brazos y ruedas alta	30	15	50,0%	15	100,0%	0,0%	0,0%
234	Silla giratoria con ruedas alta	31	7	22,6%	24	100,0%	0,0%	0,0%
235	Silla infantil madera 31 x 54 cm.	16	4	25,0%	12	100,0%	0,0%	0,0%
236	Silla infantil madera 33 x 30 cm.	16	4	25,0%	12	100,0%	0,0%	0,0%
237	Silla infantil madera 34 x 57 cm.	16	4	25,0%	12	100,0%	0,0%	0,0%
238	Sillas de ruedas plegables	14	6	42,9%	8	100,0%	0,0%	0,0%
239	Sillas fijas apilables sin brazos	70	65	92,9%	5	100,0%	0,0%	0,0%
240	Sillas modulares	574	700	100,0%	0	99,6%	0,0%	0,4%
241	Sillón ergonómico para pacientes	181	158	87,3%	23	98,1%	0,0%	1,9%
242	Sillón reclinable completo	50	41	82,0%	9	100,0%	0,0%	0,0%
243	Sofá 1 plaza	1	2	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
244	Sofá 2 plazas	1	1	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%
245	Sofá con mesa de esquina y central baja	12	1	8,3%	11	100,0%	0,0%	0,0%
246	Sofá-cama 2 m.	186	164	88,2%	22	98,2%	0,0%	1,8%
247	Soporte brazo con pie	26	9	34,6%	17	100,0%	0,0%	0,0%
248	Soporte de agua para lavado de sonda de aspiración	8	7	87,5%	1	100,0%	0,0%	0,0%
249	Soporte de termómetro	179	0	0,0%	179	-	-	-
250	Soporte elevado para TV	1	0	0,0%	1	-	-	-

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL									
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.		INCOSA				TOTAL HOSPITAL			
Mobiliario		Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente			
Nº	Nombre	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	% BUENO	% ROTO	% DETERIORADO	
251	Soporte para monitor	8	0	0,0%	8	-	-	-	
252	Soporte para posters de campañas	35	17	48,6%	18	94,1%	0,0%	5,9%	
253	Sujeta toallas de ducha	222	214	96,4%	8	99,1%	0,9%	0,0%	
254	Taburete con ruedas	20	5	25,0%	15	100,0%	0,0%	0,0%	
255	Taburete de acero inoxidable con ruedas	74	2	2,7%	72	100,0%	0,0%	0,0%	
256	Taburete de acero inoxidable sin ruedas	10	4	40,0%	6	100,0%	0,0%	0,0%	
257	Taburete fijo de 60 cm.	62	5	8,1%	57	100,0%	0,0%	0,0%	
258	Taburete giratorio alto	4	2	50,0%	2	100,0%	0,0%	0,0%	
259	Taburete giratorio alto con respaldo	12	2	16,7%	10	100,0%	0,0%	0,0%	
260	Taburete giratorio con ruedas	264	173	65,5%	91	99,4%	0,6%	0,0%	
261	Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	10	9	90,0%	1	100,0%	0,0%	0,0%	
262	Taquilla para ropa de paciente	4	9	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%	
263	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	14	4	28,6%	10	100,0%	0,0%	0,0%	
264	TV de 25"	32	30	93,8%	2	100,0%	0,0%	0,0%	

NOTA: El elemento número *80. Colgador para ropero* no ha sido posible inspeccionarlo por razones obvias, al requerir una inspección de las taquillas personales de los empleados. Por tanto, no se tendrá en cuenta como ítem con 0% de existencia.

En la siguiente tabla resumen de la inspección del mobiliario auditado se muestra el % de incumplimiento del Anexo VI del PCAP y el número de ítems con 0% de existencia y su porcentaje respecto al total de elementos.

Resumen de la Inspección Física del Mobiliario	
% Incumplimiento	**45,69%**
Nº de Items con 0% de existencia	34
% de Items en 0% de existencia respecto al total de elementos	12,9%

A continuación se muestra el resultado obtenido en cuanto al estado del mobiliario existente del hospital Infanta Cristina:

Total Hospital		
Estado Mobiliario Existente	**Bueno**	**98,6%**
	Roto	**0,4%**
	Deteriorado	**1,0%**

Los 34 ítems con 0% de existencia se exportan a la siguiente tabla:

Nº	Mobiliario con 0% de existencia
1	"Tablilla" de Historia Clínica
2	Aspirador y contenedor
3	Balas de oxígeno
4	Banco para ducha
5	Biombos de 2-3 cuerpos
6	Butaca paciente/acompañante
7	Cafetera expres de una salida
8	Carro alto portapalanganas rodado
9	Carro de historias clínicas
10	Carros nodriza
11	Cortinaje de separación
12	Cuña de acero inoxidable
13	Depósito de alcohol
14	Dispensador de cepillos
15	Grúa para pacientes
16	Litera de exploración fija de madera
17	Litera para transporte de cadáveres
18	Mamparas separadoras
19	Mesa de biblioteca 160 x 120 x 74 cm. (4 personas)
20	Mesa rectangular 120 x 60 y altura 53 cm.
21	Mesa rectangular 120 x 60 y altura 59 cm.
22	Mesa rectangular baja 120 x 60
23	Mesa telescopada
24	Palangana con soporte y ruedas
25	Palangana de aseo metálica
26	Paragüero
27	Planning para tarjetas
28	Poyata construída en madera de alto 74 cm. y 65-70 cm. de ancho, perimetral a tres lados de la sala (Equipamiento fijo)
29	Presurizador de suero
30	Racks almacenaje ML
31	Reloj calendario
32	Soporte de termómetro
33	Soporte elevado para TV
34	Soporte para monitor

Conclusiones:

- La tabla donde se muestran los porcentajes de existencia de activos físicos y el estado de conservación de los mismos en todo el hospital refleja las variaciones de cumplimiento respecto al Anexo VI del PCAP por ítem. El valor final de existencia en

% incluye todos los activos físicos, propiedad de la Sociedad Concesionaria, presentes en el Anexo correspondiente.

- La existencia de activos físicos totales sólo cumple con un 54,31% de los contemplados en el Anexo VI del PCAP, por lo que el % de incumplimiento es del **45,69%.**
- El estado de conservación de las instalaciones es el siguiente: el **98,6%** de los ítems existentes están en buen estado. El **0,4%** de los ítems existentes están rotos y el **1,0%** de los ítems existentes se consideran deteriorados.
- No se han encontrado **34** elementos o items, que deberían existir según el Anexo VI del PCAP, lo cual representa un **12,9%** del total de ítems de mobiliario del Hospital.
- Existe un ítem perteneciente a la Sociedad concesionaria, el cual no está incluido en el Anexo VI del PCAP, pero sustituye al "lavado medical de 2 plazas". Éste se muestra en la siguiente tabla junto con el número de unidades existentes (existencia) y su estado.

HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	TOTAL HOSPITAL

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente		
Nombre	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	% BUENO	% ROTO	% DETERIORADO
Lavado medical de 3 plazas	0	4	-	0	100,0%	0,0%	0,0%

- En el Anexo IV del presente documento, se aportan todos los Check List cumplimentados durante la auditoría del mismo.
- En el *Capítulo 3.5.1* se muestran los resultados obtenidos por cada zona asistencial del hospital y se describen dichos resultados.

2.6 RESUMEN DE LA ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (MAEE) IMPLANTADAS

Al inicio del período de explotación, la Sociedad Concesionaria desarrolla un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE), el cual traza las bases de la estrategia a seguir de cara a conseguir ahorros energéticos a lo largo del período de explotación.

Posteriormente, en el año 2015 se ha realizado una ampliación al PAEE en la cual se exponen las Medidas de Mejora de la Eficiencia Energética (MMEE) propuestas con sus correspondientes estudios de ahorro energético elaborados.

En base a la documentación enviada y las inspecciones realizadas in situ para comprobar la eficacia de las medidas de eficiencia energética propuestas, se extraen los siguientes datos:

- Se han desarrollado **5** medidas principales en base al PAEE.
- Todas las medidas realizadas se llevaron a cabo por ser consideradas viables técnica y económicamente por parte de la Sociedad Concesionaria.
- Se analiza no solo el desarrollo de las mismas, sino la correcta implantación.

Medidas de eficiencia energética realizadas por la S.C.		Método Comprobación	Implantación (Correcta/Incorrecta)
Iluminación	Sistema de Control y Gestión Energética	Se comprueba de manera visual in situ y se aportan fotos	Correcta
	Optimización Energética en Iluminación Exterior	Se comprueba de manera visual in situ y se aportan fotos	Correcta
	Cambiar la iluminación del Rótulo de cubierta "Hospital Infanta Cristina" a led	No ha sido posible comprobar dicha medida debido a falta de aporte de pruebas por parte de la S.C.	-
Climatización	Modificación de la temperatura de funcionamiento de enfriadora (2014)	Se comprueba de manera visual in situ y se aportan fotos	Correcta
	Optimización de la temperatura de consigna en invierno (2014)	Se comprueba de manera visual in situ y se aportan fotos	Correcta

Se extraen las siguientes **conclusiones:**

- 4 medidas correctamente implantadas (80%).
- 1 medidas sin comprobación posible (20%).
- En el *Capítulo 3.6* se analizan de manera más pormenorizada los resultados obtenidos y se catalogan dichos resultados.
- En el Anexo V se adjuntan las Medidas de Mejora de Eficiencia Energética (MAEE).

CAPÍTULO 3 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

El resultado final de la auditoria será el resultado de las revisiones realizadas a todos los elementos objeto de la presente auditoría.

- Estado de las instalaciones.
- Estado de las obligaciones contractuales según PPTE por parte de la Sociedad Concesionaria (Documentación, medios técnicos y recursos humanos).
- Estado de los planes de mantenimiento (aspecto clave en la gestión del hospital por parte de la S.C.).
- Estado de los activos físicos de mobiliario del Anexo VI del PCAP.
- Implantación de Medidas de Mejora de la Eficiencia Energética realizadas y propuestas (Planes de Ahorro y Eficiencia Energética).

3.1 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA AL ESTADO DE LAS INSTALACIONES

-La catalogación del estado de las instalaciones se realiza según el siguiente baremo:

- **NO ADECUADO**: Algunas instalaciones están afectadas por alguna incidencia crítica.
- **ADECUADO:** Nº de instalaciones afectadas por incidencias críticas=0 y existen instalaciones afectadas por alguna incidencia media
- **BUENO**: Nº de instalaciones afectadas por incidencias medias=0 y existen instalaciones afectadas por alguna incidencia leve.

En base a lo observado durante las inspecciones físicas realizadas en el Hospital Universitario Infanta Leonor se puede afirmar que el servicio de mantenimiento realizado en el hospital es **ADECUADO.**

INSTALACIÓN	PPI´s ASOCIADOS	INCIDENCIAS ACTUALES				INCIDENCIAS DESPUÉS SOLUCIÓN IN SITU			
		CRÍTICAS	MEDIAS	LEVES	TOTAL	CRÍTICAS	MEDIAS	LEVES	TOTAL
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN	ID-ITL-01, IF-IE-01, IF-IE-02 e IF-IE-04	1	1	9	11	0	1	6	7
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN	ID-ITL-01 e IF-IE-03	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES TÉRMICAS	ID-ITL-04 e IF-CLI-01	0	0	4	4	0	0	3	3
CENTRALES FRIGORÍFICAS	ID-ITL-04 e IF-CLI-01	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE	ID-ITL-04, ID-ITL-05, IF-CL-03 y IF-CL-02	0	3	78	81	0	3	46	49
CÁMARAS FRIGORÍFICAS, FRIGORÍFICOS Y AIRE ACONDICIONADO AUTÓNOMO	ID-ITL-02, ID-ITL-03 e IF-FRG-01	0	0	0	0	0	0	0	0
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACS	ID-ITL-03, ID-ITL-06, ID-ITL-07 e IF-ACS-01	0	2	1	3	0	2	1	3
INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	ID-ITL-08 e IF-CMB-01	0	0	1	1	0	0	1	1
INSTALACIÓN GENERAL DE FONTANERÍA Y TRATAMIENTO DE AGUA	ID-ITL-02 e IF-IF-01	0	0	1	1	0	0	1	1
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y RED DE DATOS	IF-TLC-01 e IF-DTA-01	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS	ID-ITL-01, IF-PCI-01 e IF-PCI-02	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALACIONES DE VACÍO Y GASES MEDICINALES	ID-ITL-09 e IF-GM-01	0	0	0	0	0	0	0	0
PARARRAYOS	IF-IE-04	0	0	3	3	0	0	3	3
APARATOS ELEVADORES	ID-ITL-01 e IF-ASC- 01	0	4	1	5	0	2	1	3
INSTALACIONES ESPECIALES: QUIRÓFANOS, UVIS...	ID-ITL-01 e IF-QRF-01	0	0	9	9	0	0	9	9
SEÑALIZACIÓN, COMPLEMENTOS DE EDIFICACIÓN Y PINTURA Y COMPLEMENTOS	IF-EG-01 e IF-EG-02	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTADO CONSTRUCTIVO DEL EDIFICIO (*)	IF-EG-01 e IF-EG-02	0	0	7	7	0	0	7	7
PUERTAS AUTOMÁTICAS	IF-PAT-01	0	0	1	1	0	0	1	1
TRANSPORTE NEUMÁTICO	IF-TRN-01	0	0	3	3	0	0	3	3
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	IF-VIG-01	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA	IF-SO-01	0	0	1	1	0	0	1	1
DETECCIÓN DE CO Y EXTRACCIÓN EN APARCAMIENTOS	IF-VIG-01	0	0	0	0	0	0	0	0
ALUMBRADO EXTERIOR	IF-IE-04 e IF-EG-02	0	0	0	0	0	0	0	0
SANEAMIENTO	IF-SAN-01	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPACTADORES DE RESIDUOS CLASIFICADOS	IF-EG-01 e IF-EG-02	0	0	0	0	0	0	0	0
SISTEMA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES	IF-GMA-01	0	0	0	0	0	0	0	0
SISTEMA DE CONTROL ENERGÉTICO DE LAS INSTALACIONES	ID-ITL- 04, ID-ITL-05 e IF-GEN-01	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**1**	**10**	**119**	**130**	**0**	**8**	**83**	**91**

- Se realiza un informe detallado de las deficiencias encontradas usando la metodología expuesta en el Capítulo 1.3.1
- En el Anexo I se facilitan las comprobaciones fotográficas y check list asociados a las deficiencias expuestas a continuación. También se facilitan los check list que no presentan deficiencias en el mismo anexo.

3.1.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

Se han detectado las siguientes anomalías en la instalación eléctrica de BT.

1. **Problema de seguridad en el cuadro eléctrico CSEN-2-I.**

Nivel de incidencia: CRÍTICA.

Descripción: el equipo auditor evidencia que no en todos los ítems inspeccionados (cuadros eléctricos) se cumplan los requisitos de la normativa de aplicación en vigor, en lo relativo a la seguridad de la instalación eléctrica.

Se presentan los siguientes hallazgos a modo de evidencia:

- Al hacer saltar una de las fases del diferencial de alumbrado 3, esta salta a 31,9 mA, cuando, según normativa de seguridad, no debe saltar a más de 30 mA de máxima.

Cabe mencionar que dicho problema ha sido subsanado de manera inmediata por el técnico de mantenimiento que acompañaba al auditor, como así ha quedado constatado en el checklist correspondiente.

Normativa incumplida: Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC BT. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. (BOE Nº: 224 de 18/09/2002).

Repercusión: En general, este tipo de defectos puede ocasionar riesgos de electrificación de operarios o riesgo de sobrecarga de líneas e interrupción inesperada de suministro eléctrico.

2. **Sobredimensionamiento de fases. Cuadro Eléctrico: CPE2-S1-SUM.**

Nivel de incidencia: MEDIA.

Descripción: el equipo auditor evidencia que no en todos los ítems inspeccionados (cuadros eléctricos) se cumplan los requisitos de la normativa de aplicación en vigor, en lo relativo a la seguridad de la instalación eléctrica.

Se presentan los siguientes hallazgos a modo de evidencia:

- Se ha medido la corriente que circula por cada fase y se ha comprobado que la fase S está sobredimensionada. Se trata de circuitos de toma de fuerza y es posible que cuelguen más equipos consumidores de dicha fases que de las demás.

Normativa incumplida: Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC BT. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. (BOE Nº: 224 de 18/09/2002).

Repercusión: En general, este tipo de defectos puede ocasionar riesgos de electrificación de operarios o riesgo de sobrecarga de líneas e interrupción inesperada de suministro eléctrico.

3. **El equipo auditor detecta las siguientes incidencias en los cuadros eléctricos revisados en la auditoría.**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción de las incidencias:

a. Cuadro Eléctrico CPE2-S1-SUM: La rotulación externa no se corresponde con el cuadro interno.

b. Cuadro eléctrico CPNI-2-M: La puerta del cuadro está suelta (se comprueba que la misma se cierra).

c. Cuadro eléctrico CSE2-2-C: En el momento de la inspección el cuadro estaba manchado y con falta de tornillería. (Se solucionan dichos problemas in situ).

d. Cuadro Eléctrico CGBT Industrial: Actúa como cuadro secundario, por lo que el nombre no es el apropiado. Se ha ampliado el cuadro y no se ha actualizado el esquema unifilar del mismo. No se ha podido medir el reparto de intensidad de corriente de las fases debido a la imposibilidad de poner la pinza amperimétrica.

e. Cuadro eléctrico CPN-2-2-F: Se comprueba que los cables estaban mal aislados. Se ha solucionado sustituyendo los cables mal aislados por una reserva.

NOTA: Como norma general en todos los cuadros eléctricos revisados se aprecia que el cableado de los mismos está demasiado junto y tenso, lo que dificulta la medición y el mantenimiento de los cuadros eléctricos.

Normativa incumplida: Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC BT. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. (BOE Nº: 224 de 18/09/2002).

Repercusión: No disponer de información adecuada y disponer de cables mal aislados puede ocasionar riesgos de electrificación de operarios. Puertas rotas o sueltas, suciedad y falta de tornillería en cuadro puede llegar a producir fallos de contacto y deterioro de equipos.

Se han encontrado las siguientes deficiencias en cuanto a los grupos electrógenos.

4. **Prealarma de temperatura de agua.**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: Durante la auditoría realizada a las instalaciones pertenecientes al grupo electrógeno se ha constatado la existencia de una prealarma de temperatura de agua.

Normativa incumplida: ninguna.

Repercusión: posible fallo en el calentador. Necesidad de revisión.

3.1.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN

No se han detectado las anomalías en la instalación eléctrica de MT, aunque cabe mencionar que las inspecciones sólo se han realizado en la sala de celdas, debido a que para acceder al propio Centro de Transformación es necesario realizar un corte de tensión.

Como única reseña, cabe mencionar que no se dispone de extintor en la sala de dióxido de carbono, ni dentro, ni en la puerta.

3.1.3 CENTRALES TÉRMICAS

Se han detectado las siguientes deficiencias:

1. **Falta aislamiento en calderas de gas natural.**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: El equipo auditor evidencia las siguientes deficiencias en el equipo.

- Se ha comprobado que el estado general de la caldera es correcto, aunque cabe mencionar que falta por aislar térmicamente parte de la valvulería.

Normativa incumplida: Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio

Repercusión: En general, este tipo de defectos ocasiona pérdidas de calor.

2. **Deterioro en Enfriadoras. (Anexo I: Ilustraciones 12 y 13).**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: El equipo auditor evidencia las siguientes deficiencias en el equipo.

- Se ha comprobado que el estado general de las enfriadoras es correcto, aunque caben mencionar las siguientes deficiencias observadas:
    - Salta una alarma de presión de aceite en el control. Dicha incidencia se soluciona tras reseteo.
    - La cobertura de los compresores está deteriorada.
    - Las conexiones eléctricas por tubo con la enfriadora están deterioradas.

Normativa incumplida: Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio

Repercusión: En general, este tipo de defectos puede producir roturas y fallos de funcionamiento en los equipos.

3. **Sistema de Bombeo. (Anexo I: Ilustración 14).**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: El equipo auditor evidencia las siguientes deficiencias en el equipo:

- Se ha comprobado que el estado general del sistema de bombeo es correcto, aunque caben mencionar las siguientes deficiencias observadas:
    - En la bomba del secundario de calderas, las conexiones eléctricas en el racor están en mal estado.
    - No se transmiten vibraciones de dichos equipos al hospital debido a que se encuentran separadas de este, en el edificio Industrial, por lo que no influyen.

Normativa incumplida: Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio

Repercusión: En general, este tipo de defectos puede producir fallos de funcionamiento en los equipos.

4. **Calorifugado no continuo. (Conductos, tuberías y válvulas).**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: El equipo auditor evidencia las siguientes deficiencias en el equipo:

- Se ha comprobado que el estado general del sistema de bombeo es correcto, aunque caben mencionar las siguientes deficiencias observadas:
    - El calorifugado no es continuo ya que las válvulas no lo están.

- Normativa incumplida: Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio

Repercusión: En general, este tipo de defectos ocasiona pérdidas de calor.

3.1.4 INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE

Se han detectado las siguientes anomalías en los fancoils (climatizadores) de la instalación y en las Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs).

UTAS

1. **Las UTAs 4, 26 y 33 tienen válvulas sin aislante y necesidad de cambio de filtro. (Anexo I: Ilustraciones 16-19).**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: durante la auditoría de los sistemas de distribución de aire se ha comprobado que las UTAs situadas en las zonas mencionadas anteriormente necesitaban un cambio de filtros y además tenían falta de aislante en las válvulas. Dichas deficiencias se han solucionado al momento.

Normativa incumplida: Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Repercusión: No cumplimiento estricto de la normativa.

2. **Las UTAs 18 y 30 tienen válvula sin aislante. (Anexo I: Ilustración 23).**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: durante la auditoría de los sistemas de distribución de aire se ha comprobado que las UTAs situadas en las zonas mencionadas anteriormente tenían falta de aislante en las válvulas. Además, cabe mencionar que, la UTA 18 tiene una puerta sin pomo y otra imposible de abrir.

Normativa incumplida: Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Repercusión: No cumplimiento estricto de la normativa.

3. **Las UTAs 49 y 50 presentan válvulas no aisladas y filtros sucios. Además, la UTA 49 tiene la batería de frío deteriorada y la UTA 50 tiene la batería de calor deteriorada. (Anexo I: Ilustraciones 26 y 27).**

Nivel de incidencia: MEDIA.

Descripción: durante la auditoría de los sistemas de distribución de aire se ha comprobado que las UTAs 49 y 50 tenían falta de aislante en las válvulas, filtros sucios y además las baterías de frío y calor deterioradas respectivamente

Normativa incumplida: Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Repercusión: No cumplimiento estricto de la normativa.

4. **La UTA 27 presenta varias deficiencias en el interior en cuanto a suciedad, falta de aislamiento en conductos y mal estado de correas.**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: El interior de la UTA, la bandeja de condensados y el filtro están sucios. En los conductos, es necesario introducir aislante en la valvulería y elementos accesorios. Existe un tramo de tubería sin reponer. Las correas de transmisión de los motores están en mal estado, agrietadas.

Normativa incumplida: Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Repercusión: No cumplimiento estricto de la normativa.

5. **La UTA 41 presenta varias deficiencias en el interior en cuanto a suciedad, óxido, falta de aislamiento y mal estado de correas. (Anexo I: Ilustración 32).**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: durante la auditoría de los sistemas de distribución de aire se ha comprobado que la UTA no tiene filtros, sólo tiene prefiltros, y estos están sucios y oxidados, se cambiaron en mayo la última vez. La correa del ventilador de impulsión está floja. En los conductos, es necesario introducir aislante en la valvulería y elementos accesorios.

Normativa incumplida: Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Repercusión: No cumplimiento estricto de la normativa.

FANCOILS

1. **El fan-coil de la Sala de Espera Planta 1 Módulo B no funciona.**

   Nivel de incidencia: MEDIA.

   Descripción: En la última modificación del RITE, en vigor desde el 06/04/13 se exige una revisión trimestral en los conductos y en la calidad ambiental. El fan-coil de la sala de espera de la planta 1 Módulo B no funciona lo que ocasiona un perjuicio grave a los usuarios.

   Normativa incumplida: Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

   Repercusión: No cumplimiento estricto de la normativa.

2. **Los siguientes fancoils presentan las siguientes deficiencias, válvulas sin aislar y filtro defectuoso o sucio. Estos son los fancoils de las siguientes zonas:**

- Sala de estar polivalente.
- Despacho de supervisión suministros planta -1.
- Dormitorio de guardia del área de psiquiatría.
- Zona de suministros.
- Habitación 237 B.
- Habitación 246 B.
- Despacho Supervisor rehabilitación.
- Habitación 239 B.
- Sala de estar comedor segunda planta.
- Supervisión tarde segunda planta.
- Trabajo administrativo segunda planta.

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: durante la auditoría de los sistemas de distribución de aire se ha comprobado que los fan-coils de las zonas anteriores presentan válvulas sin aislamiento térmico y elevada suciedad en el filtro de aire.

Normativa incumplida: Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Repercusión: No cumplimiento estricto de la normativa.

3. Los siguientes fan-coils presentan válvulas sin recubrimiento con aislamiento térmico.

- Habitación 231 B.
- Habitación 257 B.
- Habitación 260 B.
- Habitación 254 B.
- Habitación 234 B.
- Habitación 250 B.
- Consulta Traumatología
- Sala de asociación 1

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: durante la auditoría de los sistemas de distribución de aire se ha comprobado que los fan-coils antes mencionados presentan válvulas sin aislante térmico a modo de recubrimiento.

Normativa incumplida: Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Repercusión: Perdida de potencia.

4. **Los Fan-Coils del despacho 2 de la zona de diálisis y la habitación A010 de la planta baja presentan un ruido excesivo del equipo de climatización.**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: durante la auditoría de los sistemas de distribución de aire se ha comprobado que los fan-coils situados en las zonas mencionadas anteriormente necesitaban una revisión de los mismos ya que se aprecia un ruido excesivo.

Normativa incumplida: ninguna.

Repercusión: molestia a los usuarios.

5. **Los Fan-Coils de secretaria de farmacia en la planta sótano -1 y la habitación C289 tienen el conducto de aire suelto o caído. A mayores, presentan otras deficiencias como filtro en mal estado y falta de aislamiento térmico respectivamente.**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: durante la auditoría de los sistemas de distribución de aire se ha comprobado que los fan-coils situados en las zonas mencionadas anteriormente tenían conductos sueltos o caídos. Dicha deficiencia ha sido solucionada al momento.

Además, el fan-coil de secretaria de farmacia tenía el filtro en mal estado por lo que se procedió a su cambio al momento. El fan-coil de la habitación C289 presenta falta de aislante. Dicha incidencia fue solucionada.

Normativa incumplida: Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Repercusión: No cumplimiento estricto de la normativa.

6. **Los Fan Coils de la zona de suministros de la planta sótano -1, de la zona polivalente de personal planta 1, del depósito de sillas de ruedas diálisis y de la sala de espera pediatría presentan filtros sucios.**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: durante la auditoría de los sistemas de distribución de aire se ha comprobado que los fan-coils situados en las zonas mencionadas anteriormente presentan suciedad en los filtros.

Normativa incumplida: Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Repercusión: No cumplimiento estricto de la normativa.

7. **El fan-coil de la Sala de Espera de la Planta 2 presenta un filtro de aire defectuoso. Se realiza el cambio en el momento.**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: durante la auditoría de los sistemas de distribución de aire se ha comprobado que el fan-coil tiene un filtro defectuoso, el cual se cambia al momento.

Normativa incumplida: Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Repercusión: No cumplimiento estricto de la normativa.

8. **El fan-coil del Despacho de Cirugía Soporte Médico 2 presenta un acceso difícil al climatizador. Además, los filtros no son del tipo adecuado.**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: durante la auditoría de los sistemas de distribución de aire se ha comprobado que el fan-coil del despacho cirugía soporte médico 2 presenta un acceso difícil al climatizador. Además, los filtros no son del tipo adecuado.

Normativa incumplida: Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Repercusión: No cumplimiento estricto de la normativa.

9. **El fan-coil de la Habitación 155B de la Planta 1 presenta falta de limpieza en el interior de la misma. Se detectan también zonas de tubería con aislante roto. Ambas deficiencias se solucionan.**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: durante la auditoría de los sistemas de distribución de aire se ha comprobado que el fan-coil de la habitación 155B de la Planta 1 presenta suciedad en el interior del climatizador. Además, se han observado roturas de aislante en varias zonas de tubería.

Normativa incumplida: Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Repercusión: No cumplimiento estricto de la normativa.

10. **El fan-coil de la Planta 1 Vestuario Número 2 de Consultas Externas presenta difícil acceso al interior del mismo. También se aprecia mal estado del filtro de aire, el cual se cambia al momento.**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: durante la auditoría de los sistemas de distribución de aire se ha comprobado que el fan-coil de la Planta 1 Vestuario Número 2 de Consultas Externas presenta difícil acceso al interior del mismo. El filtro de aire se cambia debido al mal estado del mismo.

Normativa incumplida: Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Repercusión: No cumplimiento estricto de la normativa.

3.1.5 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACS

1. **Fugas en las bombas de distribución de ACS 1 y 3. (Anexo I: Ilustraciones 71 y 72).**

Nivel de incidencia: MEDIA.

Descripción: En el momento de la inspección, las bombas 1 y 3 estaban paradas por fugas. Cabe mencionar también que, alguna zona puntual en planta sótano presenta el aislamiento levantado.

Normativa incumplida: Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Repercusión: fallo funcionamiento de los equipos. No existe un corte de suministro debido a que otros equipos idénticos realizan dicha labor.

3.1.6 INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

En cuanto a la instalación de almacenamiento de combustibles, no ha sido posible inspeccionar los depósitos de combustible porque están bajo tierra. Éstos se encuentran operativos.

No ha sido posible observar el funcionamiento del sistema de bombeo puesto que al estar el depósito con un nivel de gasóleo correcto, las bombas no responden a la orden manual.

1. **Seguridad almacenamiento de Combustibles.**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: En cuanto a los sistemas de seguridad, no se aprecian fugas, aunque si se ha comprobado la no existencia de detectores de fugas en ciertos puntos.

3.1.7 INSTALACIÓN GENERAL DE FONTANERÍA Y TRATAMIENTO DE AGUA

1. **Pequeña fuga en conexión de tubería con el muro. (Anexo I: Ilustraciones 74).**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: En cuanto a los sistemas de seguridad, no se aprecian fugas, aunque si se ha comprobado la no existencia de detectores de fugas en ciertos puntos.

3.1.8 PARARRAYOS

1. **Deterioro de los Pararrayos. (Anexo I: Ilustraciones 76, 77 y 78).**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: el equipo auditor evidencia las siguientes deficiencias en el equipo.

- Se ha comprobado que el último tramo de la bajante noreste no está protegida adecuadamente (Edificio Industrial).
- En la bajante noroeste y flexibles se aprecian recubrimientos deteriorados.
- En la bajada sureste, se recomienda limpieza de arquetas en la puesta a tierra.

Normativa incumplida: Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC BT. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. (BOE Nº: 224 de 18/09/2002).

Repercusión: En general, este tipo de defectos puede ocasionar riesgos de electrificación de operarios o riesgo de sobrecarga de líneas e interrupción inesperada de suministro eléctrico.

3.1.9 APARATOS ELEVADORES

Se han detectado las siguientes anomalías en algunos de los ascensores.

1. **Los ascensores 8, 20, 22 y 25 no emiten sonido de emergencia. (Anexo I: Ilustraciones 80).**

Nivel de incidencia: MEDIA.

Descripción: se ha comprobado que, en cuatro de los ascensores revisados durante la auditoría no funciona el botón de sonido de emergencia que avisa de que la gente ha quedado encerada dentro del mismo. Dicha incidencia ha sido subsanada de inmediato.

Normativa: Orden 3711/2007, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden13235/2000, de 29 de diciembre, sobre inspecciones y corrección de deficiencias en ascensores.

Repercusión: imagen del Hospital.

2. **En el ascensor 22 falta un embellecedor.**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: se ha observado que en el interior del ascensor número 22 falta un embellecedor.

Normativa incumplida: Ninguna.

Repercusión: imagen del Hospital.

Valoración técnica acciones correctivas: Se debe sustituir el suelo.

3. **El ascensor 27 del edificio Industrial precisa limpieza.**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: se ha observado que el interior del ascensor número 27 precisa limpieza.

Normativa incumplida: ninguna.

Repercusión: imagen del Hospital.

3.1.10 INSTALACIONES ESPECIALES: QUIRÓFANOS, UVIS…

Se han detectado las siguientes incidencias en los quirófanos revisados.

-ZONA CMI (4 quirófanos)

1. **Visualizador oxidado en los quirófanos 1, 2 y 4. (Anexo I: Ilustración 86).**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: se ha observado que el visualizador presenta óxido en tres de los 4 quirófanos de la zona CMI.

Normativa incumplida: ninguna.

Repercusión: mala visualización de equipos.

2. **En quirófanos 2 y 3, el transformador del cuadro aislamiento está despegado.**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: se ha observado que el transformador del cuadro de aislamiento está despegado.

Normativa incumplida: ninguna.

Repercusión: imagen del Hospital.

3. **Pulsador desconchado y toma de red de datos rota en Quirófano 2.**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: se ha observado la existencia de un pulsador está desconchado y una toma de red de datos rota.

Normativa incumplida: ninguna.

Repercusión: imagen del Hospital.

4. **En el quirófano 1 el transformador del cuadro está sucio. (Anexo I: Ilustración 87).**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: se observa suciedad en el transformador del cuadro.

Normativa incumplida: ninguna.

Repercusión: este tipo de defectos pueden ocasionar fallos de funcionamiento.

5. **En el quirófano 3 se ha observado que salta una alarma en el interior pero no fuera del mismo. (Anexo I: Ilustración 88).**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: se observa cuando salta una alarma en el interior, esta no se repite en el exterior, por lo que no es posible saber si suena una alarma sin entrar al quirófano.

Normativa incumplida: ninguna.

Repercusión: este tipo de defectos pueden ocasionar problemas de comunicación entre el personal que está dentro de quirófano y fuera.

ZONA CMA (4 quirófanos)

1. **Visualizador oxidado en los quirófanos 1, 2, 3 y 4. (Anexo I: Ilustraciones 93).**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: se ha observado que el visualizador presenta óxido en tres de los 4 quirófanos de la zona CMA.

Normativa incumplida: ninguna.

Repercusión: mala visualización de equipos.

2. **En quirófanos 1 y 3, el transformador del cuadro aislamiento está despegado.**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: se ha observado que el transformador del cuadro de aislamiento está despegado.

Normativa incumplida: ninguna.

Repercusión: imagen del Hospital.

3. **En el quirófano 4 se observa el techo desconchado en uniones. (Anexo I: Ilustración 94).**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: se ha observado deficiencias en el techo, en forma de desconchado en uniones entre los tramos.

Normativa incumplida: ninguna.

Repercusión: imagen del Hospital

4. **En el quirófano 3 se observan otras deficiencias leves como mesa del quirófano con Óxido y tapa de la luz del brazo portátil de quirófano caída. (Anexo I: Ilustraciones 95 y 96).**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: se han observado otras deficiencias leves como existencia de óxido en la mesa del quirófano y falta de tapa en la luz del brazo portátil de quirófano.

Normativa incumplida: ninguna.

Repercusión: imagen del Hospital.

3.1.11 ESTADO CONSTRUCTIVO DEL EDIFICIO

El Estado constructivo del edificio es correcto en general.

No obstante se han observado una serie de deficiencias en la cubierta del edificio, como son falta de pintura y enfoscado en diferentes zonas. Cabe mencionar que, existe un contrato de ejecución de obras para la impermeabilización de la cubierta, el cual se encuentra en proceso de ejecución actualmente. Se espera finalizar dicho contrato en 2020 ya que el alcance es mayor a las deficiencias que enunciaremos a continuación:

1. **Degradación de la pintura y enfoscado de protección en los petos de obra.**

Nivel de deficiencia: LEVE.

Definición: Los petos de obra sobre el que se apoyan los lucernarios tienen su pintura y enfoscado con diferentes grados de degradación, quedándose en algunas zonas el ladrillo a la vista.

Normativa incumplida: ninguna.

Repercusión: imagen del Hospital.

2. **Enfoscado degradado en los zócalos de obra. (Anexo I: Ilustraciones 101, 102 y 103).**

Nivel de deficiencia: LEVE.

Descripción: Los zócalos de obra para el apoyo de la estructura metálica de sujeción de la red de distribución de agua caliente y fría a las UTAS, tienen también el enfoscado con un grado de degradación avanzado.

Normativa incumplida: ninguna.

Repercusión: imagen del Hospital.

3. **Degradación de la pintura y oxidación en la red de distribución de agua.**

Nivel de deficiencia: LEVE.

Definición: degradación de la pintura y oxidación en zonas de la estructura metálica que sujeta la red de distribución de agua caliente y fría de las UTAS.

Normativa incumplida: ninguna.

Repercusión: imagen del Hospital.

4. **Degradación de la pintura y oxidación en los conductos de climatización. (Anexo I: Ilustración 104).**

Nivel de deficiencia: LEVE.

Definición: Degradación de la pintura y oxidación en zonas de la estructura metálica de las pantallas en chapa ondulada de ocultación visual de los conductos de climatización.

Normativa incumplida: ninguna.

Repercusión: imagen del Hospital.

5. **Aislamiento térmico levantado en alguna tubería. (Anexo I: Ilustración 105).**

Nivel de deficiencia: LEVE.

Definición: Aislamiento térmico levantado en alguna tubería.

Normativa incumplida: ninguna.

Repercusión: imagen del Hospital.

6. **Inexistencia de la protección ignífuga en estructura metálica de luminarias. (Anexo I: Ilustración 106).**

Nivel de deficiencia: LEVE.

Definición: Inexistencia de la protección ignífuga de la estructura metálica en zonas donde se colocaron luminarias (en el interior, en el desembarco de la escalera de acceso a la cubierta.

Normativa incumplida: ninguna.

Repercusión: imagen del Hospital.

7. **Falta de limpieza en ventiladores de cubierta. (Anexo I: Ilustración 107).**

Nivel de deficiencia: LEVE.

Definición: Falta de limpieza en ventiladores de cubierta. Se aprecian restos de papel de aluminio.

Normativa incumplida: Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio

Repercusión: fallos de funcionamiento en equipos.

3.1.12 PUERTAS AUTOMÁTICAS

Se han detectado las siguientes deficiencias:

1. **Las dos puertas de interior de urgencias (apertura mediante pulsador) carecen de sensor de movimiento.**

Nivel de incidencia: LEVE.

Definición: Las dos puertas de interior de urgencias (apertura mediante pulsador) carecen de sensor de movimiento.

Normativa incumplida: ninguna.

Repercusión: imagen del Hospital.

3.1.13 TRANSPORTE NEUMÁTICO

Se detectan las siguientes incidencias en la instalación de transporte neumático:

1. **Falta de placa de protección en estación de envío de balas. (Anexo I: Ilustraciones 112 y 113).**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: se ha detectado que una de las estaciones de envío de balas está sin placa de protección de cableado. En las siguientes imágenes puede comprobarse la diferencia entre llevar placa y no llevarla.

Normativa incumplida: ninguna.

Repercusión: imagen del Hospital.

3.1.14 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA

1. **Numerosos fallos de aislamiento en la instalación solar térmica. (Anexo I: Ilustraciones 115, 116 y 117).**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: Se observan numerosos fallos de aislamiento, sobre todo en la unión de la tubería con el colector.

Normativa incumplida: Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Repercusión: No cumplimiento estricto de la normativa.

2. **Renovación o limpieza de colectores.**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: Hay algún colector que necesita ser renovado y algún otro limpiado.

Normativa incumplida: ninguna

Repercusión: mal funcionamiento de los equipos.

3. **Oxidación de las bombas de recirculación. (Anexo I: Ilustraciones 118).**

Nivel de incidencia: LEVE.

Descripción: una de las bombas presenta óxido debido a una filtración de agua.

Normativa incumplida: ninguna

Repercusión: deterioro de los equipos.

3.2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA AL ESTADO DE LA DOCUMENTACIÓN (CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES)

-La catalogación del estado de la documentación obligatoria sobre el mantenimiento, de la cual debe disponer y además de manera adecuada según PPTe, se realiza según el siguiente baremo:

- **NO EXISTENCIA:** la documentación auditada no existe cuando la Sociedad Concesionaria no dispone de dicha documentación o no se facilita la misma a la empresa auditora.
- **EXISTENCIA Y NO CUMPLIMIENTO:** la documentación auditada existe y no cumple cuando la Sociedad Concesionaria dispone de la documentación y esta se facilita a la empresa auditora, pero, la misma se estima no adecuada a los parámetros requeridos por el PPTE.
- **EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO:** la documentación auditada existe y cumple cuando la Sociedad Concesionaria dispone de la documentación, esta se facilita a la empresa auditora y se estima adecuada a los parámetros requeridos por el PPTE.

DOCUMENTACIÓN Y MEDIOS	ASPECTO A ANALIZAR	CATALOGACIÓN DE LOS RESULTADOS	COMPROBACIÓN/DOCUMENTO
1-Proyectos de equipamiento y mobiliarios. Relación del mobiliario y equipamiento del servicio.	Existencia de la documentación	Existe y Cumple	Proyecto de Mobiliario
2-Programa funcionamiento instalaciones (Libro del Edificio)	Existencia documentación Libro del Edificio: Esquemas de principio, planos de distribución, fichas técnicas, memorias descriptivas	Existe y Cumple	Memorias de funcionamiento Sistema de Gestión de Edificios e Instalaciones, Planos, Memorias Constructivas, etc.
3-Inventario de instalaciones, mobiliario y equipos. Descripción detallada de cada equipo y número de unidades del mismo.	Existencia de documentación con los siguientes aspectos: características técnicas del equipo,	Existe y No Cumple	Inventario instalaciones Hospital de Parla
4-Registro de quejas y respuesta	Existencia de la documentación	Existe y Cumple	Reclamación_1_2017
5-Planes de ahorro y eficiencia energética			
Plan de ahorro y eficiencia energética (PAEE)	Existencia de la documentación	Existe y Cumple	Ampliación al Plan de Ahorro y Eficiencia (2012)
Estudios anuales de las medidas de mejora energética implantadas	Existencia de la documentación	No existe	
6-Plan de emergencia/contingencia o plan de autoprotección			
Plan de emergencia/contingencia	Existencia de la documentación	Existe y Cumple	Plan de Autoprotección
Versión del Plan de emergencia/contingencia	Actualización de la documentación	Existe y Cumple	01/12/2017 (Actualmente en proceso de actualización)
7-Libros de mantenimiento en soporte físico	Existencia de la documentación	Existe y Cumple	-
8-Manual de Procedimiento de Servicio	Existencia de la documentación		
Manual de Procedimiento del Servicio	Existencia de la documentación	Existe y Cumple	Manual de Procedimiento Hospital Universitario Infanta Cristina
Aprobación del Manual de Procedimiento del Servicio	Aprobación de la documentación por parte de la Administración	Existe y Cumple	Se registra la firma
Versión del Manual de Procedimiento del Servicio	Actualización de la documentación	Existe y Cumple	Versión 2011
9-Aplicación informática para gestión del mantenimiento	Existencia de la aplicación	Existe y Cumple	PRISMA III
10-Aplicación informática para gestión técnica de instalaciones y equipos	Existencia de la aplicación	Existe y Cumple	SILTROL
11-Capacidad, formación y organización de equipos de trabajo	Adecuación del personal	Cumple	CV equipo mantenimiento
12-Medios técnicos, gestión de almacenes y Stock	Adecuación de los medios logísticos	Cumple	Comprobación en PRISMA III

A continuación se aportan las comprobaciones a la existencia y adecuación de la documentación obligatoria según PPTE.

3.3 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA A LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN LOS PLANES DE MANTENIMIENTO SEGÚN PPTE

La catalogación del estado de la documentación obligatoria sobre los planes de mantenimiento, de la cual debe disponer y además de manera adecuada según PPTe, se realiza según el siguiente baremo:

- **NO EXISTENCIA:** la documentación auditada no existe cuando la Sociedad Concesionaria no dispone de dicha documentación o no se facilita la misma a la empresa auditora.
- **EXISTENCIA Y NO CUMPLIMIENTO:** la documentación auditada existe y no cumple cuando la Sociedad Concesionaria dispone de la documentación y esta se facilita a la empresa auditora, pero, la misma se estima no adecuada a los parámetros requeridos por el PPTE.
- **EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO:** la documentación auditada existe y cumple cuando la Sociedad Concesionaria dispone de la documentación, esta se facilita a la empresa auditora y se estima adecuada a los parámetros requeridos por el PPTE.

DOCUMENTACIÓN	ASPECTO A ANALIZAR	CATALOGACIÓN DE LOS RESULTADOS
1-Plan de Mantenimiento Conductivo		
Programa de necesidades	Existencia de la documentación	No existe
Emisión de órdenes de trabajo, exportación y revisión de Check List	Existencia de la documentación	Existe y Cumple
Documentación de control de mantenimiento Conductivo	Existencia de la documentación	Existe y Cumple
Evolución de consumos energéticos de los últimos tres años	Existencia de la documentación	Existe y No Cumple
Mediciones de confort	Adecuación de valores a Normativa correspondiente	No cumple
2-Plan de Mantenimiento Preventivo		
Plan de Reposición detallado (30 años, duración de la concesión).	Existencia y Adecuación de la documentación	No existe
Ciclo de vida útil de las instalaciones	Existencia y Adecuación de la documentación	No Cumple
Planes a largo plazo (quinquenales)	Existencia y Adecuación de la documentación	Existe y Cumple
Planes a medio plazo (anuales)	Existencia y Adecuación de la documentación	Existe y No Cumple
Planes a corto plazo (mensuales)	Existencia y Adecuación de la documentación	Existe y No Cumple
Registro del mantenimiento preventivo realizado	Existencia y Adecuación de la documentación	No cumple
3-Plan de Mantenimiento Correctivo		
Registro de las OTs de mantenimiento correctivo de los últimos dos años	Existencia de la documentación	Existe
Nivel cumplimentación de OTs (índice criticidad, medidas de seguridad, tiempos de respuesta, frecuencia de incidencias, etc)	Adecuación de la documentación	No cumple
Correspondencia de las SPS con las OTs en los últimos dos años	Existencia de la documentación	Cumple
4-Plan de Mantenimiento Técnico-Legal		
Informes técnico-legales: OCAs	Existencia de la documentación	Existe y Cumple
Registros para control de realización de las revisiones Técnico-legales	Existencia de la documentación	Existe y cumple
Certificaciones y calibrados de los aparatos de medida utilizados	Existencia de la documentación	Existe y cumple
5-Informes de resumen de mantenimiento		
Informe anual de mantenimiento 2017	Existencia de la documentación	Existe y Cumple
Informe anual de mantenimiento 2016	Existencia de la documentación	Existe y Cumple
Informe mensual de mantenimiento del último año	Existencia de la documentación	Existe y Cumple

A continuación se aportan las comprobaciones a la existencia y adecuación de la documentación obligatoria perteneciente a los planes de mantenimiento según PPTE.

3.3.1 PLAN DE MANTENIMIENTO CONDUCTIVO

El mantenimiento Conductivo es el conjunto de tareas de mantenimiento que llevan a cabo los técnicos encargados del mantenimiento del Hospital.

El mantenimiento conductivo incluye al menos los siguientes tipos de tareas.

1. Inspecciones sensoriales.
2. Lectura de parámetros en el sistema de control.
3. Lectura de parámetros en campo (con instrumentación local).
4. Realización de mediciones sencillas.
5. Realización de pequeñas tareas de mantenimiento de primer nivel

Se aportan las siguientes comprobaciones para el análisis de la documentación perteneciente a los planes de mantenimiento presentada:

1. **Programa de necesidades.**

El programa de necesidades es aquel que define los requisitos para satisfacer las necesidades del hospital en función de variables tales como las franjas horarias o las épocas estacionales. Según el PPTE *"La Sociedad concesionaria… Establecerá de acuerdo con la Administración Sanitaria, los programas de necesidades, en función de las distintas épocas, zonas y horarios, compatibilizando en todo momento las mejores prestaciones con las máximas eficiencias y economías posibles".*

La Sociedad concesionaria no ha proporcionado dicho informe.

2. **Emisión de órdenes de trabajo, exportación y revisión de Check List para control conductivo.**

Para la realización del mantenimiento conductivo, la empresa de mantenimiento emite órdenes de trabajo previas a la toma de datos. Estas órdenes de trabajo son como las correspondientes a la siguiente figura. En ellas se verifica y se comprueba el estado de los equipos y se mide la temperatura y humedad en las ubicaciones correspondientes.

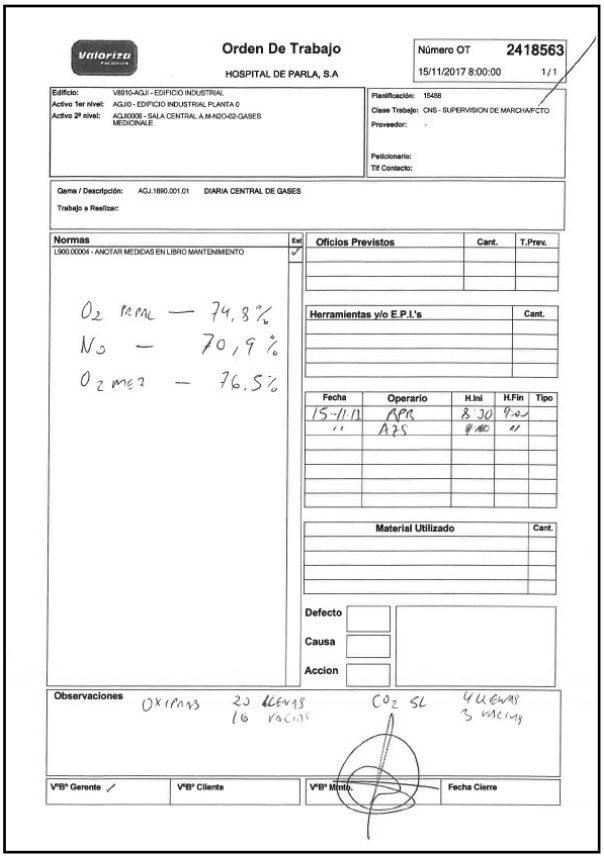

Valoriza

Orden De Trabajo

HOSPITAL DE PARLA, S.A

Número OT 2418563
15/11/2017 8:00:00 1/1

Edificio: V8910-AGJI - EDIFICIO INDUSTRIAL
Activo 1er nivel: AGJI0 - EDIFICIO INDUSTRIAL PLANTA 0
Activo 2º nivel: AGJI0006 - SALA CENTRAL A.M-N2O-02-GASES MEDICINALE

Planificación: 15488
Clase Trabajo: CNS - SUPERVISION DE MARCHA/FCTO
Proveedor: -
Peticionario:
Tlf Contacto:

Gama / Descripción: AGJ.1890.001.01 DIARIA CENTRAL DE GASES
Trabajo a Realizar:

Normas	Est
L900.00004 - ANOTAR MEDIDAS EN LIBRO MANTENIMIENTO	✓

O_2 PRPAL — 74,8%
No — 70,9%
O_2 MEZ — 76.5%

Oficios Previstos	Cant.	T.Prev.

Herramientas y/o E.P.I.'s	Cant.

Fecha	Operario	H.Ini	H.Fin	Tipo
15-11-17	RPR	8:30	9:00	
"	AZS	9:00	"	

Material Utilizado	Cant.

Defecto
Causa
Accion

Observaciones: OXIPANS 20 llenas 16 vacias; CO_2 5L 4 llenas 3 vacias

V°B° Gerente ✓ | V°B° Cliente | V°B° Mmto. | Fecha Cierre

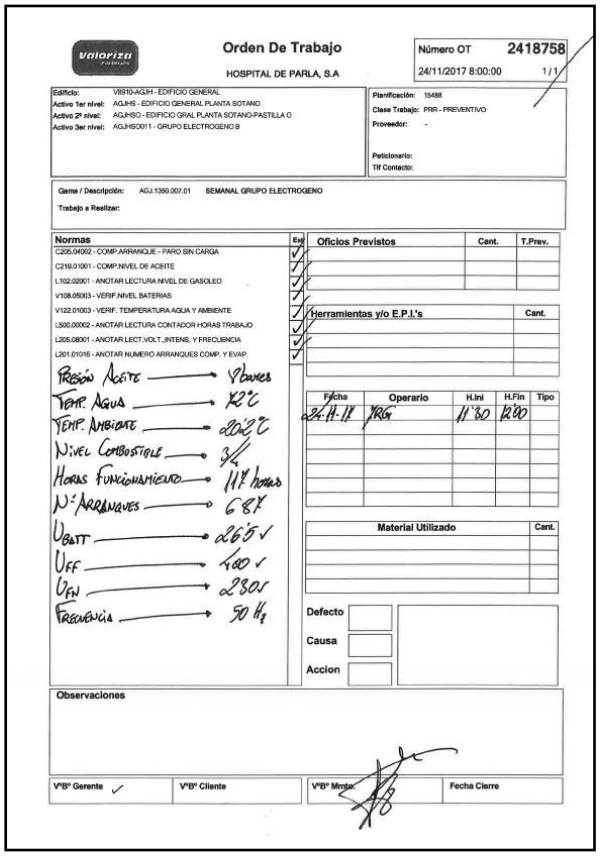

Valoriza

Orden De Trabajo

HOSPITAL DE PARLA, S.A

Número OT 2418758
24/11/2017 8:00:00 1/1

Edificio: V8910-AGJH - EDIFICIO GENERAL
Activo 1er nivel: AGJHS - EDIFICIO GENERAL PLANTA SOTANO
Activo 2º nivel: AGJHSO - EDIFICIO GRAL PLANTA SOTANO-PASTILLA O
Activo 3er nivel: AGJHSO011 - GRUPO ELECTROGENO B

Planificación: 15488
Clase Trabajo: PRR - PREVENTIVO
Proveedor: -
Peticionario:
Tlf Contacto:

Gama / Descripción: AGJ.1350.007.01 SEMANAL GRUPO ELECTROGENO
Trabajo a Realizar:

Normas	Est
C205.04002 - COMP.ARRANQUE - PARO SIN CARGA	✓
C219.01001 - COMP.NIVEL DE ACEITE	✓
L102.02001 - ANOTAR LECTURA NIVEL DE GASOLEO	✓
V108.05003 - VERIF.NIVEL BATERIAS	✓
V122.01003 - VERIF. TEMPERATURA AGUA Y AMBIENTE	✓
L500.00002 - ANOTAR LECTURA CONTADOR HORAS TRABAJO	✓
L205.08001 - ANOTAR LECT.VOLT.,INTENS. Y FRECUENCIA	✓
L201.01016 - ANOTAR NUMERO ARRANQUES COMP. Y EVAP.	✓

Presión Aceite → 8 bares
Temp. Agua → 72°C
Temp. Ambiente → 20'2°C
Nivel Combustible → 3/4
Horas Funcionamiento → 117 horas
Nº Arranques → 687
U_{BATT} → 26'5 ✓
U_{FF} → 400 ✓
U_{FN} → 230 ✓
Frecuencia → 50 Hz

Oficios Previstos	Cant.	T.Prev.

Herramientas y/o E.P.I.'s	Cant.

Fecha	Operario	H.Ini	H.Fin	Tipo
24-11-17	YRG	11:30	12:00	

Material Utilizado	Cant.

Defecto
Causa
Accion

Observaciones

V°B° Gerente ✓ | V°B° Cliente | V°B° Mmto. | Fecha Cierre

Los partes o check list de mantenimiento conductivo realizados hasta la fecha se archivan de forma ordenada y la consulta de los mismos es sencilla.

3. Elaboración de documentación de control de mantenimiento Conductivo. (últimos dos años).

Con los check list anteriores se elaboran una serie de tablas como las de las Figuras siguientes en las cuales se anotan las lecturas tomadas.

Hospital de Parla

Informe mensual-Mantenimiento

Informe mensual Hospital Infanta Cristina
Fecha: 01/2017

CONTROL DE CONSUMOS DE AGUA SANITARIA

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Acumulado
LECTURA	2014	131.843	136.229	140.966	145.474	150.314	154.127	157.998	161.829	165.405	169.131	172.866	177.006	
CONSUMO			9.667		9.012			8.929		7.447	6.958		7.573	49.586
Acumulado		0	9.667	9.667	18.679	18.679	18.679	27.608	27.608	35.055	42.013	42.013	49.586	
LECTURA	2015	180.558	183.852	188.208	191.808	195.458	199.522	203.058	207.054	210.973	214.793	218.232	221.881	
CONSUMO			7.851		7.934		7.557		7.301		7.239		7.609	45.491
Acumulado			7.851		15.785		23.342		30.643		37.882		45.491	
LECTURA	2016	225.806	230.482	234.315	238.266	242.605	247.225	253.130	255.169	258.936	262.677	266.894	271.243	
CONSUMO			8.785		8.182		8.199		7.975		7.165		8.722	49.028
Acumulado			8.785		16.967		25.166		33.141		40.306		49.028	

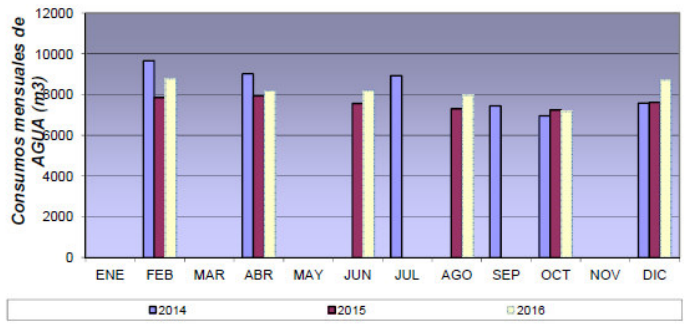

Hospital de Parla

Informe mensual-Mantenimiento

Informe mensual Hospital Infanta Cristina
Fecha: 01/2017

CONTROL DE CONSUMOS DE ELECTRICIDAD

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Acumulado
LECTURA														
CONSUMO	2014	847.256	770.756	899.301	851.959	908.676	947.564	1.096.609	1.108.102	971.820	883.120	827.700	837.007	10.949.870
Acumulado		847.256	1.618.012	2.517.313	3.369.272	4.277.948	5.225.512	6.322.121	7.430.223	8.402.043	9.285.163	10.112.863	10.949.870	
LECTURA														
CONSUMO	2015	866.465	770.558	819.529	808.358	903.073	1.017.686	1.222.333	1.035.212	866.689	826.398	791.226	823.521	10.751.048
Acumulado		866.465	1.637.023	2.456.552	3.264.910	4.167.983	5.185.669	6.408.002	7.443.214	8.309.903	9.136.301	9.927.527	10.751.048	
LECTURA														
CONSUMO	2016	817.958	771.331	794.738	761.341	838.853	944.783	1.100.360	1.051.933	913.829	826.151	773.062	794.255	10.388.594
Acumulado		817.958	1.589.289	2.384.027	3.145.368	3.984.221	4.929.004	6.029.364	7.081.297	7.995.126	8.821.277	9.594.339	10.388.594	

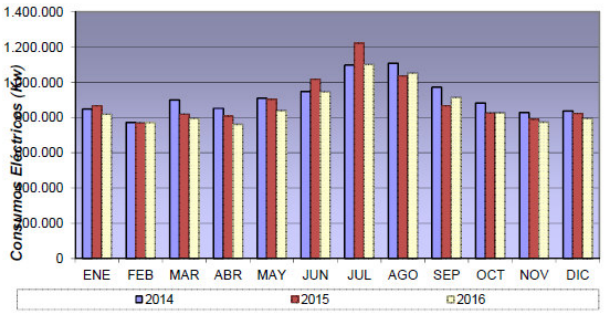

4. Evolución de Consumos Energéticos en los últimos tres años.

La empresa concesionaria, según PPTE, está obligada a recoger datos de los consumos energéticos producidos y organizarlos.

"Como responsable de la conducción y explotación de las instalaciones, deberá llevar un exhaustivo control de consumos: agua, combustible, gases, electricidad, etc, tanto para conocer los rendimientos y parámetros de explotación, como para prever con la suficiente antelación la necesidad de aprovisionamiento".

Estos registros se organizan en una serie de informes mensuales y anuales para analizar su evolución a lo largo del tiempo.

De estos informes, que se analizan en el apartado "*3.3.5. Informes mensuales y anuales de los Planes de Mantenimiento"* se ha valido Incosa para poder analizar la evolución del consumo energético a lo largo de los últimos años. Esta evolución será el dato clave para poder catalogar si las Medidas de Mejora Energética desarrolladas por la Sociedad Concesionaria proporcionan un ahorro energético real en la facturación global del Hospital.

- Consumos energéticos (últimos tres años).

-Consumos de gas natural.

Consumos gas en Hospital Infanta Cristina (2015-2017)			
MES	CONSUMOS GAS NATURAL (m3)		
	2015	2016	2017
ENERO	88.956	73.375	76.403
FEBRERO	80.839	83.597	59.753
MARZO	71.463	62.921	51.688
ABRIL	46.557	48.774	34.517
MAYO	30.059	37.329	32.504
JUNIO	25.393	17.176	8.535
JULIO	11.795	11.362	8.156
AGOSTO	6.793	6.478	4.327
SEPTIEMBRE	19.424	12.946	14.153
OCTUBRE	35.573	25.197	21.470
NOVIEMBRE	50.095	53.771	49.787
DICIEMBRE	56.652	72.129	68.138
TOTAL	***523.599***	***505.055***	***429.431***

- El consumo de gas natural es estacional.

-Consumo de electricidad.

Consumos electricidad en Hospital Infanta Cristina (2015-2017)			
MES	CONSUMOS ELECTRICIDAD (KW)		
	2015	2016	2017
ENERO	866.465	817.958	807.056
FEBRERO	770.558	771.331	733.763
MARZO	819.529	794.738	794.798
ABRIL	808.358	761.341	780.246
MAYO	903.073	838.853	866.750
JUNIO	1.017.686	944.783	981.774
JULIO	1.222.333	1.100.360	986.395
AGOSTO	1.035.212	1.051.933	1.001.912
SEPTIEMBRE	866.689	913.829	849.005
OCTUBRE	826.398	826.151	836.108
NOVIEMBRE	791.226	773.062	748.844
DICIEMBRE	823.521	794.255	780.617
TOTAL	***10.751.048***	***10.388.594***	***10.167.268***

-Consumo de ACS.

Consumos agua en Hospital Infanta Cristina (2015-2017)			
MES	CONSUMOS AGUA ACS (m3)		
	2015	2016	2017
ENERO	3.552	3.925	3.946
FEBRERO	3.294	4.676	3.527
MARZO	4.356	3.833	4.363
ABRIL	3.600	3.951	4.194
MAYO	3.650	4.339	4.447
JUNIO	4.064	4.620	4.001
JULIO	3.536	5.905	3.925
AGOSTO	3.996	2.039	3.111
SEPTIEMBRE	3.919	3.767	3.355
OCTUBRE	3.820	3.741	3.330
NOVIEMBRE	3.439	4.217	3.696
DICIEMBRE	3.649	4.349	3.473
TOTAL	***44.875***	***49.362***	***45.368***

A la vista de los resultados obtenidos, se pueden sacar las siguientes conclusiones del control de consumos energéticos:

- Se observa que se sigue un control de los consumos generales del hospital mediante facturas.

- No se realiza un seguimiento de los consumos energéticos desglosados por sistemas (calefacción, refrigeración, iluminación interior, iluminación exterior, ACS, ascensores y escaleras mecánicas, etc) con el fin de conocer el Balance Energético del edificio y así diagnosticar dónde se producen los mayores consumos energéticos, dónde tomar medidas de ahorro energético y de qué manera para llegar a obtener unos ahorros energéticos importantes y por último cuantificar los resultados obtenidos en cuanto ahorro producido una vez implementadas las medidas.

5. Mediciones de confort para mejora del plan de mantenimiento conductivo

Incosa ha realizado una serie de toma de muestras, en periodos definidos, para verificar lo reflejado en el PPTE que se indica a continuación:

"La Sociedad concesionaria, como responsable de la conducción y explotación de las instalaciones, atenderá tanto a las exigencias del servicio: puesta en marcha y parada de las instalaciones y equipos y a las debidas prestaciones y confort: vigilancia y control, como a los parámetros que definen una buena explotación".

Las mediciones a realizar son de temperatura, humedad, luxometría, velocidad de aire residual y sonometría y se usan como herramienta a la realización de la auditoría al plan de mantenimiento conductivo.

El método de revisión de las mediciones de confort térmico se basa en utilizar sondas portátiles calibradas y hacer un barrido sobre todas y cada una de las zonas y plantas que componen el hospital.

Resultado de las mediciones Temperatura, Humedad y Velocidad Residual

La adecuación de las mediciones de temperatura y humedad se analiza en base al Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE. Se incluye la Instrucción técnica complementaria IT 1.1.4.1.3. del RITE por la que se regula la velocidad del aire en la zona ocupada dentro de unos límites de bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las personas y la vestimenta).

Teniendo en cuenta las temperaturas interiores de los hospitales, la velocidad residual, para cumplir normativa, se debe calcular en base a la siguiente fórmula:

$$V = \frac{t_a}{100} - 0{,}07$$

La velocidad residual máxima que se debería detectar para temperaturas dentro del rango de la normativa, debería de estar entre estos valores: 0,14 - 0,16.

Los rangos de temperatura y humedad admitidos por la normativa RITE son los siguientes:

Estación	Temperatura operativa °C	Humedad relativa %
Verano	23…25	45…60
Invierno	21…23	40…50

En la siguiente tabla se resumen las desviaciones en temperatura y humedad encontradas en base a los rangos que se regulan mediante la normativa correspondiente:

Medición	Parámetro de confort	Zona	Nº Mediciones	RITE	
				Adecuadas	No Adecuadas
1ª	Temperatura	Centro Sanitario	165	63 (38,2%)	102 (61,8%)
	Humedad	Centro Sanitario	165	0 (0%)	165 (100%)
2ª	Temperatura	Centro Sanitario	165	97 (58,8%)	68 (41,2%)
	Humedad	Centro Sanitario	165	0 (0%)	165 (100%)
3ª	Temperatura	Centro Sanitario	165	84 (50,9%)	81 (49,1%)
	Humedad	Centro Sanitario	165	2 (1,2%)	163 (98,8%)
TOTAL	Temperatura	Centro Sanitario	495	244 (49,3%)	251 (50,7%)
	Humedad	Centro Sanitario	495	2 (0,4%)	493 (99,6%)

- Se han obtenido un **50,7%** de medidas de temperatura con valores fuera de normativa. Las tomas de muestras que no cumplen se engloban en los siguientes rangos:

TOMA DE MUESTRAS	FECHA	Tª < 20	20 ≤ Tª < 21	23 ≤ Tª < 24	24 ≤ Tª < 25	Tª > 25	TOTAL
1ª	23/11/2017	14	15	63	8	2	102
2ª	18/12/2017	7	13	43	5	0	68
3ª	01/03/2018	0	4	64	12	1	81
TOTAL		**21**	**32**	**170**	**25**	**3**	**251**
%		**8,37%**	**12,75%**	**67,73%**	**9,96%**	**1,20%**	**100,00%**

- Se han obtenido un **99,6%** de medidas de humedad con valores fuera de normativa. Las tomas de muestras que no cumplen se engloban en los siguientes rangos:

TOMA DE MUESTRAS	FECHA	H < 25	25 ≤ H < 30	30 ≤ H < 35	35 ≤ H < 40	H > 50	TOTAL
1ª	23/11/2017	77	81	6	1	0	165
2ª	18/12/2017	62	96	6	1	0	165
3ª	01/03/2018	0	6	124	33	0	163
TOTAL		**139**	**183**	**136**	**35**	**0**	**493**
%		**28,19%**	**37,12%**	**27,59%**	**7,10%**	**0,00%**	**100,00%**

- Todos los valores son inferiores al rango de humedad que marca la normativa correspondiente.

Medición	Parámetro de confort	Zona	Nº Mediciones	RITE	
				Adecuadas	No adecuadas
1ª	Velocidad residual	Salas de espera, puestos de control, pasillos… etc.	39	39 (100%)	0
2ª	Velocidad residual	Salas de espera, puestos de control, pasillos… etc.	38	38 (100%)	0
3ª	Velocidad residual	Salas de espera, puestos de control, pasillos… etc.	38	38 (100%)	0
TOTAL	Velocidad residual	Hospital	115	115 (100%)	0

- Se ha obtenido un **0%** de medidas de velocidad residual con valores fuera de normativa.

Resultado de las mediciones de Luxometría

La adecuación de las mediciones de luxometría se analiza en base a la normativa UNE 12464_1 Norma Europea sobre iluminación de interiores, por la que, para uso general, las oficinas de personal, zonas de examen, etc deben disponer de un nivel mínimo de iluminación de 500 luxes, y las salas de espera, puestos de control, pasillos, etc de 200 luxes.

Medición	Parámetro de confort	Zona	Nº Mediciones	UNE	
				Adecuadas	No Adecuadas
1ª	Luxometría	Oficinas de personal, zonas de examen… etc	127	70 (55,1%)	57 (44,9%)
		Salas de espera, puestos de control, pasillos… etc	38	35 (92,1%)	3 (7,9%)
2ª	Luxometría	Oficinas de personal, zonas de examen… etc	127	18 (14,2%)	109 (85,8%)
		Salas de espera, puestos de control, pasillos… etc	38	33 (86,8%)	5 (13,2%)
3ª	Luxometría	Oficinas de personal, zonas de examen… etc	127	10 (7,9%)	117 (92,1%)
		Salas de espera, puestos de control, pasillos… etc	38	36 (94,7%)	2 (5,3%)
TOTAL	Luxometría	Oficinas de personal, zonas de examen… etc	381	98 (25,7%)	283 (74,3%)
		Salas de espera, puestos de control, pasillos… etc	114	104 (91,2%)	10 (8,8%)

- Se ha obtenido un **74,3%** de medidas de luxometría en las zonas de oficinas, de examen, etc con valores fuera de normativa.
- Se ha obtenido un **8,8%** de medidas de luxometría en salas de espera, puestos de control, pasillos, etc con valores fuera de normativa.

Las tomas de muestras que no cumplen se engloban en los siguientes rangos:

TOMA DE MUESTRAS	FECHA	Oficinas de personal... 500 > Lux > 400	Salas de espera... 200 > Lux > 100	Oficinas de personal... 400 ≥ Lux > 300	Salas de espera... Lux≤ 100	Oficinas de personal... Lux ≤ 300	TOTAL
1ª	23/11/2017 y 24/11/2017	11	2	15	1	31	60
2ª	08/02/2018	26	5	41	0	42	114
3ª	01/03/2018	21	2	37	0	59	119
TOTAL		**58**	**9**	**93**	**1**	**132**	**293**
%		**19,80%**	**3,07%**	**31,74%**	**0,34%**	**45,05%**	**100,00%**

Resultado de las mediciones de Sonometría

La adecuación de las mediciones de sonometría se analiza en base al RD 1367/2007 *de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.*

En el caso de una instalación hospitalaria, los índices de tolerancia de ruido durante las mañanas y tardes para las zonas de estancia (salas de espera, pasillos, puestos de control) son, máximo de 45 decibelios. Para las habitaciones y despachos el límite según normativa son 40 decibelios.

Uso del edificio	Tipo de Recinto	Índices de ruido		
		L_d	L_e	L_n
Vivienda o uso residencial	Estancias	45	45	35
	Dormitorios	40	40	30
Hospitalario	Zonas de estancia	45	45	35
	Dormitorios	40	40	30
Educativo o cultural	Aulas	40	40	40
	Salas de lectura	35	35	35

Los valores obtenidos son los siguientes:

Medición	Parámetro de confort	Zona	Nº Mediciones	RITE	
				Adecuadas	No adecuadas
1ª	Sonometría	Salas de espera, puestos de control, pasillos... etc.	34	33 (97,1%)	1 (2,9%)
		Oficinas de personal, zonas de examen	144	70 (48,6%)	74 (51,4%)
2ª	Sonometría	Salas de espera, puestos de control, pasillos... etc.	38	38 (100,0%)	0 (0,0%)
		Oficinas de personal, zonas de examen	127	121 (95,3%)	6 (4,7%)
TOTAL	Sonometría	Salas de espera, puestos de control, pasillos... etc.	72	71 (98,6%)	1 (1,4%)
		Oficinas de personal, zonas de examen	271	191 (70,5%)	80 (29,5%)

- Se han obtenido un **29,5%** de medidas de sonometría en las zonas de oficinas, de examen, etc con valores fuera de normativa.
- Se han obtenido un **1,4%** de medidas de sonometría en salas de espera, puestos de control, pasillos, etc con valores fuera de normativa.

Las tomas de muestras que no cumplen se engloban en los siguientes rangos:

TOMA DE MUESTRAS	FECHA	Oficinas de personal... 45 > Db > 50	Salas de espera... 40 > Lux > 45	Salas de espera... Db ≥ 50	Oficinas de personal... Db ≥ 45	TOTAL
1ª	08/02/2018	0	57	1	17	75
2ª	01/03/2018	0	6	0	0	6
TOTAL		**0**	**63**	**1**	**17**	**81**
%		**0,00%**	**77,78%**	**1,23%**	**20,99%**	**100,00%**

En el Anexo III se aportan todos los Check List correspondientes a las evaluaciones realizadas.

3.3.2 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El plan de mantenimiento preventivo engloba mucha información, ya que prevé lo que habrá que invertir y las tareas que habrá que realizar, año a año hasta el fin del período de concesión de la explotación del hospital. En cuanto al análisis del mismo, se realiza la documentación atendiendo al período al que afecta de más a menos. Primeramente, se evalúa la realización de planes de reposición a 30 años, posteriormente planes preventivos quinquenales y para finalizar los planes a medio y corto plazo y la comprobación de su realización.

1. **Plan de Reposición (30 años, duración de la concesión).**

La Sociedad Concesionaria deberá elaborar un Plan de Reposición que engloba las sustituciones a realizar tanto en obra civil como en instalaciones y mobiliario a lo largo de los 30 años de la concesión.

La Sociedad Concesionaria no nos ha proporcionado un plan de reposición a 30 años. La información que nos ha proporcionado ha sido la correspondiente al presente documento, en el cual se muestran las reposiciones a llevar a cabo a lo largo del año 2017.

Hospital de Parla

MES PREVISTO	CONCEPTO	OCI INSTI MOB	UBICACIÓN ESTIMADA
ENERO	PAPELERAS Y CONTENEDORES RESIDUOS *contenedor con tapa de plástico 70 L: 13 ud.* *papelera de pedal 51. metálica. 73 ud.* *papelera push pompatado 12 l. plástico. 64 ud.* *papelera rejilla 10 l. metálica. 5 ud.* *papelera cabezal basculante 40 l.: 6ud.*	MOB	DIÁLISIS, QUIRÓFANO, DESPACHOS, HABITACIONES, PUESTOS DE GESTIÓN DE TURNOS,...
ENERO	ACTUACIÓN EN PUERTA PSIQUIATRÍA	OC	HOSP. PSIQUIATRÍA
ENERO	ADAPTACIÓN CUADRO ELÉCTRICO	INST	COCINA PERSONAL
FEBRERO	MOBILIARIO *mesas rectas con faldón: 5 ud.* *estanterías con puertas bajas: 5 ud.* *sillas giratorias respaldo alto con brazos: 20 ud.* *cajoneras: 5 ud.*	MOB	CONSULTAS DERMAT., CONSULTAS NEFROL., REHAB. CARDIACA Y DESPACHOS
FEBRERO	LÁMPARAS EXPLORACIÓN. (10 uds.)	MOB	TODO EL HOSPITAL
FEBRERO	MAMPARA EN DUCHA MATERNIDAD	OC	MATERNIDAD. UNIDAD BO
FEBRERO	ALBARDILLA CORONACIÓN CASETÓN- FACHADA. Desarrollo 650mm.	OC	CUBIERTA-CASETONES
MARZO	VACUÓMETROS (8 uds.) Y CAUDALÍMETROS (15 ud.)	MOB	CONSULTAS, HABITACIONES,...
MARZO	PUERTAS EXTERIORES CASETONES- 4 puertas	OC	CUBIERTA-CASETONES
MARZO	LAVAMANOS	MOB	DIÁLISIS- SALA AGUDOS
MARZO	SAI	INST	ANATOMÍA PATOLÓGICA
MARZO	UNIDAD DE CONTROL DEL APARCAMIENTO	INST	APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
MARZO	CONTADOR Y REPOSICIÓN EN LÍNEA DE FUERZA	INST	EXPLOTACIONES COMERCIALES
MARZO	CAMBIOS FILTROS/ACEITES ENFRIADORAS	INST	CUBIERTA-CASETONES
ABRIL	BOMBA AGUA FRÍA CON VARIADOR DE FRECUENCIA	INST	EDIF. INDUSTRIAL
ABRIL	SAI	INST	QUIRÓFANO- CMA
ABRIL	VIDEOPORTERO	INST	FARMACIA
ABRIL	COLCHONES CLÍNICOS (15 uds.)	MOB	TODO EL HOSPITAL
ABRIL	CABLEADO ASCENSORES	INST	
MAYO	TRABAJOS FACHADAS	OC	URBANIZACIÓN- TODO EL HOSP
MAYO	PUERTAS RF PSIQUIATRÍA	OC	PSIQUIATRÍA
MAYO	ESTORES	MOB	HOSPITALIZACIÓN
JUNIO	REPOSICIÓN AISLANTE CUBIERTA	OC	CUBIERTA
JUNIO	CABLEADO ASCENSORES	INST	
JUNIO	PUERTA TRAFOS	OC	EDIFICIO INDUSTRIAL
JULIO	PINTURA EXTERIOR APARCAMIENTO	OC	URBANIZACIÓN
JULIO	REPOSICIÓN AISLANTE CUBIERTA	OC	CUBIERTA
JULIO	CABLEADO ASCENSORES	INST	
JULIO	PANELES DE QUIRÓFANO	INST	QUIRÓFANO
AGOSTO	TRABAJOS VERANO. REVISIÓN PINTURA Y ACABADOS	OC	
AGOSTO	PANELES DE QUIRÓFANO	INST	QUIRÓFANO
AGOSTO	REPOSICIÓN AISLANTE CUBIERTA	OC	CUBIERTA
SEPTIEMBRE	BALDOSAS DIRECCIONALES	OC	URBANIZACIÓN
SEPTIEMBRE	CABLEADO ASCENSORES	INST	
SEPTIEMBRE	TELEVISIÓN	MOB	
OCTUBRE	VINILOS PUERTAS	OC	ENTRADAS HOSPITAL
OCTUBRE	SILLONES PACIENTES	MOB	HOSPITALIZACIÓN
OCTUBRE	PERSIANAS AUTOMATIZADAS PSIQUIATRÍA	OC	HOSP. PSIQUIATRÍA
NOVIEMBRE	ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	INST	TODO EL HOSPITAL
NOVIEMBRE	MOBILIARIO	MOB	
NOVIEMBRE	ARCOS SILLAS RUEDAS	MOB	TODO EL HOSPITAL
DICIEMBRE	FRIGORÍFICOS DOS PUERTAS	MOB	
DICIEMBRE	REVISIÓN SIST.CONTROL PCI	INST	TODO EL HOSPITAL
DICIEMBRE	CONTROL INSTALACIONES	INST	EDIF. INDUSTRIAL
DICIEMBRE	MICROONDAS	MOB	

Dada la escasez de información, en el apartado 2.4 se desarrolla el estudio de la vida útil de las instalaciones. Este es el dato clave para elaborar el plan de reposiciones a 30 años del hospital.

2. Ciclo de vida útil de las instalaciones.

Dado que la Sociedad Concesionaria no nos proporciona una vida útil exacta de sus instalaciones como base para la realización de las reposiciones a realizar durante el período de concesión, se desarrolla la siguiente tabla de ciclos de vida:

Descripción	Vida Útil estimada concesionaria	Vida Útil INCOSA	Vida útil restante (años)	Nº Equipos	Estado
FAN-COIL	80%	6	-4	922	PLAZO DE REPOSICIÓN SOBREPASADO
BOMBA ACS	100%	6	-4	3	PLAZO DE REPOSICIÓN SOBREPASADO
BOMBA CLIMATIZACIÓN	160%	7	-3	18	PLAZO DE REPOSICIÓN SOBREPASADO
BOMBA JOCKEY	100%	5	-5	1	PLAZO DE REPOSICIÓN SOBREPASADO
BOMBA PCI	(100%-0%)	5	-5	2	PLAZO DE REPOSICIÓN SOBREPASADO
SAI	400%	7	-3	26	PLAZO DE REPOSICIÓN SOBREPASADO
CLIMATIZADOR	80%	12	2	32	PRÓXIMO FIN VIDA ÚTIL
DEPOSITO GASOIL	50%	23	13	2	CORRECTO
CALDERA	((4)80% - (2)-80%)	14	4	6	CORRECTO
VASO EXPANSIÓN	80%	18	8	1	CORRECTO
ACUMULADOR	100%	15	5	4	CORRECTO
CAPTADOR SOLAR	100%	20	10	75	CORRECTO
ENFRIADORA	80%	15	5	4	CORRECTO
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO	50%	20	10	19	CORRECTO
TRANSFORMADOR	50%	20	10	6	CORRECTO
ASCENSOR	80%	12	2	27	PRÓXIMO FIN VIDA ÚTIL
UTA	80%	15	5	63	CORRECTO
RECUPERADOR UTA	-80%	15	5	12	CORRECTO
GRUPO ELECTRÓGENO	50%	20	10	3	CORRECTO
CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA	100%	15	5	6	CORRECTO
CENTRAL EXTINCIÓN AUTOMÁTICA	100%	15	5	7	CORRECTO
B.I.E	100%	20	10	199	CORRECTO
EXTINTOR	100%	20	10	466	CORRECTO
ROCIADOR	100%	30	20	5	CORRECTO
DETECTOR ÓPTICO	100%	15	5	2851	CORRECTO
DETECTOR ALGORÍTMICO	100%	15	5	2896	CORRECTO
RACK	90%	30	20	2	CORRECTO
EXTINCIÓN TRIPLE	130%	12	2	1	PRÓXIMO FIN VIDA ÚTIL
EXTINCIÓN SIMPLE	130%	12	2	1	PRÓXIMO FIN VIDA ÚTIL
ARMARIO FRIGORÍFICO	130%	10	0	2	EN PLAZO DE REPOSICIÓN

3. Planes a largo plazo (cinco años).

Son los planes para los edificios e instalaciones, incluyendo mantenimiento de ciclos de vida, sustituciones, mejoras previstas y programas de reposición y renovación.

La Sociedad Concesionaria dispone de dos planes de mantenimiento a largo plazo realizados.


Hospital de Parla

INFORME DE PLAN DE REPOSICIONES E INVERSIONES
Y PLANES DE MANTENIMIENTO (2008 – 2012).
PLANIFICACIÓN DEL PERIODO: 2013 - 2017.

4. Plan a medio plazo (anual)

Programas detallados para cada periodo de 12 meses. Estos programas anuales serán presentados a la Administración Sanitaria al menos 4 meses antes de su puesta en ejecución. Se incluirá información sobre posibles repercusiones que la realización de estos trabajos puedan tener en la actividad del Hospital.

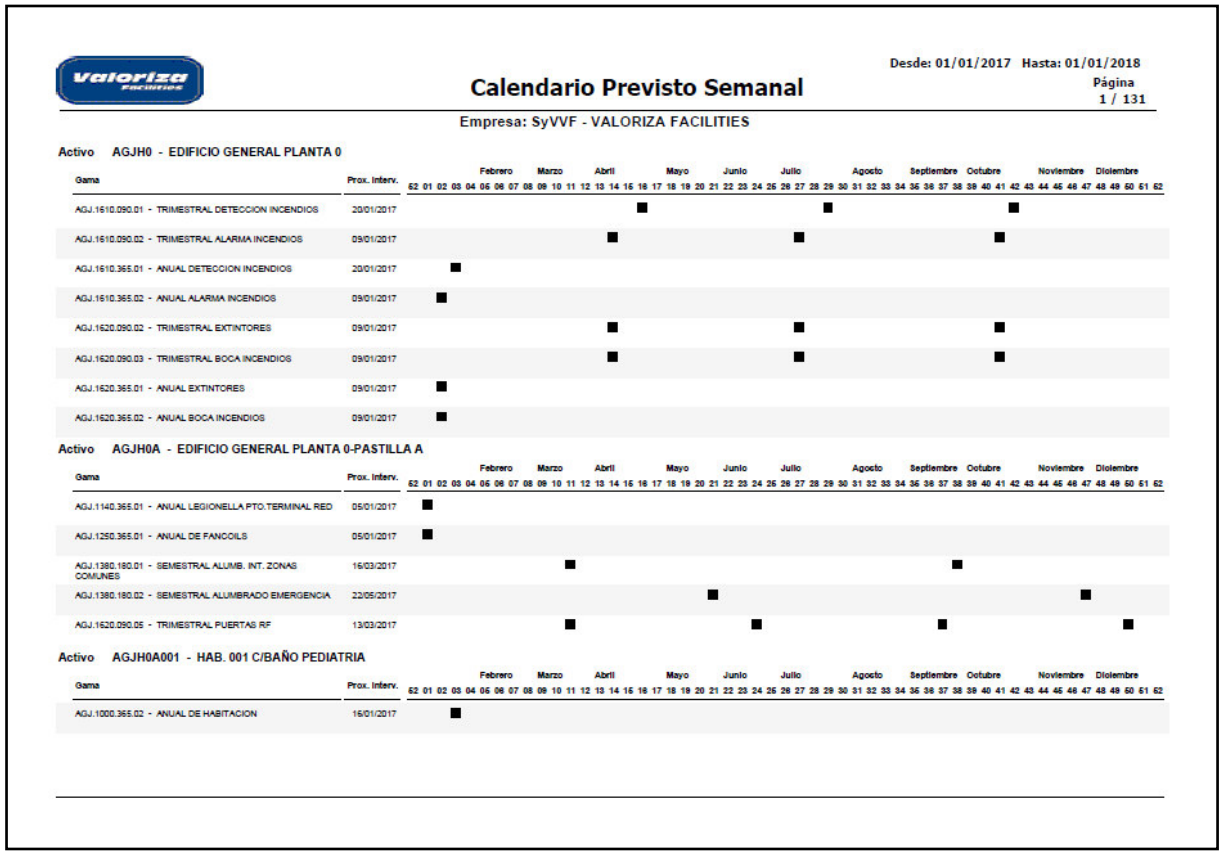

Valoriza Facilities

Calendario Previsto Semanal

Desde: 01/01/2017 Hasta: 01/01/2018
Página 1 / 131

Empresa: SyVVF - VALORIZA FACILITIES

Activo AGJH0 - EDIFICIO GENERAL PLANTA 0

Gama	Prox. Interv.
AGJ.1610.090.01 - TRIMESTRAL DETECCION INCENDIOS	20/01/2017
AGJ.1610.090.02 - TRIMESTRAL ALARMA INCENDIOS	09/01/2017
AGJ.1610.365.01 - ANUAL DETECCION INCENDIOS	20/01/2017
AGJ.1610.365.02 - ANUAL ALARMA INCENDIOS	09/01/2017
AGJ.1620.090.02 - TRIMESTRAL EXTINTORES	09/01/2017
AGJ.1620.090.03 - TRIMESTRAL BOCA INCENDIOS	09/01/2017
AGJ.1620.365.01 - ANUAL EXTINTORES	09/01/2017
AGJ.1620.365.02 - ANUAL BOCA INCENDIOS	09/01/2017

Activo AGJH0A - EDIFICIO GENERAL PLANTA 0-PASTILLA A

Gama	Prox. Interv.
AGJ.1140.365.01 - ANUAL LEGIONELLA PTO.TERMINAL RED	05/01/2017
AGJ.1250.365.01 - ANUAL DE FANCOILS	05/01/2017
AGJ.1380.180.01 - SEMESTRAL ALUMB. INT. ZONAS COMUNES	15/03/2017
AGJ.1380.180.02 - SEMESTRAL ALUMBRADO EMERGENCIA	22/05/2017
AGJ.1620.090.05 - TRIMESTRAL PUERTAS RF	13/03/2017

Activo AGJH0A001 - HAB. 001 C/BAÑO PEDIATRIA

Gama	Prox. Interv.
AGJ.1000.365.02 - ANUAL DE HABITACION	15/01/2017

Dicha tabla no solo contiene el mantenimiento preventivo que se debe realizar cada mes, sino también las OCAS quedan reflejadas con su revisión correspondiente.

5. Planes a corto plazo (mensual).

Programa detallado, cada mes, de los trabajos a realizar en el próximo mes, informando como mínimo de:

- Localización de trabajo que será llevado a cabo identificando claramente las actividades que alterarán el funcionamiento del hospital.
- Valoración de los riesgos.
- Periodo de tiempo en que el trabajo va a ser desarrollado.
- Calidad y estándares a ser alcanzados.
- Recursos/subcontratas usadas.
- Permisos de trabajo requeridos.

En el documento facilitado por el hospital, aparece tanto el mantenimiento conductivo y el preventivo, como queda señalado en la tabla.

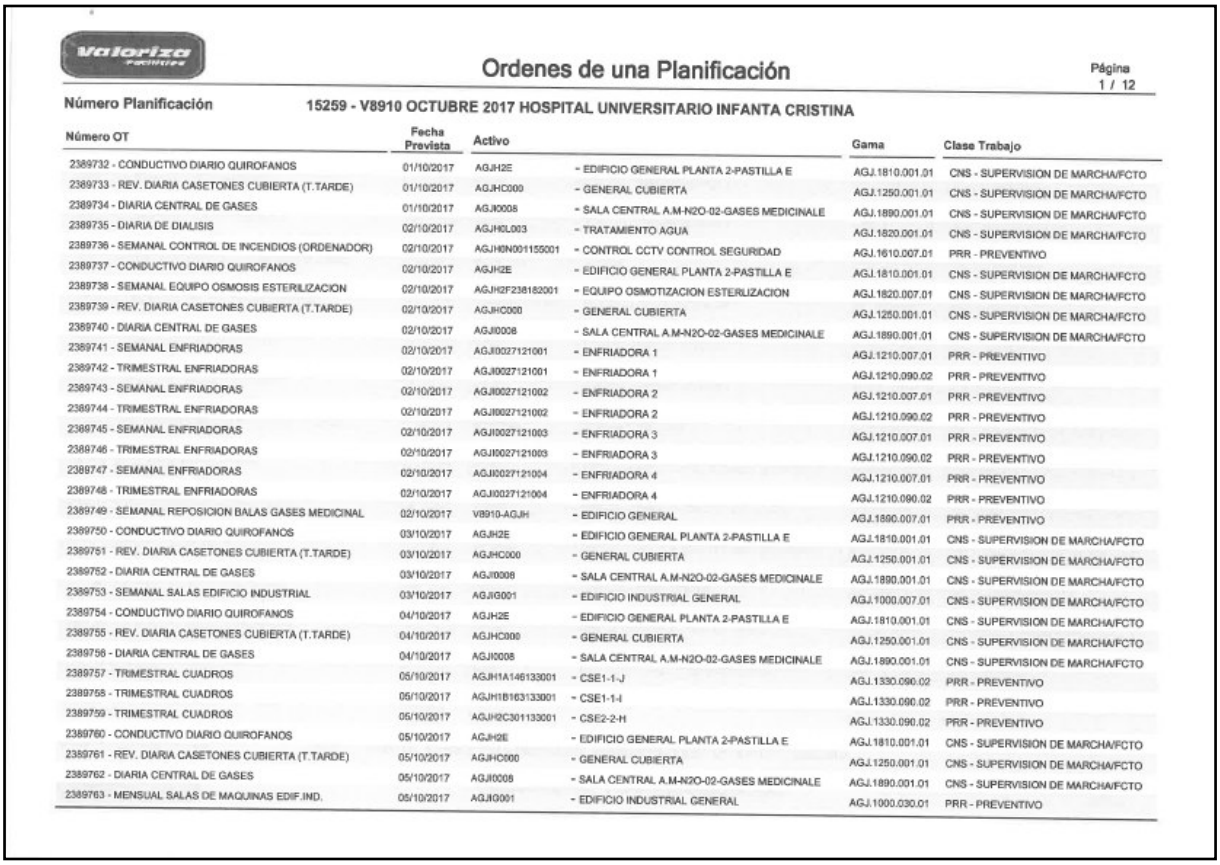

Valoriza Facilities

Ordenes de una Planificación

Página 1 / 12

Número Planificación 15259 - V8910 OCTUBRE 2017 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Número OT	Fecha Prevista	Activo		Gama	Clase Trabajo
2389732 - CONDUCTIVO DIARIO QUIROFANOS	01/10/2017	AGJH2E	- EDIFICIO GENERAL PLANTA 2-PASTILLA E	AGJ.1810.001.01	CNS - SUPERVISION DE MARCHA/FCTO
2389733 - REV. DIARIA CASETONES CUBIERTA (T.TARDE)	01/10/2017	AGJHC000	- GENERAL CUBIERTA	AGJ.1250.001.01	CNS - SUPERVISION DE MARCHA/FCTO
2389734 - DIARIA CENTRAL DE GASES	01/10/2017	AGJI0008	- SALA CENTRAL A.M-N2O-02-GASES MEDICINALE	AGJ.1890.001.01	CNS - SUPERVISION DE MARCHA/FCTO
2389735 - DIARIA DE DIALISIS	02/10/2017	AGJH0L003	- TRATAMIENTO AGUA	AGJ.1820.001.01	CNS - SUPERVISION DE MARCHA/FCTO
2389736 - SEMANAL CONTROL DE INCENDIOS (ORDENADOR)	02/10/2017	AGJH0N001155001	- CONTROL CCTV CONTROL SEGURIDAD	AGJ.1610.007.01	PRR - PREVENTIVO
2389737 - CONDUCTIVO DIARIO QUIROFANOS	02/10/2017	AGJH2E	- EDIFICIO GENERAL PLANTA 2-PASTILLA E	AGJ.1810.001.01	CNS - SUPERVISION DE MARCHA/FCTO
2389738 - SEMANAL EQUIPO OSMOSIS ESTERILIZACION	02/10/2017	AGJH2F238182001	- EQUIPO OSMOTIZACION ESTERLIZACION	AGJ.1820.007.01	CNS - SUPERVISION DE MARCHA/FCTO
2389739 - REV. DIARIA CASETONES CUBIERTA (T.TARDE)	02/10/2017	AGJHC000	- GENERAL CUBIERTA	AGJ.1250.001.01	CNS - SUPERVISION DE MARCHA/FCTO
2389740 - DIARIA CENTRAL DE GASES	02/10/2017	AGJI0008	- SALA CENTRAL A.M-N2O-02-GASES MEDICINALE	AGJ.1890.001.01	CNS - SUPERVISION DE MARCHA/FCTO
2389741 - SEMANAL ENFRIADORAS	02/10/2017	AGJI0027121001	- ENFRIADORA 1	AGJ.1210.007.01	PRR - PREVENTIVO
2389742 - TRIMESTRAL ENFRIADORAS	02/10/2017	AGJI0027121001	- ENFRIADORA 1	AGJ.1210.090.02	PRR - PREVENTIVO
2389743 - SEMANAL ENFRIADORAS	02/10/2017	AGJI0027121002	- ENFRIADORA 2	AGJ.1210.007.01	PRR - PREVENTIVO
2389744 - TRIMESTRAL ENFRIADORAS	02/10/2017	AGJI0027121002	- ENFRIADORA 2	AGJ.1210.090.02	PRR - PREVENTIVO
2389745 - SEMANAL ENFRIADORAS	02/10/2017	AGJI0027121003	- ENFRIADORA 3	AGJ.1210.007.01	PRR - PREVENTIVO
2389746 - TRIMESTRAL ENFRIADORAS	02/10/2017	AGJI0027121003	- ENFRIADORA 3	AGJ.1210.090.02	PRR - PREVENTIVO
2389747 - SEMANAL ENFRIADORAS	02/10/2017	AGJI0027121004	- ENFRIADORA 4	AGJ.1210.007.01	PRR - PREVENTIVO
2389748 - TRIMESTRAL ENFRIADORAS	02/10/2017	AGJI0027121004	- ENFRIADORA 4	AGJ.1210.090.02	PRR - PREVENTIVO
2389749 - SEMANAL REPOSICION BALAS GASES MEDICINAL	02/10/2017	V8910-AGJH	- EDIFICIO GENERAL	AGJ.1890.007.01	PRR - PREVENTIVO
2389750 - CONDUCTIVO DIARIO QUIROFANOS	03/10/2017	AGJH2E	- EDIFICIO GENERAL PLANTA 2-PASTILLA E	AGJ.1810.001.01	CNS - SUPERVISION DE MARCHA/FCTO
2389751 - REV. DIARIA CASETONES CUBIERTA (T.TARDE)	03/10/2017	AGJHC000	- GENERAL CUBIERTA	AGJ.1250.001.01	CNS - SUPERVISION DE MARCHA/FCTO
2389752 - DIARIA CENTRAL DE GASES	03/10/2017	AGJI0008	- SALA CENTRAL A.M-N2O-02-GASES MEDICINALE	AGJ.1890.001.01	CNS - SUPERVISION DE MARCHA/FCTO
2389753 - SEMANAL SALAS EDIFICIO INDUSTRIAL	03/10/2017	AGJIG001	- EDIFICIO INDUSTRIAL GENERAL	AGJ.1000.007.01	CNS - SUPERVISION DE MARCHA/FCTO
2389754 - CONDUCTIVO DIARIO QUIROFANOS	04/10/2017	AGJH2E	- EDIFICIO GENERAL PLANTA 2-PASTILLA E	AGJ.1810.001.01	CNS - SUPERVISION DE MARCHA/FCTO
2389755 - REV. DIARIA CASETONES CUBIERTA (T.TARDE)	04/10/2017	AGJHC000	- GENERAL CUBIERTA	AGJ.1250.001.01	CNS - SUPERVISION DE MARCHA/FCTO
2389756 - DIARIA CENTRAL DE GASES	04/10/2017	AGJI0008	- SALA CENTRAL A.M-N2O-02-GASES MEDICINALE	AGJ.1890.001.01	CNS - SUPERVISION DE MARCHA/FCTO
2389757 - TRIMESTRAL CUADROS	05/10/2017	AGJH1A146133001	- CSE1-1-J	AGJ.1330.090.02	PRR - PREVENTIVO
2389758 - TRIMESTRAL CUADROS	05/10/2017	AGJH1B163133001	- CSE1-1-I	AGJ.1330.090.02	PRR - PREVENTIVO
2389759 - TRIMESTRAL CUADROS	05/10/2017	AGJH2C301133001	- CSE2-2-H	AGJ.1330.090.02	PRR - PREVENTIVO
2389760 - CONDUCTIVO DIARIO QUIROFANOS	05/10/2017	AGJH2E	- EDIFICIO GENERAL PLANTA 2-PASTILLA E	AGJ.1810.001.01	CNS - SUPERVISION DE MARCHA/FCTO
2389761 - REV. DIARIA CASETONES CUBIERTA (T.TARDE)	05/10/2017	AGJHC000	- GENERAL CUBIERTA	AGJ.1250.001.01	CNS - SUPERVISION DE MARCHA/FCTO
2389762 - DIARIA CENTRAL DE GASES	05/10/2017	AGJI0008	- SALA CENTRAL A.M-N2O-02-GASES MEDICINALE	AGJ.1890.001.01	CNS - SUPERVISION DE MARCHA/FCTO
2389763 - MENSUAL SALAS DE MAQUINAS EDIF.IND.	05/10/2017	AGJIG001	- EDIFICIO INDUSTRIAL GENERAL	AGJ.1000.030.01	PRR - PREVENTIVO

3.3.3 PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El registro de las órdenes de trabajo correspondientes a los mantenimientos correctivos se realiza en el programa de gestión del mantenimiento y se proporciona en una hoja de cálculo para su análisis

Se ha procedido al estudio de la hoja de cálculo. Se estudia la correspondencia entre la misma y la hoja de SPS facilitada por el hospital, además de la tipología y grado de detalle del registro de las órdenes de trabajo.

Se dispone de los datos correspondientes a las órdenes de trabajo correctivas de 2016 y 2017. Los datos que incluye el registro son los siguientes:

- Número de Orden de Trabajo.
- Denominación de Orden de trabajo.
- Fecha/Hora edición.
- Horas Mano de Obra propia

El nivel de detalle de la información facilitada en cuanto al registro del mantenimiento correctivo no cumple con las obligaciones del PPTE.

El registro de los mismos debe de incluir los siguientes aspectos:

"La Sociedad Concesionaria deberá proporcionar un servicio global de reparaciones y mantenimiento correctivo, incluyendo un servicio inmediato de apoyo y consejo técnico y administrativo en los trabajos que surjan de peticiones o Solicitudes de Trabajo **(ST**) de emergencia, de urgencia y de rutina del servicio. La Sociedad Concesionaria deberá responder y rectificar dentro de los tiempos de respuesta y rectificación para alcanzar los estándares del servicio establecidos en el Anexo A y para satisfacer los requerimientos de la ley.

Las ST darán lugar a las correspondientes Ordenes de Trabajo **(OT**) en las que vendrán especificadas las tareas a realizar, las instrucciones de seguridad, las verificaciones y los correspondientes descargos".

Número OT	Denominación OT	Fecha/Hora Edició	Horas Mano de Obra Propi
2167095	FOCOS DE TECHO BOX URG. PED. SIN LUZ	1-1-17 3:15	1:30:00
2167494	FRIO EN SALA ESPERA URGENCIAS	1-1-17 16:00	0:30:00
2167492	HAY AGUA EN VESTUARIO FEMENINO 1C	1-1-17 18:00	2:00:00
2167496	DESATASCAR WC FEMENINO CAFETERIA	1-1-17 20:00	1:00:00
2167072	LUZ FUNDIDA EN CUARTO SUCIO 2B	2-1-17 7:35	1:00:00
2167081	CERRADURA TAQUILLA FORZADA DIGESTIVO	2-1-17 8:25	0:30:00
2167075	ROTO IMAN DE PUERTA PASILLO PEDIATRIA	2-1-17 9:35	1:00:00
2170993	ROTO EL RESPALDO DE SILLA EN PEDIATRIA	2-1-17 9:35	0:30:00
2167079	BALA CO2 SALA 24 ENDOSCOPIAS	2-1-17 9:45	1:00:00
2167091	NO FUNCIONA TV DEL PUESTO 8 DIALISIS	2-1-17 10:25	0:30:00
2167076	LLAVE DENTRO DE CERRADURA LENCERIA RX	2-1-17 10:40	0:30:00
2167077	HALOGENO BAÑO CUARTO GUARDIA 2 FUNDIDO	2-1-17 10:45	0:30:00
2167074	TALLIMETRO DE BASCULA FLOJO EN PEDIATRIA	2-1-17 10:50	0:30:00
2167083	NO FUNCIONA LAMPARA TECHO QX 3 CMA	2-1-17 11:15	4:00:00
2167092	TIMBRE DE CONTROL URGENCIAS ROTO	2-1-17 11:35	0:30:00
2167073	PERSIANA ROTA EN HAB. 161	2-1-17 12:00	0:30:00
2167498	RECEPCIONAR FILTROS Y COLOCARLOS	2-1-17 12:00	2:00:00
2170903	PERSIANA AVERIADA EN HAB. 161	2-1-17 12:00	1:00:00
2172050	FRENO DE LA CAMA ROTO HAB. 161	2-1-17 12:00	2:00:00
2167499	REPARAR MESILLA EN TALLER DE LA 2C	2-1-17 13:00	1:00:00
2167082	NO HAY LUZ EN HAB. 5	2-1-17 14:10	1:00:00
2167071	NO FUNCIONA LAMPARA QX 4 CMA	2-1-17 14:20	1:00:00
2167088	NO HAY LUZ EN LA 2B	2-1-17 15:10	0:30:00
2167087	NO HAY LUZ EN HAB . 181	2-1-17 15:15	0:30:00
2167085	HABITACIONES DE 1B SIN LUZ	2-1-17 15:20	0:30:00
2167576	REVISAR PALO DE SUERO EN SILLA EN URG.	2-1-17 16:00	0:30:00
2167070	REVISAR CISTERNAS WC VESTUARIOS 1C	2-1-17 17:30	0:30:00
2167093	PERSIANA DE HAB. 138 ROTA	2-1-17 17:30	0:30:00
2167500	SUBIR PRESION A CIRCUITO PLACAS SOLARES	2-1-17 18:00	2:00:00
2170995	TORNILLO BARANDILLA CAMA DE HAB. 135	2-1-17 21:15	1:00:00
2167508	SUBIR TEMPERATURA EN NEONATOS	3-1-17 0:00	0:30:00
2476451	SE HA IDO LA LUZ EN 2C	3-1-17 3:00	0:30:00
2167634	CAMBIAR BALA CO2 EN SALA 24 ENDOSCOPIAS	3-1-17 8:30	0:30:00
2167629	REVISAR LAMPARA QX 3 CMA	3-1-17 8:55	1:00:00
2167658	LAVABO ASEO FEMENINO ENTRADA URGENCIAS	3-1-17 9:45	0:30:00
2477604	NO FUNCIONA TOMA DE VACIO DE QX 1 CMI	3-1-17 9:45	1:00:00
2167625	HACE FRIO EN SALA DE AGUDOS	3-1-17 10:05	0:30:00
2167620	ARREGLO CERRADURA TAQUILLA ENDOCRINO	3-1-17 10:20	1:00:00
2167613	PUERTA DESCOLGADA EN ASEO CONTROL 1 URG.	3-1-17 10:40	0:30:00
2167586	CAJONERA CONSULTA 6 BLOQUEADA	3-1-17 11:00	0:20:00
2167583	ARREGLAR CERRADURA TAQUILLA VEST. REHAB.	3-1-17 11:50	0:20:00
2167581	APRETAR MANILLA PUERTA FRENTE SALA 18	3-1-17 12:10	0:15:00
2167579	ARREGLAR BOMBIN EN TAQUILLA 008 CEX	3-1-17 12:35	0:15:00
2167594	PUERTA ENTRADA FAMILIARES UCI	3-1-17 13:30	0:15:00
2167572	MESA DE HAB. 246 ROTA	3-1-17 14:50	0:30:00
2167570	SIN LUZ EN CONSULTA OFTALMOLOGIA	3-1-17 16:00	1:00:00
2167503	REPARAR RESPALDO DE SILLON EN NEONATOS	3-1-17 16:45	2:00:00
2167507	PERSIANA DE HAB. 173 ROTA	3-1-17 17:25	1:00:00
2167505	PUERTA ROTA ACCESO CONTROL 1 URG.	3-1-17 20:00	1:00:00
2167595	TELEFONO URGENCIAS OBSTETRICIA 2 AVERIAD	3-1-17 20:40	0:15:00
2174252	FALTA CANDADO PORTARROLLOS ESPERA DIALIS	3-1-17 22:00	0:30:00
2171775	PUERTA QX 4 CMI NO CIERRA BIEN	4-1-17 8:30	1:30:00

Este documento ha sido contrastado con otro documento facilitado por la UTC donde se encuentra el registro de los sps registrados por el hospital durante 11 meses del año 2017, de este se ha escogido al azar 100 items para compararlos con las órdenes de trabajo registradas por medio de los servicios de mantenimiento. De este estudio se puede extraer que solo 84 de los 100 sps revisados se encontraban en los registros de mantenimiento, el resto de los SPS que no quedan analizados se debe principalmente a que estos no quedan registrados como OT en el programa de mantenimiento.

A modo de resumen se presenta un conjunto de tablas donde se puede apreciar un resumen del total de los datos a analizar:

Registro	Nº	Correctivo		Tiempo cumplimentado		T.medio(min)
		Si	No	Si	No	
OTs	10.025	10.025	0	10.025	0	68
SPS	3.847	3.847	0	3.847	0	50

	Registrados	
Sps analizados	Si	No
100	84	16

Para analizar la cantidad de OTs que provienen directamente de SPS, se utilizaran solo las OTs que hemos analizado para la comprobación de los sps debido a que por la inexistente referenciación directa entre OT y SPS, resulta imposible analizar el global de las OTs para conocer el porcentaje exacto.

Una vez analizadas se puede observar que de las 10.025 OTs de los dos años solo 7756 se espera que estén reflejadas, mientras que si todos los SPS se registrasen como OTs el número de SPS debería ser de alrededor de 9.233. De los datos anteriores se puede extraer que mientras que el 92% de las OTs deberían provenir de SPS, solo el 77% de los mismos se encuentran reflejados. Todos estos datos quedan reflejados en la siguiente tabla:

Registro	Nº	%
OTs	10025	100%
SPS que se espera encontrar en el documento (*2)	7756	77%
SPS que se estima que debería haber en el documento (*1)	9233	92%

*1=3847/11x24

*2=9233x84%

Tras el análisis realizado podemos concluir que la información sobre la gestión del mantenimiento se considera **NO ADECUADA** por las siguientes razones:

- La no referenciación directa de las OTs a los SPS dificulta su análisis.

- Las explicaciones sobre los trabajos no son suficientemente descriptivas de la naturaleza, acción e importancia de los trabajos realizados y esto impide en numerosos casos su correcta clasificación.
- No se está analizando la tipología de las incidencias, el tipo de instalación, ni si se trata de elementos críticos o no. El personal solo evalúa la gravedad de manera propia, no queda registro de la calificación de la misma y no se sigue ningún criterio unificado.
- No es posible analizar por parte de Incosa si el tiempo de respuesta es el indicado para cada labor al no disponer de una tipología de gravedad de incidencia. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas, esta debería ser de la siguiente manera:

  "La Sociedad concesionaria deberá proporcionar un servicio global de reparaciones y mantenimiento correctivo, incluyendo un servicio inmediato de apoyo o consejo técnico y administrativo en los trabajos que surjan de peticiones o Solicitudes de Trabajo (ST) de emergencia, de urgencia y de rutina del servicio. La Sociedad concesionaria deberá responder y rectificar dentro de los tiempos de respuesta y rectificación para alcanzar los estándares del servicio establecidos en el Anexo A y para satisfacer los requerimientos de la ley".
- No es posible conocer el porcentaje de incidencias que se corresponde con cada tipo de instalación y el porcentaje que afecta a mobiliario.

3.3.4 PLAN DE MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL

En cuanto al plan de mantenimiento técnico-legal, la sociedad concesionaria debe de cumplir una serie de criterios según PPTE, los cuales son los siguientes:

1. **Existencia de registros para control de las revisiones por parte de las OCAs y comprobación de su cumplimiento (Mantenimiento preventivo).**

El mantenimiento técnico legal es realizado en base al GMAO. En él se encuentran todas las pruebas y tareas técnicas a realizar, sobre aquellas instalaciones que, de acuerdo a las especificaciones de los reglamentos industriales, tanto de carácter general, comunitario, nacional o autonómico, de obligado cumplimiento, lo requieran.

Dichas pruebas técnicas de mantenimiento, son realizadas por empresas externas. Estas pruebas se realizan con una regularidad según la instalación. Disponen de un planning, donde se refleja los tiempos a realizar dichas pruebas regulares y rutinarias, indicadas en el apartado de Mantenimiento Preventivo.

CONTROL OCAs HOSPITAL INFANTA CRISTINA PARLA

INSTALACIÓN	FRECUENCIA	FECHA DE ALTA	INSPECCIÓN 1		INSPECCIÓN 2		INSPECCIÓN 3		INSPECCIÓN 4		INSPECCIÓN 5		PROX. INSP.
			FECHA	RESULTADO	FECHA	RESULTADO	FECHA	RESULTADO	FECHA	RESULTADO	FECHA	RESULTADO	
ASCENSORES (27 UDS)	2 AÑOS	ene-08	ene-10	F	dic-11	F	dic-13	F	dic-15	F	dic-17	F	dic-19
BAJA TENSIÓN	5 AÑOS	jun-07	ago-12	F	ago-17	NF	ene-18	F					jul-22
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (3 UDS)	3 AÑOS	abr-07	mar-11	NF	sep-11	F	abr-14	F	mar-17	F			mar-20
DEPOSITO COMBUSTIBLE 10.000 LTS.	10 AÑOS	may-07	may-17	F									may-22
ESTANQUEIDAD TUBERIAS GASOLEO ENTERRADAS	5 AÑOS	may-07	jun-17	F									may-22
ESTANQUEIDAD TUBERIAS GASOLEO SUPERFICIE	10 AÑOS		jul-17	F									may-27
DEPOSITO COMBUSTIBLE 3.000 LTS.	10 AÑOS	mar-07	mar-07										NO PROCEDE
EFICIENCIA ENERGETICA CALOR	4 AÑOS		sep-17	F									sep-21
EFICIENCIA ENERGETICA FRIO	5 AÑOS		sep-17	F									sep-22
GENERADORES DE VAPOR (CESE 10/06/2016)	6 AÑOS	may-08	abr-13	F									NO PROCEDE
OCA PCI (1º 3 AÑOS)	10 AÑOS	ene-18											ene-21

	REVISIÓN 1		REVISIÓN 2		REVISIÓN 3		REVISIÓN 4		REVISIÓN 5	
	FECHA	RESULTADO	FECHA	RESULTADO	FECHA	RESULTADO	FECHA	RESULTADO	FECHA	RESULTADO
RETIMBRADO BIES Y EXTINTORES	sep-12		sep-17							

2. Comprobar la existencia de certificaciones y calibrados de los aparatos de medida utilizados.

Para la realización de las mediciones necesarias para dicho control, debe de realizarse con equipos calibrados. Ya que la concesionaria es responsable de todas las acciones correctivas y sanciones que surjan, y deben satisfacer los requerimientos de las pruebas reglamentarias.

Tras hacer la comprobación de los registros, se verifica que se está cumpliendo. Tanto en tiempos, como en pruebas y en certificados de calibración de los instrumentos fijos y equipos portátiles a utilizar.

Se adjuntan las siguientes calibraciones

1-Analizador de combustión.

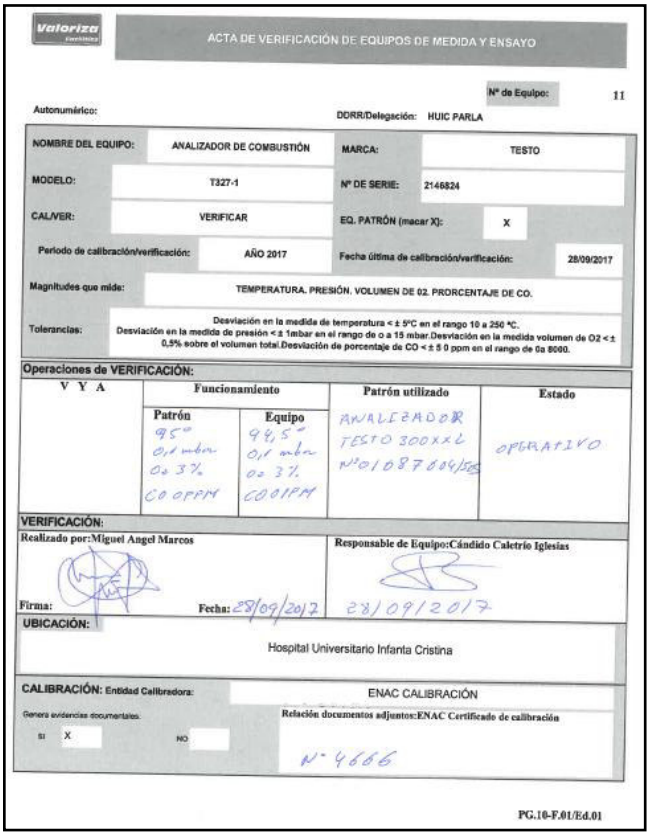

Valoriza

ACTA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO

Nº de Equipo: 11

Autonumérico: DDRR/Delegación: HUIC PARLA

NOMBRE DEL EQUIPO:	ANALIZADOR DE COMBUSTIÓN	MARCA:	TESTO
MODELO:	T327-1	Nº DE SERIE:	2146824
CAL/VER:	VERIFICAR	EQ. PATRÓN (macar X):	X
Período de calibración/verificación:	AÑO 2017	Fecha última de calibración/verificación:	28/09/2017
Magnitudes que mide:	TEMPERATURA. PRESIÓN. VOLUMEN DE 02. PRORCENTAJE DE CO.		
Tolerancias:	Desviación en la medida de temperatura < ± 5ºC en el rango 10 a 250 ºC. Desviación en la medida de presión < ± 1mbar en el rango de 0 a 15 mbar.Desviación en la medida volumen de O2 < ± 0,5% sobre el volumen total.Desviación de porcentaje de CO < ± 5 0 ppm en el rango de 0a 8000.		

Operaciones de VERIFICACIÓN:

V Y A	Funcionamiento		Patrón utilizado	Estado
	Patrón	Equipo		
	95º 0,1 mbar 0= 3% CO 0PPM	94,5º 0,1 mbar 0= 3% CO01PM	ANALIZADOR TESTO 300XXL Nº01087604/50	OPERATIVO

VERIFICACIÓN:

Realizado por:Miguel Angel Marcos — Responsable de Equipo:Cándido Caletrío Iglesias

Firma: Fecha: 28/09/2017 — 28/09/2017

UBICACIÓN: Hospital Universitario Infanta Cristina

CALIBRACIÓN: Entidad Calibradora: ENAC CALIBRACIÓN

Genera evidencias documentales: SI X NO

Relación documentos adjuntos:ENAC Certificado de calibración Nº 4666

PG.10-F.01/Ed.01

2-Comprobador Instalaciones B.T.



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration

SGS

Número *Number* VFL.570004/01

Página 1 de 6 páginas
Page 1 of 6 pages

LABORATORIO DE CALIBRACION DE SGS TECNOS S.A.

C/. Trespaderne, 29-28042 MADRID
Edif.. Barajas-1 (Barrio del Aeropuerto)
Teléf. : 91 313 80 00 / 81 64
Fax: 91 313 80 93
e-mail es.calibracion.lab@sgs.com

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CERTIFICADO SEGUN ISO 9001 POR BRITISH STANDARDS INSTITUTION (BSI)

OBJETO *Item* COMPROBADOR DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

ACCESORIOS:

MARCA *Mark* GOSSEN METRAWATT

MODELO *Model* PROFITEST SII+ 0100

Nº SERIE *Identification* M520KSE2005

ITEM: N/C

SOLICITANTE *Applicant* VALORIZA FACILITIES, S.A.U.
(HOSPITAL INFANTA CRISTINA)
Avda. Nueve de Junio, 2
C.P. 28980, Parla
(Madrid)

FECHA/S DE CALIBRACION *Date/s of Calibration* 23 de Febrero de 2015

Signatario/s autorizado/s *Authorised Signatory/ies*

Fecha de Emisión *Date of issue* 23 de Febrero de 2015

SGS Tecnos, S.A.

JOSE L. LUCENA PEDRAZA
Director Técnico Laboratorio de Calibración

El Laboratorio de Calibración de SGS Tecnos S.A. dispone de un sistema de gestión de la calidad que ha sido certificado de acuerdo a la norma BS EN ISO 9001, por el British Standards Institution (BSI) con núm de registro FS 38015..
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito de SGS Tecnos S.A.

The SGS Tecnos, S.A. Calibration Laboratory has a Quality Management System certified according to the International Standard BS EN ISO 9001, by the British Standards Institution (BSI) with the registered number FS 38015.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of SGS Tecnos S.A.

3-Luxómetro

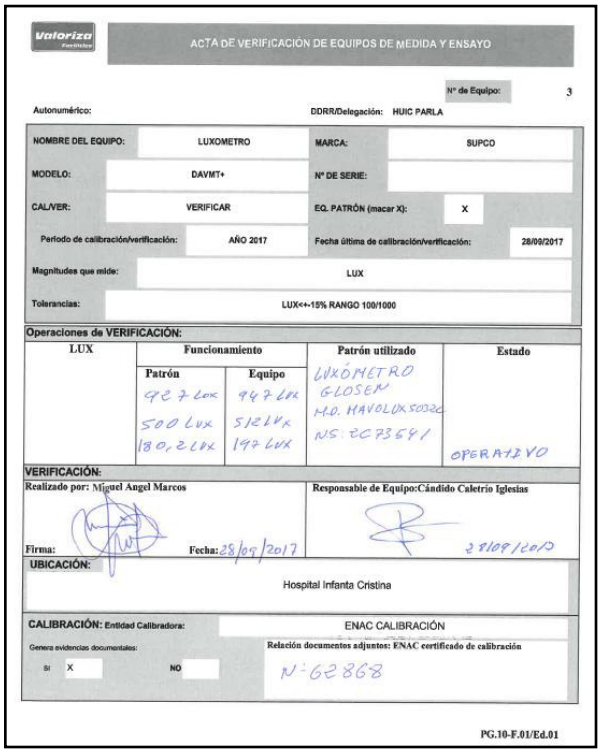

Valoriza Facilities

ACTA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO

Nº de Equipo: 3

Autonumérico: DDRR/Delegación: HUIC PARLA

NOMBRE DEL EQUIPO:	LUXOMETRO	MARCA:	SUPCO
MODELO:	DAVMT+	Nº DE SERIE:	
CAL/VER:	VERIFICAR	EQ. PATRÓN (macar X):	X
Período de calibración/verificación:	AÑO 2017	Fecha última de calibración/verificación:	28/09/2017
Magnitudes que mide:	LUX		
Tolerancias:	LUX<+-15% RANGO 100/1000		

Operaciones de VERIFICACIÓN:

LUX	Funcionamiento		Patrón utilizado	Estado
	Patrón	Equipo		
	947 Lux	947 Lux	LUXOMETRO GLOSEN M.D. HAVOLUX 50320 NS: 2CP3691	OPERATIVO
	500 Lux	512 Lux		
	180,2 Lux	197 Lux		

VERIFICACIÓN:

Realizado por: Miguel Angel Marcos — Firma: — Fecha: 28/09/2017

Responsable de Equipo: Cándido Caletrio Iglesias — 28/09/2017

UBICACIÓN: Hospital Infanta Cristina

CALIBRACIÓN: Entidad Calibradora: ENAC CALIBRACIÓN

Genera evidencias documentales: SI X NO

Relación documentos adjuntos: ENAC certificado de calibración Nº 62868

PG.10-F.01/Ed.01

4-Manómetro presión diferencial



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration

Número VFL.920001/01
Number

Página 1 de 3 páginas
Page 1 of 3 pages

LABORATORIO DE CALIBRACION DE SGS TECNOS S.A.

C/. Trespaderne, 29-28042 MADRID
Edif. Barajas-1 (Barrio del Aeropuerto)
Telf. : 91 313 80 00 / 81 64
Fax: 91 313 80 93
e-mail es.calibracion.lab@sgs.com

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
CERTIFICADO SEGUN ISO 9001 POR
BRITISH STANDARDS INSTITUTION
(BSI)

OBJETO / Item: MANOMETRO PRESIÓN DIFERENCIAL

ACCESORIOS:

MARCA / Mark: TESTO

MODELO / Model: 510

Nº SERIE / Identification: 38923885/806

ITEM: N/C

SOLICITANTE / Applicant: VALORIZA FACILITIES, S.A.U
(Hospital Infanta Cristina)
Avda. de Junio, 2
28980 Parla (Madrid)

FECHA/S DE CALIBRACION / Date/s of Calibration: 24 de febrero de 2015

Signatario/s autorizado/s / Authorised Signatory/ies

Fecha de Emisión / Date of issue: 24 de febrero de 2015

SGS Tecnos, S.A.

JOSE L. LUCENA PEDRAZA
Director Técnico Laboratorio de Calibración

El Laboratorio de Calibración de SGS Tecnos S.A. dispone de un sistema de gestión de la calidad que ha sido certificado de acuerdo a la norma BS EN ISO 9001, por el British Standards Institution (BSI) con núm.. de registro FS 38015.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito de SGS Tecnos S.A.

The SGS Tecnos, S.A. Calibration Laboratory has a Quality Management System certified according to the International Standard BS EN ISO 9001, by the British Standards Institution (BSI), with the registered number FS 38015.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of SGS Tecnos S.A.

5-Multímetro digital



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration

Número VFL.560003/01
Number

Página 1 de 4 páginas
Page 1 of 4 páginas

LABORATORIO DE CALIBRACION DE SGS TECNOS S.A.

C/ Trespaderne, 29 - 28042 MADRID
Edificio Barajas 1 (Barrio del Aeropuerto)
Tel. : 91 313 80 00 / 81 64
Fax: 91 313 80 93
e-mail es.calibracion.lab@sgs.com

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
CERTIFICADO SEGUN ISO 9001
POR BRITISH STANDARDS INSTITUTION
(BSI)

INSTRUMENTO / Instrument: Multímetro digital

ACCESORIOS:

MARCA / Mark: GOSSEN METRAWATT

MODELO / Model: METRAHIT PRO

Nº SERIE / Identification: M242ASI0208

ITEM: n/c

SOLICITANTE / Applicant: VALORIZA FACILITIES,S.A.U.(H.INFANTA CRISTINA)
Av.9 de Junio,2. 28980,PARLA(Mad)

FECHA/S DE CALIBRACIÓN / Date/s of calibration: 28 de febrero de 2015

Signatario/s autorizado/s / Authorised signatory/ies

Fecha de Emisión / Date of issue: 28 de febrero de 2015

SGS Tecnos, S.A.

JOSE L. LUCENA PEDRAZA
Director Técnico Laboratorio de Calibración

El Laboratorio de Calibración de SGS Tecnos, S.A. dispone de un sistema de gestión de la calidad que ha sido certificado de acuerdo a la norma BS EN ISO 9001, por el British Standards Institution (BSI) con número de registro FS 38015.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito de SGS Tecnos S.A.

The SGS Tecnos, S.A. Calibration Laboratory has a Quality Management System certified according to the International Standard BS EN ISO 9001, by the British Standards Institution (BSI) with the registered number FS 38015.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of SGS Tecnos S.A.

6-Pinza amperimétrica

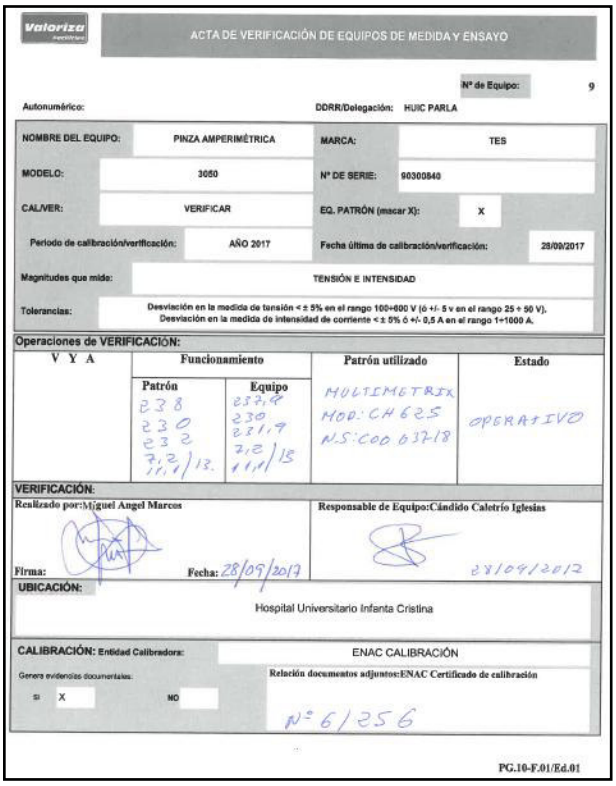

Valoriza

ACTA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO

Nº de Equipo: 9

Autonumérico: DDRR/Delegación: HUIC PARLA

NOMBRE DEL EQUIPO:	PINZA AMPERIMÉTRICA	MARCA:	TES
MODELO:	3050	Nº DE SERIE:	90300840
CAL/VER:	VERIFICAR	EQ. PATRÓN (macar X):	X
Periodo de calibración/verificación:	AÑO 2017	Fecha última de calibración/verificación:	28/09/2017
Magnitudes que mide:	TENSIÓN E INTENSIDAD		
Tolerancias:	Desviación en la medida de tensión < ± 5% en el rango 100÷600 V (ó +/- 5 v en el rango 25 ÷ 90 V). Desviación en la medida de intensidad de corriente < ± 5% ó +/- 0,5 A en el rango 1÷1000 A.		

Operaciones de VERIFICACIÓN:

V Y A	Funcionamiento		Patrón utilizado	Estado
	Patrón	Equipo		
	238	237,9	MULTIMETRIX MOD: CH625 N.S: C00 637-18	OPERATIVO
	230	230		
	232	231,9		
	7,2	7,2		
	11,1	11,1		

VERIFICACIÓN:

Realizado por: Miguel Angel Marcos — Firma: — Fecha: 28/09/2017

Responsable de Equipo: Cándido Caletrío Iglesias — 28/09/2017

UBICACIÓN: Hospital Universitario Infanta Cristina

CALIBRACIÓN: Entidad Calibradora: ENAC CALIBRACIÓN

Genera evidencias documentales: SI X NO

Relación documentos adjuntos: ENAC Certificado de calibración Nº 6/256

PG.10-F.01/Ed.01

7-Termo-anemómetro

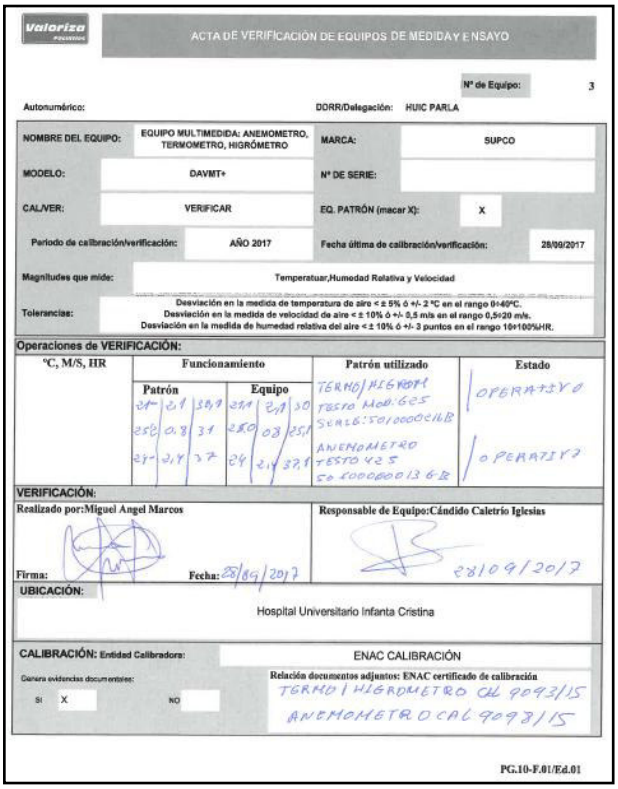

Valoriza

ACTA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO

Nº de Equipo: 3

Autonumérico: DDRR/Delegación: HUIC PARLA

NOMBRE DEL EQUIPO:	EQUIPO MULTIMEDIDA: ANEMOMETRO, TERMOMETRO, HIGRÓMETRO	MARCA:	SUPCO
MODELO:	DAVMT+	Nº DE SERIE:	
CAL/VER:	VERIFICAR	EQ. PATRÓN (macar X):	X
Periodo de calibración/verificación:	AÑO 2017	Fecha última de calibración/verificación:	28/09/2017
Magnitudes que mide:	Temperatuar,Humedad Relativa y Velocidad		
Tolerancias:	Desviación en la medida de temperatura de aire < ± 5% ó +/- 2 ºC en el rango 0÷40ºC. Desviación en la medida de velocidad de aire < ± 10% ó +/- 0,5 m/s en el rango 0,5÷20 m/s. Desviación en la medida de humedad relativa del aire < ± 10% ó +/- 3 puntos en el rango 10÷100%HR.		

Operaciones de VERIFICACIÓN:

ºC, M/S, HR	Funcionamiento		Patrón utilizado	Estado
	Patrón	Equipo		
	24 / 2,1 / 38,9	24,1 / 2,1 / 30	TERMO/HIGROM TESTO MOD:605 SERIE:501000016B	OPERATIVO
	25,8 / 0,8 / 34	25,8 / 0,3 / 25,1		
	24 / 2,1 / 37	24 / 2,1 / 37,1	ANEMOMETRO TESTO 425 SE 1000000136B	OPERATIVO

VERIFICACIÓN:

Realizado por: Miguel Angel Marcos — Firma: — Fecha: 28/09/2017

Responsable de Equipo: Cándido Caletrío Iglesias — 28/09/2017

UBICACIÓN: Hospital Universitario Infanta Cristina

CALIBRACIÓN: Entidad Calibradora: ENAC CALIBRACIÓN

Genera evidencias documentales: SI X NO

Relación documentos adjuntos: ENAC certificado de calibración TERMO/HIGROMETRO CAL 9093/15 ANEMOMETRO CAL 9093/15

PG.10-F.01/Ed.01

8-Termómetro CHY.



PROYCAL

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of calibration

Número CAL9094/15
Number

Página 1 de 4
Pages

PROYECTOS Y CALIBRACIÓN, S.L.
C/ Santísima Trinidad nº 7
28010 MADRID
Telf.: 91 448 77 69 • Fax: 91 591 21 21
E-Mail: laboratorio@proycal.com

OBJETO *Item*	Lector digital con una sonda tipo K Termómetro digital
MARCA *Mark*	CHY
MODELO *Model*	500K
IDENTIFICACION *Identification*	25001561
SOLICITANTE *Applicant*	VALORIZA FACILITIES, S.A.U. Paseo de la Castellana, 83-85 28046 MADRID
FECHA/S DE CALIBRACION *Date/s of Calibration*	08 de septiembre de 2015

Signatario/s Autorizado/s
Autorized Signatory/ies

Fecha de Emisión
Date of issue

Firmado digitalmente por Jesus Pol Trigo

Jefe del Laboratorio

10 de septiembre de 2015

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en el que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse por el mal uso de los instrumentos calibrados.
Este certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización expresa de PROYCAL.

9-Termómetro TIF

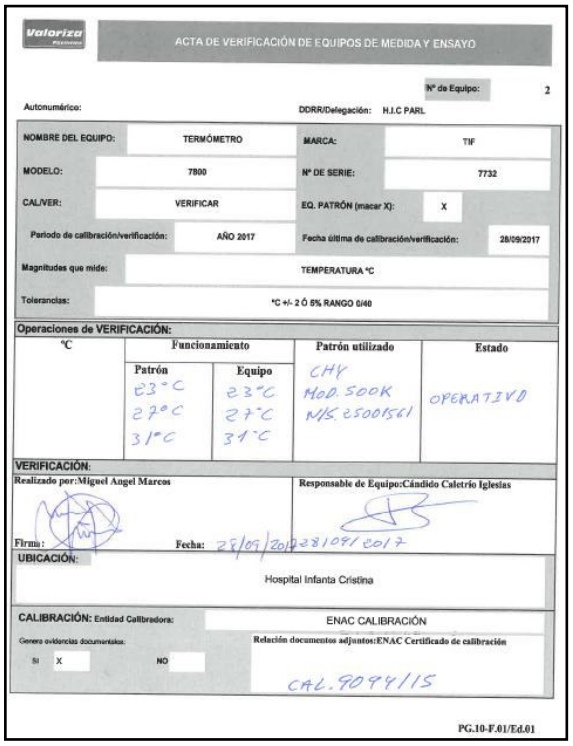

Valoriza Facilities

ACTA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO

Nº de Equipo: 2

Autonumérico: DDRR/Delegación: H.I.C PARL

NOMBRE DEL EQUIPO:	TERMÓMETRO	MARCA:	TIF
MODELO:	7800	Nº DE SERIE:	7732
CAL/VER:	VERIFICAR	EQ. PATRÓN (marcar X):	X
Periodo de calibración/verificación:	AÑO 2017	Fecha última de calibración/verificación:	28/09/2017
Magnitudes que mide:	TEMPERATURA ºC		
Tolerancias:	ºC +/- 2 Ó 5% RANGO 0/40		

Operaciones de VERIFICACIÓN:

ºC	Funcionamiento		Patrón utilizado	Estado
	Patrón	Equipo		
	23°C	23°C	CHY MOD. 500K N/S 25001561	OPERATIVO
	27°C	27°C		
	31°C	31°C		

VERIFICACIÓN:

Realizado por: Miguel Angel Marcos — Responsable de Equipo: Cándido Caletrío Iglesias

Firma: Fecha: 28/09/2017 28/09/2017

UBICACIÓN: Hospital Infanta Cristina

CALIBRACIÓN: Entidad Calibradora: ENAC CALIBRACIÓN

Genera evidencias documentales: SI X NO

Relación documentos adjuntos: ENAC Certificado de calibración

CAL.9094/15

PG.10-F.01/Ed.01

3. Informes técnico-legales: Realización de revisiones por parte de empresas externas acreditadas u OCAs.

Resumen de las Inspecciones Documentales Técnico-Legales	
Revisiones	**Parte de Revisión por parte la OCA visto in situ**
Revisiones ACS	√
Revisiones AFS	√
Limpieza y Desinfección ACS y AFS	√
Revisión de limpieza y desinfección de las Instalaciones de Refrigeración	√
Revisión de las Instalaciones Térmicas	√
Revisión del Programa de Gestión del Mantenimiento	√
Revisión del Programa de Gestión de las Instalaciones	√
Revisión de las mediciones de temperatura	√
Revisión de otros elementos de la instalación	√
Revisión del Sistema Eléctrico y de Control	√
Revisión del sistema de energía auxiliar	√
Revisión del sistema de producción solar para ACS	√
Revisión de la instalación de Gasóleo	√
Revisión de la instalación de Gas	√
Revisión de la instalación de evacuación de aguas residuales	√
Revisión de la instalación de gases medicinales	√
Revisión de los elementos de Electricidad General	√
Revisión de los Quirófanos	√
Revisión de los Ascensores	√
Revisión de la Instalación de PCI	√

(*) Se han detectado dos incidencias leves en las revisiones de AFS (Agua Fría Sanitaria).

1. No existe un registro de purgas y operaciones en zonas no habitadas.

2. La medición de niveles de cloro libre o combinado en un número representativo de puntos terminales, la cual no debe superar los 0,2 mg/litro, ha dado 0,67 mg/litro.

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN DOCUMENTAL
INSPECCIONES TECNICO-LEGALES (2)

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Porta S.A.	COD. PARTE:	-ID-ITL-02.01
INSPECTOR:	Alvaro	FECHA:	15-12-2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	FLORENCIO	HORA:	10.45

ZONA REVISADA:			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
REVISIONES ACS	1	EXISTE REGISTRO DE LA REVISION TRIMESTRAL DEL ESTADO Y CONSERVACION DE TODOS LOS DEPOSITOS DE ACS.	X		X		
	2	EXISTE REGISTRO DE LA REVISION MENSUAL DEL ESTADO Y CONSERVACION DE UN NUMERO REPRESENTATIVO DE PUNTOS TERMINALES DE LA RED. TOTALIDAD POR ANUALIDAD COMPLETA.	X		X		
	3	EXISTE REGISTRO DE PURGAS Y OPERACIONES EN ZONAS NO HABITADAS. MENSUALMENTE PURGA DE TUBERIAS, SEMANALMENTE PURGA DE FONDO DE ACUMULADORES. SEMANALMENTE APERTURA DE GRIFOS Y DUCHAS NO UTILIZADOS.	X			X	*2
	4	SE DOCUMENTA LAS OPERACIONES DE CONTROL DE TEMPERATURA. DEPOSITOS FINALES DE ACS > 60ºC DIARIAMENTE. MUESTREO ROTATORIO EN GRIFOS Y DUCHAS >50ºC MENSUALMENTE (SE COMPLETARA EL 100% ANUALMENTE).	X		X		
	5	EXISTE ANALITICA DETERMINACION DE LEGIONELLA EN PUNTOS REPRESENTATIVOS DE LA INSTALACION	X		X		
REVISIONES AFS	6	EXISTE REGISTRO DE LA REVISION TRIMESTRAL DEL ESTADO Y CONSERVACION DE TODOS LOS DEPOSITOS DE AFS.	X		X		
	7	EXISTE REGISTRO DE LA REVISION MENSUAL DEL ESTADO Y CONSERVACION DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE PUNTOS TERMINALES DE LA RED. TOTALIDAD POR ANUALIDAD COMPLETA.	X		X		
	8	SE DOCUMENTA LAS OPERACIONES DE CONTROL DE TEMPERATURAS EN LOS DEPOSITOS DE AFS, MANTENIENDOLA POR DEBAJO DE LOS 20ºC, SIEMPRE QUE LAS CONDICIONES CLIMATICAS LO PERMITAN.	X		X		
	9	SE REGISTRAN LAS MEDICIONES DE NIVELES DE CLORO LIBRE O COMBINADO EN UN NUMERO REPRESENTATIVO DE PUNTOS TERMINALES, CON MAGNITUDES <0,2MG/L	X			X	*1
LIMPIEZA Y DESINFECCION ACS Y AFS	10	SE REGISTRA LAS LABORES DE DESINFECCION QUIMICA O TERMICA REALIZADAS EN LA TOTALIDAD DE LA INSTALACIÓN DE ACS ANUALMENTE. S/ PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN RD.865/2003	X		X		
	11	SI EXISTE PARTES DE LA INSTALACIÓN DE ACS CON FUNCIONAMIENTO ESTACIONAL (PARADAS >1MES), SE REGISTRA LAS LABORES DE DESINFECCION Y LIMPIEZA. S/ PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN RD.865/2003		X			*3
	12	SE REGISTRA LAS ACTUACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN DEPOSITOS DE LA INSTALACIÓN DE AFS POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO QUIMICO S/ RD.865/2003	X		X		
	13	SE REGISTRA LAS ACTUACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN ELEMENTOS DESMONTABLES S/ PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN RD.865/2003	X		X		
	14	EN CASO DE DETECCION DE BROTE DE LEGIONELOSIS, SE PROCEDE Y REGISTRA SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO RD.865/2003		X			*4
REVISION TORRES DE REFRIGERACION NO HAY *5	15	SE REVISA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE CONSERVACION Y LIMPIEZA DEL SEPARADOR DE GOTAS ANUALMENTE					
	16	SE REVISA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE CONSERVACION Y LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y EL RELLENO SEMESTRALMENTE.					
	17	SE REVISA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LA BANDEJA MENSUALMENTE					
	18	SE REVISA LA CALIDAD FISICO-QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA: MENSUALMENTE: (Tª – PH – CONDUCTIVIDAD – TURBIDEZ – HIERRO TOTAL) DIARIAMENTE: (NIVEL DE CLORO O BIOCIDA UTILIZADO) MENSUALMENTE: TOTAL DE AEROBIOS EN EL AGUA DE LA BALSA. TRIMESTRALMENTE: DETERMINACION DE LEGIONELLA 15 DIAS TRAS DESINFECCION Y LIMPIEZA: DETERMINACION DE LEGIONELLA					
	19	SI EXISTE CAMBIOS EN LOS PARAMETROS FISICO-QUIMICOS, SE PROCEDE A MODIFICA EL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUA					
	20	SI EXISTE CAMBIOS EN EL RECUENTO DE AEROBIOS Y NIVEL DE DESINFECTANTE, SE REALIZA UNA DETERMINACION DE LEGIONELLA					

OBSERVACIONES

*1 = Foto adjunta con cloro libre 0'67 mg/L
*2 No existe registro
*3 No hay paradas
*4 No ha habido nunca
*5 Usan sistemas de agua-aire, no agua-agua

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Alvaro	

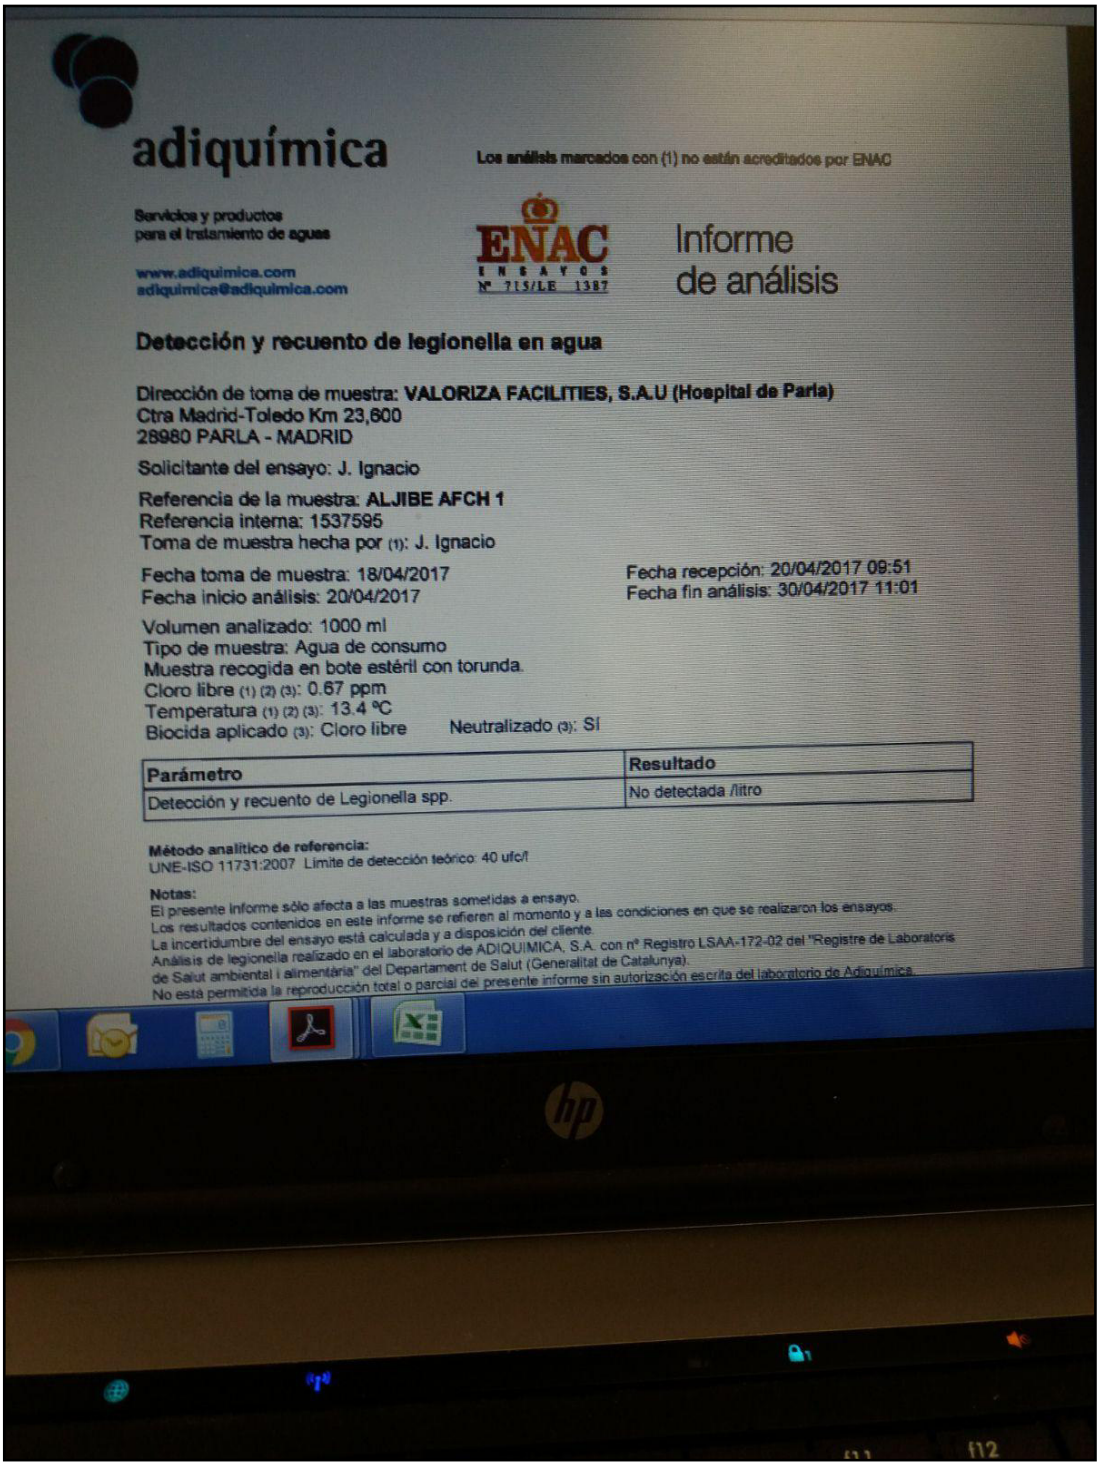

adiquímica

Los análisis marcados con (1) no están acreditados por ENAC

Servicios y productos para el tratamiento de aguas

www.adiquimica.com
adiquimica@adiquimica.com

ENAC ENSAYOS Nº 715/LE 1387

Informe de análisis

Detección y recuento de legionella en agua

Dirección de toma de muestra: **VALORIZA FACILITIES, S.A.U (Hospital de Parla)**
Ctra Madrid-Toledo Km 23,600
28980 PARLA - MADRID

Solicitante del ensayo: J. Ignacio

Referencia de la muestra: **ALJIBE AFCH 1**
Referencia interna: 1537595
Toma de muestra hecha por (1): J. Ignacio

Fecha toma de muestra: 18/04/2017
Fecha inicio análisis: 20/04/2017

Fecha recepción: 20/04/2017 09:51
Fecha fin análisis: 30/04/2017 11:01

Volumen analizado: 1000 ml
Tipo de muestra: Agua de consumo
Muestra recogida en bote estéril con torunda.
Cloro libre (1) (2) (3): 0.67 ppm
Temperatura (1) (2) (3): 13.4 ºC
Biocida aplicado (3): Cloro libre Neutralizado (3): SI

Parámetro	Resultado
Detección y recuento de Legionella spp.	No detectada /litro

Método analítico de referencia:
UNE-ISO 11731:2007 Límite de detección teórico: 40 ufc/l

Notas:
El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Los resultados contenidos en este informe se refieren al momento y a las condiciones en que se realizaron los ensayos.
La incertidumbre del ensayo está calculada y a disposición del cliente.
Análisis de legionella realizado en el laboratorio de ADIQUIMICA, S.A. con nº Registro LSAA-172-02 del "Registre de Laboratoris de Salut ambiental i alimentària" del Departament de Salut (Generalitat de Catalunya).
No está permitida la reproducción total o parcial del presente informe sin autorización escrita del laboratorio de Adiquímica.

- En el Anejo I se dispone de los check list correspondientes a los registros realizados por parte de las OCAs, dichos registros han sido analizados y verificada su existencia y adecuación.

3.3.5 INFORMES MENSUALES Y ANUALES DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO

El PPTE establece para el control de las operaciones de mantenimiento la creación de informes mensuales y anuales de actividad.

En estos informes se resumen las órdenes de trabajo de los distintos planes de mantenimiento. También se recogen los consumos energéticos registrados mensual y anualmente, ya comentados en apartados anteriores.

Se dispone de los informes mensuales de mantenimiento de los últimos veinticuatro meses, siendo los resultados los siguientes:

1. **Informe Anual del Servicio de Gestión de Mantenimiento 2016**

-Resumen actividades de Mantenimiento realizado

	Nº Ordenes Trabajo/mes PLAN	Nº Ordenes Trabajo/mes REAL
Mantenimiento Preventivo	8610	8604
Mantenimiento Correctivo		3815
Mantenimiento Técnico-Legal		
Trabajos Varios		78

2. **Informe Anual del Servicio de Gestión de Mantenimiento 2017**

-Resumen actividades de Mantenimiento realizado

	Nº Ordenes Trabajo/Anual PLAN	Nº Ordenes Trabajo/anual REAL
Mantenimiento Preventivo	4611	4611
Mantenimiento Correctivo		5166
Mantenimiento Técnico-Legal		79
Trabajos Varios		71

3. Informe mensual del Servicio de Gestión de Mantenimiento los últimos dos años

-Resumen mensual actividades del Mantenimiento realizado 2016

Tipología Mantenimiento	2016											
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
Metenimiento Preventivo	444	432	434	337	306	393	414	316	429	355	379	399
Metenimiento Correctivo	384	404	342	426	402	458	380	302	321	432	443	376
Mantenimiento Técnico-Legal	1	2	1	11	6	-	-	-	10	-	-	-
Trabajos Varios	-	-	-	-	12	-	-	-	1	61	1	-

-Resumen mensual actividades del Mantenimiento realizado 2017

Tipología Mantenimiento	2017											
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
Metenimiento Preventivo	404	335	430	337	397	416	360	306	438	358	382	382
Metenimiento Correctivo	440	380	509	438	414	360	372	398	453	412	412	354
Mantenimiento Técnico-Legal	1	-	10	-	4	4	10	10	-	-	3	37
Trabajos Varios	-	8	-	12	-	8	6	30	-	2	4	1

3.4 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA VIDA ÚTIL DE LAS INSTALACIONES

Descripción	Vida Útil estimada concesionaria	Vida Útil INCOSA	Vida útil restante (años)	Nº Equipos	Estado
FAN-COIL	80%	6	-4	922	PLAZO DE REPOSICIÓN SOBREPASADO
BOMBA ACS	100%	6	-4	3	PLAZO DE REPOSICIÓN SOBREPASADO
BOMBA CLIMATIZACIÓN	160%	7	-3	18	PLAZO DE REPOSICIÓN SOBREPASADO
BOMBA JOCKEY	100%	5	-5	1	PLAZO DE REPOSICIÓN SOBREPASADO
BOMBA PCI	(100%-0%)	5	-5	2	PLAZO DE REPOSICIÓN SOBREPASADO
SAI	400%	7	-3	26	PLAZO DE REPOSICIÓN SOBREPASADO
CLIMATIZADOR	80%	12	2	32	PRÓXIMO FIN VIDA ÚTIL
DEPOSITO GASOIL	50%	23	13	2	CORRECTO
CALDERA	((4)80% - (2)-80%)	14	4	6	CORRECTO
VASO EXPANSIÓN	80%	18	8	1	CORRECTO
ACUMULADOR	100%	15	5	4	CORRECTO
CAPTADOR SOLAR	100%	20	10	75	CORRECTO
ENFRIADORA	80%	15	5	4	CORRECTO
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO	50%	20	10	19	CORRECTO
TRANSFORMADOR	50%	20	10	6	CORRECTO
ASCENSOR	80%	12	2	27	PRÓXIMO FIN VIDA ÚTIL
UTA	80%	15	5	63	CORRECTO
RECUPERADOR UTA	-80%	15	5	12	CORRECTO
GRUPO ELECTRÓGENO	50%	20	10	3	CORRECTO
CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA	100%	15	5	6	CORRECTO
CENTRAL EXTINCIÓN AUTOMÁTICA	100%	15	5	7	CORRECTO
B.I.E	100%	20	10	199	CORRECTO
EXTINTOR	100%	20	10	466	CORRECTO
ROCIADOR	100%	30	20	5	CORRECTO
DETECTOR ÓPTICO	100%	15	5	2851	CORRECTO
DETECTOR ALGORÍTMICO	100%	15	5	2896	CORRECTO
RACK	90%	30	20	2	CORRECTO
EXTINCIÓN TRIPLE	130%	12	2	1	PRÓXIMO FIN VIDA ÚTIL
EXTINCIÓN SIMPLE	130%	12	2	1	PRÓXIMO FIN VIDA ÚTIL
ARMARIO FRIGORÍFICO	130%	10	0	2	EN PLAZO DE REPOSICIÓN

Como se puede observar muchas de las instalaciones deberían haber sido repuestas según la vida útil teórica. Cabe mencionar que no se ha podido utilizar la vida útil ofrecida por la empresa concesionaria debido a que la información, al venir en tanto por ciento, es inexacta.

A mayores durante la visita se evaluó el estado de todas las instalaciones, y salvo pequeños defectos, las mismas funcionaban de manera correcta.

3.5 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA AL ESTADO DE LOS ACTIVOS FÍSICOS

La catalogación del estado de los activos físicos (mobiliario) propios de la empresa concesionaria (incluidos en el Anexo VI del PCAP) se realiza según los siguientes baremos:

En cuanto al % de cumplimiento, el resultado se evalúa de la siguiente manera:

- **BUENO:** % cumplimiento >= 90%.
- **ADECUADO:** 75% <= % cumplimiento < 90%.
- **NO ADECUADO:** 50% <= % cumplimiento < 75%.
- **DEFICIENTE:** 25% <= % cumplimiento < 50%
- **MUY DEFICIENTE O MALO:** 0% <= % cumplimiento < 25%.

Dado que el resultado obtenido es 54,31%, este se cataloga como **NO ADECUADO**.

En cuanto al estado de los activos físicos existentes, el resultado se evalúa de la siguiente manera.

- **BUENO:** % activos físicos en buen estado >= 95%.
- **ADECUADO:** 90% <= % cumplimiento < 95%.
- **NO ADECUADO:** 75% <= % cumplimiento < 90%.
- **MALO:** 0% <= % cumplimiento < 75%

El estado general de conservación de los equipos es **BUENO,** ya que supone el 98,6% de los ítems de la Sociedad Concesionaria existentes.

3.5.1 INFORME DETALLADO DEL ESTADO DEL MOBILIARIO DE LA S.C. (ANEXO VI DEL PCAP)

Se realiza un informe detallado usando la metodología expuesta en el Capítulo 1.3.5.

Se realiza el control de todo el mobiliario según el **Anexo VI del PCAP: EQUIPAMIENTO BÁSICO DE MOBILIARIO.**

En el siguiente documento se expone la información recogida. Se ha organizado por módulos específicos, tomando como base los definidos en dicho Anexo VI. En cada módulo la información se desglosa en los siguientes dos puntos:

- **Contextualización de área,** donde se exponen las principales modificaciones y restructuraciones respecto al Anexo VI del PCAP. Los cambios de ubicación de salas que conllevan mobiliario diferente se han auditado en los check list correspondientes a la nueva función, y se deja indicado en el apartado de observaciones de ubicación dentro de las check list.
- **Análisis de incidencias,** donde se muestran los resultados más notables de los activos deteriorados o rotos y fotografías. En este punto también se muestra una tabla con los datos de desviación, (se refleja en rojo cuando el porcentaje de

cumplimiento es cero y las unidades que faltan. Verde cuando el porcentaje de las unidades existentes coinciden con los datos del Anexo VI del PCAP) de todos los ítem auditados recogidos en el Anexo VI del PCAP.

Los activos existentes que son propiedad de la concesionaria, pero no están ubicados en la localización que refleja el Anexo VI del PCAP, han sido también auditados. Estos se reflejan tanto en la tabla de Resultados de la Auditoría de los activos físicos, como en cada una de las tablas de este punto.

Una problemática específica de este hospital ha sido la dificultad de identificar la propiedad de los elementos a auditar. El mal estado de conservación no permite observar el código de referencia del activo, y en otras ocasiones los equipamientos carecen del adhesivo correspondiente. Otro problema añadido es la doble etiquetación de determinados equipamientos de mobiliario donde **el hospital y la concesionaria afirman ser los propietarios de un mismo ítem.** Para aclarar de quién es la propiedad de los activos sin etiquetar y con doble etiquetado, el personal de la concesionaria nos acompañó identificando marca y modelo de su mobiliario.

-Incidencias generales en todo el hospital:

Incidencias Generales del Hospital	
Mobiliario	Incidencia
Lavado medical de 2 plazas	El 80% han sido sustituidos por lavados medicales de 3 plazas
Armario vitrina colgado 80 x 90 x 35 cm	El 21,6% se encuentran sin cristal
Soporte de termómetro	0% de existencia en todas las hospitalizaciones
Butaca paciente/acompañante	
Cuña de acero inoxidable	No son de acero inoxidable, ni metálicas, son de plástico, por tanto no se han contabilizado
Palangana de acero inoxidable	
Tablilla de Historia Clínica	No se encuentran en ningún puesto de control de enfermería
Planning para tarjetas	
Reloj calendario	El 93,6% no tienen fecha y han sido contabilizados como "Reloj"
Reloj de pared con fecha	
Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1,05% de existencia entre todas las hospitalizaciones y 15,95% de existencia en el total del hospital
Cortinaje de separación	0% de existencia en el Bloque Quirúrgico
Sillas modulares	En este ítem han sido contabilizados 2 tipos de mobiliario: los bancos modulares metálicos (Imagen 1-A) y las butacas (Imagen 1-B)
Colgador para ropero	No se ha podido verificar su existencia debido a la privacidad de los armarios roperos modulares

Imagen 1. Sillas modulares, A: bancos modulares metálicos. B: butacas

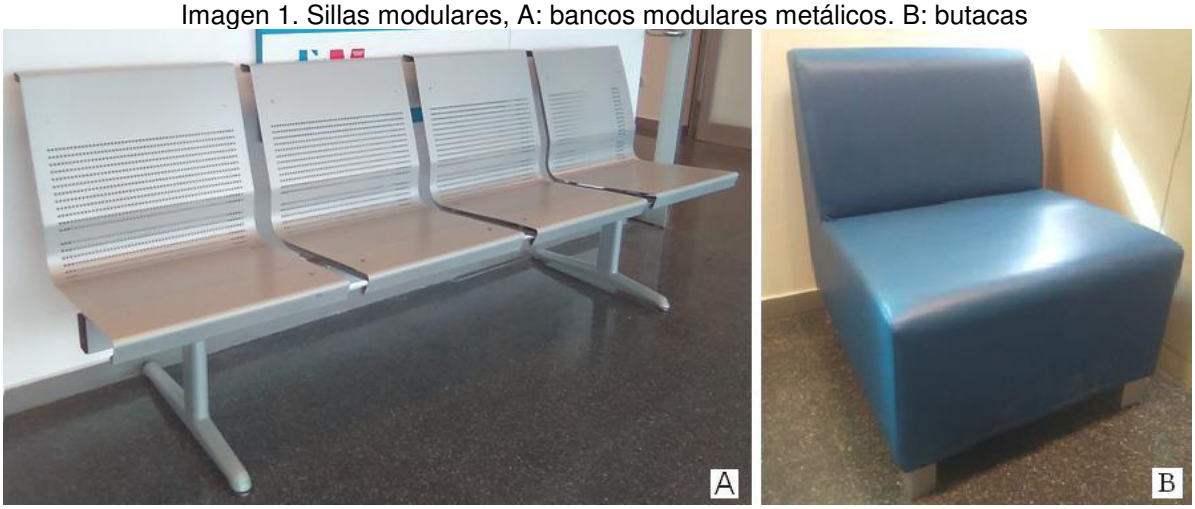

ANÁLISIS DE LAS INCIDENCIAS EN FUNCIÓN DE LA UBICACIÓN

HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL

1. Contextualización de área

El área corresponde con la ubicación sobre el plano y con la función definida en el Anexo VI del PCAP.

Existen solamente 118 habitaciones frente a las 130 habitaciones establecidas en el Anexo VI. Por otra parte, no existen las Zonas Intermedias.

2. Análisis de Incidencias

En el área de Hospitalización Convencional se han encontrado las siguientes incidencias:

- Ausencia de los siguientes elementos: "tablilla" de historia clínica, armario altura 74 x 80 x 40 cm, armario oficio colgado 80 x 90 x 35 cm, aspirador y contenedor, butaca paciente/acompañante, carro de historias clínicas, escabel, expositor de folletos, fotocopiadora, frigorífico 300L, jardinera, litera de exploración con cabecero abatible y ruedas, mueble clínico encastrado con pileta dos cuerpos (elemento fijo), papelera con tapa basculante de 50l, perchero de pie, plafón de corcho, planning para tarjetas, reloj de pared con fecha, repisa para elementos de aseo (elemento fijo), sofá con mesa de esquina y central baja, soporte de termómetro y taburete giratorio con ruedas
- En los aseos no existen repisas para objetos de aseo (elemento fijo).
- Las palanganas y cuñas son de plástico, no metálicas ni de acero inoxidable como especifica el Anexo VI del PCAP respectivamente, por tanto no se han contabilizado
- El 3,5% de las mesitas de noche clínica (4 unidades) se encuentran deterioradas.
- El 4,7% de los juegos de barandillas para cama clínica se encuentran deteriorados (5 unidades) y el 3,7% se encuentran rotos (4 unidades).
- El 4,5% de las camas clínicas eléctricas con accesorios se encuentran rotas (5 unidades) y el 6,3% se encuentran deterioradas (7 unidades).
- El 6,4% de los colchones de látex para cama clínica se encuentran deteriorados (7 unidades) y el 0,9% se encuentran rotos (1 unidad).
- El 40,0% de los cubos de basura con pedal 12L se encuentran rotos (2 unidades).
- El 3,1% de los dispensadores de jabón se encuentran rotos (1 unidad).
- En los aseos las palanganas y cuñas son de plástico, no metálicas ni de acero inoxidable como especifica el Anexo VI del PCAP respectivamente. Por tanto, no se han contabilizado.

Mesa cigüeña para comer rota. Ubicación: Planta primera, módulo A.



Juego de barandillas para cama clínica roto. Ubicación: Planta primera, módulo A



Cama clínica eléctrica con accesorios rota. Ubicación: Planta primera, módulo A

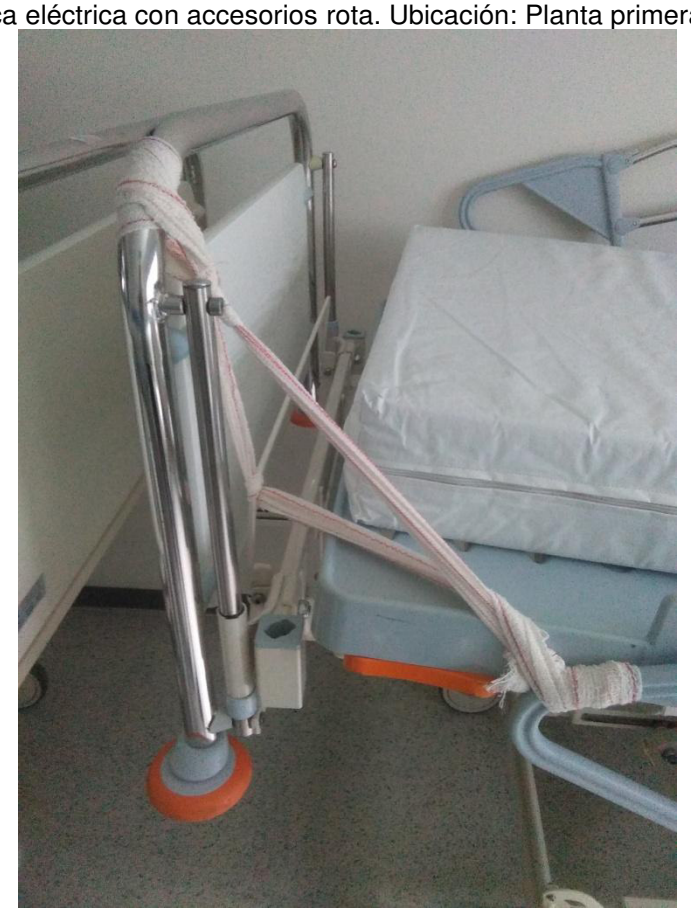

Colchón de látex para cama clínica deteriorado. Ubicación: Planta primera, módulo A.

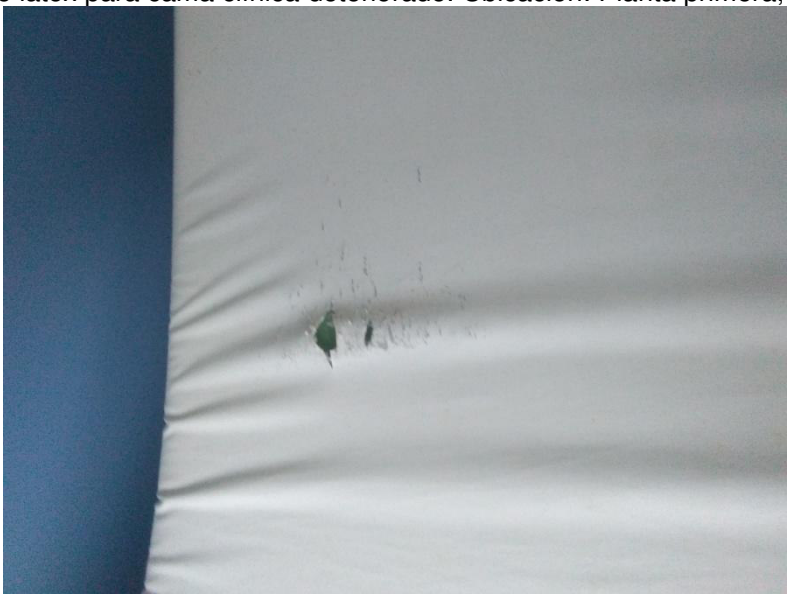

A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en la Unidad de Hospitalización Convencional, donde el porcentaje de incumplimiento es del 51,7%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
"Tablilla" de Historia Clínica	150	0	0,0%	150		-		-		-
Abrazadera en pared (elemento fijo)	130	146	100,0%	0	146	100,0%		0,0%		0,0%
Accesorios de ducha (elemento fijo)	130	146	100,0%	0	146	100,0%		0,0%		0,0%
Almohada para cama clínica	130	95	73,1%	35	95	100,0%		0,0%		0,0%
Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	4	2	50,0%	2	2	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	18	2	11,1%	16	2	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	2	0	0,0%	2		-		-		-
Armario oficio colgado 80 x 90 x 35 cm.	2	0	0,0%	2		-		-		-
Armario ropero modular	36	36	100,0%	0	36	100,0%		0,0%		0,0%
Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	20	5	25,0%	15	5	100,0%		0,0%		0,0%
Aspirador y contenedor	5	0	0,0%	5		-		-		-
Banco de vestidor	4	6	100,0%	0	6	100,0%		0,0%		0,0%
Botella	130	43	33,1%	87	43	100,0%		0,0%		0,0%
Butaca paciente/acompañante	130	0	0,0%	130		-		-		-
Cafetera eléctrica	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera colgante de dos cajones	11	3	27,3%	8	3	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera de tres cajones con ruedas	9	10	100,0%	0	10	100,0%		0,0%		0,0%
Cama clínica eléctrica con accesorios	130	112	86,2%	18	100	89,3%	5	4,5%	7	6,3%
Carro de curas con cajones	5	6	100,0%	0	6	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de curas de 3 estantes con buzón de deshechos	5	1	20,0%	4	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de historias clínicas	5	0	0,0%	5		-		-		-
Carro de lencería	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de limpieza	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de transporte de ropa sucia	14	6	42,9%	8	6	100,0%		0,0%		0,0%
Caudalímetro de oxígeno	130	116	89,2%	14	116	100,0%		0,0%		0,0%
Colchón de látex para cama clínica	130	109	83,8%	21	101	92,7%	1	0,9%	7	6,4%
Colgador mural individual	18	9	50,0%	9	9	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador mural múltiple (módulo)	8	6	75,0%	2	6	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador para ropero	628	0	0,0%	628		-		-		-
Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	5	1	20,0%	4	1	100,0%		0,0%		0,0%
Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	65	48	73,8%	17	48	100,0%		0,0%		0,0%
Cortinaje de exploración	5	1	20,0%	4	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cuadro decoración pared	174	137	78,7%	37	136	99,3%	1	0,7%		0,0%
Cubo de basura con pedal 12L	35	5	14,3%	30	3	60,0%	2	40,0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 5L	130	9	6,9%	121	9	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con tapa basculante de 50L	15	2	13,3%	13	2	100,0%		0,0%		0,0%
Cuña de acero inoxidable con soporte	130	0	0,0%	130		-		-		-
Dispensador de jabón	40	32	80,0%	8	31	96,9%	1	3,1%		0,0%
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	148	154	100,0%	0	154	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de toallas de papel	22	15	68,2%	7	15	100,0%		0,0%		0,0%
Escabel	5	0	0,0%	5		-		-		-
Escobilla WC	130	127	97,7%	3	127	100,0%		0,0%		0,0%
Esfigmomanómetro de mercurio de pared	5	2	40,0%	3	2	100,0%		0,0%		0,0%
Esfigmomanómetro de pared	130	0	0,0%	130		-		-		-
Espejo encastrado (elemento fijo)	148	164	100,0%	0	164	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería de 180 x 100 cm. Y 8 estantes	21	20	95,2%	1	20	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería de pared de 3 estantes	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Expositor de folletos	6	0	0,0%	6		-		-		-
Foco de exploración de pie	5	4	80,0%	1	4	100,0%		0,0%		0,0%
Fotocopiadoras	2	0	0,0%	2		-		-		-
Frigorífico 300L	5	0	0,0%	5		-		-		-
Frigorífico 80L	2	3	100,0%	0	3	100,0%		0,0%		0,0%
Gavetas para fungible	5	2	40,0%	3	2	100,0%		0,0%		0,0%
Horno microondas empotrado	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Jardinera	10	0	0,0%	10		-		-		-
Juego de barandillas para cama clínica	130	107	82,3%	23	98	91,6%	4	3,7%	5	4,7%
Lavabo con repisa (elemento fijo)	148	169	100,0%	0	168	99,4%	1	0,6%		0,0%
Litera de exploración con cabecero abatible y ruedas	5	0	0,0%	5		-		-		-
Mesa cigüeña para comer	130	114	87,7%	16	111	97,4%	1	0,9%	2	1,8%
Mesa comedor de 120 X 80 X 74 cm.	12	12	100,0%	0	12	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	15	9	60,0%	6	9	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	10	2	20,0%	8	2	100,0%		0,0%		0,0%
Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	24	4	16,7%	20	4	100,0%		0,0%		0,0%
Mesita de noche clínica	130	114	87,7%	16	110	96,5%		0,0%	4	3,5%

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
ML de guia para cortinas de zonas clínicas	20	2	10,0%	18	2	100,0%		0,0%		0,0%
Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	5	4	80,0%	1	4	100,0%		0,0%		0,0%
Mueble clínico encastrado con pilta dos cuerpos (elemento fijo)	5	0	0,0%	5		-		-		-
Negatoscopio de tres cuerpos	5	1	20,0%	4	1	100,0%		0,0%		0,0%
Nevera de 150 L	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Palangana de aseo metálica	130	0	0,0%	130		-		-		-
Papelera	32	29	90,6%	3	29	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera con tapa basculante de 25L	12	4	33,3%	8	2	50,0%	2	50,0%		0,0%
Papelera con tapa basculante de 50L	4	0	0,0%	4		-		-		-
Papelera metálica	130	117	90,0%	13	117	100,0%		0,0%		0,0%
Perchero de pie	13	0	0,0%	13		-		-		-
Perchero mural múltiple (módulo)	5	2	40,0%	3	2	100,0%		0,0%		0,0%
Pizarra para rotulador de pared	8	2	25,0%	6	2	100,0%		0,0%		0,0%
Plafón de avisos	5	6	100,0%	0	6	100,0%		0,0%		0,0%
Plafón de corcho	2	0	0,0%	2		-		-		-
Planning para tarjetas	5	0	0,0%	5		-		-		-
Porta-sueros para cama clínica	130	95	73,1%	35	94	98,9%		0,0%	1	1,1%
Portasueros rodado	130	97	74,6%	33	97	100,0%		0,0%		0,0%
Poyatas (Equipamiento fijo)	22	6	27,3%	16	6	100,0%		0,0%		0,0%
Regulador de vacío	130	112	86,2%	18	112	100,0%		0,0%		0,0%
Reloj de pared con fecha	5	0	0,0%	5		-		-		-
Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	148	0	0,0%	148		-		-		-
Secamanos eléctrico	8	13	100,0%	0	13	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija	144	122	84,7%	22	122	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija con brazos	132	54	40,9%	78	54	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas	31	9	29,0%	22	9	100,0%		0,0%		0,0%
Sillas modulares	120	80	66,7%	40	80	100,0%		0,0%		0,0%
Sillón ergonómico para pacientes	130	111	85,4%	19	110	99,1%		0,0%	1	0,9%
Sofá con mesa de esquina y central baja	6	0	0,0%	6		-		-		-
Sofá-cama 2 m.	130	116	89,2%	14	116	100,0%		0,0%		0,0%
Soporte de termómetro	130	0	0,0%	130		-		-		-
Soporte para posters de campañas	6	2	33,3%	4	2	100,0%		0,0%		0,0%
Sujeta toallas de ducha	130	146	100,0%	0	146	100,0%		0,0%		0,0%
Taburete fijo de 60 cm.	15	1	6,7%	14	1	100,0%		0,0%		0,0%
Taburete giratorio con ruedas	5	0	0,0%	5		-		-		-
Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	5	2	40,0%	3	2	100,0%		0,0%		0,0%
% de incumplimiento			51,7%			98,3%		1,3%		0,3%

HOSPITALIZACIÓN OBSTÉTRICA

1. Contextualización de área

El área corresponde con la ubicación sobre el plano y con la función definida en el Anexo VI del PCAP. Existe 1 habitación adicional a las establecidas en el Anexo VI (27 habitaciones), las cuales han sido contabilizadas (total: 28 habitaciones).

La “Zona preparación de biberones” y la sala de “Nido” se corresponden con una sala técnica. Por otra parte, no existen las Zonas Intermedias y no existe la “Sala de estar pacientes/comedor”.

2. Análisis de Incidencias

En el área de Hospitalización Obstétrica se han encontrado las siguientes incidencias:

- No se ha encontrado el siguiente equipamiento: "tablilla" de historia clínica, armario altura 125 x 80 x 40 cm, aspirador y contenedor, butaca paciente/acompañante, cajonera colgante de dos cajones, carro de historias clínicas, conjunto dispensador-cortador de papel para litera, cubo de basura con pedal 5L, cubo de basura con tapa basculante de 50L, cuña de acero inoxidable, escabel, esfigmomanómetro de mercurio de pared, foco de exploración de pie, frigorífico 300L, jardinera, litera de exploración con cabecero abatible y ruedas, mesa comedor de 120 x 80 x 74 cm, mueble clínico con pileta encastrada con grifo monomando, negatoscopio de tres cuerpos, perchero mural múltiple (módulo), planning para tarjetas, reloj de pared con fecha, soporte de termómetro, soporte para posters de campañas, taburete fijo de 60 cm y torre de dispensación de documentos de 15 huecos.
- En los aseos no existen repisas para objetos de aseo (elemento fijo)
- Las palanganas y cuñas son de plástico, no metálicas ni de acero inoxidable como especifica el Anexo VI del PCAP respectivamente, por tanto no se han contabilizado
- El 100% de los calentadores de biberones se encuentran deteriorados (1 unidad).
- El 100% de los colgadores murales individuales se encuentran rotos (1 unidad).
- El 7,4% de las sillas fijas se encuentran deterioradas (2 unidades) y el 3,7% se encuentras rotas (1 unidad).
- El 7,7% de los sillones ergonómicos para pacientes se encuentran deteriorados.
- El 3,7% de los sofá-cama 2m se encuentran deteriorados (1 unidad).

Calentador de biberones dañado, no funciona. Ubicación: Planta segunda, sala técnica.

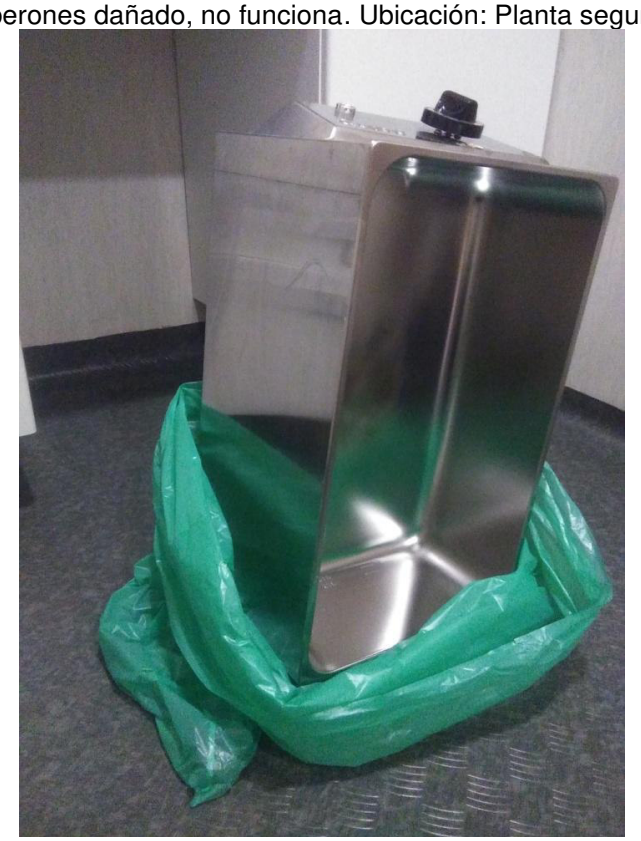

Silla fija deteriorada. Ubicación: Planta segunda, habitación.

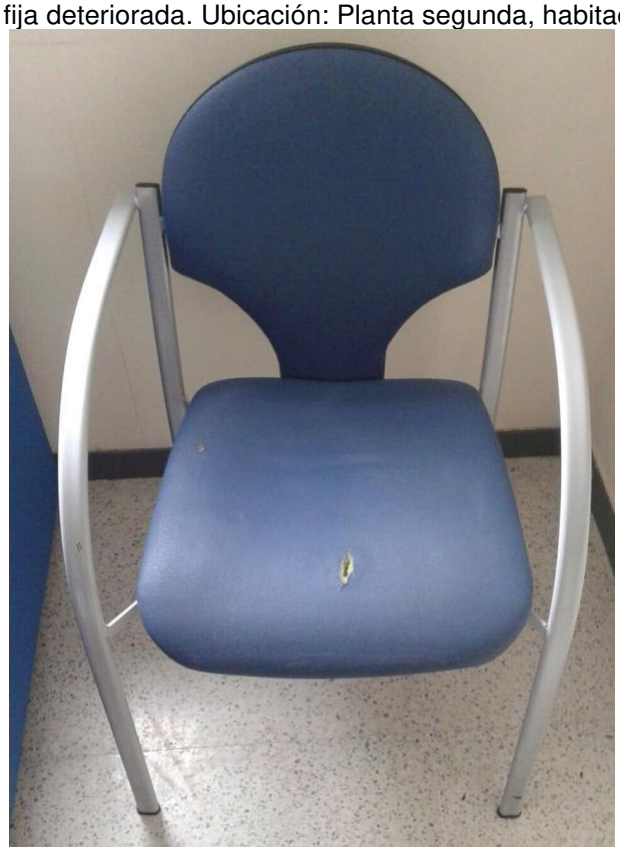

Sofá-cama 2m deteriorado. Ubicación: Planta segunda, habitación.

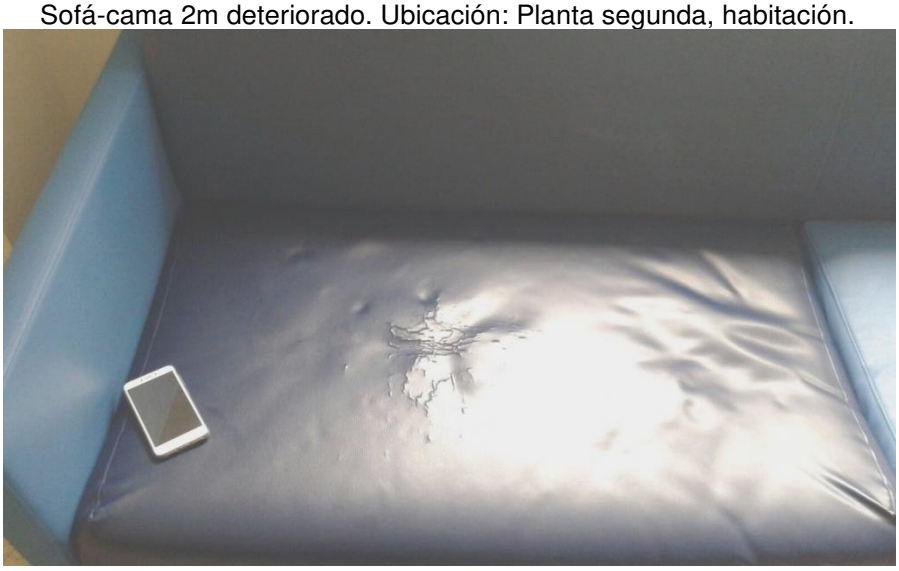

Colgador mural individual roto. Ubicación: Planta segunda, aseo personal.

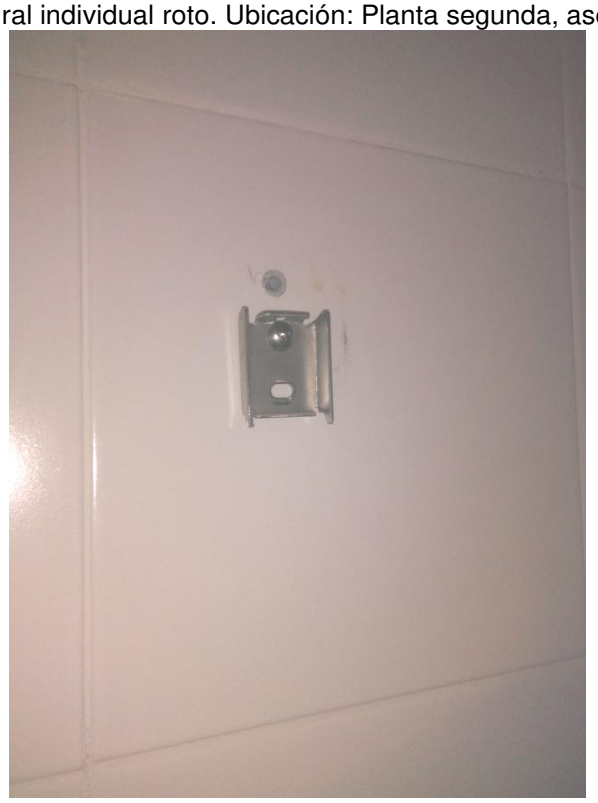

A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en la Unidad de Hospitalización Obstétrica, donde el porcentaje de incumplimiento es del 45,6%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL										
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	INCOSA				HOSPITALIZACIÓN OBSTÉTRICA					
Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
"Tablilla" de Historia Clínica	30	0	0,0%	30		-		-		-
Abrazadera en pared (elemento fijo)	27	27	100,0%	0	27	100,0%		0,0%		0,0%
Accesorios de ducha (elemento fijo)	27	27	100,0%	0	27	100,0%		0,0%		0,0%
Almohada para cama clínica	27	20	74,1%	7	20	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 125 X 80 x 40 cm.	2	0	0,0%	2		-		-		-
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	8	3	37,5%	5	3	100,0%		0,0%		0,0%
Aspirador y contenedor	1	0	0,0%	1		-		-		-
Báscula pesa bebes con tallímetro	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Botella	27	3	11,1%	24	3	100,0%		0,0%		0,0%
Butaca paciente/acompañante	27	0	0,0%	27		-		-		-
Cajonera colgante de dos cajones	1	0	0,0%	1		-		-		-
Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Calentador de biberones	2	1	50,0%	1		0,0%		0,0%	1	100,0%
Cama clínica eléctrica con accesorios	27	25	92,6%	2	25	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de curas con cajones	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de curas de 3 estantes con buzón de deshechos	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de historias clínicas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Carro de transporte de ropa sucia	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Caudalímetro de oxígeno	27	27	100,0%	0	27	100,0%		0,0%		0,0%
Colchón de látex para cama clínica	27	25	92,6%	2	25	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador mural individual	2	1	50,0%	1		0,0%	1	100,0%		0,0%
Colgador para ropero	108	0	0,0%	108		-		-		-
Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	0	0,0%	1		-		-		-
Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	5	21	100,0%	0	21	100,0%		0,0%		0,0%
Cortinaje de exploración	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cuadro decoración pared	31	8	25,8%	23	8	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 12L	8	1	12,5%	7	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 5L	29	0	0,0%	29		-		-		-
Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1	0	0,0%	1		-		-		-
Cunas neonato	18	4	22,2%	14	4	100,0%		0,0%		0,0%
Cuña de acero inoxidable con soporte	27	0	0,0%	27		-		-		-
Dispensador de jabón	9	7	77,8%	2	7	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	29	29	100,0%	0	29	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de toallas de papel	9	7	77,8%	2	7	100,0%		0,0%		0,0%
Escabel	1	0	0,0%	1		-		-		-
Escobilla WC	27	26	96,3%	1	26	100,0%		0,0%		0,0%
Esfigmomanómetro de pared	28	0	0,0%	28		-		-		-
Espejo encastrado (elemento fijo)	29	29	100,0%	0	29	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería de 180 x 100 cm. Y 8 estantes	1	6	100,0%	0	6	100,0%		0,0%		0,0%
Expositor de folletos	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Foco de exploración de pie	2	0	0,0%	2		-		-		-
Frigorífico 300L	1	0	0,0%	1		-		-		-
Gavetas para fungible	1	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Jardinera	2	0	0,0%	2		-		-		-
Juego de barandillas para cama clínica	27	25	92,6%	2	25	100,0%		0,0%		0,0%
Lavabo con repisa (elemento fijo)	29	29	100,0%	0	29	100,0%		0,0%		0,0%
Litera de exploración con cabecero abatible y ruedas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Mesa cigüeña para comer	27	27	100,0%	0	27	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa comedor de 120 X 80 X 74 cm.	6	0	0,0%	6		-		-		-
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa desnudabebés	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Mesita de noche clínica	27	27	100,0%	0	27	100,0%		0,0%		0,0%
ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	25,0%	3	1	100,0%		0,0%		0,0%
Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Mueble clínico con pileta encastrada con grifo monomando	1	0	0,0%	1		-		-		-
Negatoscopio de tres cuerpos	1	0	0,0%	1		-		-		-
Palangana de aseo metálica	27	0	0,0%	27		-		-		-
Papelera	4	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera con tapa basculante de 25L	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera metálica	27	26	96,3%	1	26	100,0%		0,0%		0,0%
Perchero de pie	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Perchero mural múltiple (módulo)	1	0	0,0%	1		-		-		-
Pizarra para rotulador de pared	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Plafón de avisos	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Planning para tarjetas	1	0	0,0%	1		-		-		-

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	HOSPITALIZACIÓN OBSTÉTRICA

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Porta-sueros para cama clínica	27	24	88,9%	3	24	100,0%		0,0%		0,0%
Portasueros rodado	27	14	51,9%	13	14	100,0%		0,0%		0,0%
Poyatas (Equipamiento fijo)	9	4	44,4%	5	4	100,0%		0,0%		0,0%
Regulador de vacío	27	26	96,3%	1	26	100,0%		0,0%		0,0%
Reloj de pared con fecha	1	0	0,0%	1		-		-		-
Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	29	0	0,0%	29		-		-		-
Sacaleches	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija	29	27	93,1%	2	24	88,9%	1	3,7%	2	7,4%
Silla fija con brazos	30	8	26,7%	22	8	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas	4	5	100,0%	0	5	100,0%		0,0%		0,0%
Sillón ergonómico para pacientes	27	26	96,3%	1	24	92,3%		0,0%	2	7,7%
Sofá-cama 2 m.	27	27	100,0%	0	26	96,3%		0,0%	1	3,7%
Soporte de termómetro	27	0	0,0%	27		-		-		-
Soporte para posters de campañas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Sujeta toallas de ducha	27	25	92,6%	2	25	100,0%		0,0%		0,0%
Taburete fijo de 60 cm.	3	0	0,0%	3		-		-		-
Taburete giratorio alto con respaldo	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Taburete giratorio con ruedas	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	0	0,0%	1		-		-		-
% de incumplimiento			45,6%			96,2%		1,8%		2,0%

HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA

1. Contextualización de área

El área corresponde con la ubicación sobre el plano y con la función definida en el Anexo VI del PCAP.

Existen 22 habitaciones en esta hospitalización, 9 más de las establecidas en el Anexo VI (13 habitaciones). Por otra parte, no existen las Zonas Intermedias.

2. Análisis de Incidencias

En el área de Hospitalización Pediátrica se han encontrado las siguientes incidencias:

- No se ha encontrado el siguiente equipamiento: "tablilla" de historia clínica, aspirador y contenedor, botella, butaca paciente/acompañante, carro de curas con cajones, carro de curas de 3 estantes con buzón de deshechos, carro de historias clínicas, conjunto dispensador-cortador de papel para litera, cortinaje de exploración, cubo de basura con pedal 12L, escabel, esfigmomanómetro de mercurio de pared, frigorífico 300L, gavetas para material fungible, litera de exploración con cabecero abatible y ruedas, mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm, mesa rectangular 120 x 60 y altura 53 cm, mesa rectangular 120 x 60 y altura 59 cm, ML de guía para cortinas de zonas clínicas, mueble clínico encastrado con pileta dos cuerpos (elemento fijo), negatoscopio de tres cuerpos, perchero mural múltiple (módulo), planning para tarjetas, reloj de pared con fecha, repisa para elementos de aseo (elemento fijo), taburete fijo de 60 cm, taburete giratorio alto con respaldo y torre de dispensación de documentos de 15 huecos.
- El 9,5% de los sofá-cama 2m están deteriorados (2 unidades).
- El 6,7% de los colchones de espuma para cama clínica se encuentran deteriorados (1 unidad).

A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en la Unidad de Hospitalización Pediátrica, donde el porcentaje de incumplimiento es del 52,1%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
"Tablilla" de Historia Clínica	30	0	0,0%	30		-		-		-
Almohada para cama clínica	4	11	100,0%	0	11	100,0%		0%		0,0%
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0%		0,0%
Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	6	3	50,0%	3	3	100,0%		0%		0,0%
Aspirador y contenedor	1	0	0,0%	1		-		-		-
Botella	13	0	0,0%	13		-		-		-
Butaca paciente/acompañante	13	0	0,0%	13		-		-		-
Cajonera colgante de dos cajones	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Calentador de biberones	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0%		0,0%
Cama clínica eléctrica	4	15	100,0%	0	15	100,0%		0%		0,0%
Cama infantil con barandilla	8	1	12,5%	7	1	100,0%		0%		0,0%
Carro de curas con cajones	1	0	0,0%	1		-		-		-
Carro de curas de 3 estantes con buzón de deshechos	1	0	0,0%	1		-		-		-
Carro de historias clínicas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Carro de transporte de ropa sucia	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0%		0,0%
Carro infantil con ruedas 90 x 55 x 59 cm.	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Colchón de espuma para cama clínica	4	15	100,0%	0	14	93,3%		0%	1	6,7%
Colgador mural individual	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0%		0,0%
Colgador para ropero	52	0	0,0%	52		-		-		-
Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	0	0,0%	1		-		-		-
Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	5	1	20,0%	4	1	100,0%		0%		0,0%
Cortinaje de exploración	1	0	0,0%	1		-		-		-
Cuadro decoración pared	13	12	92,3%	1	12	100,0%		0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 12L	6	0	0,0%	6		-		-		-
Cubo de basura con pedal 50L	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 5L	15	10	66,7%	5	10	100,0%		0%		0,0%
Cuna alta	11	3	27,3%	8	3	100,0%		0%		0,0%
Cuña de acero inoxidable	13	0	0,0%	13		-		-		-
Dispensador de jabón	7	6	85,7%	1	6	100,0%		0%		0,0%
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	15	19	100,0%	0	19	100,0%		0%		0,0%
Dispensador de toallas de papel	7	6	85,7%	1	6	100,0%		0%		0,0%
Escabel	1	0	0,0%	1		-		-		-
Escobilla WC	13	18	100,0%	0	18	100,0%		0%		0,0%
Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	0	0,0%	1		-		-		-
Espejo encastrado (elemento fijo)	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0%		0,0%
Estantería de 180 x 100 cm. Y 8 estantes	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Foco de exploración de pie	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Frigorífico 300L	1	0	0,0%	1		-		-		-
Gavetas para material fungible	1	0	0,0%	1		-		-		-
Juego de barandillas para cama clínica	8	15	100,0%	0	15	100,0%		0%		0,0%
Lavabo con repisa (elemento fijo)	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0%		0,0%
Litera de exploración con cabecero abatible y ruedas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Mesa cigüeña para comer	13	8	61,5%	5	8	100,0%		0%		0,0%
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	0	0,0%	1		-		-		-
Mesa rectangular 120 x 60 y altura 53 cm.	2	0	0,0%	2		-		-		-
Mesa rectangular 120 x 60 y altura 59 cm.	2	0	0,0%	2		-		-		-
Mesa redonda, diámetro 120 y altura 40 cm.	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0%		0,0%
Mesa redonda, diámetro 120 y altura 47 cm.	4	1	25,0%	3	1	100,0%		0%		0,0%
Mesa redonda, diámetro 120 y altura 54 cm.	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0%		0,0%
Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Mesita de noche clínica	13	8	61,5%	5	8	100,0%		0%		0,0%
ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	0	0,0%	4		-		-		-
Módulo casillero guardería 90 x 75 x 40 cm.	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Módulo cubetero guardería 90 x 75 x 40 cm.	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0%		0,0%
Módulo estantería guardería 90 x 75 x 40 cm.	6	2	33,3%	4	2	100,0%		0%		0,0%
Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Mueble clínico encastrado con pilta dos cuerpos (elemento fijo)	1	0	0,0%	1		-		-		-
Negatoscopio de tres cuerpos	1	0	0,0%	1		-		-		-
Papelera	3	3	100,0%	0	3	100,0%		0%		0,0%
Papelera con tapa basculante de 25L	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0%		0,0%
Perchero de pie	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Perchero mural múltiple (módulo)	1	0	0,0%	1		-		-		-
Pizarra para rotulador de pared	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Plafón de avisos	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Planning para tarjetas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Portasueros para cama clínica	4	15	100,0%	0	15	100,0%		0%		0,0%
Poyatas (Equipamiento fijo)	5	1	20,0%	4	1	100,0%		0%		0,0%
Reloj de pared con fecha	1	0	0,0%	1		-		-		-
Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	2	0	0,0%	2		-		-		-
Silla fija	13	15	100,0%	0	15	100,0%		0%		0,0%
Silla fija con brazos	10	8	80,0%	2	8	100,0%		0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas	4	1	25,0%	3	1	100,0%		0%		0,0%
Silla infantil madera 31 x 54 cm.	16	4	25,0%	12	4	100,0%		0%		0,0%
Silla infantil madera 33 x 30 cm.	16	4	25,0%	12	4	100,0%		0%		0,0%
Silla infantil madera 34 x 57 cm.	16	4	25,0%	12	4	100,0%		0%		0,0%
Sofá-cama 2 m.	13	21	100,0%	0	19	90,5%		0%	2	9,5%
Sujeta toallas de ducha	13	18	100,0%	0	18	100,0%		0%		0,0%
Taburete fijo de 60 cm.	3	0	0,0%	3		-		-		-
Taburete giratorio alto con respaldo	1	0	0,0%	1		-		-		-
Taburete giratorio con ruedas	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	0	0,0%	1		-		-		-
TV de 25"	13	14	100,0%	0	14	100,0%		0%		0,0%
% de incumplimiento			52,1%			99,7%		0,0%		0,3%

HOSPITALIZACIÓN NEONATOLÓGICA

1. Contextualización de área

El área corresponde con la ubicación sobre el plano y con la función definida en el Anexo VI del PCAP. Sin embargo, no existen las siguientes zonas:

- Habitación de lactancia materna.
- Zona de trabajo personal.
- Despacho de información.

2. Análisis de Incidencias

En el área de Hospitalización Neonatológica no se ha encontrado el siguiente equipamiento: "tablilla" de historia clínica, armario oficio colgado 80 x 90 x 35 cm, carro de historias clínicas, conjunto dispensador-cortador de papel para litera, cubo de basura con tapa basculante de 50L, esfigmomanómetro de mercurio de pared, foco de exploración de pie, jardinera, negatoscopio de tres cuerpos, papelera con tapa basculante de 50L, planning para tarjetas, repisa para elementos de aseo (elemento fijo), secamanos eléctrico, soporte de termómetro, soporte para posters de campañas, taburete fijo de 60 cm.

A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en la Unidad de Hospitalización Neonatológica, donde el porcentaje de incumplimiento es del 44,4%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL										
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	INCOSA				HOSPITALIZACIÓN NEONATOLÓGICA					
Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
"Tablilla" de Historia Clínica	30	0	0,0%	30		-		-		-
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	4	4	100,0%	0	4	100,0%		0%		0,0%
Armario altura 200 X 80 x 40 cm. Con estantería y archivador	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Armario oficio colgado 80 x 90 x 35 cm.	1	0	0,0%	1		-		-		-
Armario ropero modular	18	35	100,0%	0	35	100,0%		0%		0,0%
Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	3	2	66,7%	1	2	100,0%		0%		0,0%
Banco de vestidor	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0%		0,0%
Cafetera eléctrica	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Cajonera colgante de dos cajones	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0%		0,0%
Cajonera de tres cajones con ruedas	3	7	100,0%	0	7	100,0%		0%		0,0%
Carro de curas	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Carro de curas con cajones	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Carro de historias clínicas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Carro de lencería	1	7	100,0%	0	7	100,0%		0%		0,0%
Carro de limpieza	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Carro de transporte de ropa sucia	4	1	25,0%	3	1	100,0%		0%		0,0%
Caudalímetro de oxígeno	6	8	100,0%	0	8	100,0%		0%		0,0%
Colgador mural individual	6	1	16,7%	5	1	100,0%		0%		0,0%
Colgador mural múltiple (módulo)	4	2	50,0%	2	2	100,0%		0%		0,0%

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	HOSPITALIZACIÓN NEONATOLÓGICA

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Colgador para ropero	78	0	0,0%	78		-		-		-
Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	0	0,0%	1		-		-		-
Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	25	20	80,0%	5	20	100,0%		0%		0,0%
Cuadro decoración pared	18	6	33,3%	12	6	100,0%		0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 12L	10	2	20,0%	8	2	100,0%		0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 5L	12	3	25,0%	9	3	100,0%		0%		0,0%
Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1	0	0,0%	1		-		-		-
Dispensador de jabón	11	7	63,6%	4	7	100,0%		0%		0,0%
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	11	7	63,6%	4	7	100,0%		0%		0,0%
Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	0	0,0%	1		-		-		-
Esfigmomanómetro de pared	6	0	0,0%	6		-		-		-
Espejo encastrado (elemento fijo)	6	3	50,0%	3	3	100,0%		0%		0,0%
Estantería de 180 x 100 cm. Y 8 estantes	9	8	88,9%	1	8	100,0%		0%		0,0%
Estantería de pared de 3 estantes	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Expositor de folletos	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0%		0,0%
Foco de exploración de pie	1	0	0,0%	1		-		-		-
Fotocopiadora	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Frigorífico 300L	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Frigorífico 80L	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Horno microondas empotrado	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Jardinera	2	0	0,0%	2		-		-		-
Lavabo con repisa (elemento fijo)	6	3	50,0%	3	3	100,0%		0%		0,0%
Mesa de exploración de bebés	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0%		0,0%
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	5	6	100,0%	0	6	100,0%		0%		0,0%
Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	3	2	66,7%	1	2	100,0%		0%		0,0%
Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	8	2	25,0%	6	2	100,0%		0%		0,0%
Microondas de 20-25L	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Negatoscopio de tres cuerpos	1	0	0,0%	1		-		-		-
Nevera de 150 L	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Papelera	12	15	100,0%	0	15	100,0%		0%		0,0%
Papelera con tapa basculante de 25L	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0%		0,0%
Papelera con tapa basculante de 50L	2	0	0,0%	2		-		-		-
Papelera metálica	6	1	16,7%	5	1	100,0%		0%		0,0%
Perchero de pie	4	4	100,0%	0	4	100,0%		0%		0,0%
Pizarra para rotulador de pared	3	2	66,7%	1	2	100,0%		0%		0,0%
Plafón de avisos	1	2	100,0%	0	2	100,0%		0%		0,0%
Plafón de corcho	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Planning para tarjetas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Poyatas (Equipamiento fijo)	6	4	66,7%	2	4	100,0%		0%		0,0%
Regulador de vacío	6	8	100,0%	0	8	100,0%		0%		0,0%
Reloj de pared con fecha	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	6	0	0,0%	6		-		-		-
Secamanos eléctrico	6	0	0,0%	6		-		-		-
Silla fija	10	3	30,0%	7	3	100,0%		0%		0,0%
Silla fija con brazos	30	15	50,0%	15	15	100,0%		0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas	8	10	100,0%	0	10	100,0%		0%		0,0%
Sillas modulares	40	16	40,0%	24	16	100,0%		0%		0,0%
Sofá con mesa de esquina y central baja	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0%		0,0%
Soporte de termómetro	6	0	0,0%	6		-		-		-
Soporte para posters de campañas	3	0	0,0%	3		-		-		-
Taburete fijo de 60 cm.	2	0	0,0%	2		-		-		-
Taburete giratorio con ruedas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
% de incumplimiento			44,4%			100,0%		0,0%		0,0%

HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA

1. Contextualización de área

El área corresponde con la ubicación sobre el plano y con la función definida en el Anexo VI del PCAP. Sin embargo no existe el Almacén de medicamentos, ni la Sala Técnica Polivalente.

Por cuestiones de seguridad en el baño de las habitaciones sólo se encuentran elementos fijos: lavabo con repisa y espejo encastrado. Y en las habitaciones no hay el siguiente mobiliario:

- Caudalímetro de oxígeno, soporte de termómetro, esfigmomanómetro de mercurio de pared y regulador de vacío.
- “Sofá-cama 2m”
- Porta-sueros para cama clínica, portasueros rodado.
- Mesita de noche clínica y mesa cigüeña para comer
- Sillones ergonómicos para pacientes
- Sillas fijas y butaca paciente/acompañante
- Cuadro de decoración pared, papelera metálica.

2. Análisis de Incidencias

En el área de Hospitalización Psiquiátrica se han encontrado las siguientes incidencias:

- El 11,8% de los espejos encastrados (elemento fijo) se encuentran deteriorados, y sin código (2 unidades).
- El 6,3% de los lavabos con repisa (elemento fijo) se encuentran deteriorados, y sin código (1 unidad).
- El 8,3% de los juegos de barandillas para cama clínica se encuentran rotos, y sin código. (1 unidad).
- Ausencia del siguiente equipamiento: "tablilla" de historia clínica, armario altura 125 x 80 x 40 cm, armario oficio colgado 80 x 90 x 35 cm, aspirador y contenedor, banco de vestidor, cajonera colgante de dos cajones, carro de historias clínicas, colgador mural múltiple (módulo), conjunto dispensador-cortador de papel para litera, cortinaje de exploración, cubo de basura con tapa basculante de 50L, escabel, expositor de folletos, foco de exploración de pie, fotocopiadora, frigorífico 80L, jardinera, litera de exploración con cabecero abatible y ruedas, microondas de 20-25L, ML de guía para cortinas de zonas clínicas, negatoscopio de tres cuerpos, planning para tarjetas, porta-sueros para cama clínica, reloj de pared con fecha, sofá con mesa de esquina y central baja y taburete giratorio con ruedas.

Cama sin juego de barandillas para cama clínica. Ubicación planta baja, habitación 067.

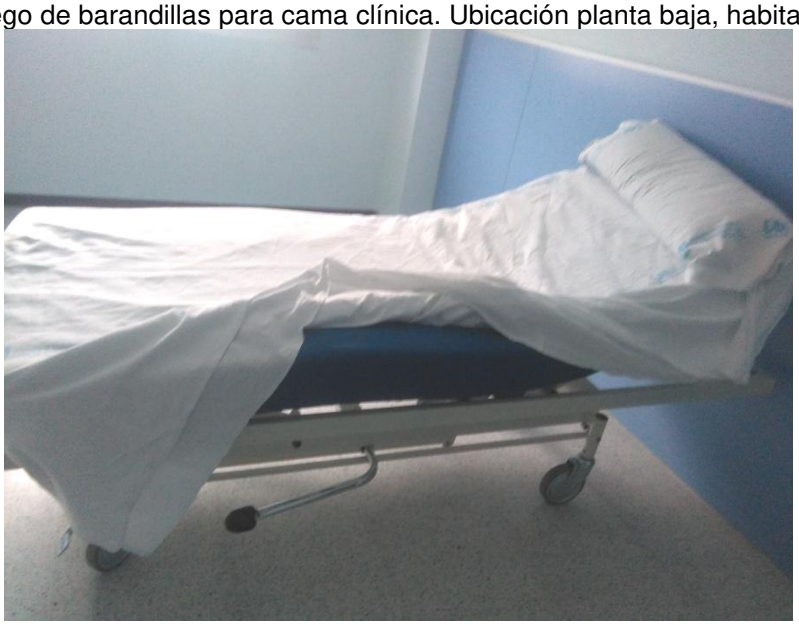

A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica, donde el porcentaje de incumplimiento es del 61,0%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
"Tablilla" de Historia Clínica	30	0	0,0%	30		-		-		-
Abrazadera en pared (elemento fijo)	16	0	0,0%	16		-		-		-
Accesorios de ducha (elemento fijo)	16	0	0,0%	16		-		-		-
Almohada para cama clínica	16	11	68,8%	5	11	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 125 X 80 x 40 cm.	2	0	0,0%	2		-		-		-
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	4	1	25,0%	3	1	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 200 X 80 x 40 cm. Con estantería y archivador	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Armario oficio colgado 80 x 90 x 35 cm.	1	0	0,0%	1		-		-		-
Armario ropero modular	18	11	61,1%	7	11	100,0%		0,0%		0,0%
Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	4	2	50,0%	2	2	100,0%		0,0%		0,0%
Aspirador y contenedor	1	0	0,0%	1		-		-		-
Banco de vestidor	2	0	0,0%	2		-		-		-
Botella	16	0	0,0%	16		-		-		-
Butaca paciente/acompañante	16	0	0,0%	16	0	-		-		-
Cafetera eléctrica	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera colgante de dos cajones	2	0	0,0%	2		-		-		-
Cajonera de tres cajones con ruedas	3	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Cama clínica eléctrica con accesorios	16	12	75,0%	4	12	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de curas con cajones	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de curas de 3 estantes con buzón de deshechos	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de historias clínicas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Carro de lencería	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de limpieza	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de transporte de ropa sucia	4	1	25,0%	3	1	100,0%		0,0%		0,0%
Caudalímetro de oxígeno	16	0	0,0%	16		-		-		-
Colchón de látex para cama clínica	16	12	75,0%	4	12	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador mural individual	4	2	50,0%	2	2	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador mural múltiple (módulo)	4	0	0,0%	4		-		-		-
Colgador para ropero	70	0	0,0%	70		-		-		-
Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	0	0,0%	1		-		-		-
Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	25	40	100,0%	0	40	100,0%		0,0%		0,0%
Cortinaje de exploración	1	0	0,0%	1		-		-		-
Cuadro decoración pared	26	1	3,8%	25	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 12L	8	0	0,0%	8		-		-		-
Cubo de basura con pedal 5L	20	0	0,0%	20		-		-		-
Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1	0	0,0%	1		-		-		-
Cuña de acero inoxidable con soporte	16	0	0,0%	16		-		-		-
Dispensador de jabón	9	6	66,7%	3	6	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	20	3	15,0%	17	3	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de toallas de papel	7	4	57,1%	3	4	100,0%		0,0%		0,0%
Escabel	1	0	0,0%	1		-		-		-
Escobilla WC	16	0	0,0%	16		-		-		-
Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	0	0,0%	1		-		-		-
Esfigmomanómetro de pared	16	0	0,0%	16		-		-		-
Espejo encastrado (elemento fijo)	20	17	85,0%	3	15	88,2%		0,0%	2	11,8%
Estantería de 180 x 100 cm. Y 8 estantes	9	7	77,8%	2	7	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería de pared de 3 estantes	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Expositor de folletos	1	0	0,0%	1		-		-		-
Foco de exploración de pie	1	0	0,0%	1		-		-		-
Fotocopiadora	1	0	0,0%	1		-		-		-
Frigorífico 300L	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Frigorífico 80L	1	0	0,0%	1		-		-		-

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Gavetas para fungible	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Horno microondas empotrado	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Jardinera	3	0	0,0%	3		-		-		-
Juego de barandillas para cama clínica	16	12	75,0%	4	11	91,7%	1	8,3%		0,0%
Lavabo con repisa (elemento fijo)	20	16	80,0%	4	15	93,8%		0,0%	1	6,3%
Litera de exploración con cabecero abatible y ruedas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Mesa cigüeña para comer	16	0	0,0%	16		-		-		-
Mesa comedor de 120 X 80 X 74 cm.	6	4	66,7%	2	4	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	4	3	75,0%	1	3	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	3	2	66,7%	1	2	100,0%		0,0%		0,0%
Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	4	3	75,0%	1	3	100,0%		0,0%		0,0%
Mesita de noche clínica	16	0	0,0%	16		-		-		-
Microondas de 20-25L	1	0	0,0%	1		-		-		-
ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	0	0,0%	4		-		-		-
Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Mueble clínico encastrado con pilta dos cuerpos (elemento fijo)	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Negatoscopio de tres cuerpos	1	0	0,0%	1		-		-		-
Nevera de 150 L	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Palangana de aseo metálica	16	0	0,0%	16		-		-		-
Papelera	11	8	72,7%	3	8	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera con tapa basculante de 25L	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera con tapa basculante de 50L	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera metálica	16	0	0,0%	16		-		-		-
Perchero de pie	5	3	60,0%	2	3	100,0%		0,0%		0,0%
Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Pizarra para rotulador de pared	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0,0%		0,0%
Plafón de avisos	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Plafón de corcho	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Planning para tarjetas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Porta-sueros para cama clínica	16	0	0,0%	16		-		-		-
Portasueros rodado	16	0	0,0%	16		-		-		-
Poyatas (Equipamiento fijo)	5	2	40,0%	3	2	100,0%		0,0%		0,0%
Regulador de vacío	16	0	0,0%	16		-		-		-
Reloj de pared con fecha	1	0	0,0%	1		-		-		-
Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	20	0	0,0%	20		-		-		-
Secamanos eléctrico	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija	20	3	15,0%	17	3	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija con brazos	48	26	54,2%	22	26	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas	7	7	100,0%	0	7	100,0%		0,0%		0,0%
Sillas modulares	20	19	95,0%	1	19	100,0%		0,0%		0,0%
Sillón ergonómico para pacientes	16	0	0,0%	16		-		-		-
Sofá con mesa de esquina y central baja	1	0	0,0%	1		-		-		-
Sofá-cama 2 m.	16	0	0,0%	16		-		-		-
Soporte de termómetro	16	0	0,0%	16		-		-		-
Soporte para posters de campañas	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Sujeta toallas de ducha	16	0	0,0%	16		-		-		-
Taburete fijo de 60 cm.	3	3	100,0%	0	3	100,0%		0,0%		0,0%
Taburete giratorio con ruedas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
% de incumplimiento			61,0%			99,5%		0,2%		0,3%

UCI

1. Contextualización de área

La unidad de Hospitalización de Críticos corresponde con la ubicación sobre el plano y con la función definida en el Anexo VI del PCAP. Sin embargo se encontraron las siguientes modificaciones:

- Solo 8 boxes se encuentran operativos (de los 20 boxes existentes). Los boxes no operativos se encuentran sin el equipamiento establecido en el Anexo VI y son los siguientes: box 01, box 02, box 04, box 11, box 12, box 13, box 03 aislado, box 04 aislado, box 05 aislado, box 06 aislado, box 01 aislado y box 02 aislado.
- Sólo en los boxes de aislamiento hay baño.
- No existen las siguientes zonas: oficio, esclusa de familiares, secretaría, zona intermedia y aseos de pacientes.
- Un Puesto de Control (de los dos existentes) actualmente está sin uso.
- La Zona Polivalente de personal, actualmente es utilizada como almacén.
- El almacén de equipamientos es actualmente una consulta para pacientes crónicos complejos.

Box 02 no operativo.



Puesto de control de enfermería sin uso. Ubicación planta primera.



2. Análisis de Incidencias

En esta unidad se registran las siguientes incidencias del mobiliario:

- EL 44,4% de los colchones de cama especial UCI se encuentran deteriorados (4 unidades).
- En los aseos de personal no hay secamanos eléctrico, en su lugar hay dispensadores de toallas de papel.
- El 20,0% de los colgadores murales múltiples se encuentran deteriorados (1 unidad).
- El 20,0% de los dispensadores de toallas de papel se encuentran deteriorados (1 unidad).
- El 14,3% de los dispensadores de jabón se encuentran rotos (1 unidad).
- Ausencias de los siguientes elementos: "tablilla" de historia clínica, armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas, armario altura 74 x 80 x 40 cm, armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm, armario oficio colgado 80 x 90 x 35 cm, banquillos elevadores, cafetera eléctrica, cajonera colgante de dos cajones, cajonera de mostrador, carro alto portapalanganas rodado, carro bajo portapalanganas, carro de fungible, carro de historias clínicas, carro de limpieza, carro de suturas, carro hermético para recogida de instrumental sucio, carro medicación anestesia, cestas alámbricas, colgador para ropero, cubo alto con soporte giratorio, cubo de basura con pedal 12L, escalera 1 peldaño inoxidable, escalera con cinco peldaños y pies aislantes, expositor de folletos, jardinera, lámpara de quirófano (elemento fijo), mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes, mesa auxiliar Mayo, mesa instrumental 120x60 cms, mesa mayo hidráulica inoxidable con freno, mesa riñonera, mostrador de información de 200-240 cm, negatoscopio de cuatro cuerpos, pizarra blanca rotuladores, planning para tarjetas, portasueros doble con ruedas, regulador de vacío, reloj de pared con fecha, silla giratoria con ruedas alta, sofá con mesa de esquina y central baja,

taburete de acero inoxidable con ruedas, taburete de acero inoxidable sin ruedas, taburete fijo de 60 cm y torre de dispensación de documentos de 15 huecos.

Dispensador de toallas de papel deteriorado. Ubicación planta primera, puesto de control de enfermería.



A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en la Unidad de Hospitalización Críticos - UCI, donde el porcentaje de incumplimiento es del 65,6%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	UCI

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
"Tablilla" de Historia Clínica	60	0	0,0%	60		-		-		-
Almohada	20	9	45,0%	11	9	100,0%		0,0%		0,0%
Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	5	2	40,0%	3	2	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 200 X 80 x 40 cm. Con estantería y archivador	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	0	0,0%	1		-		-		-
Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	2	0	0,0%	2		-		-		-
Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm.	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Armario oficio colgado 80 x 90 x 35 cm.	1	0	0,0%	1		-		-		-
Armario ropero modular	50	43	86,0%	7	43	100,0%		0,0%		0,0%
Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	4	3	75,0%	1	3	100,0%		0,0%		0,0%
Banco de vestidor	9	3	33,3%	6	3	100,0%		0,0%		0,0%
Banquillos elevadores	1	0	0,0%	1		-		-		-
Barra soporte lateral pared	2	0	0,0%	2		-		-		-
Cafetera eléctrica	1	0	0,0%	1		-		-		-
Cajonera colgante de dos cajones	1	0	0,0%	1		-		-		-
Cajonera de mostrador	2	0	0,0%	2		-		-		-
Cajonera de tres cajones con ruedas	4	11	100,0%	0	11	100,0%		0,0%		0,0%
Cama especial UCI con accesorios	20	9	45,0%	11	9	100,0%		0,0%		0,0%
Cama individual	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Camilla de transporte	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro alto portapalanganas rodado	1	0	0,0%	1		-		-		-
Carro bajo portapalanganas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Carro de curas con cajones	2	11	100,0%	0	11	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de fungible	1	0	0,0%	1		-		-		-
Carro de historias clínicas	2	0	0,0%	2		-		-		-
Carro de lencería	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de limpieza	1	0	0,0%	1		-		-		-
Carro de suturas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Carro de transporte de ropa sucia	8	1	12,5%	7	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro hermético para recogida de instrumental sucio	1	0	0,0%	1		-		-		-
Carro medicación anestesia	1	0	0,0%	1		-		-		-
Cestas alámbricas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Colchón de cama especial UCI	20	9	45,0%	11	5	55,6%		0,0%	4	44,4%
Colgador mural individual	6	2	33,3%	4	2	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador mural múltiple (módulo)	10	5	50,0%	5	4	80,0%		0,0%	1	20,0%
Colgador para ropero	150	0	0,0%	150		-		-		-
Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	30	20	66,7%	10	20	100,0%		0,0%		0,0%
Cuadro decoración pared	14	4	28,6%	10	4	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo alto con soporte giratorio	1	0	0,0%	1		-		-		-
Cubo de basura con pedal 12L	31	0	0,0%	31		-		-		-
Cubo de basura con pedal 5L	6	3	50,0%	3	3	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con tapa basculante de 50L	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Cuña con soporte	20	0	0,0%	20		-		-		-
Dispensador de jabón	14	7	50,0%	7	6	85,7%	1	14,3%		0,0%
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	6	4	66,7%	2	4	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de toallas de papel	10	5	50,0%	5	4	80,0%		0,0%	1	20,0%
Escalera 1 peldaño inoxidable	1	0	0,0%	1		-		-		-
Escalera con cinco peldaños y pies aislantes	1	0	0,0%	1		-		-		-
Espejo encastrado (elemento fijo)	6	4	66,7%	2	4	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería de 180 x 100 cm. Y 8 estantes	6	20	100,0%	0	20	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería metálica 5/6 niveles ML	4	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Expositor de folletos	2	0	0,0%	2		-		-		-
Frigorífico 300L	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0,0%		0,0%
Horno microondas empotrado	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Jardinera	3	0	0,0%	3		-		-		-
Lámpara de quirófano (elemento fijo)	1	0	0,0%	1		-		-		-
Lavabo con repisa (elemento fijo)	6	5	83,3%	1	5	100,0%		0,0%		0,0%
Luz para mesita de noche	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	1	0	0,0%	1		-		-		-
Mesa auxiliar Mayo	1	0	0,0%	1		-		-		-
Mesa cigüeña para comer	20	8	40,0%	12	8	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	5	6	100,0%	0	6	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa instrumental 120x60 cms.	1	0	0,0%	1		-		-		-
Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	1	0	0,0%	1		-		-		-
Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	4	1	25,0%	3	1	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa riñonera	1	0	0,0%	1		-		-		-

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	UCI

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	9	2	22,2%	7	2	100,0%		0,0%		0,0%
Mesita de noche	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Mostrador de información de 200-240 cm.	1	0	0,0%	1		-		-		-
Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	2	3	100,0%	0	3	100,0%		0,0%		0,0%
Negatoscopio de cuatro cuerpos	1	0	0,0%	1		-		-		-
Nevera de 150 L	1	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera	15	16	100,0%	0	16	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera con tapa basculante de 25L	5	1	20,0%	4	1	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera con tapa basculante de 50L	5	3	60,0%	2	3	100,0%		0,0%		0,0%
Perchero de pie	6	1	16,7%	5	1	100,0%		0,0%		0,0%
Pizarra blanca rotuladores	2	0	0,0%	2		-		-		-
Pizarra para rotulador de pared	3	3	100,0%	0	3	100,0%		0,0%		0,0%
Plafón de avisos	2	3	100,0%	0	3	100,0%		0,0%		0,0%
Planning para tarjetas	2	0	0,0%	2		-		-		-
Portasuero doble con ruedas	6	0	0,0%	6		-		-		-
Poyatas (Equipamiento fijo)	7	9	100,0%	0	9	100,0%		0,0%		0,0%
Regulador de vacío	1	0	0,0%	1		-		-		-
Reloj calendario	20	0	0,0%	20		-		-		-
Reloj de pared con fecha	3	0	0,0%	3		-		-		-
Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	4	0	0,0%	4		-		-		-
Secamanos eléctrico	4	2	50,0%	2	2	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija	6	9	100,0%	0	9	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija con brazos	34	17	50,0%	17	17	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas	9	16	100,0%	0	16	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con ruedas alta	2	0	0,0%	2		-		-		-
Sillas modulares	55	2	3,6%	53	2	100,0%		0,0%		0,0%
Sofá con mesa de esquina y central baja	3	0	0,0%	3		-		-		-
Soporte para posters de campañas	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Taburete con ruedas	20	5	25,0%	15	5	100,0%		0,0%		0,0%
Taburete de acero inoxidable con ruedas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Taburete de acero inoxidable sin ruedas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Taburete fijo de 60 cm.	8	0	0,0%	8		-		-		-
Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	1	0	0,0%	1		-		-		-
Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	2	0	0,0%	2		-		-		-
% de incumplimiento			65,6%			98,3%		0,2%		1,4%

BLOQUE QUIRÚRGICO

1. Contextualización de área

El Bloque Quirúrgico corresponde con la ubicación sobre el plano y con la función definida en el Anexo VI del PCAP. Sin embargo, sólo se encuentra una sala "URPA", de las 8 salas "URPA" establecidas en el Anexo VI del PCAP.

2. Análisis de Incidencias

En el Bloque Quirúrgico se encontraron las siguientes incidencias:

- En los quirófanos no hay taburetes de acero inoxidable con ruedas, se encuentran sustituidos por taburetes giratorios con ruedas.
- Hay 2 lámparas de quirófano (elemento fijo) en vez de sólo una como se establece en el Anexo VI.
- En las Zonas de apoyo, 4 de los "Lavados medicales de 2 plazas" están sustituidos por "Lavados medicales de 3 plazas".
- El carro de anestesia, sutura y fungibles es el mismo.
- No se ha encontrado el siguiente equipamiento: accesorios de ducha (elemento fijo), armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas, armario altura 74 x 80 x 40 cm, armario ropero modular, banco de vestidor, botella, cajonera colgante de dos cajones, carro alto portapalanganas rodado, carro de limpieza, carro de transporte de ropa sucia, colgador mural múltiple (módulo), contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm, cortinaje de exploración, cortinaje de separación, cuadro decoración pared, cubo de basura con pedal 5L, cubo de basura con tapa basculante de 50L, dispensador de cepillos, escabel, escalera con cinco peldaños y pies aislantes, esfigmomanómetro de mercurio de pared, estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes, expositor de folletos, jardinera, mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm, mesita de noche clínica, mostrador de información de 200-240 cm, negatoscopio de cuatro cuerpos, papelera con tapa basculante de 50L, presurizador de suero, racks almacenaje ML, reloj de pared con fecha, repisa para elementos de aseo (elemento fijo), secamanos eléctrico, silla giratoria con brazos y ruedas alta, sillas modulares, soporte para posters de campañas, sujeta toallas de ducha y taburete fijo de 60 cm.

Lavado medical de 3 plazas (no de 2 plazas). Ubicación: Planta segunda, zonas de apoyo.

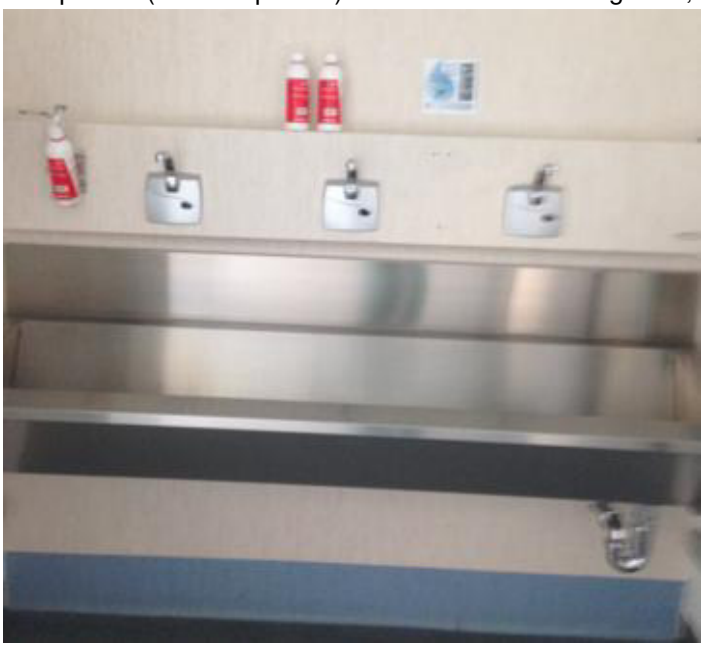

Taburetes giratorios con ruedas (no son acero inoxidable como exige el Anexo VI del PCAP). Ubicación: quirófano.



El carro para anestesia, fungibles y sutura es el mismo (debiendo ser tres diferentes). Ubicación: Planta segunda, quirófanos.

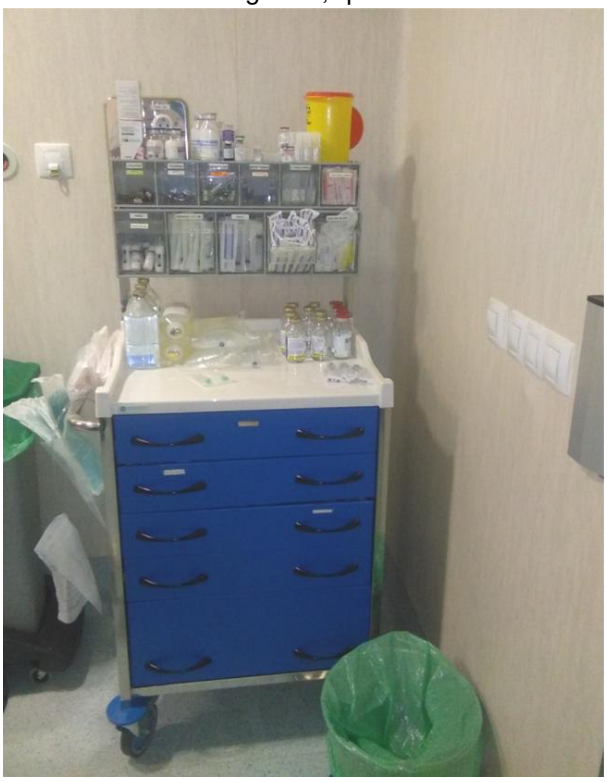

A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en el Bloque Quirúrgico, donde el porcentaje de incumplimiento es del 64,5%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	BLOQUE QUIRÚRGICO

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Abrazadera en pared (elemento fijo)	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Accesorios de ducha (elemento fijo)	2	0	0,0%	2		-		-		-
Almohada para cama clínica	137	14	10,2%	123	14	100,0%		0,0%		0,0%
Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	2	0	0,0%	2		-		-		-
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	10	8	80,0%	2	8	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	0	0,0%	1		-		-		-
Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	47	12	25,5%	35	12	100,0%		0,0%		0,0%
Armario ropero modular	40	0	0,0%	40		-		-		-
Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Banco de vestidor	8	0	0,0%	8		-		-		-
Banquillos elevadores	9	1	11,1%	8	1	100,0%		0,0%		0,0%
Botella	2	0	0,0%	2		-		-		-
Cajonera colgante de dos cajones	3	0	0,0%	3		-		-		-
Cajonera de mostrador	5	2	40,0%	3	2	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera de tres cajones con ruedas	7	9	100,0%	0	9	100,0%		0,0%		0,0%
Cama clínica eléctrica	143	23	16,1%	120	23	100,0%		0,0%		0,0%
Camilla de exploración ginecológica	2	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Camillas	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Carro alto portapalanganas rodado	9	0	0,0%	9		-		-		-
Carro bajo portapalanganas	9	9	100,0%	0	9	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de distribución material esteril tipo quirófano	18	10	55,6%	8	10	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de fungible	25	8	32,0%	17	8	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de lencería	4	1	25,0%	3	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de limpieza	1	0	0,0%	1		-		-		-
Carro de parada	8	1	12,5%	7	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de suturas	9	9	100,0%	0	9	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de transporte de ropa sucia	8	0	0,0%	8		-		-		-
Carro hermético para recogida de instrumental sucio	18	2	11,1%	16	2	100,0%		0,0%		0,0%
Carro medicación anestesia	9	9	100,0%	0	9	100,0%		0,0%		0,0%
Carro para material de tres estantes inoxidable	8	1	12,5%	7	1	100,0%		0,0%		0,0%
Caudalímetro de oxígeno	142	14	9,9%	128	14	100,0%		0,0%		0,0%
Cesta de acero inoxidable 60 x 30 x 14	70	80	100,0%	0	80	100,0%		0,0%		0,0%
Cestas alámbricas	9	9	100,0%	0	9	100,0%		0,0%		0,0%
Colchón de espuma para cama clínica	137	14	10,2%	123	14	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador mural individual	5	2	40,0%	3	2	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador mural múltiple (módulo)	8	0	0,0%	8		-		-		-
Colgador para ropero	120	0	0,0%	120		-		-		-
Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	15	0	0,0%	15		-		-		-
Contenedor de sondas de aspiración	8	7	87,5%	1	7	100,0%		0,0%		0,0%
Cortinaje de exploración	2	0	0,0%	2		-		-		-
Cortinaje de separación	24	0	0,0%	24		-		-		-
Cuadro decoración pared	3	0	0,0%	3		-		-		-
Cubo alto con soporte giratorio	9	3	33,3%	6	3	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 12L	26	1	3,8%	25	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 5L	5	0	0,0%	5		-		-		-
Cubo de basura con tapa basculante de 50L	4	0	0,0%	4		-		-		-
Cubo de basura de 25L	9	1	11,1%	8	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cuña con portacuñas	14	0	0,0%	14		-		-		-
Cuña de acero inoxidable con soporte	2	0	0,0%	2		-		-		-
Dispensador de cepillos	5	0	0,0%	5		-		-		-
Dispensador de jabón	35	22	62,9%	13	22	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de jabón para zona quirúrgica	5	5	100,0%	0	5	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	7	4	57,1%	3	4	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de toallas de papel	28	14	50,0%	14	14	100,0%		0,0%		0,0%
Escabel	2	0	0,0%	2		-		-		-
Escalera 1 peldaño inoxidable	9	5	55,6%	4	5	100,0%		0,0%		0,0%
Escalera con cinco peldaños y pies aislantes	2	0	0,0%	2		-		-		-
Escobilla WC	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Esfigmomanómetro de mercurio de pared	136	0	0,0%	136		-		-		-
Esfigmomanómetro de pared	14	0	0,0%	14		-		-		-
Espejo encastrado (elemento fijo)	7	4	57,1%	3	4	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería de 180 x 100 cm. Y 8 estantes	6	0	0,0%	6		-		-		-
Expositor de folletos	1	0	0,0%	1		-		-		-
Foco de exploración de pie	8	11	100,0%	0	11	100,0%		0,0%		0,0%
Jardinera	1	0	0,0%	1		-		-		-
Lámpara de quirófano (elemento fijo)	9	17	100,0%	0	17	100,0%		0,0%		0,0%
Lavabo con repisa (elemento fijo)	9	4	44,4%	5	4	100,0%		0,0%		0,0%

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	BLOQUE QUIRÚRGICO

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Lavado medical de 2 plazas	5	1	20,0%	4	1	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	9	7	77,8%	2	7	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa auxiliar Mayo	9	3	33,3%	6	3	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa cigüeña para comer	64	6	9,4%	58	6	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	10	9	90,0%	1	9	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa instrumental 120x60 cms.	9	6	66,7%	3	6	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	9	8	88,9%	1	8	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa riñonera	9	8	88,9%	1	8	100,0%		0,0%		0,0%
Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	3	0	0,0%	3		-		-		-
Mesita de noche clínica	14	0	0,0%	14		-		-		-
ML de guia para cortinas de zonas clínicas	8	1	12,5%	7	1	100,0%		0,0%		0,0%
Mostrador de información de 200-240 cm.	1	0	0,0%	1		-		-		-
Mostrador de recepción de 120-140 cm.	3	3	100,0%	0	3	100,0%		0,0%		0,0%
Mueble clínico con doble pila encastrado (elemento fijo)	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Mueble para soporte de monitores	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Negatoscopio de cuatro cuerpos	13	0	0,0%	13		-		-		-
Negatoscopio de tres cuerpos	16	2	12,5%	14	2	100,0%		0,0%		0,0%
Palangana de aseo metálica	2	0	0,0%	2		-		-		-
Palangana de baño metálica	14	0	0,0%	14		-		-		-
Papelera	15	12	80,0%	3	12	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera con tapa basculante de 50L	5	0	0,0%	5		-		-		-
Perchero de pie	10	6	60,0%	4	6	100,0%		0,0%		0,0%
Perchero mural múltiple (módulo)	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Pizarra blanca rotuladores	9	9	100,0%	0	9	100,0%		0,0%		0,0%
Pizarra para rotulador de pared	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0,0%		0,0%
Portasuero doble con ruedas	9	4	44,4%	5	4	100,0%		0,0%		0,0%
Portasueros para cama clínica	128	7	5,5%	121	7	100,0%		0,0%		0,0%
Portasueros rodado	14	2	14,3%	12	2	100,0%		0,0%		0,0%
Poyatas (Equipamiento fijo)	12	11	91,7%	1	11	100,0%		0,0%		0,0%
Presurizador de suero	8	0	0,0%	8		-		-		-
Racks almacenaje ML	14	0	0,0%	14		-		-		-
Regulador de vacío	31	19	61,3%	12	19	100,0%		0,0%		0,0%
Reloj	9	7	77,8%	2	7	100,0%		0,0%		0,0%
Reloj calendario	12	0	0,0%	12		-		-		-
Reloj de pared con fecha	1	0	0,0%	1		-		-		-
Repisa de escritura de 70 x 35 cm.	9	1	11,1%	8	1	100,0%		0,0%		0,0%
Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	5	0	0,0%	5		-		-		-
Secamanos eléctrico	1	0	0,0%	1		-		-		-
Silla fija	13	7	53,8%	6	7	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija con brazos	23	2	8,7%	21	2	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas	11	10	90,9%	1	10	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas alta	2	0	0,0%	2		-		-		-
Silla giratoria con ruedas alta	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0,0%		0,0%
Sillas modulares	15	0	0,0%	15		-		-		-
Sillón reclinable completo	10	8	80,0%	2	8	100,0%		0,0%		0,0%
Soporte de agua para lavado de sonda de aspiración	8	7	87,5%	1	7	100,0%		0,0%		0,0%
Soporte para monitor	8	0	0,0%	8		-		-		-
Soporte para posters de campañas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Sujeta toallas de ducha	2	0	0,0%	2		-		-		-
Taburete de acero inoxidable con ruedas	73	2	2,7%	71	2	100,0%		0,0%		0,0%
Taburete de acero inoxidable sin ruedas	9	4	44,4%	5	4	100,0%		0,0%		0,0%
Taburete fijo de 60 cm.	4	0	0,0%	4		-		-		-
Taburete giratorio con ruedas	8	32	100,0%	0	32	100,0%		0,0%		0,0%
Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	9	9	100,0%	0	9	100,0%		0,0%		0,0%
% de incumplimiento			64,5%			100,0%		0,0%		0,0%

URGENCIAS

1. Contextualización de área

La unidad de Urgencias ha sufrido cambios y redistribuciones respecto al Anexo VI del PCAP los cuales se muestran a continuación:

- Se encuentran 4 boxes de exploración pediátrica respecto a los 2 establecidos en el Anexo VI.
- No existe la “Sala Sillones de Observación y Espera”.
- El box exploración “agitados” (box 14) se utiliza como despacho (no operativo).
- Se auditaron 2 zonas limpias y 2 zonas sucias, una adicional de cada una según lo establecido en el Anexo VI.
- La sala de reuniones se utiliza como despacho médico.

2. Análisis de Incidencias

Se han encontrado las siguientes incidencias en la unidad de urgencias:

- El 77,5% de los armarios vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm se encuentran rotos (31 unidades).
- El 5,6% de las camillas de urgencias con barandillas se encuentran rotas (1 unidad).
- El 42,9% de los colgadores murales individuales se encuentran rotos (6 unidades).
- El 82,6% de los cubos de basura con pedal 12L se encuentran rotos (19 unidades).
- No se ha encontrado el siguiente equipamiento: abrazadera en pared (elemento fijo), accesorios de ducha (elemento fijo), ala de 1 m. para mesa, armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas, aspirador y contenedor, balas de oxígeno, biombos de 2-3 cuerpos, cafetera eléctrica, carro de historias clínicas, carro de parada, expositor de folletos, grúa para pacientes, litera de exploración fija de madera, mostrador de información de 200-240 cm, mostrador de recepción de 120-140 cm, nevera de 150 L, papelera con tapa basculante de 50L, regulador de vacío, reloj de pared con fecha, repisa para elementos de aseo (elemento fijo), sillas de ruedas plegables, sillón reclinable completo y torre de dispensación de documentos de 15 huecos

Armario vitrina colgado de 80x90x35 cm. (Sin cristal). Ubicación: Planta baja.



A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en la unidad de Urgencias, donde el porcentaje de incumplimiento es del 44,4%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	URGENCIAS

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Abrazadera en pared (elemento fijo)	4	0	0,0%	4		-		-		-
Accesorios de ducha (elemento fijo)	4	0	0,0%	4		-		-		-
Ala de 1 m. para mesa	2	0	0,0%	2		-		-		-
Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	2	0	0,0%	2		-		-		-
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	13	6	46,2%	7	6	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Armario ropero modular	20	20	100,0%	0	20	100,0%		0,0%		0,0%
Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	35	40	100,0%	0	9	22,5%	31	77,5%		0,0%
Aspirador y contenedor	8	0	0,0%	8		-		-		-
Balas de oxígeno	6	0	0,0%	6		-		-		-
Banco de vestidor	4	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Barra soporte lateral pared	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Báscula de pie con altímetro	3	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Biombos de 2-3 cuerpos	6	0	0,0%	6		-		-		-
Botella	4	6	100,0%	0	6	100,0%		0,0%		0,0%
Cafetera eléctrica	1	0	0,0%	1		-		-		-
Cajonera colgante de dos cajones	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera de mostrador	6	2	33,3%	4	2	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera de tres cajones con ruedas	5	7	100,0%	0	7	100,0%		0,0%		0,0%
Cama clínica eléctrica	12	18	100,0%	0	18	100,0%		0,0%		0,0%
Camilla de exploración de tres cuerpos	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Camilla de urgencias con barandillas	30	18	60,0%	12	17	94,4%	1	5,6%		0,0%
Carro auxiliar de yesos	1	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de curas con cajones	31	38	100,0%	0	38	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de historias clínicas	2	0	0,0%	2		-		-		-
Carro de lencería	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de limpieza	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de parada	1	0	0,0%	1		-		-		-
Carro de transporte de ropa sucia	7	4	57,1%	3	4	100,0%		0,0%		0,0%
Caudalímetro 02 con humidificador	49	42	85,7%	7	42	100,0%		0,0%		0,0%
Colchones de látex para cama clínica	12	18	100,0%	0	18	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador mural individual	43	14	32,6%	29	8	57,1%	6	42,9%		0,0%
Colgador mural múltiple (módulo)	11	1	9,1%	10	1	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador para ropero	60	0	0,0%	60		-		-		-

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	URGENCIAS

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	3	2	66,7%	1	2	100,0%		0,0%		0,0%
Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	30	25	83,3%	5	25	100,0%		0,0%		0,0%
Cortina para box de urgencias	22	27	100,0%	0	27	100,0%		0,0%		0,0%
Cortinaje de ducha	4	1	25,0%	3	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cuadro decoración pared	18	10	55,6%	8	10	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura 100L	3	2	66,7%	1	2	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura 50L	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 12L	73	23	31,5%	50	4	17,4%	19	82,6%		0,0%
Cubo de basura con pedal 5L	12	12	100,0%	0	12	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con tapa basculante de 50L	4	6	100,0%	0	6	100,0%		0,0%		0,0%
Cuña de acero inoxidable	4	0	0,0%	4		-		-		-
Dispensador de jabón	55	62	100,0%	0	62	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	16	25	100,0%	0	25	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de toallas de papel	43	48	100,0%	0	48	100,0%		0,0%		0,0%
Escabel	31	27	87,1%	4	27	100,0%		0,0%		0,0%
Escobilla WC	4	2	50,0%	2	2	100,0%		0,0%		0,0%
Esfigmomanómetro de mercurio de pared	56	18	32,1%	38	18	100,0%		0,0%		0,0%
Espejo encastrado (elemento fijo)	16	20	100,0%	0	20	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería de 180 x 100 cm. Y 8 estantes	9	16	100,0%	0	16	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería de pared de 3 estantes	1	5	100,0%	0	5	100,0%		0,0%		0,0%
Expositor de folletos	4	0	0,0%	4		-		-		-
Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	29	10	34,5%	19	10	100,0%		0,0%		0,0%
Frigorífico 300L	1	5	100,0%	0	5	100,0%		0,0%		0,0%
Frigorífico 80L	1	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Gavetas para material fungible	26	31	100,0%	0	31	100,0%		0,0%		0,0%
Grúa para pacientes	1		0,0%	1		-		-		-
Horno microondas empotrado	2	5	100,0%	0	5	100,0%		0,0%		0,0%
Jardinera	13	1	7,7%	12	1	100,0%		0,0%		0,0%
Lavabo con repisa (elemento fijo)	16	29	100,0%	0	29	100,0%		0,0%		0,0%
Litera de exploración fija de madera	1	0	0,0%	1		-		-		-
Litera ginecológica convertible	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa auxiliar Mayo	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa cigüeña para comer	38	26	68,4%	12	26	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	8	13	100,0%	0	13	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0,0%		0,0%
Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	17	3	17,6%	14	3	100,0%		0,0%		0,0%
Mesita de noche clínica	12	24	100,0%	0	24	100,0%		0,0%		0,0%
Mostrador de control de 250 cm	1	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Mostrador de información de 200-240 cm.	1	0	0,0%	1		-		-		-
Mostrador de recepción de 120-140 cm.	1	0	0,0%	1		-		-		-
Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Negatoscopio de dos cuerpos	3	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Negatoscopio de tres cuerpos	30	21	70,0%	9	21	100,0%		0,0%		0,0%
Nevera de 150 L	1	0	0,0%	1		-		-		-
Palangana con soporte y ruedas	4	0	0,0%	4		-		-		-
Palangana de aseo metálica	4	0	0,0%	4		-		-		-
Papelera	19	30	100,0%	0	30	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera con tapa basculante de 25L	4	3	75,0%	1	3	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera con tapa basculante de 50L	2	0	0,0%	2		-		-		-
Perchero de pie	5	3	60,0%	2	3	100,0%		0,0%		0,0%
Pizarra para rotulador de pared	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0,0%		0,0%
Plafón de avisos	1	7	100,0%	0	7	100,0%		0,0%		0,0%
Portasuero adaptable a la litera	43	40	93,0%	3	40	100,0%		0,0%		0,0%
Poyatas (Equipamiento fijo)	34	2	5,9%	32	2	100,0%		0,0%		0,0%
Regulador de vacío	8	0	0,0%	8		-		-		-
Reloj de pared con fecha	2	0	0,0%	2		-		-		-
Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	16	0	0,0%	16		-		-		-
Secamanos eléctrico	8	12	100,0%	0	12	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija	16	14	87,5%	2	14	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija con brazos	24	14	58,3%	10	14	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas	11	23	100,0%	0	23	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con ruedas alta	6	1	16,7%	5	1	100,0%		0,0%		0,0%
Sillas de ruedas plegables	8	0	0,0%	8		-		-		-
Sillas modulares	112	166	100,0%	0	166	100,0%		0,0%		0,0%
Sillón reclinable completo	10	0	0,0%	10		-		-		-
Sillones ergonómicos para paciente	8	11	100,0%	0	11	100,0%		0,0%		0,0%
Soporte brazo con pie	26	9	34,6%	17	9	100,0%		0,0%		0,0%
Soporte para posters de campañas	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0,0%		0,0%
Sujeta toallas de ducha	8	4	50,0%	4	4	100,0%		0,0%		0,0%
Taburete fijo de 60 cm.	7	1	14,3%	6	1	100,0%		0,0%		0,0%
Taburete giratorio con ruedas	91	26	28,6%	65	25	96,2%	1	3,8%		0,0%
Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	0	0,0%	1		-		-		-
% de incumplimiento			44,4%			97,6%		2,4%		0,0%

UNIDAD DE CONSULTAS EXTERNAS

1. Contextualización de área

El área corresponde con la ubicación sobre el plano y con la función definida en el Anexo VI del PCAP. Sin embargo, se encontraron las siguientes modificaciones:

- No se encuentra el despacho de supervisión.
- Una zona polivalente de personal se corresponde con una consulta de nefrología.
- En la unidad de psiquiatría, se reduce de manera sensible el mobiliario de las habitaciones y aseos, por razones de seguridad.

2. Análisis de Incidencias

Se han encontrado las siguientes incidencias en la unidad de consultas externas:

- Se han encontrado 24 negatoscopios de 2 cuerpos en lugar de negatoscopios de 3 cuerpos como se establece en el Anexo VI.
- El 3,3% de los armarios vitrina colgados de 80 x 90 x 35 cm se encuentran deteriorados (2 unidades).
- El 60,0% de los cubos de basura con pedal 12L se encuentran rotos (3 unidades).
- El 1,0% de los cubos dispensadores de jabón se encuentran rotos (1 unidad).
- El 55,6% de las papeleras con tapa basculante de 50L se encuentran rotas (5 unidades).
- No se ha encontrado el siguiente mobiliario: armario altura 200 x 80 x 40 cm. con estantería y archivador, cafetera eléctrica, cajonera de tres cajones con ruedas, camilla de transporte de pacientes, carro de lencería, carro de limpieza, carro de transporte de ropa sucia, cubo de basura con tapa basculante de 50L, estantería de pared de 3 estantes, gavetas para material fungible, horno microondas empotrado, jardinera, nevera de 150 L, reloj de pared con fecha, repisa para elementos de aseo (elemento fijo) y taburete fijo de 60 cm.

Negatoscopio de 2 cuerpos.



Dispensador de jabón roto.



A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en la unidad de Consultas Externas, donde el porcentaje de incumplimiento es del 48,7%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	CONSULTAS EXTERNAS

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	13	8	61,5%	5	8	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 200 X 80 x 40 cm. Con estantería y archivador	1	0	0,0%	1		-		-		-
Armario ropero modular	72	94	100,0%	0	94	100,0%		0,0%		0,0%
Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	135	61	45,2%	74	59	96,7%		0,0%	2	3,3%
Banco de vestidor	8	9	100,0%	0	9	100,0%		0,0%		0,0%
Barra soporte lateral pared	10	9	90,0%	1	9	100,0%		0,0%		0,0%
Báscula de pie con altímetro	67	31	46,3%	36	31	100,0%		0,0%		0,0%
Butaca de extracciones con sujeta brazos	8	1	12,5%	7	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cafetera eléctrica	2	0	0,0%	2		-		-		-
Cajonera colgante de dos cajones	68	9	13,2%	59	9	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera de mostrador	13	9	69,2%	4	9	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera de tres cajones con ruedas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Camilla de transporte de pacientes	2	0	0,0%	2		-		-		-
Carro auxiliar pequeño 60 x 40 x 85	8	1	12,5%	7	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de curas con cajones	67	33	49,3%	34	33	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de lencería	2	0	0,0%	2		-		-		-
Carro de limpieza	2	0	0,0%	2		-		-		-
Carro de transporte de ropa sucia	28	0	0,0%	28		-		-		-
Colgador mural individual	36	31	86,1%	5	31	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador mural múltiple (módulo)	24	6	25,0%	18	6	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador para ropero	216	0	0,0%	216		-		-		-
Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	68	59	86,8%	9	59	100,0%		0,0%		0,0%
Conjunto lineal de asientos y mesitas	34	34	100,0%	0	34	100,0%		0,0%		0,0%
Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	40	18	45,0%	22	18	100,0%		0,0%		0,0%
Cortinaje de exploración	68	52	76,5%	16	52	100,0%		0,0%		0,0%
Cuadro decoración pared	5	32	100,0%	0	32	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 12L	112	5	4,5%	107	2	40,0%	3	60,0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 50L	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 5L	36	30	83,3%	6	30	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con tapa basculante de 50L	10	0	0,0%	10		-		-		-
Dispensador de jabón	114	98	86,0%	16	97	99,0%	1	1,0%		0,0%
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	36	46	100,0%	0	46	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de toallas de papel	80	63	78,8%	17	63	100,0%		0,0%		0,0%
Escabel	68	50	73,5%	18	50	100,0%		0,0%		0,0%
Esfigmomanómetro de mercurio de pared	72	41	56,9%	31	41	100,0%		0,0%		0,0%
Espejo encastrado (elemento fijo)	32	33	100,0%	0	33	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería de 180 x 100 cm. Y 8 estantes	8	18	100,0%	0	18	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería de pared de 3 estantes	2	0	0,0%	2		-		-		-
Expositor de folletos	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Foco de exploración de pie	76	44	57,9%	32	44	100,0%		0,0%		0,0%
Gavetas para material fungible	1	0	0,0%	1		-		-		-
Horno microondas empotrado	2	0	0,0%	2		-		-		-
Jardinera	4	0	0,0%	4		-		-		-
Juego de bandejas	75	5	6,7%	70	5	100,0%		0,0%		0,0%
Juego estándar de curas	198	43	21,7%	155	43	100,0%		0,0%		0,0%
Lavabo con repisa (elemento fijo)	42	44	100,0%	0	44	100,0%		0,0%		0,0%
Litera de exploración	67	64	95,5%	3	64	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	69	63	91,3%	6	63	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
ML de guia para cortinas de zonas clínicas	272	49	18,0%	223	49	100,0%		0,0%		0,0%
Mostrador de información de 200-240 cm.	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Mostrador de recepción de 200-240 cm.	11	11	100,0%	0	11	100,0%		0,0%		0,0%
Negatoscopio de tres cuerpos	68	31	45,6%	37	31	100,0%		0,0%		0,0%
Nevera de 150 L	2	0	0,0%	2		-		-		-
Oscilometro con brazal de pierna	66	27	40,9%	39	27	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera	83	107	100,0%	0	107	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera con tapa basculante de 50L	8	9	100,0%	0	4	44,4%		0,0%	5	55,6%
Papelera para sala de espera	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0,0%		0,0%
Perchero de pie	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0,0%		0,0%
Perchero mural múltiple (módulo)	68	43	63,2%	25	43	100,0%		0,0%		0,0%
Pizarra para rotulador de pared	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Poyatas (Equipamiento fijo)	81	45	55,6%	36	45	100,0%		0,0%		0,0%

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	CONSULTAS EXTERNAS

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Reloj de pared con fecha	12	0	0,0%	12		-		-		-
Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	22	0	0,0%	22		-		-		-
Secamanos eléctrico	34	33	97,1%	1	33	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija	136	94	69,1%	42	94	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija con brazos	16	7	43,8%	9	7	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas	71	68	95,8%	3	68	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas alta	22	10	45,5%	12	10	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con ruedas alta	12	2	16,7%	10	2	100,0%		0,0%		0,0%
Sillas de ruedas plegables	6	6	100,0%	0	6	100,0%		0,0%		0,0%
Soporte para posters de campañas	2	8	100,0%	0	8	100,0%		0,0%		0,0%
Taburete fijo de 60 cm.	10	0	0,0%	10		-		-		-
Taburete giratorio con ruedas	76	52	68,4%	24	52	100,0%		0,0%		0,0%
TV de 25"	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
% de incumplimiento			48,7%			98,1%		1,0%		0,9%

GABINETES TÉCNICOS

1. Contextualización de área

El área corresponde con la ubicación sobre el plano y con la función definida en el Anexo VI del PCAP. Sin embargo, se encontraron las siguientes modificaciones:

- En Cirugía vascular, no se encuentra la sala dopler vascular periférico.
- En Alergología no se encuentra la sala de test cutáneos. Las pruebas se realizan en las consultas 17 y 20.
- En la zona de Otorrinolaringología sólo hay una sala de audiometría, no 3 como figura en el Anexo VI.
- En la zona de Cardiología según el Anexo VI deberían existir las siguientes salas: 1 sala de monitorización Holter, 2 salas de pruebas de esfuerzo y test de Tilt, 3 salas Electrocardiógrafo y 2 Ecocardiografías. Sin embargo sólo existen: 1 sala de pruebas de esfuerzo y test de Tilt, y 1 sala de ecocardiografía. La electrocardiografía se realiza en consulta.

2. Análisis de Incidencias

En el área de gabinetes técnicos se han detectado las siguientes incidencias:

- El 23,3% de los armarios vitrina colgados de 80 x 90 x 35 cm se encuentran deteriorados (7 unidades) y el 10,0% se encuentran rotos (3 unidades).
- El 6,7% de los conjuntos dispensador-cortador de papel para litera se encuentran deteriorados (1 unidad).
- El 3,4% de los dispensadores de jabón se encuentran rotos (1 unidad).
- El 5,3% de las literas de exploración de tres cuerpos se encuentran deteriorados (1 unidad)
- No se encontraron los siguientes elementos: armario altura 200 X 80 x 40 cm, carro de transporte de ropa sucia, cubo alto con soporte giratorio, litera de exploración fija de madera y portasuero adaptable a la litera.

Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm deteriorado, sin cristal. Ubicación: Planta primera, sala PAAF.



Conjunto dispensador-cortador de papel para litera roto. Ubicación: Planta primera, sala PAAF.



Dispensador de jabón roto. Ubicación: Planta primera, otorrinolaringología.



A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en la unidad de Gabinetes Técnicos, donde el porcentaje de incumplimiento es del 55,1%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	GABINETES TÉCNICOS

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	0	0,0%	2		-		-		-
Armario endoscopia	5	2	40,0%	3	2	100,0%		0,0%		0,0%
Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	65	30	46,2%	35	20	66,7%	3	10,0%	7	23,3%
Báscula de pie con altímetro	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera colgante de dos cajones	42	15	35,7%	27	15	100,0%		0,0%		0,0%
Carro auxiliar de yesos	3	2	66,7%	1	2	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de curas con cajones	3	2	66,7%	1	2	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de transporte de ropa sucia	3	0	0,0%	3		-		-		-
Colgador mural múltiple (módulo)	6	4	66,7%	2	4	100,0%		0,0%		0,0%
Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	40	15	37,5%	25	14	93,3%	1	6,7%		0,0%
Cortinaje de exploración	45	16	35,6%	29	16	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo alto con soporte giratorio	2	0	0,0%	2		-		-		-
Cubo de basura 100L	3	3	100,0%	0	3	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 12L	44	3	6,8%	41	3	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con tapa basculante de 50L	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de jabón	52	29	55,8%	23	28	96,6%	1	3,4%		0,0%
Dispensador de toallas de papel	52	32	61,5%	20	32	100,0%		0,0%		0,0%
Escabel	50	16	32,0%	34	16	100,0%		0,0%		0,0%
Esfigmomanómetro de mercurio de pared	51	14	27,5%	37	14	100,0%		0,0%		0,0%
Foco de exploración de pie	45	13	28,9%	32	13	100,0%		0,0%		0,0%
Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0,0%		0,0%
Gavetas para fungible	41	22	53,7%	19	22	100,0%		0,0%		0,0%
Litera de exploración de tres cuerpos	30	19	63,3%	11	18	94,7%		0,0%	1	5,3%
Litera de exploración fija de madera	3	0	0,0%	3		-		-		-
Litera de exploración ginecológica	3	2	66,7%	1	2	100,0%		0,0%		0,0%
Litera de exploración obstétrica	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Litera de exploración urológica	3	3	100,0%	0	3	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	46	27	58,7%	19	27	100,0%		0,0%		0,0%
ML de guia para cortinas de zonas clínicas	181	19	10,5%	162	19	100,0%		0,0%		0,0%
Negatoscopio de tres cuerpos	50	24	48,0%	26	24	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera	48	48	100,0%	0	48	100,0%		0,0%		0,0%
Perchero mural múltiple (módulo)	46	22	47,8%	24	22	100,0%		0,0%		0,0%
Portasuero adaptable a la litera	3	0	0,0%	3		-		-		-
Poyatas (Equipamiento fijo)	48	20	41,7%	28	20	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija	14	3	21,4%	11	3	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas	48	35	72,9%	13	35	100,0%		0,0%		0,0%
Taburete giratorio con ruedas	53	37	69,8%	16	37	100,0%		0,0%		0,0%
% de incumplimiento			55,1%			98,6%		0,6%		0,8%

HOSPITAL DE DÍA MÉDICO

1. Contextualización de área

El área corresponde con la ubicación sobre el plano y con la función definida en el Anexo VI del PCAP. Sin embargo, se encontraron las siguientes modificaciones:

- El despacho de información comparte espacio con la zona de recepción.
- No se encuentra el despacho de supervisión.
- En la zona de recepción dos aseos de personal, son dos vestuarios de personal (masculino y femenino).
- La sala de utensilios de limpieza se utiliza como vestuario de pacientes.

2. Análisis de Incidencias

En el área de Hospital de Día Médico se encontraron las siguientes incidencias:

- El mostrador de información de la zona de recepción no es el que aparece en el Anexo VI. El que aparece en el Anexo VI es de 200-240cm y el existente es de 120cm.
- El 100% de los armarios vitrina colgados de 80 x 90 x 35 cm se encuentran rotos (2 unidades).
- El 100% de las papeleras con tapa basculante de 25L se encuentran deterioradas (2 unidades).
- El 8,3% de las sillas modulares se encuentran deterioradas (3 unidades).
- Ausencia de los siguientes elementos: "tablilla" de historia clínica, accesorios de ducha (elemento fijo), armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas, aspirador y contenedor, barra soporte lateral pared, botella, cajonera colgante de dos cajones, carro de curas de 3 estantes con buzón de deshechos, carro de historias clínicas, conjunto dispensador-cortador de papel para litera, cortinaje de exploración, cubo de basura con pedal 12L, cubo de basura con tapa basculante de 50L, escobilla WC, esfigmomanómetro de mercurio de pared, estantería de pared de 3 estantes, expositor de folletos, fotocopiadoras, frigorífico 300L, frigorífico 80L, jardinera, mostrador de información de 200-240 cm, mueble clínico con doble pila encastrado (elemento fijo), negatoscopio de tres cuerpos, perchero de pie, pizarra para rotulador de pared, plafón de corcho, planning para tarjetas, portasuero doble con ruedas, reloj de pared con fecha, sujeta toallas de ducha, taburete fijo de 60 cm y torre de dispensación de documentos de 15 huecos

Mostrador de información cuyas medidas no se corresponden con el Anexo VI. Ubicación: Planta primera, recepción.



Sillas modulares deterioradas. Ubicación: Planta primera, sala de espera.



A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en el Hospital de Día Médico, donde el porcentaje de incumplimiento es del 54,1%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	HOSPITAL DE DÍA MÉDICO

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
"Tablilla" de Historia Clínica	30	0	0,0%	30		-		-		-
Abrazadera en pared (elemento fijo)	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0,0%		0,0%
Accesorios de ducha (elemento fijo)	3	0	0,0%	3		-		-		-
Almohada	4	8	100,0%	0	8	100,0%		0,0%		0,0%
Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	5	3	60,0%	2	3	100,0%		0,0%		0,0%
Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	9	2	22,2%	7		0,0%	2	100,0%		0,0%
Aspirador y contenedor	1	0	0,0%	1		-		-		-
Barra soporte lateral de pared	1	0	0,0%	1		-		-		-
Báscula de pie con altímetro	1	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Botella	17	0	0,0%	17		-		-		-
Cafetera eléctrica	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera colgante de dos cajones	4	0	0,0%	4		-		-		-
Cajonera de mostrador	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera de tres cajones con ruedas	3	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Cama clínica eléctrica	4	8	100,0%	0	8	100,0%		0,0%		0,0%
Camilla de transporte	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de curas con cajones	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de curas de 3 estantes con buzón de deshechos	1	0	0,0%	1		-		-		-
Carro de historias clínicas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Carro de lencería	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de limpieza	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de transporte de ropa sucia	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Caudalímetro de oxígeno	4	8	100,0%	0	8	100,0%		0,0%		0,0%
Colchón de látex para cama clínica	4	8	100,0%	0	8	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador mural individual	6	2	33,3%	4	2	100,0%		0,0%		0,0%
Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	3	0	0,0%	3		-		-		-
Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	10	53	100,0%	0	53	100,0%		0,0%		0,0%
Cortinaje de exploración	3	0	0,0%	3		-		-		-
Cuadro decoración pared	11	13	100,0%	0	13	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 12L	15	0	0,0%	15		-		-		-
Cubo de basura con pedal 5L	6	11	100,0%	0	11	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1	0	0,0%	1		-		-		-
Cuña de acero inoxidable	15	0	0,0%	15		-		-		-
Cuña de acero inoxidable con soporte	2	0	0,0%	2		-		-		-
Dispensador de jabón	14	10	71,4%	4	10	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	9	6	66,7%	3	6	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de toallas de papel	9	7	77,8%	2	7	100,0%		0,0%		0,0%
Escabel	4	3	75,0%	1	3	100,0%		0,0%		0,0%
Escalera con cinco peldaños y pies aislantes	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Escobilla WC	3	0	0,0%	3		-		-		-
Esfigmomanómetro de mercurio de pared	3	0	0,0%	3		-		-		-
Esfigmomanómetro de pared	4	0	0,0%	4		-		-		-
Esfigmomanómetro portátil	1	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Espejo encastrado (elemento fijo)	9	6	66,7%	3	6	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería de pared de 3 estantes	1	0	0,0%	1		-		-		-
Estantería metálica 5/6 niveles ML	9	8	88,9%	1	8	100,0%		0,0%		0,0%
Expositor de folletos	1	0	0,0%	1		-		-		-
Foco de exploración de pie	3	2	66,7%	1	2	100,0%		0,0%		0,0%
Fotocopiadoras	1	0	0,0%	1		-		-		-
Frigorífico 300L	1	0	0,0%	1		-		-		-
Frigorífico 80L	1	0	0,0%	1		-		-		-
Gavetas para fungible	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	HOSPITAL DE DÍA MÉDICO

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Gavetas para material fungible	1	0	0,0%	1		-		-		-
Horno microondas empotrado	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Jardinera	2	0	0,0%	2		-		-		-
Lavabo con repisa (elemento fijo)	9	6	66,7%	3	6	100,0%		0,0%		0,0%
Litera de exploración	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Litera de exploración con cabecero abatible y ruedas	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa cigüeña para comer	4	8	100,0%	0	8	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	7	3	42,9%	4	3	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	6	6	100,0%	0	6	100,0%		0,0%		0,0%
Mesita de noche clínica	18	23	100,0%	0	23	100,0%		0,0%		0,0%
ML de guia para cortinas de zonas clínicas	12	0	0,0%	12		-		-		-
Mostrador de información de 200-240 cm.	1	0	0,0%	1		-		-		-
Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	1	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Mueble clínico con doble pila encastrado (elemento fijo)	1	0	0,0%	1		-		-		-
Negatoscopio de dos cuerpos	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Negatoscopio de tres cuerpos	3	0	0,0%	3		-		-		-
Nevera de 150 L	1	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Palangana de aseo metálica	3	0	0,0%	3		-		-		-
Panel separador	4	8	100,0%	0	8	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera	12	12	100,0%	0	12	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera con tapa basculante de 25L	4	2	50,0%	2		0,0%		0,0%	2	100,0%
Perchero de pie	3	0	0,0%	3		-		-		-
Perchero mural múltiple (módulo)	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0,0%		0,0%
Pizarra para rotulador de pared	2	0	0,0%	2		-		-		-
Plafón de avisos	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Plafón de corcho	1	0	0,0%	1		-		-		-
Planning para tarjetas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Portasuero doble con ruedas	5	0	0,0%	5		-		-		-
Poyatas (Equipamiento fijo)	8	2	25,0%	6	2	100,0%		0,0%		0,0%
Regulador de vacío	4	8	100,0%	0	8	100,0%		0,0%		0,0%
Reloj de pared con fecha	3	0	0,0%	3		-		-		-
Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	9	1	11,1%	8	1	100,0%		0,0%		0,0%
Secamanos eléctrico	4	2	50,0%	2	2	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija	4	8	100,0%	0	8	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija con brazos	27	20	74,1%	7	20	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas	9	6	66,7%	3	6	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con ruedas alta	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Sillas modulares	30	36	100,0%	0	33	91,7%		0,0%	3	8,3%
Sillón reclinable completo	14	19	100,0%	0	19	100,0%		0,0%		0,0%
Soporte para posters de campañas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Sujeta toallas de ducha	3	0	0,0%	3		-		-		-
Taburete fijo de 60 cm.	3	0	0,0%	3		-		-		-
Taburete giratorio con ruedas	3	2	66,7%	1	2	100,0%		0,0%		0,0%
Taquilla para ropa de paciente	4	9	100,0%	0	9	100,0%		0,0%		0,0%
Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	0	0,0%	1		-		-		-
% de incumplimiento			54,1%			96,8%		1,5%		1,7%

UNIDAD DE DIÁLISIS

1. Contextualización de área

El área corresponde con la ubicación sobre el plano y con la función definida en el Anexo VI del PCAP. Sin embargo se encontraron las siguientes modificaciones:

- No existen las “zonas intermedias”.
- La zona de trabajo personal es utilizada como vestuario del personal.
- Existe un vestuario de personal adicional al Anexo VI.
- La zona de “Recepción, Información, Secretaría” es compartida con la Unidad de Rehabilitación y se encuentra vacía y sin uso.
- En la zona de tratamiento no existe la sala de pacientes aislados

Recepción, Información, Secretaría vacía.



2. Análisis de Incidencias

En la Unidad de Diálisis se han detectado las siguientes incidencias:

- El 86,7% de los cubos de basura con pedal 12L se encuentran deteriorados (13 unidades).
- Ausencia de los siguientes elementos: "tablilla" de historia clínica, armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas, aspirador y contenedor, cajonera de mostrador, carro de curas de 3 estantes con buzón de deshechos, carro de historias clínicas, conjunto dispensador-cortador de papel para litera, cortinaje de exploración, cubo de basura con tapa basculante de 50L, escabel, expositor de folletos, foco de exploración de pie, fotocopiadora, gavetas para material fungible, jardinera, litera de exploración con cabecero abatible y ruedas, mesa telescopada, mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm, mostrador de información de 200-240

cm, mueble clínico encastrado con pileta dos cuerpos (elemento fijo), negatoscopio de tres cuerpos, perchero de pie, perchero mural múltiple (módulo), plafón de corcho, planning para tarjetas, repisa para elementos de aseo (elemento fijo), silla fija con brazos, silla giratoria con ruedas alta, taburete fijo de 60 cm, taburete giratorio con ruedas y torre de dispensación de documentos de 15 huecos.

A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en la Unidad de Diálisis, donde el porcentaje de incumplimiento es del 60,4%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	UNIDAD DE DIÁLISIS

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
"Tablilla" de Historia Clínica	30	0	0,0%	30		-		-		-
Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	2	0	0,0%	2		-		-		-
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0%		0,0%
Armario altura 200 X 80 x 40 cm. Con estantería y archivador	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	4	1	25,0%	3	1	100,0%		0%		0,0%
Aspirador y contenedor	1	0	0,0%	1		-		-		-
Barra soporte lateral pared	1	0	0,0%	1		-		-		-
Báscula de pie con altímetro	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Cafetera eléctrica	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Cajonera colgante de dos cajones	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0%		0,0%
Cajonera de mostrador	2	0	0,0%	2		-		-		-
Cajonera de tres cajones con ruedas	3	3	100,0%	0	3	100,0%		0%		0,0%
Cama clínica eléctrica	10	3	30,0%	7	3	100,0%		0%		0,0%
Carro de curas con cajones	6	8	100,0%	0	8	100,0%		0%		0,0%
Carro de curas de 3 estantes con buzón de deshechos	1	0	0,0%	1		-		-		-
Carro de historias clínicas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Carro de limpieza	1	0	0,0%	1		-		-		-
Carro de transporte de ropa sucia	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0%		0,0%
Colgador mural individual	9	11	100,0%	0	11	100,0%		0%		0,0%
Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	0	0,0%	1		-		-		-
Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	5	1	20,0%	4	1	100,0%		0%		0,0%
Cortinaje de exploración	1	0	0,0%	1		-		-		-
Cuadro decoración pared	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 12L	37	15	40,5%	22	2	13,3%		0%	13	86,7%
Cubo de basura con pedal 5L	9	1	11,1%	8	1	100,0%		0%		0,0%
Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1	0	0,0%	1		-		-		-
Dispensador de jabón	39	18	46,2%	21	18	100,0%		0%		0,0%
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	9	10	100,0%	0	10	100,0%		0%		0,0%
Dispensador de toallas de papel	34	9	26,5%	25	9	100,0%		0%		0,0%
Escabel	1	0	0,0%	1		-		-		-
Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Espejo encastrado (elemento fijo)	9	8	88,9%	1	8	100,0%		0%		0,0%
Estantería de 180 x 100 cm. Y 8 estantes	5	1	20,0%	4	1	100,0%		0%		0,0%
Estantería de pared de 3 estantes	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Expositor de folletos	1	0	0,0%	1		-		-		-
Foco de exploración de pie	1	0	0,0%	1		-		-		-
Fotocopiadora	1	0	0,0%	1		-		-		-
Frigorífico 300L	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Gavetas para material fungible	1	0	0,0%	1		-		-		-
Horno microondas empotrado	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Jardinera	1	0	0,0%	1		-		-		-
Lavabo con repisa (elemento fijo)	9	13	100,0%	0	13	100,0%		0%		0,0%
Litera de exploración con cabecero abatible y ruedas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	4	2	50,0%	2	2	100,0%		0%		0,0%
Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Mesa telescopada	1	0	0,0%	1		-		-		-
Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	3	0	0,0%	3		-		-		-
Mesita de noche clínica	10	3	30,0%	7	3	100,0%		0%		0,0%
ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	0	0,0%	4		-		-		-

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	UNIDAD DE DIÁLISIS

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Mostrador de información de 200-240 cm.	1	0	0,0%	1		-		-		-
Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Mueble clínico con pileta encastrada con grifo monomando	26	3	11,5%	23	3	100,0%		0%		0,0%
Mueble clínico encastrado con pilta dos cuerpos (elemento fijo)	1	0	0,0%	1		-		-		-
Negatoscopio de tres cuerpos	1	0	0,0%	1		-		-		-
Nevera de 150 L	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Papelera	8	7	87,5%	1	7	100,0%		0%		0,0%
Papelera con tapa basculante de 25L	1	2	100,0%	0	2	100,0%		0%		0,0%
Perchero de pie	2	0	0,0%	2		-		-		-
Perchero mural múltiple (módulo)	1	0	0,0%	1		-		-		-
Pizarra para rotulador de pared	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Plafón de avisos	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Plafón de corcho	1	0	0,0%	1		-		-		-
Planning para tarjetas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Poyatas (Equipamiento fijo)	4	1	25,0%	3	1	100,0%		0%		0,0%
Reloj de pared con fecha	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0%		0,0%
Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	9	0	0,0%	9		-		-		-
Secamanos eléctrico	5	4	80,0%	1	4	100,0%		0%		0,0%
Silla fija	6	5	83,3%	1	5	100,0%		0%		0,0%
Silla fija con brazos	10	0	0,0%	10		-		-		-
Silla giratoria con brazos y ruedas	6	4	66,7%	2	4	100,0%		0%		0,0%
Silla giratoria con ruedas alta	2	0	0,0%	2		-		-		-
Sillas modulares	15	1	6,7%	14	1	100,0%		0%		0,0%
Sillón reclinable completo	16	14	87,5%	2	14	100,0%		0%		0,0%
Soporte para posters de campañas	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Taburete fijo de 60 cm.	3	0	0,0%	3		-		-		-
Taburete giratorio con ruedas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	0	0,0%	1		-		-		-
TV de 25"	16	14	87,5%	2	14	100,0%		0%		0,0%
% de incumplimiento			60,4%			98,1%		0,0%		1,9%

UNIDAD DE REHABILITACIÓN

1. Contextualización de área

El área corresponde con la ubicación sobre el plano y con la función definida en el Anexo VI del PCAP. Sin embargo se encontraron las siguientes modificaciones:

- En la sala de espera de la zona de recepción se encuentran dos aseos adaptados en lugar de uno, como establece el Anexo VI.
- La zona de "Recepción, Información, Secretaría" está compartida con la Unidad de Diálisis.
- Los boxes de cinesiterapia son actualmente el gimnasio e hidroterapia.
- Se encuentran 6 boxes de electroterapia en lugar de 5 como establece el Anexo VI (1 box adicional).
- Las salas de rehabilitación cardiorespiratoria y de pruebas funcionales están situadas en la primera planta, a diferencia del resto de la unidad que se encuentra ubicada en la Planta Baja.
- No existe la zona de Baño Galvánico y Tanque Hubbard.
- En la zona de trabajo de personal, la sala de trabajo de fisioterapeutas no existe, en su lugar se encuentra un gimnasio infantil.

2. Análisis de Incidencias

En la unidad de rehabilitación se han detectado las siguientes incidencias:

- El 7,7% de los armarios vitrina colgados de 80 x 90 x 35 cm se encuentran deteriorados (1 unidad).
- El 33,3% de las papeleras con tapa basculante de 50L se encuentran deterioradas (1 unidad).
- El 100% de los soportes para poster de campañas se encuentran deteriorados (1 unidad).
- Mobiliario no encontrado en el área: armario altura 200 x 80 x 40 cm, banco para ducha, cubo de basura con tapa basculante de 50L, esfigmomanómetro de mercurio de pared, jardinera, litera de exploración, mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm, negatoscopio de tres cuerpos, pizarra para rotulador de pared, repisa para elementos de aseo (elemento fijo), y taburete fijo de 60 cm.

Papelera con tapa basculante de 50L deteriorada, tapa rota. Ubicación: Planta baja, vestuario de pacientes femenino.



A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en la unidad de Rehabilitación, donde el porcentaje de incumplimiento es del 47,9%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	UNIDAD DE REHABILITACIÓN

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Armario altura 125 X 80 x 40 cm.	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	0	0,0%	2		-		-		-
Armario altura 200 X 80 x 40 cm. Con estantería y archivador	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Armario ropero modular	60	55	91,7%	5	55	100,0%		0,0%		0,0%
Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	23	13	56,5%	10	12	92,3%		0,0%	1	7,7%
Banco de vestidor	8	4	50,0%	4	4	100,0%		0,0%		0,0%
Banco para ducha	2	0	0,0%	2		-		-		-
Barra soporte lateral pared	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cafetera eléctrica	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera colgante de dos cajones	20	3	15,0%	17	3	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera de mostrador	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera de tres cajones con ruedas	1	8	100,0%	0	8	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de lencería	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de transporte de ropa sucia	4	1	25,0%	3	1	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador mural individual	7	4	57,1%	3	4	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador mural múltiple (módulo)	8	1	12,5%	7	1	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador para ropero	180	0	0,0%	180		-		-		-
Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	19	8	42,1%	11	8	100,0%		0,0%		0,0%
Conjunto encastrado de codina y fregadero (equipamiento fijo)	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Conjunto encastrado de codina y fregadero (obra)	1	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Cortinaje de exploración	19	5	26,3%	14	5	100,0%		0,0%		0,0%
Cuadro decoración pared	3	2	66,7%	1	2	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 12L	28	4	14,3%	24	4	100,0%		0,0%		0,0%

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	UNIDAD DE REHABILITACIÓN

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Cubo de basura con pedal 5L	7	3	42,9%	4	3	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1	0	0,0%	1		-		-		-
Dispensador de jabón	29	17	58,6%	12	17	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	9	7	77,8%	2	7	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de toallas de papel	20	12	60,0%	8	12	100,0%		0,0%		0,0%
Escabel	17	8	47,1%	9	8	100,0%		0,0%		0,0%
Esfigmomanómetro de mercurio de pared	3	0	0,0%	3		-		-		-
Espejo encastrado (elemento fijo)	7	5	71,4%	2	5	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería de pared de 3 estantes	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Foco de exploración de pie	17	7	41,2%	10	7	100,0%		0,0%		0,0%
Gavetas para material fungible	19	14	73,7%	5	14	100,0%		0,0%		0,0%
Horno microondas empotrado	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Jardinera	1	0	0,0%	1		-		-		-
Lavabo con repisa (elemento fijo)	7	5	71,4%	2	5	100,0%		0,0%		0,0%
Litera de exploración	3	0	0,0%	3		-		-		-
Litera de exploración de tres cuerpos	14	11	78,6%	3	11	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	21	12	57,1%	9	12	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Mesas trapezoidales	10	2	20,0%	8	2	100,0%		0,0%		0,0%
Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	3	0	0,0%	3		-		-		-
ML de guia para cortinas de zonas clínicas	28	6	21,4%	22	6	100,0%		0,0%		0,0%
Mostrador de información de 200-240 cm.	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Negatoscopio de tres cuerpos	3	0	0,0%	3		-		-		-
Nevera de 150 L	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera	25	27	100,0%	0	27	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera con tapa basculante de 50L	4	3	75,0%	1	2	66,7%		0,0%	1	33,3%
Perchero de pie	3	2	66,7%	1	2	100,0%		0,0%		0,0%
Perchero mural múltiple (módulo)	19	5	26,3%	14	5	100,0%		0,0%		0,0%
Pizarra para rotulador de pared	2	0	0,0%	2		-		-		-
Poyatas (Equipamiento fijo)	4	1	25,0%	3	1	100,0%		0,0%		0,0%
Reloj de pared con fecha	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	5	0	0,0%	5		-		-		-
Secamanos eléctrico	9	4	44,4%	5	4	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija con brazos	30	22	73,3%	8	22	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas	31	17	54,8%	14	17	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con ruedas alta	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Sillas modulares	20	12	60,0%	8	12	100,0%		0,0%		0,0%
Soporte para posters de campañas	1	1	100,0%	0		0,0%		0,0%	1	100,0%
Sujeta toallas de ducha	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Taburete fijo de 60 cm.	1	0	0,0%	1		-		-		-
Taburete giratorio con ruedas	19	13	68,4%	6	13	100,0%		0,0%		0,0%
% de incumplimiento			47,9%			97,4%		0,0%		2,6%

DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN

1. Contextualización de área

La Unidad de Diagnóstico por la Imagen presenta las siguientes variaciones respecto al Anexo VI del PCAP:

- Sólo hay 5 zonas de mando de las 14 establecidas en el Anexo VI.
- No existe la zona de trabajo administrativo.
- Se encuentran 2 salas de espera ambulatoria no operativas (sin uso).
- La tercera sala de ecografías está en obras.

Sala ecografía 3 (en obras). Ubicación: Planta baja.



Sala de espera ambulatoria sin uso. Ubicación: Planta baja.



2. Análisis de Incidencias

En cuanto a las incidencias del área de Diagnóstico por la Imagen se registran las siguientes:

- No se han encontrado los siguientes elementos: armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas, armario altura 74 x 80 x 40 cm, cafetera eléctrica, cajonera de tres cajones con ruedas, cortinaje de exploración, cubo de basura con pedal 5L, escalera con cinco peldaños y pies aislantes, esfigmomanómetro de mercurio de pared, expositor de folletos, jardinera, mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm, ML de guía para cortinas de zonas clínicas, negatoscopio de tres cuerpos, plafón de corcho, poyata construida en madera de alto 74 cm y 65-70 cm de ancho perimetral a tres lados de la sala (Equipamiento fijo), reloj de pared con fecha, repisa para elementos de aseo (elemento fijo) y soporte para posters de campañas.

A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en la unidad de Diagnóstico por la Imagen, donde el porcentaje de incumplimiento es del 46,2%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL										
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	INCOSA				DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN					
Mobiliario	**Cumplimiento respecto ANEXO VI**				**Estado del mobiliario existente**					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	2	0	0,0%	2		-		-		-
Armario altura 125 X 80 x 40 cm.	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	8	9	100,0%	0	9	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 200 X 80 x 40 cm. Con estantería y archivador	1	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	0	0,0%	1		-		-		-
Barra soporte lateral pared	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cafetera eléctrica	1	0	0,0%	1		-		-		-
Cajonera colgante de dos cajones	4	1	25,0%	3	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera de mostrador	4	5	100,0%	0	5	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera de tres cajones con ruedas	3	0	0,0%	3		-		-		-
Carro de limpieza	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador mural individual	4	1	25,0%	3	1	100,0%		0,0%		0,0%
Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	4	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	20	1	5,0%	19	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cortinaje de exploración	4	0	0,0%	4		-		-		-
Cuadro decoración pared	18	14	77,8%	4	14	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 12L	9	4	44,4%	5	4	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 5L	4	0	0,0%	4		-		-		-
Dispensador de jabón	6	7	100,0%	0	7	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	4	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de toallas de papel	6	5	83,3%	1	5	100,0%		0,0%		0,0%
Escabel	4	2	50,0%	2	2	100,0%		0,0%		0,0%
Escalera con cinco peldaños y pies aislantes	1	0	0,0%	1		-		-		-
Esfigmomanómetro de mercurio de pared	4	0	0,0%	4		-		-		-
Espejo encastrado (elemento fijo)	4	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería de 180 x 100 cm. Y 8 estantes	4	1	25,0%	3	1	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería de pared de 3 estantes	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería metálica 5/6 niveles ML	10	1	10,0%	9	1	100,0%		0,0%		0,0%
Expositor de folletos	6	0	0,0%	6		-		-		-
Foco de exploración de pie	4	1	25,0%	3	1	100,0%		0,0%		0,0%
Horno microondas empotrado	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Jardinera	6	0	0,0%	6		-		-		-
Lavabo con repisa (elemento fijo)	4	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Litera de exploración	4	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	12	13	100,0%	0	13	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	18	0	0,0%	18		-		-		-

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
ML de guia para cortinas de zonas clínicas	16	0	0,0%	16		-		-		-
Mostrador de información de 200-240 cm.	2	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Negatoscopio de cuatro cuerpos	8	1	12,5%	7	1	100,0%		0,0%		0,0%
Negatoscopio de tres cuerpos	4	0	0,0%	4		-		-		-
Nevera de 150 L	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera	30	30	100,0%	0	30	100,0%		0,0%		0,0%
Perchero de pie	4	5	100,0%	0	5	100,0%		0,0%		0,0%
Perchero mural múltiple (módulo)	4	2	50,0%	2	2	100,0%		0,0%		0,0%
Pizarra para rotulador de pared	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Plafón de corcho	1	0	0,0%	1		-		-		-
Poyata construída en madera de alto 74 cm. y 65-70 cm. de ancho, perimetral a tres lados de la sala (Equipamiento fijo)	2	0	0,0%	2		-		-		-
Poyatas (Equipamiento fijo)	5	4	80,0%	1	4	100,0%		0,0%		0,0%
Reloj de pared con fecha	2	0	0,0%	2		-		-		-
Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	4	0	0,0%	4		-		-		-
Secamanos eléctrico	3	3	100,0%	0	3	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija	10	13	100,0%	0	13	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija con brazos	16	24	100,0%	0	24	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas	22	18	81,8%	4	18	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas alta	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Sillas modulares	90	69	76,7%	21	69	100,0%		0,0%		0,0%
Soporte para posters de campañas	6	0	0,0%	6		-		-		-
Taburete giratorio con ruedas	4	7	100,0%	0	7	100,0%		0,0%		0,0%
% de incumplimiento			46,2%			100,0%		0,0%		0,0%

UNIDAD DE LABORATORIOS

1. Contextualización de área

La Unidad de Laboratorios, presenta las siguientes variaciones respecto al Anexo VI del PCAP:

- Un laboratorio de control de coagulación está dentro de la zona de banco de sangre (Planta Baja).
- La sala de espera del laboratorio se utiliza como sala de recuperación.

2. Análisis de Incidencias

En la Unidad de Laboratorios no se han encontrado los siguientes elementos: armario altura 200 x 80 x 40 cm, cafetera eléctrica, cajonera de mostrador, cajonera de tres cajones con ruedas, colgador mural individual, conjunto lineal de asientos y mesitas, contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm, cubo de basura con pedal 12L, cubo de basura con pedal 50L, cubo de basura con pedal 5L, dispensador de jabón, dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m., dispensador de toallas de papel, escalera con cinco peldaños y pies aislantes, espejo encastrado (elemento fijo), estantería metálica 5/6 niveles ML, expositor de folletos, horno microondas empotrado, jardinera, lavabo con repisa (elemento fijo), mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm, mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas), mostrador de recepción de 200-240 cm, nevera de 150 L, papelera para sala de espera, perchero de pie, pizarra para rotulador de pared, poyatas (equipamiento fijo), reloj de pared con fecha, repisa para elementos de aseo (elemento fijo), secamanos eléctrico, silla fija con brazos, silla giratoria con brazos y ruedas y soporte para posters de campañas.

A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en la unidad de Laboratorios, donde el porcentaje de incumplimiento es del 88,9%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	LABORATORIOS

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	0	0,0%	2		-		-		-
Cafetera eléctrica	1	0	0,0%	1		-		-		-
Cajonera de mostrador	2	0	0,0%	2		-		-		-
Cajonera de tres cajones con ruedas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Colgador mural individual	9	0	0,0%	9		-		-		-
Conjunto lineal de asientos y mesitas	24	0	0,0%	24		-		-		-
Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	10	0	0,0%	10		-		-		-
Cuadro decoración pared	6	6	100,0%	0	6	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 12L	9	0	0,0%	9		-		-		-
Cubo de basura con pedal 50L	2	0	0,0%	2		-		-		-
Cubo de basura con pedal 5L	9	0	0,0%	9		-		-		-
Dispensador de jabón	9	0	0,0%	9		-		-		-
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	9	0	0,0%	9		-		-		-
Dispensador de toallas de papel	5	0	0,0%	5		-		-		-
Escalera con cinco peldaños y pies aislantes	1	0	0,0%	1		-		-		-
Espejo encastrado (elemento fijo)	9	0	0,0%	9		-		-		-
Estantería metálica 5/6 niveles ML	8	0	0,0%	8		-		-		-
Expositor de folletos	2	0	0,0%	2		-		-		-
Horno microondas empotrado	1	0	0,0%	1		-		-		-
Jardinera	3	0	0,0%	3		-		-		-
Lavabo con repisa (elemento fijo)	9	0	0,0%	9		-		-		-
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	0	0,0%	1		-		-		-
Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	0	0,0%	1		-		-		-
Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	3	3	100,0%	0	3	100,0%		0,0%		0,0%
Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1	0	0,0%	1		-		-		-
Nevera de 150 L	1	0	0,0%	1		-		-		-
Papelera	4	2	50,0%	2	2	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera para sala de espera	2	0	0,0%	2		-		-		-
Perchero de pie	2	0	0,0%	2		-		-		-
Pizarra para rotulador de pared	1	0	0,0%	1		-		-		-
Poyatas (Equipamiento fijo)	4	0	0,0%	4		-		-		-
Reloj de pared con fecha	1	0	0,0%	1		-		-		-
Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	9	0	0,0%	9		-		-		-
Secamanos eléctrico	4	0	0,0%	4		-		-		-
Silla fija	2	3	100,0%	0	3	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija con brazos	8	0	0,0%	8		-		-		-
Silla giratoria con brazos y ruedas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Sillas modulares	15	12	80,0%	3	12	100,0%		0,0%		0,0%
Soporte para posters de campañas	2	0	0,0%	2		-		-		-
Taburete giratorio alto con respaldo	8	1	12,5%	7	1	100,0%		0,0%		0,0%
% de incumplimiento			88,9%			100,0%		0,0%		0,0%

FARMACIA

1. Contextualización de área

La unidad de Farmacia corresponde con la ubicación sobre el plano y con la función definida en el Anexo VI del PCAP. Presenta las siguientes variaciones sobre el Anexo VI del PCAP:

- No existen los 2 aseos públicos establecidos en el Anexo VI del PCAP.
- La zona de recepción de mercancías y la zona de dispensación ambulatoria comparten el mismo espacio.

2. Análisis de Incidencias

En cuanto a las incidencias del área de Farmacia se registran las siguientes:

- El 33,3% de los colgadores murales individuales se encuentran rotos (1 unidad).

- No se encuentran los siguientes elementos: armario ropero modular, cajonera de mostrador, carros nodriza, colgador mural múltiple (módulo), cuadro decoración pared, cubo de basura con pedal 12L, cubo de basura con pedal 50L, depósito de alcohol, escalera con cinco peldaños y pies aislantes, escalera con tres peldaños y pies aislantes, expositor de folletos, fotocopiadora, jardinera, mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas), mostrador de recepción de 200-240 cm, papelera con tapa basculante de 50L, reloj de pared con fecha, repisa para elementos de aseo (elemento fijo), soporte para posters de campañas y taburete giratorio alto con respaldo.

A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en la unidad de Farmacia, donde el porcentaje de incumplimiento es del 45,0%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	FARMACIA

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Almacenable en pales	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	6	6	100,0%	0	6	100,0%		0,0%		0,0%
Armario ropero modular	9	9	100,0%	18	9	100,0%		0,0%		0,0%
Banco de vestidor	1	3	100,0%	0	3	100,0%		0,0%		0,0%
Cafetera eléctrica	1	1	100,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera colgante de dos cajones	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera de mostrador	2	0	0,0%	0		-		-		-
Cajonera de tres cajones con ruedas	3	6	100,0%	0	6	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de limpieza	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de transporte de ropa sucia	2	1	50,0%	3	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carros nodriza	3	0	0,0%	15		-		-		-
Colgador mural individual	2	3	100,0%	2	2	66,7%	1	33,3%		0,0%
Colgador mural múltiple (módulo)	3	0	0,0%	5		-		-		-
Colgador para ropero	27	0	0,0%	54		-		-		-
Cuadro decoración pared	3	0	0,0%	3		-		-		-
Cubo de basura con pedal 12L	2	0	0,0%	4		-		-		-
Cubo de basura con pedal 50L	2	0	0,0%	1		-		-		-
Cubo de basura con pedal 5L	2	2	100,0%	2	2	100,0%		0,0%		0,0%
Depósito de alcohol	1	0	0,0%	1		-		-		-
Dispensador de jabón	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	2	3	100,0%	0	3	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de toallas de papel	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Escalera con cinco peldaños y pies aislantes	1	0	0,0%	1		-		-		-
Escalera con tres peldaños y pies aislantes	1	0	0,0%	1		-		-		-
Espejo encastrado (elemento fijo)	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Estación de picking	1	1	100,0%	5	1	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería de pared de 3 estantes	1	1	100,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería metálica 5/6 niveles ML	7	8	100,0%	0	8	100,0%		0,0%		0,0%
Expositor de folletos	1	0	0,0%	1		-		-		-
Fotocopiadora	1	0	0,0%	0		-		-		-
Horno microondas empotrado	1	1	100,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Jardinera	1	0	0,0%	1		-		-		-
Lavabo con repisa (elemento fijo)	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa de preparación 200 x 100 x 80 cm.	1	1	100,0%	5	1	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	6	8	100,0%	0	8	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	0	0,0%	0		-		-		-
Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	2	1	50,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Modulos compactos de farmacia completos	8	13	100,0%	7	13	100,0%		0,0%		0,0%
Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1	0	0,0%	0		-		-		-
Nevera de 150 L	1	1	100,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera	8	9	100,0%	2	9	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera con tapa basculante de 50L	1	0	0,0%	2		-		-		-
Perchero de pie	2	1	50,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Pizarra para rotulador de pared	1	0	0,0%	0		-		-		-
Plafón de corcho	1	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Poyatas (Equipamiento fijo)	4	3	75,0%	0	3	100,0%		0,0%		0,0%
Reloj de pared con fecha	1	0	0,0%	3		-		-		-
Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	2	0	0,0%	4		-		-		-
Silla fija	5	5	100,0%	4	5	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija con brazos	8	3	37,5%	0	3	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas	5	8	100,0%	0	8	100,0%		0,0%		0,0%
Sillas modulares	10	6	60,0%	8	6	100,0%		0,0%		0,0%
Soporte para posters de campañas	1	0	0,0%	1		-		-		-
Taburete giratorio alto	4	2	50,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Taburete giratorio alto con respaldo	2	0	0,0%	6		-		-		-
% de incumplimiento			45,0%			99,0%		1,0%		0,0%

SOPORTE MÉDICO

1. Contextualización de área

La unidad de Soporte Médico presenta las siguientes variaciones sobre el Anexo VI del PCAP:

- Las 4 secretarías médicas están sin equipamiento.
- No se encuentran los 4 aseos de personal establecidos en el Anexo VI.

Secretaría de soporte médico vacía. Ubicación: Planta segunda.



2. Análisis de Incidencias

En cuanto a las incidencias del área de Soporte Médico se registran las siguientes:

- El 11,1% del cortinaje de ducha se encuentra deteriorado (2 unidades).
- El 11,1% de luces para mesita de noche se encuentran deterioradas (2 unidades).
- El 11,1% de las mesitas de noche se encuentran deterioradas (2 unidades).
- El 1,3% de las sillas fijas con brazos se encuentran deterioradas (1 unidad).
- El 11,1% de sujeta toallas de ducha se encuentran rotos (2 unidades).
- No se encuentran los siguientes elementos: cafetera exprés de una salida, dispensador de toallas de papel, espejo encastrado (elemento fijo), frigorífico 80L, lavabo con repisa (elemento fijo), mesa rectangular baja 120 x 60, paragüero, plafón de corcho, repisa para elementos de aseo (elemento fijo), soporte elevado para TV y TV de 25"

A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en la unidad de Soporte Médico, donde el porcentaje de incumplimiento es del 42,0%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	SOPORTE MÉDICO

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Ala de 1 m. para mesa	8	1	12,5%	7	1	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	81	109	100,0%	0	109	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	7	3	42,9%	4	3	100,0%		0,0%		0,0%
Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm.	18	18	100,0%	0	18	100,0%		0,0%		0,0%
Asiento modular confortable	6	2	33,3%	4	2	100,0%		0,0%		0,0%
Cafetera expres de una salida	1	0	0,0%	1		-		-		-
Cajonera de tres cajones con ruedas	72	86	100,0%	0	86	100,0%		0,0%		0,0%
Cama individual	18	18	100,0%	0	18	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de lencería	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de limpieza	1	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador mural individual	22	18	81,8%	4	18	100,0%		0,0%		0,0%
Cortinaje de ducha	18	18	100,0%	0	16	88,9%		0,0%	2	11,1%
Cubo de basura con pedal 12L	23	1	4,3%	22	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 5L	4	18	100,0%	0	18	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de jabón	22	18	81,8%	4	18	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	22	18	81,8%	4	18	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de toallas de papel	4	0	0,0%	4		-		-		-
Espejo encastrado (elemento fijo)	4	0	0,0%	4		-		-		-
Estantería de pared de 3 estantes	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Frigorífico 80L	1	0	0,0%	1		-		-		-
Lavabo con repisa (elemento fijo)	4	0	0,0%	4		-		-		-
Luz para mesita de noche	18	18	100,0%	0	16	88,9%		0,0%	2	11,1%
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	90	121	100,0%	0	121	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa rectangular baja 120 x 60	1	0	0,0%	1		-		-		-
Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	8	5	62,5%	3	5	100,0%		0,0%		0,0%
Mesita de noche	18	18	100,0%	0	16	88,9%		0,0%	2	11,1%
Papelera	80	94	100,0%	0	94	100,0%		0,0%		0,0%
Paragüero	1	0	0,0%	1		-		-		-
Perchero de pie	9	2	22,2%	7	2	100,0%		0,0%		0,0%
Pizarra para rotulador de pared	8	7	87,5%	1	7	100,0%		0,0%		0,0%
Plafón de corcho	4	0	0,0%	4		-		-		-
Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	4	0	0,0%	4		-		-		-
Silla fija	80	113	100,0%	0	113	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija con brazos	82	76	92,7%	6	75	98,7%		0,0%	1	1,3%
Silla giratoria con brazos y ruedas	72	90	100,0%	0	90	100,0%		0,0%		0,0%
Soporte elevado para TV	1	0	0,0%	1		-		-		-
Sujeta toallas de ducha	18	18	100,0%	0	16	88,9%	2	11,1%		0,0%
TV de 25"	1	0	0,0%	1		-		-		-
% de incumplimiento			42,0%			98,4%		0,4%		1,2%

GESTIÓN DE PACIENTES

1. Contextualización de área

La Unidad de Gestión de Pacientes presenta las siguientes variaciones sobre el Anexo VI del PCAP:

- En la Zona de Caja, no existe la sala de Caja Fuerte, ni el Área de trabajo.
- La Zona de Duelo es utilizada como guardería, por tanto no existen las salas establecidas en el Anexo VI: 1 sala de Recepción, 3 Salas de túmulo y 3 Salas de familiares.
- En la zona de autopsias, solamente se encuentran 2 Puestos de sala de autopsias de los 3 que aparecen en el Anexo VI. Uno de ellos es utilizado para autopsias y el otro es utilizado para la preparación de cadáveres.

2. Análisis de Incidencias

En cuanto a las incidencias del área de Gestión de Pacientes se registran las siguientes:

- Ausencia de los siguientes elementos: carro de transporte de ropa sucia, cuadro decoración pared, escalera con tres peldaños y pies aislantes, jardinera, litera para transporte de cadáveres, mamparas separadoras, mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm, negatoscopio de tres cuerpos, palangana con soporte y ruedas, papelera con tapa basculante de 50L, reloj de pared con fecha y repisa para elementos de aseo (elemento fijo).

A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en la unidad de Gestión de pacientes, donde el porcentaje de incumplimiento es del 48,0%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	GESTIÓN DE PACIENTES

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Altar	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Armario altura 125 X 80 x 40 cm.	9	4	44,4%	5	4	100,0%		0%		0,0%
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	11	10	90,9%	1	10	100,0%		0%		0,0%
Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm.	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Armario modular 200x40x100 cms	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0%		0,0%
Armario ropero modular	6	1	16,7%	5	1	100,0%		0%		0,0%
Balanza de 10 kilos	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0%		0,0%
Banco de vestidor	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Barra soporte lateral pared	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0%		0,0%
Cajonera colgante de dos cajones	15	8	53,3%	7	8	100,0%		0%		0,0%
Cajonera de mostrador	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0%		0,0%
Cama individual	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Cámara de cadáveres de 6 cuerpos	6	6	100,0%	0	6	100,0%		0%		0,0%
Carro de transporte de ropa sucia	1	0	0,0%	1		-		-		-
Colgador mural individual	14	6	42,9%	8	6	100,0%		0%		0,0%
Colgador mural múltiple (módulo)	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Colgador para ropero	16	0	0,0%	16		-		-		-
Cortinaje de ducha	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Cuadro decoración pared	8	0	0,0%	8		-		-		-
Cubo de basura con pedal 12L	14	2	14,3%	12	2	100,0%		0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 5L	13	6	46,2%	7	6	100,0%		0%		0,0%
Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Dispensador de jabón	15	10	66,7%	5	10	100,0%		0%		0,0%
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	14	9	64,3%	5	9	100,0%		0%		0,0%
Dispensador de toallas de papel	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0%		0,0%
Escalera con tres peldaños y pies aislantes	1	0	0,0%	1		-		-		-
Espejo encastrado (elemento fijo)	10	6	60,0%	4	6	100,0%		0%		0,0%
Estantería metálica 5/6 niveles ML	5	1	20,0%	4	1	100,0%		0%		0,0%
Expositor de folletos	4	1	25,0%	3	1	100,0%		0%		0,0%
Jardinera	4	0	0,0%	4		-		-		-
Lavabo con repisa (elemento fijo)	10	6	60,0%	4	6	100,0%		0%		0,0%
Litera para transporte de cadáveres	3	0	0,0%	3		-		-		-
Luz para mesita de noche	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Mamparas separadoras	3	0	0,0%	3		-		-		-
Mesa de autopsias	3	1	33,3%	2	1	100,0%		0%		0,0%
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	23	21	91,3%	2	21	100,0%		0%		0,0%
Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	4	0	0,0%	4		-		-		-
Mesita de noche	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Mostrador de recepción de 200-240 cm.	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0%		0,0%
Negatoscopio de tres cuerpos	3	0	0,0%	3		-		-		-
Palangana con soporte y ruedas	3	0	0,0%	3		-		-		-
Papelera	23	20	87,0%	3	20	100,0%		0%		0,0%
Papelera con tapa basculante de 50L	1	0	0,0%	1		-		-		-
Poyatas (Equipamiento fijo)	3	2	66,7%	1	2	100,0%		0%		0,0%
Reloj de pared con fecha	2	0	0,0%	2		-		-		-
Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	10	0	0,0%	10		-		-		-
Secamanos eléctrico	12	6	50,0%	6	6	100,0%		0%		0,0%
Silla fija	28	21	75,0%	7	21	100,0%		0%		0,0%
Silla fija con brazos	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas	19	18	94,7%	1	18	100,0%		0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas alta	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0%		0,0%
Sillas fijas apilables sin brazos	70	65	92,9%	5	65	100,0%		0%		0,0%
Sillas modulares	32	8	25,0%	24	8	100,0%		0%		0,0%
Soporte para posters de campañas	4	1	25,0%	3	1	100,0%		0%		0,0%
Sujeta toallas de ducha	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
% de incumplimiento			48,0%			100,0%		0,0%		0,0%

FORMACIÓN Y DOCENCIA

1. Contextualización de área

La unidad de Formación y Docencia corresponde con la ubicación sobre el plano y con la función definida en el Anexo VI del PCAP. Cabe resaltar que en la zona de Biblioteca no existe la sala de Secretaría.

2. Análisis de Incidencias

En cuanto a las incidencias del área de Formación y Docencia se registran las siguientes:

- Ausencia de los siguientes elementos: cajonera colgante de dos cajones, colgador mural individual, cubo de basura con pedal 12L, cubo de basura con pedal 5L, escalera con tres peldaños y pies aislantes, mesa de biblioteca 160 x 120 x 74 cm. (4 personas) y repisa para elementos de aseo (elemento fijo).

A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en la unidad de Formación y Docencia, donde el porcentaje de incumplimiento es del 36,2%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL										
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	INCOSA				FORMACIÓN Y DOCENCIA					
Mobiliario	**Cumplimiento respecto ANEXO VI**				**Estado del mobiliario existente**					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	10	1	10,0%	9	1	100,0%		0,0%		0,0%
Armario de biblioteca de 200 x 80 x 40 cm de ancho	12	12	100,0%	0	12	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera colgante de dos cajones	4	0	0,0%	4		-		-		-
Cajonera de mostrador	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador mural individual	2	0	0,0%	2		-		-		-
Cubo de basura con pedal 12L	2	0	0,0%	2		-		-		-
Cubo de basura con pedal 5L	2	0	0,0%	2		-		-		-
Dispensador de jabón	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de toallas de papel	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Escalera con tres peldaños y pies aislantes	1	0	0,0%	1		-		-		-
Espejo encastrado (elemento fijo)	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería metálica 5/6 niveles ML	5	5	100,0%	0	5	100,0%		0,0%		0,0%
Lavabo con repisa (elemento fijo)	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa cabecera aula 250 x 90 x 74 cm.	4	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa de biblioteca 160 x 120 x 74 cm. (4 personas)	6	0	0,0%	6		-		-		-
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	4	7	100,0%	0	7	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa de trabajo de 160 x 80 x 74 cm.	22	20	90,9%	2	20	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	5	5	100,0%	0	5	100,0%		0,0%		0,0%
Mostrador de recepción de 120-140 cm.	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Pantalla proyección	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera	21	19	90,5%	2	19	100,0%		0,0%		0,0%
Perchero de pie	15	1	6,7%	14	1	100,0%		0,0%		0,0%
Pizarra para rotulador de pared	17	3	17,6%	14	3	100,0%		0,0%		0,0%
Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	2	0	0,0%	2		-		-		-
Silla fija	76	52	68,4%	24	52	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija con brazos	254	74	29,1%	180	74	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas	4	8	100,0%	0	8	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas alta	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
% de incumplimiento			36,2%			100,0%		0,0%		0,0%

INVESTIGACIÓN

1. Contextualización de área

La unidad de Investigación corresponde con la ubicación sobre el plano y con la función definida en el Anexo VI del PCAP. Cabe resaltar que no existen los 2 aseos de personal que aparecen en dicho Anexo VI.

2. Análisis de Incidencias

En cuanto a las incidencias del área de Investigación se registran las siguientes:

- Ausencia de los siguientes elementos: colgador mural individual, cubo de basura con pedal 12L, cubo de basura con pedal 5L, dispensador de jabón, dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m, dispensador de toallas de papel, espejo encastrado (elemento fijo), lavabo con repisa (elemento fijo), mostrador de información de 200-240 cm, perchero de pie, reloj de pared con fecha y repisa para elementos de aseo (elemento fijo).

A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en la unidad de Investigación, donde el porcentaje de incumplimiento es del 54,9%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL										
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	INCOSA				INVESTIGACIÓN					
Mobiliario	**Cumplimiento respecto ANEXO VI**				**Estado del mobiliario existente**					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	4	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera de mostrador	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera de tres cajones con ruedas	4	1	25,0%	3	1	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador mural individual	2	0	0,0%	2		-		-		-
Cubo de basura con pedal 12L	2	0	0,0%	2		-		-		-
Cubo de basura con pedal 5L	2	0	0,0%	2		-		-		-
Dispensador de jabón	2	0	0,0%	2		-		-		-
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	2	0	0,0%	2		-		-		-
Dispensador de toallas de papel	2	0	0,0%	2		-		-		-
Escalera con tres peldaños y pies aislantes	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Espejo encastrado (elemento fijo)	2	0	0,0%	2		-		-		-
Estantería metálica 5/6 niveles ML	10	1	10,0%	9	1	100,0%		0,0%		0,0%
Lavabo con repisa (elemento fijo)	2	0	0,0%	2		-		-		-
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	4	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa reuniones 350 x 120 x 74 cm. (12 personas)	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Mostrador de información de 200-240 cm.	1	0	0,0%	1		-		-		-
Papelera	6	6	100,0%	0	6	100,0%		0,0%		0,0%
Perchero de pie	1	0	0,0%	1		-		-		-
Pizarra para rotulador de pared	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Reloj de pared con fecha	1	0	0,0%	1		-		-		-
Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	2	0	0,0%	2		-		-		-
Silla fija	4	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija con brazos	12	10	83,3%	2	10	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas	4	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con ruedas alta	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
% de incumplimiento			54,9%			100,0%		0,0%		0,0%

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

1. Contextualización de área

El área corresponde con la ubicación sobre el plano y con la función definida en el Anexo VI del PCAP. Sin embargo, se encontraron las siguientes modificaciones:

- No se encuentran los 4 aseos de personal que aparecen en el Anexo VI.
- Las cuatro salas de Secretarías médicas se encuentran vacías (sin mobiliario).

2. Análisis de Incidencias

En cuanto a las incidencias del área de Administración y Gestión se registra la ausencia de los siguientes elementos: jardinera y mesa de trabajo redonda de 120 cm.

A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en la unidad de Administración y Gestión, donde el porcentaje de incumplimiento es del 18,8%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Ala de 1 m. para mesa	4	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	9	6	66,7%	3	6	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera colgante de dos cajones	3	2	66,7%	1	2	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera de tres cajones con ruedas	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Cuadro decoración pared	4	7	100,0%	0	7	100,0%		0,0%		0,0%
Jardinera	2	0	0,0%	2		-		-		-
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	3	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa de trabajo de 160 x 80 x 74 cm.	2	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa de trabajo redonda de 120 cm.	2	0	0,0%	2		-		-		-
Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	1	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera	5	5	100,0%	0	5	100,0%		0,0%		0,0%
Perchero de pie	3	2	66,7%	1	2	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija	13	14	100,0%	0	14	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas	5	5	100,0%	0	5	100,0%		0,0%		0,0%
Sofá 1 plaza	1	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Sofá 2 plazas	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
% de incumplimiento			18,8%			100,0%		0,0%		0,0%

SOCIAL

1. Contextualización de área

El área se corresponde con la ubicación sobre plano y con la función definida en el Anexo VI del PCAP. Sin embargo, se encontraron las siguientes modificaciones:

- En la zona de Vestuario, existen sólo 7 salas de taquillas, de las 20 salas de taquillas que establece el Anexo VI.
- Hay un aseo completo (con ducha) adicional respecto a lo establecido en el Anexo VI. En total se han auditado 2 aseos completos.

2. Análisis de Incidencias

En cuanto a las incidencias del área de Administración y Gestión se registran las siguientes:

- Ausencia de los siguientes elementos: armario altura 74 x 80 x 40 cm, carro de limpieza, carro de transporte de ropa sucia, cortinaje de ducha, mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas), perchero de pie, repisa para elementos de aseo (elemento fijo), silla fija con brazos y sujeta toallas de ducha.
- El 5,3% de los colgadores murales individuales se encuentran deteriorados (1unidad) y el 21,1% se encuentran rotos (4 unidades).
- El 20,0% de los cubos de basura con pedal 5L se encuentran deteriorados (3 unidades)

A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en la unidad de Social, donde el porcentaje de incumplimiento es del 50,9%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL		
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	**INCOSA**	SOCIAL

Mobiliario	Cumplimiento respecto ANEXO VI				Estado del mobiliario existente					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	7	9	100,0%	0	9	100,0%		0,0%		0,0%
Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	0	0,0%	1		-		-		-
Armario ropero modular	400	457	100,0%	0	394	86,2%		0,0%	63	13,8%
Banco de vestidor	20	35	100,0%	0	35	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera colgante de dos cajones	7	6	85,7%	1	6	100,0%		0,0%		0,0%
Carro de limpieza	1	0	0,0%	1		-		-		-
Carro de transporte de ropa sucia	20	0	0,0%	20		-		-		-
Colgador mural individual	46	19	41,3%	27	14	73,7%	4	21,1%	1	5,3%
Colgador mural múltiple (módulo)	20	19	95,0%	1	19	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador para ropero	800	0	0,0%	800		-		-		-
Cortinaje de ducha	2	0	0,0%	2		-		-		-
Cubo de basura con pedal 12L	44	1	2,3%	43	1	100,0%		0,0%	0	0,0%
Cubo de basura con pedal 5L	44	15	34,1%	29	12	80,0%		0,0%	3	20,0%
Dispensador de jabón	84	19	22,6%	65	19	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	44	21	47,7%	23	21	100,0%		0,0%		0,0%
Espejo encastrado (elemento fijo)	42	13	31,0%	29	13	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería de pared de 3 estantes	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería metálica 5/6 niveles ML	4	4	100,0%	0	4	100,0%		0,0%		0,0%
Lavabo con repisa (elemento fijo)	42	29	69,0%	13	29	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	7	10	100,0%	0	10	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	0	0,0%	1		-		-		-
Papelera	8	8	100,0%	0	8	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera con tapa basculante de 50L	20	10	50,0%	10	10	100,0%		0,0%		0,0%
Perchero de pie	1	0	0,0%	1		-		-		-
Pizarra para rotulador de pared	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0,0%		0,0%
Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	42	0	0,0%	42		-		-		-
Secamanos eléctrico	44	19	43,2%	25	19	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija	7	24	100,0%	0	24	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija con brazos	8		0,0%	8		-		-		-
Silla giratoria con brazos y ruedas	7	8	100,0%	0	8	100,0%		0,0%		0,0%
Sujeta toallas de ducha	2	0	0,0%	2		-		-		-
% de incumplimiento			50,9%			97,1%		1,0%		1,9%

LENCERÍA Y LIMPIEZA

1. Contextualización de área

Las áreas de Lencería y Limpieza se corresponden con la ubicación sobre plano y con la función definida para cada una de ellas en el Anexo VI del PCAP. Sin embargo, se encontraron las siguientes modificaciones:

- No existe zona de trabajo administrativo.
- Existe un despacho dentro del almacén de ropa limpia.
- La zona de útiles y maquinaria se corresponde con el área de lavado de carros.

2. Análisis de Incidencias

En cuanto a las incidencias de las áreas de Lencería y Limpieza se registran las siguientes:

- Ausencia de los siguientes elementos: cajonera colgante de dos cajones, cubo de basura con pedal 12L, cubo de basura con pedal 5L y silla giratoria con brazos y ruedas.

A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en las unidades de Lencería y Limpieza, donde el porcentaje de incumplimiento es del 50,6%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL										
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	INCOSA				LENCERÍA Y LIMPIEZA					
Mobiliario	**Cumplimiento respecto ANEXO VI**				**Estado del mobiliario existente**					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Báscula de suelo	1	2	100,0%	0	2	100,0%		0,0%		0,0%
Cajonera colgante de dos cajones	2	0	0,0%	2		-		-		-
Carro de lencería	20	18	90,0%	2	18	100,0%		0,0%		0,0%
Colgador mural individual	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 12L	2	0	0,0%	2		-		-		-
Cubo de basura con pedal 5L	2	0	0,0%	2		-		-		-
Dispensador de jabón	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Escalera con tres peldaños y pies aislantes	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Estantería metálica 5/6 niveles ML	35	45	100,0%	0	45	100,0%		0,0%		0,0%
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Papelera	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Secamanos eléctrico	2	1	50,0%	1	1	100,0%		0,0%		0,0%
Silla fija	2	3	100,0%	0	3	100,0%		0,0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas	2	0	0,0%	2		-		-		-
% de incumplimiento			50,6%			100,0%		0,0%		0,0%

INFORMÁTICA, RESIDUOS Y SEGURIDAD

1. Contextualización de área

El área se corresponde con la ubicación sobre plano y con la función definida en el Anexo VI del PCAP.

2. Análisis de Incidencias

En cuanto a las incidencias del área de Lencería y Limpieza se registran las siguientes:

- Ausencia de los siguientes elementos: cajonera colgante de dos cajones, cubo de basura con pedal 12L, cubo de basura con pedal 5L y escalera con tres peldaños y pies aislantes.

A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto al Anexo VI en cuanto a: existencia, porcentaje de existencia, y estado del mobiliario existente auditado en las unidades de Informática, Residuos y Seguridad, donde el porcentaje de incumplimiento es del 43,1%.

INSPECCIÓN MOBILIARIO DEL HOSPITAL										
HOSPITAL INFANTA CRISTINA Hospital de Parla. S.A.	INCOSA				INFORMÁTICA, RESIDUOS Y SEGURIDAD					
Mobiliario	**Cumplimiento respecto ANEXO VI**				**Estado del mobiliario existente**					
	Anexo VI	Existencia	% Existencia	Faltan	BUENO	% BUENO	ROTO	% ROTO	DETERIORADO	% DETERIORADO
Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	3	2	66,7%	1	2	100,0%		0%		0,0%
Cajonera colgante de dos cajones	3	0	0,0%	3		-		-		-
Cajonera de mostrador	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Colgador mural individual	4	2	50,0%	2	2	100,0%		0%		0,0%
Cubo de basura con pedal 12L	4	0	0,0%	4		-		-		-
Cubo de basura con pedal 5L	4	0	0,0%	4		-		-		-
Dispensador de jabón	4	4	100,0%	0	4	100,0%		0%		0,0%
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	4	4	100,0%	0	4	100,0%		0%		0,0%
Escalera con tres peldaños y pies aislantes	2	0	0,0%	2		-		-		-
Estantería metálica 5/6 niveles ML	10	2	20,0%	8	2	100,0%		0%		0,0%
Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	3	2	66,7%	1	2	100,0%		0%		0,0%
Mostrador de recepción de 120-140 cm.	1	1	100,0%	0	1	100,0%		0%		0,0%
Papelera	4	3	75,0%	1	3	100,0%		0%		0,0%
Secamanos eléctrico	4	4	100,0%	0	4	100,0%		0%		0,0%
Silla fija	4	3	75,0%	1	3	100,0%		0%		0,0%
Silla giratoria con brazos y ruedas	7	4	57,1%	3	4	100,0%		0%		0,0%
% de incumplimiento			43,1%			100,0%		0,0%		0,0%

RESUMEN

En el siguiente gráfico se pueden comparar los porcentajes de incumplimiento de las diferentes unidades del Hospital Infanta Cristina detallados anteriormente (barras azules) con el porcentaje de incumplimiento total del Hospital (línea roja). Resalta la unidad de Laboratorios, la cual posee el porcentaje de incumplimiento más elevado (88,9%) debido a la carencia de muchos de los elementos establecidos en el Anexo VI del PCAP. Mientras que la unidad de Administración y Gestión presenta el porcentaje de incumplimiento más bajo (18,8%) en comparación con el resto de unidades.

Gráfico de % de incumplimiento de las unidades del Hospital y % de incumplimiento total del Hospital (45,69%).

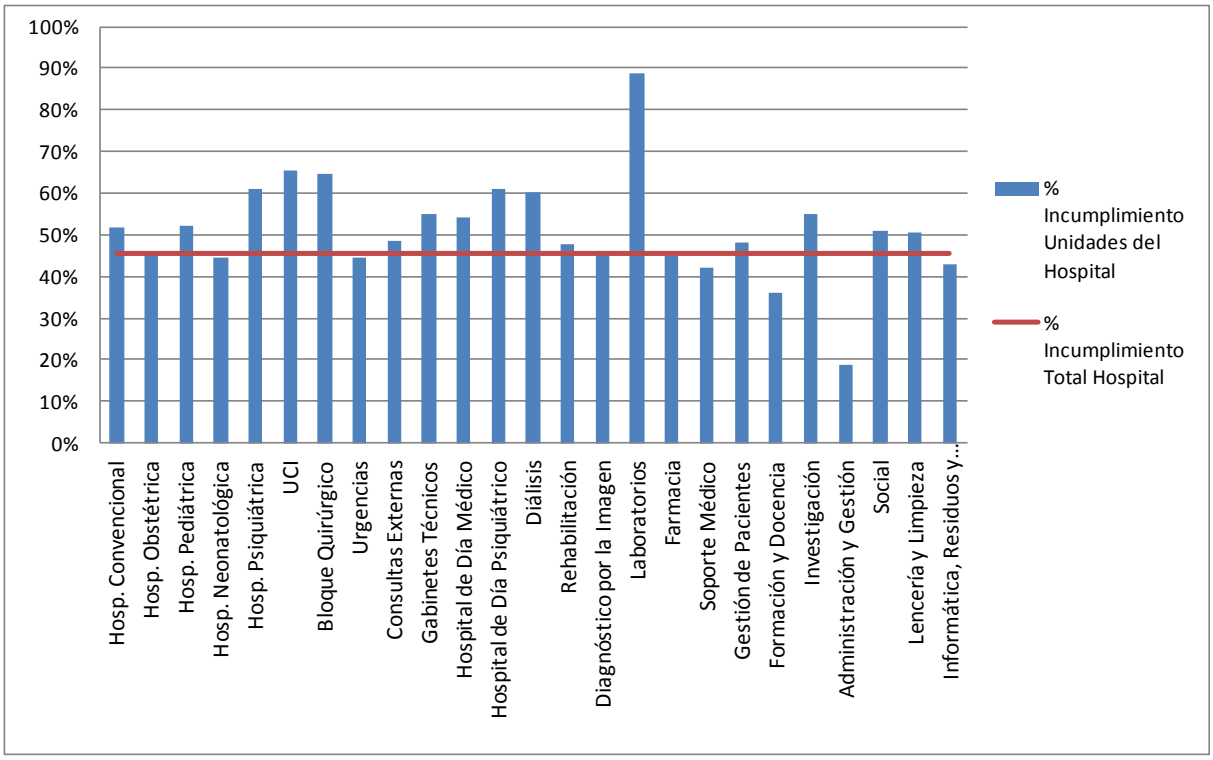

3.6 RESULTADOS DE LAS MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA IMPLANTADAS

-La catalogación de las medidas de Ahorro y Eficiencia Energética Implantadas se realiza según el siguiente baremo:

- Realización de las Medidas de Ahorro Energético.
- Eficacia de las medidas realizadas. Ahorro energético últimos años

En base a las inspecciones realizadas en cuanto a la realización de las medidas de eficiencia energética propuestas, se han propuesto 5 medidas viables a desarrollar a partir del PAEE del 2012 cuyo resultado de implantación ha sido el siguiente:

- 4 medidas correctamente implantadas (80%).
- 1 medidas sin comprobación posible (20%)

Conclusión:

- De las 4 medidas estudiadas el 100% (4) de las medidas han sido implementadas. A la vista de los resultados mostrados podemos decir que se le ha una calificación de **ADECUADA** la implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética.

A continuación se analiza cada una de las medidas de mejora de eficiencia energética (MAEE) implantadas entre 2012.

3.6.1 MMEE 1: RECUPERADOR HUMOS-AGUA

Un recuperador de calor de humos permite recuperar la mayor parte de la energía perdida en los productos de combustión en forma de calor sensible y latente.

De este modo, se consigue aumentar el rendimiento global del sistema “caldera + recuperador”, pudiéndose alcanzar rendimientos de hasta el 108% sobre el P.C.I.

Un sistema de recuperador de humos de una caldera supondrá el acople de un recuperador de humos a la caldera del sistema con mayor tiempo de uso (o prioritaria), recuperando calor del conducto de retorno del circuito de impulsión. El esquema de la instalación es el que sigue:

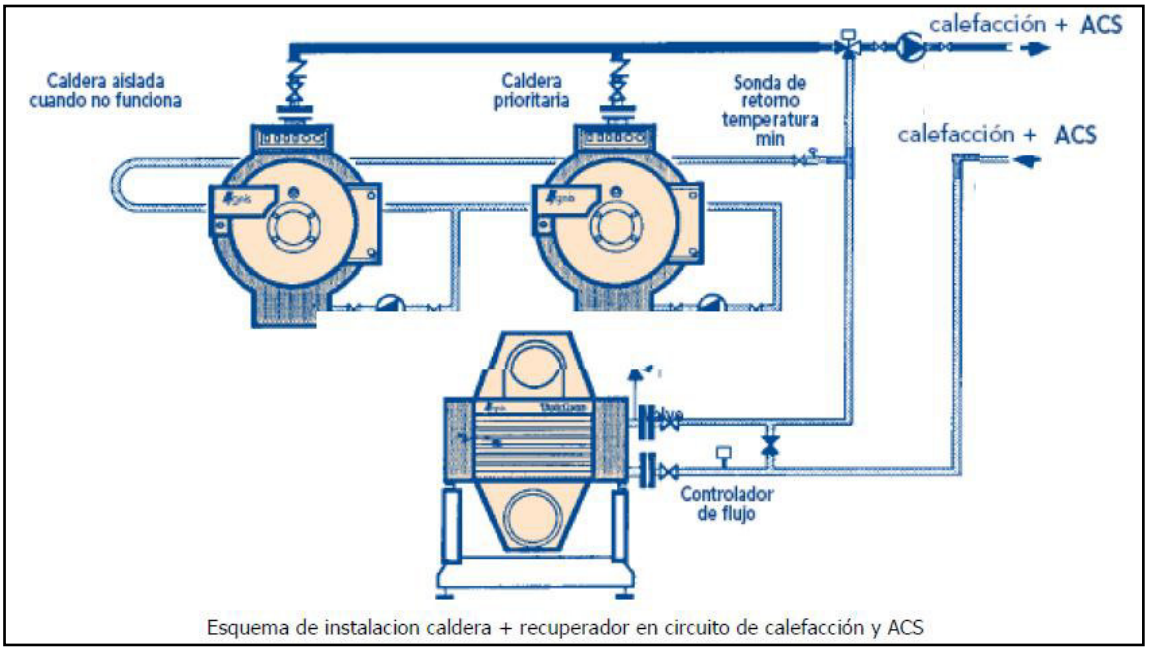

Esquema de instalacion caldera + recuperador en circuito de calefacción y ACS

Subsistema recuperador

Constituido por un recuperador de humos TOTALECO 4 de Ygnis o similar, para calderas o gas.



Recuperador TOTALECO de Ygnis.

La instalación del recuperador de humos deberá ir asociada a la caldera de mayor porcentaje de uso.

Imagen del Recuperador de humos-agua en caldera 1



3.6.2 MMEE 1: RECUPERACIÓN TÉRMICA EN CLIMATIZADORES

Para reducir el consumo energético, se ha instalado un sistema de recuperación de calor en diversos climatizadores presentes en el hospital. El sistema de recuperación de calor consta, según RITE de:

- Sistema de filtrado de aire de retorno F6.
- Humidificador adiabático de pulverización.
- Recuperador de placas (con by-pass en los climatizadores que no sean 100% aire exterior).
- Sistema de filtrado en entrada de aire exterior F7.

Los climatizadores a los que se les pueden añadir el sistema de recuperación de calor son aquellos que no disponen del mismo y que por las dimensiones de sus casetones y ubicaciones de los retornos, es viable su instalación.

Los climatizadores a los que se les propuso inicialmente añadir el modulo de recuperación de calor son los siguientes:

CASETON	Nº UTA	MARCA	MODELO	POT. FRIO	POT.CALOR	CAUDAL	Tº CONSIGNA IMPULSION INVIERNO	Tº RETORNO INVIERNO
4	UTA 9	AIRVENT	PB-8,5-E	92	52	7700	28	23,8
4	UTA 49	AIRVENT	PB-15	99	124	14600	22	22,2
5	UTA 51	AIRVENT	PB-8,5	55	70	8100	22	
5	UTA 50	AIRVENT	PB-7,5-E	49	61	7200	30	
8	UTA 5	AIRVENT	PB-17	204	143	16800	22	23,5
8	UTA 6	AIRVENT	PB-7,5-E	151	85	12300	26	26,2
9	UTA 43	AIRVENT	PB-7,5	63	44	6300	24	23,9
9	UTA 45	AIRVENT	PB-3	24	26	3000	20	
11	UTA 11	AIRVENT	PB-7,5-E	71	43	6400	24	22,5
11	UTA 7	AIRVENT	PB-10-E	111	62	9100	20	22,7
13	UTA 20	AIRVENT	PB-5	64	32	4680	23	24,1
14	UTA 18	AIRVENT	PB- 7,5 E	62	42	6100	24	25,2
14	UTA 21	AIRVENT	PB- 7,5 E	58	41			
15	HTA 37	AIRVENT	PB-10-E	67	84	8750	26	25,1

Se ha comprobado que todos los climatizadores anteriores han instalado el sistema de recuperación de calor, salvo el de la UTA 49.







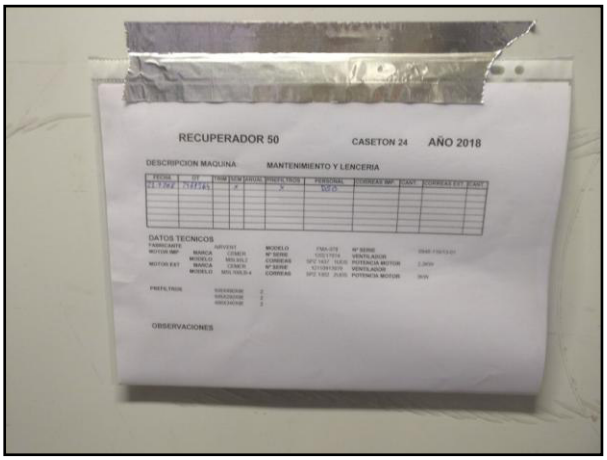

La instalación de módulos de recuperación térmica en 14 de los climatizadores supone una disminución en la demanda térmica y frigorífica.

3.6.3 MMEE 1: SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN ENERGÉTICA

Sistema de control para la optimización energética en la iluminación interior

Se han instalado tres sistemas de optimización energética:

- Regulación del nivel lumínico en función del aporte de luz natural.
- Regulación del nivel lumínico en horarios nocturnos.
- Encendidos por control de presencia.

Los criterios fundamentales en iluminación que determinan el ambiente o entorno luminoso son:

- Distribución de luminarias.
- Iluminancia.
- Uniformidades de iluminancia.
- Deslumbramiento.
- Direccionalidad de la luz o modelado.
- Color en el espacio visual.
- Efectos perjudiciales sobre la visión.

Los valores necesarios para satisfacer los criterios de iluminancia, deslumbramiento molesto y rendimiento de colores están dados en la norma UNE EN 12464-1, relativa a la iluminación en lugares de trabajo para interiores.

- Regulación del nivel lumínico en función del aporte de luz natural.

Hay tres objetivos principales para el empleo de sistemas de control de alumbrado artificial en respuesta a la luz natural, que son: ahorro de energía, economía de costes y confort del usuario.

La luz natural está disponible gratis y es renovable. El ahorro total posible de energía en un edificio utilizando luz natural es una combinación de ahorros de energía “directos” sobre el alumbrado artificial:

- Reducción del flujo cuando hay bastante luz natural disponible.
- Disminución de los niveles iniciales de iluminación en el caso de superar actualmente los niveles de iluminación marcados por la UNE 12464-1.

- Reducción de la carga de refrigeración, dando como resultado un ahorro de energía en refrigeración, ya que se produce menos calor como consecuencia de la potencia consumida en los componentes de la instalación de iluminación.

- Regulación del nivel lumínico en horarios nocturnos.

El control de iluminación en función del nivel lumínico está basado en los mismos fundamentos que el control de la iluminación artificial en función de la luz natural: ahorro de energía, economía de costes y confort del usuario.

Se establece que la iluminación media mantenida de pasillos en establecimientos sanitarios, será como mínimo 200 lux durante el día y 50 lux en horario nocturno.

Por esto se supone la instalación, mediante sistema de control, de regulación por niveles lumínicos en horarios nocturnos en los pasillos.

- Encendidos por control de presencia.

En el HIC existen lugares de tránsito cuya ocupación justifica la instalación de sistemas de control de encendidos por presencia.

De esta forma, han sido estudiadas detalladamente zonas que, por su índice de ocupación, no permanecen en uso todas las horas del día. A pesar de esto, actualmente, la iluminación correspondiente a estas zonas permanece encendida durante todo el día o están sujetos a encendidos y apagados manuales, corriendo el riesgo de olvidos en los apagados.

Se dispone de una herramienta de gestión de control lumínico. Este sistema de gestión se controla mediante un Ipad y se gestiona por zona (encendido/apagado y nivel lumínico).



3.6.4 MMEE 1: OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN EXTERIOR

Se pretende optimizar las horas de operación de las luminarias y reducir transitoriamente su potencia, siempre sin reducir la luminosidad. Con la finalidad de ahorrar energía se instalan los siguientes sistemas:

- Balastros serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia.
- Reguladores-estabilizadores en cabecera de línea.
- Balastros electrónicos de potencia regulable.

Se comprueba la existencia de los balastros electrónicos instalados, como puede verse en la siguiente figura:



Se ha comprobado que estos están instalados en las farolas, no se ha sacado foto debido a la complejidad de diferenciación en las mismas debido a la altura.

3.6.5 MMEE 1: RENOVACIÓN DE RÓTULO DE CUBIERTA POR UNO DE TECNOLOGÍA LED

Se ha propuesto la renovación del actual rótulo de cubierta “Hospital Infanta Cristina” a led. Anteriormente se iluminaba con neón. Las características serían las siguientes:

- Módulo LED con carcasa de plástico y de alivio de tensión con protección IP68.
- LED de alta potencia en el chip-on-board tecnología (COB).
- Fuente de corriente integrada para estabilizar flujo luminoso.
- Cadena, Flexible, se puede dividir entre cualquier módulo
- Fijación con tornillo M3 o premontado doble cara cinta adhesiva.
- Conexión: Cable 180 mm, ambas partes
- Máxima temperatura soportada.

Se han solicitado datos para poder comprobar que dicha medida de ahorro se ha realizado. Como no se han aportado, supondremos que la medida no se ha realizado.

CAPÍTULO 4 CUADRO DE MANDO (PARÁMETROS DE DESEMPEÑO)

A lo largo de todo el proceso de auditoría, se han establecido una serie de parámetros representativos de la gestión de la calidad del mantenimiento que se está realizando en el Hospital Infanta Cristina. Estos conceptos o valores constituyen los estándares o mediciones que permiten establecer una decisión sobre la gestión más objetiva.

PROCESO	OBJETIVO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR O PARÁMETRO DE DESEMPEÑO	FÓRMULA DE CÁLCULO	VALOR REFERENCIA O NIVEL DE CUMPLIMIENTO EXIGIBLE	RESPONSABLE CALCULAR EL INDICADOR	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN O TOMA DE DATOS	REGISTRO DE DATOS CALCULADOS	RESULTADOS 2017	OBSERVACIONES/ ANÁLISIS
GESTION DEL MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	Cumplimiento de la estimación de la vida útil de los activos	nº activos con estimaciónx100/nº activos totales	100,00	Empresa externa	Anual	Este mismo registro	0,00	No hay una estimación exacta de la vida útil de los activos
		Cumplimiento de los planes de reposición anuales y quinquenales.	nº activos repuestosx100/nº activos totales según planes de renovación	100,00	Empresa externa	Anual	Este mismo registro	-	No hay una descripción de los bienes activos repuestos
		Cumplimiento del Plan de Mantenimiento técnico-legal.	nº items realizadosx100/nº items totales según normativa vigente	100,00	Empresa externa	Anual	Este mismo registro	100,00	
	Mantenimiento Conductivo	Mediciones de temperatura	nº desviaciones según RITEx100/nº de mediciones totales	100,00	Empresa externa	Anual	Este mismo registro	50,71	Los resultados se han obtenido de tres mediciones realizadas.
		Mediciones de humedad	nº desviaciones según RITEx100/nº de mediciones totales	100,00	Empresa externa	Anual	Este mismo registro	99,60	Los resultados se han obtenido de tres mediciones realizadas.
		Mediciones de iluminación	nº desviaciones según UNE 12464_1x100/nº de mediciones totales	100,00	Empresa externa	Anual	Este mismo registro	59,19	Los resultados se han obtenido de dos mediciones realizadas.
	Mantenimiento Correctivo	Valoración de la gravedad de las incidencias	nº incidencias estimadasx100/nº incidencias totales	100,00	Empresa externa	Anual	Este mismo registro	0,00	No hay una jerarquía en la valoración de las incidencias
		Cumplimiento de los tiempos de respuesta en función de la gravedad de las incidencias	tiempo respuesta real en horasx100/tiempo respuesta debido en horas	100,00	Empresa externa	Anual	Este mismo registro	-	No se puede valorar por ausencia del punto anterior
	Cumplimiento y estado de los activos físicos mobiliario del Anexo VI del PPTE.	Cumplimiento del mobiliario del Anexo VI del PPTE.	nº activos existentesx100/nº activos totales según PPTE	100,00	Empresa externa	Anual	Este mismo registro	54,31	Hay un incumplimiento aproximadamente de la mitad del mobiliario del Anexo VI del
		Estado del mobiliario del Anexo VI del PPTE.	nº activos existentes en buen estadox100/nº activos existentes	100,00	Empresa externa	Anual	Este mismo registro	98,60	
	Planes de eficiencia energética en la explotación de los hospitales.	Cumplimiento de los planes de Eficiencia Energética	nº mejoras realizadas adecuadamentex100/nº mejoras totales según planes de Eficiencia Energética	100,00	Empresa externa	Anual	Este mismo registro	100,00	No se consideran las mejoras sin comprobación posible.
		Ahorro de consumo eléctrico	consumo actualx100/consumo hace dos años	Reducción del consumo	Empresa externa	Anual	Este mismo registro	12,69	
		Ahorro de consumo de combustibles (gas natural, gasóleo)	consumo actualx100/consumo hace dos años	Reducción del consumo	Empresa externa	Anual	Este mismo registro	16,49	
		Ahorro de consumo de ACS	consumo actualx100/consumo hace dos años	Reducción del consumo	Empresa externa	Anual	Este mismo registro	-1,77	Se produce un incremento del consumo.

CAPÍTULO 5 PROPUESTAS DE MEJORA CATALOGADAS POR PROCESOS (PLAN DE ACCIÓN)

En este capítulo se proponen mejoras en tres aspectos básicos: mejoras energéticas y mejoras sobre la gestión por parte de Incosa.

5.1 PROPUESTA DE MEJORAS ENERGÉTICAS POR PARTE DE INCOSA

Las mejoras para el ahorro energético y de emisiones de CO2 son las siguientes.

5.1.1 AHORRO DE ENERGÍA PARA MANTENER LA CALIDAD DEL AIRE

Se propone disminuir el gasto energético cambiando el sistema de aporte de aire primario, siguiendo la opción c, indicada en la instrucción técnica IT 1.1.4.2.3 Caudal mínimo del aire exterior de ventilación del RITE, la cual permite limitar el aporte de aire exterior hasta la nulidad en función de la concentración de CO2 de la sala.

La implantación de este sistema tiene un coste medio-bajo frente al ahorro que supone implantar este sistema, que en las temporadas de invierno/verano tendrá su máximo reporte.

5.1.2 MEJORA DE LA ILUMINACIÓN

Actualmente las luminarias instaladas son en su mayor parte lámparas fluorescentes. Se tiene control de iluminación en cuanto a detectores de presencia.

Sustitución de lámparas de bajo consumo y de halogenuros por lámparas de tecnología LED. Esta medida de ahorro disminuirá el consumo eléctrico en iluminación.

Se propone la sustitución de las luminarias de funcionamiento continuo, como es el caso de las zonas de urgencia, pasillos técnicos, etc. por luminarias que usen lámparas de tipo LED. Esto supone una mejora que con un periodo de amortización medio de entre 1-2 años para sustitución de lámparas y entre 2-4 años para la sustitución de luminarias completas., ya que la potencia de las luminarias Led son entre un 40 y un 70% menores a las luminarias convencionales.

5.2 PROPUESTAS DE MEJORA SOBRE LA GESTIÓN POR PARTE DE INCOSA

La gestión del mantenimiento requiere una mejora de manera sustancial. Se procede a ofrecer una solución a los principales incumplimientos que se producen en cuanto los planes de mantenimiento gestionados por la plataforma de gestión PRISMA III.

1. **Plan de Mantenimiento Correctivo-Registro de las OTs.**

La Sociedad Concesionaria está en la obligación de disponer de un registro de plan de mantenimiento correctivo debidamente detallado.

Este documento debería de abarcar, como mínimo, los siguientes puntos para cumplir con los requisitos contractuales de cómo definir una Orden Trabajo (OT):

- Número OT.
- Denominación OT.
- Código Activo.
- Denominación Activo.
- Fecha/Hora Emisión OT.
- Fecha/Hora Cierre OT.
- Descripción OT.
- Tipología Incidencia (obra civil, instalaciones, mobiliario)
- Tiempo de atención
- Gravedad de la incidencia.

2. **Plan de Mantenimiento Conductivo-Programa de necesidades.**

La Sociedad Concesionaria está en la obligación de disponer de un registro de plan de mantenimiento correctivo debidamente detallado.

Este documento debería de abarcar, como mínimo, los siguientes puntos:

- Registro de mantenimiento de cada instalación que recoja todas las incidencias, actividades realizadas, regulados obtenidos y las fechas de paradas y puestas en marcha técnicas de la instalación, incluyendo su motivo.
- Recepción, inventariado y puesta en marcha, sin incremento alguno del coste del contrato, de los nuevos equipos e instalaciones adquiridos o introducidos por la entidad contratante.
- Diferenciación de las distintas épocas, zonas y horarios.

3. Registro del plan de Mantenimiento Preventivo

La Sociedad Concesionaria está en la obligación de disponer de un registro de plan de mantenimiento preventivo debidamente detallado.

Este documento debería de abarcar, como mínimo, los siguientes puntos:

- Número OT.
- Denominación OT.
- Código Activo.
- Denominación Activo.
- Fecha/Hora Emisión OT.
- Fecha/Hora Cierre OT.
- Descripción OT.
- Tipología Incidencia (obra civil, instalaciones, mobiliario)
- Tiempo de atención
- Gravedad de la incidencia
- Frecuencia de repetición de la incidencia.

4. Plan de Mantenimiento Conductivo-Programa de necesidades.

La Sociedad Concesionaria está en la obligación de disponer de un registro de plan de mantenimiento correctivo debidamente detallado.

Este documento debería de abarcar, como mínimo, los siguientes puntos:

- Registro de mantenimiento de cada instalación que recoja todas las incidencias, actividades realizadas, resultados obtenidos y las fechas de paradas y puestas en marcha técnicas de la instalación, incluyendo su motivo.
- Recepción, inventariado y puesta en marcha, sin incremento alguno del coste del contrato, de los nuevos equipos e instalaciones adquiridos o introducidos por la entidad contratante.
- Diferenciación de las distintas épocas, zonas y horarios.

  Estudiar el impacto de cada acción, estudiando el antes y el después (de forma cuantitativa) y así conocer el impacto de cada medida

5. Plan de Reposición-Ciclo de vida de las Instalaciones

La Sociedad Concesionaria está en la obligación de disponer de una planificación en cuanto a reposiciones o sustituciones de obra civil, instalaciones y mobiliario durante los 30 años que dura el período de concesión de la explotación del Hospital Universitario Infanta Cristina.

Este documento debe estar debidamente detallado y relacionado de manera directa con el ciclo de vida de las instalaciones y equipos y debería constar de los siguientes puntos:

- Denominación del sistema.
- Denominación del equipo o instalación.
- Número total de equipos similares instalados.
- Vida útil del equipo (años).
- Número de años restante hasta su reposición, partiendo del día de inicio de funcionamiento del hospital.
- Importe de la reposición/unidad.
- Importe de la reposición total.
- Importe anual a invertir.
- Importe total durante del período de concesión.

En Madrid, Abril de 2018

Por Incosa: El autor,



Fdo.: Fco. Javier Balbás Sánchez

Auditor

ANEJOS

I. ANEXOS A LA AUDITORÍA A LAS INSTALACIONES

I.1 DOCUMENTACIÓN INCIDENCIAS (RESULTADO DE LA AUDITORÍA AL ESTADO DE LAS INSTALACIONES)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

Se han detectado las siguientes anomalías en la instalación eléctrica de BT.

1. Problema de seguridad en el cuadro eléctrico CSEN-2-I

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	COD. PARTE:	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alcaraz	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA REVISADA: CSEN-2-I

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	X		X		
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO	NA				*
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	NA				*
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X			X	*2
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS	X		X		
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

* Zona en desuso del hospital.

*2 : Una de las fases salta 31'9 mA y debería saltar a 30mA de máxima. del diferencial de alumbrado 3 (30mA, 25A, 4P)

solucionado

AUDITOR: [signature] RESP. DE LA INSTALACIÓN: [signature]

Ilustración 1: Check list Cuadro eléctrico CSEN-2-I

2. Sobredimensionamiento de fases. Cuadro Eléctrico: CPE2-S1-SUM

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Pasla S.A.	COD. PARTE:	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alcaine	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA REVISADA: CPE2-S1-SUM

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	X		X		
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO	X			X	1
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	X		X		
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	NA				
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS	X		X		
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

*La rotulación externa no se corresponde con el cuadro interno

1: Fase S superior, son circuitos de tomas de fuerza y puede ser que tenga más cargas conectadas.

AUDITOR: Pedro

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 2: Check list Cuadro eléctrico CPE2-S1-SUM

a. Cuadro Eléctrico CPE2-S1-SUM: La rotulación externa no se corresponde con el cuadro interno.

b. Cuadro eléctrico CPNI-2-M: La puerta del cuadro está suelta (se comprueba que la misma se cierra).

c. Cuadro eléctrico CSE2-2-C: En el momento de la inspección el cuadro estaba manchado y con falta de tornillería. (Se solucionan dichos problemas in situ).

d. Cuadro Eléctrico CGBT Industrial: Actúa como cuadro secundario, por lo que el nombre no es el apropiado. Se ha ampliado el cuadro y no se ha actualizado el esquema unifilar del mismo. No se ha podido medir el reparto de intensidad de corriente de las fases debido a la imposibilidad de poner la pinza amperimétrica.

e. Cuadro eléctrico CPN-2-2-F: Se comprueba que los cables estaban más aislados. Se ha solucionado sustituyendo los cables mal aislados por una reserva.

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HJC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Poza S.A	**COD. PARTE:**	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alegre	**FECHA:**	22/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER	**HORA:**	11:50

ZONA REVISADA: CPN1-2-H

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		*
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	X		X		
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO		X			
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO		X			
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In		X			
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS	X		X		
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

*1: Puerta suelta (Si que cierra)

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 3: Check list Cuadro eléctrico CPN1-2-H

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Gestión de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alestre	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER	**HORA:**	

ZONA REVISADA: CSE 1-1-J

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	✓		✓		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	✓		✓		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	✓		✓		
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	✓		✓		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	✓		✓		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO	NA				
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	NA				
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	✓		✓		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	✓		✓		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	✓		✓		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓	A_1
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	✓		✓		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS	✓		✓		
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	✓		✓		

OBSERVACIONES

A_1: Diferencial de 30mA que alimenta cuadros de habitaciones donde también son de 30mA.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 4: Check list Cuadro eléctrico CSE 1-1-J

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Poniente SA.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: CGBT Industrial

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO: PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	X		X		1
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO		X			2
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO		X			2
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	NA				
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS	X		X		
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

* Actúa como cuadro secundario por lo que el nombre no es el apropiado.
1: Se ha ampliado el ~~circuito~~ cuadro y no se ha actualizado el unifilar.
2: No se ha podido medir debido a imposibilidad de poner la pinza.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 5: Check list Cuadro eléctrico CGBT Industrial

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Inspección y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Perla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alas Ene	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: CSE2-2-C

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X				#1
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	X		X		
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO	X		X		
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	X		X		
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	NA				
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS	X		X		
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

#1 → Manchado y con falta de Escuadra. Solucionado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 6: Check list Cuadro eléctrico CSE2-2-C

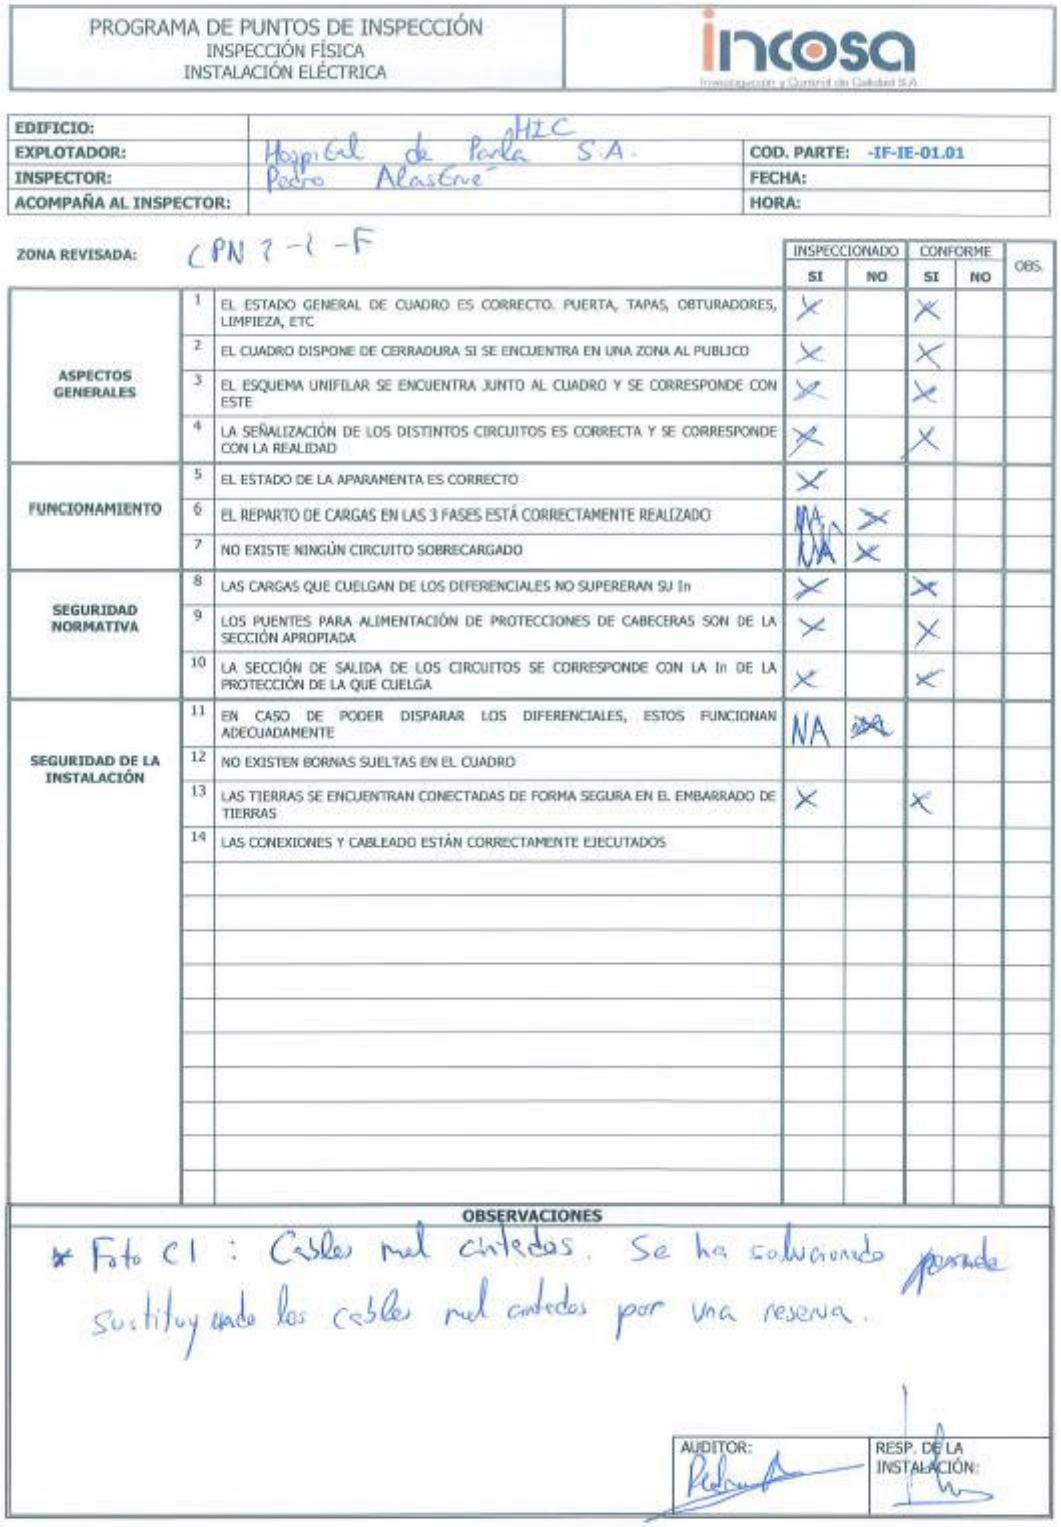

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	COD. PARTE:	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA REVISADA: CPN 2-1-F

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	X		X		
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X				
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO	NA	X			
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	NA	X			
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	NA	NA			
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO					
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS	X		X		
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS					

OBSERVACIONES

* Foto C1 : Cables mal cintados. Se ha solucionado grapando sustituyendo los cables mal cintados por una reserva.

AUDITOR:

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 7: Check list Cuadro eléctrico CPN2-2-F

NOTA: Como norma general en todos los cuadros eléctricos revisados se aprecia que el cableado de los mismos está demasiado junto y tenso, lo que dificulta la medición y el mantenimiento de los cuadros eléctricos.

Se han encontrado las siguientes deficiencias.

1. Prealarma de temperatura de agua

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. GRUPO ELECTRÓGENO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla SA.	COD. PARTE:	-IF-IE-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alas Ceru	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER	HORA:	

ZONA REVISADA: B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EN REPOSO	1	NO EXISTE NINGÚN PILOTO DE ALARMA ENCENDIDO	X		X		*
	2	EL CALENTADOR DEL CARTER FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	3	EL ESTADO DE LAS BATERÍAS DE ARRANQUE Y EL NIVEL DEL EECTROLITO ES CORRECTO	X		X		
	4	EL NIVEL DEL AGUA DEL RADIADOR Y DE ACEITE EN EL CÁRTER ES CORRECTO	X		X		
		EL NIVEL DE COMBUSTIBLE SE ENCUENTRA POR ENCIMA DEL NIVEL MÍNIMO MARCADO POR EL PPT	X		X		
	5	EL ESTADO DEL G.E. Y DE LOS ELEMENTOS CONECTADOS A ÉL SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO (Tubería de gasóleo, depósito nodriza, tubo de escape, bandejas eléctricas)	X		X		
ARRANQUE Y CONMUTACIÓN	6	SE CORTA LA ALIMENTACIÓN DE RED Y SE REALIZA LA CONMUTACIÓN DE INTERRUPTORES SIN PROBLEMAS (SI PROCEDE)	NA				
	7	EL TIEMPO DE ARRANQUE DEL GRUPO DESPUÉS DE LA MANIOBRA DE CORTE DE RED SE ENCUENTRA EN RANGO	NA				
	8	EL TIEMPO DE CONMUTACIÓN A GRUPO DESPUÉS DEL CORTE DE SUMINISTRO DE RED SE ENCUENTRA EN RANGO	NA				
	9	EL EQUIPO ARRANCA EN POSICIÓN AUTOMÁTICO DURANTE 10 MINUTOS SIN CARGA Y SU FUNCIONAMIENTO ES CORRECTO	NA				
FUNCIONAMIENTO DEL G.E.	10	LAS TENSIONES, FRECUENCIA, PRESIONES Y TEMPERATURA SEGÚN HOJA DE PROTOCOLO SON NORMALES	X		X		
	11	LA TEMPERATURA DEL BLOQUE ES CORRECTA	X		X		
	12	LA BOMBA DE CIRCULACIÓN DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	13	LOS VENTILADORES DE LA SALA ARRANCAN SIMULTANEAMENTE AL GE (SI PROCEDE)	NA				
	14	NO SE OBSERVAN FUGAS DE COMBUSTIBLE, AGUA, REFRIGERANTE O ACEITE LUBRICANTE	X		X		
	15	EN CASO DE TEMPERATURA BAJA EN EL TERMOSTATO DE LOS CALENTADORES, SE CONECTAN LAS RESISTENCIAS DE CALDEO	X		X		
	16	EL G.E. NO EMITE RUIDOS EXTRAÑOS O EXCESIVOS	X		X		
	17	LOS HUMOS DE ESCAPE SE CONDUCEN AL EXTERIOR DE FORMA CORRECTA	X		X		

OBSERVACIONES

* Prealarma de Tª de agua.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 8: Check list Grupo Electrógeno B

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN

No se han detectado las anomalías en la instalación eléctrica de MT, aunque cabe mencionar que las inspecciones sólo se han realizado en la sala de celdas, debido a que para acceder al propio Centro de Transformación es necesario realizar un corte de tensión.

Como única reseña, cabe mencionar que no se dispone de extintor en la sala de dióxido de carbono, ni dentro, ni en la puerta.

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alasérvé	**FECHA:**	10/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	12:10

ZONA REVISADA: EDIFICIO INDUSTRIAL

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
TRANSFORMADOR NA	1	LOS TRANSFORMADORES SON DEL TIPO Y POTENCIA INDICADOS EN LA DOCUMENTACIÓN					
	2	SU ESTADO ES CORRECTO Y NO EMITEN RUIDOS EXTRAÑOS					
	3	LOS TRANSFORMADORES SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE ACUÑADOS					
	4	LAS CONEXIONES DE LOS TRANSFORMADORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
PROTECCIONES	5	LAS CELDAS DE MEDIA TENSION SE ENCUENTRAN OPERATIVAS	X		X		
	6	EL ESQUEMA QUE FORMAN LAS CELDAS SE CORRESPONDE CON LO INDICADO EN LOS PLANOS Y DOCUMENTACIÓN	X		X		
	7	LA SEÑALIZACIÓN DE TENSIÓN POR PILOTOS Y DE INDICACIÓN DE APERTURA Y CIERRE ES CORRECTA	X		X		
CONDICIONES DE SEGURIDAD 1	8	EN LUGAR VISIBLE SE DISPONE DE LAS INSTRUCCIONES PARA LA REANIMACIÓN DE SALVAMENTO	X		X		
	9	EN LUGAR VISIBLE SE DISPONE DE LA SECUENCIA SEGURA PARA EL TRABAJO EN ELEMENTOS SIN TENSIÓN	X		X		
	10	EL ANILLO DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN RODEA EL PERIMETRO INTERIOR DEL CT Y A ÉL ESTÁN CONECTADOS TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA SALA	X		X		
	11	LA TIERRA DE PROTECCIÓN DISPONE DE UN SECCIONADOR DE CORTE VISIBLE EN EL INTERIOR DE LA SALA	X		X		
	12	LA TIERRA DE SERVICIO DE LOS DOS TRANSFORMADORES DISPONE DE UN SECCIONADOR DE CORTE VISIBLE EN EL INTERIOR DE LA SALA	X		X		
	13	LA TIERRA DE PROTECCIÓN Y LA DE SERVICIO SON INDEPENDIENTES	X		X		
	14	EL CT DISPONE DE ELEMENTOS DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS	X		X		
	15	SE DISPONE DE EXTRACCIÓN FORZADA EN LA SALA	X		X		
	16	EN CASO DE DETECCIÓN DE INCENDIO LA EXTRACCIÓN FORZADA SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE	X		X		
	17	SE HAN DISPUESTO ELEMENTOS DE PROTECCION DIRECTA (REJA DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR CONTRA CONTACTOS DIRECTOS)	X		X		
	18	SE DISPONE DE BANQUETA, GUANTES, PERTIGA, INDICADOR DE TENSIÓN Y MANETA PARA REALIZAR DE FORMA SEGURA LAS MANIOBRAS EN A.T	X		X		
	19	SE DISPONE DE EXTINTOR EN LA SALA DE DIOXIDO DE CARBONO Y SU ESTADO Y PRESIÓN DE GAS ES ADECUADA	X		X		
	20	LA APERTURA DE LA SALA REQUIERE DE LLAVE, LA CUAL NO SE ENCUENTRA ACCESIBLE	X		X		

OBSERVACIONES

1 La inspección solo se ha realizado en la sala de celdas debido a que para ~~proseguir la inspección~~ acceder al propio C.T. es necesario realizar un corte de tensión.

1: Sala de celdas

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 9: Check list Centro de Transformación zona industrial

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HJC		
EXPLOTADOR:	Hosp. Cal de Porta S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alas Cruz	**FECHA:**	10/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	17:50

ZONA REVISADA:			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
TRANSFORMADOR NA	1	LOS TRANSFORMADORES SON DEL TIPO Y POTENCIA INDICADOS EN LA DOCUMENTACIÓN					
	2	SU ESTADO ES CORRECTO Y NO EMITEN RUIDOS EXTRAÑOS					
	3	LOS TRANSFORMADORES SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE ACUÑADOS					
	4	LAS CONEXIONES DE LOS TRANSFORMADORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
PROTECCIONES	5	LAS CELDAS DE MEDIA TENSION SE ENCUENTRAN OPERATIVAS	X		X		
	6	EL ESQUEMA QUE FORMAN LAS CELDAS SE CORRESPONDE CON LO INDICADO EN LOS PLANOS Y DOCUMENTACIÓN	X		X		
	7	LA SEÑALIZACIÓN DE TENSIÓN POR PILOTOS Y DE INDICACIÓN DE APERTURA Y CIERRE ES CORRECTA	X		X		
CONDICIONES DE SEGURIDAD (1)	8	EN LUGAR VISIBLE SE DISPONE DE LAS INSTRUCCIONES PARA LA REANIMACIÓN DE SALVAMENTO	X		X		
	9	EN LUGAR VISIBLE SE DISPONE DE LA SECUENCIA SEGURA PARA EL TRABAJO EN ELEMENTOS SIN TENSIÓN	X		X		
	10	EL ANILLO DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN RODEA EL PERIMETRO INTERIOR DEL CT Y A ÉL ESTÁN CONECTADOS TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA SALA	X		X		
	11	LA TIERRA DE PROTECCIÓN DISPONE DE UN SECCIONADOR DE CORTE VISIBLE EN EL INTERIOR DE LA SALA	X		X		
	12	LA TIERRA DE SERVICIO DE LOS DOS TRANSFORMADORES DISPONE DE UN SECCIONADOR DE CORTE VISIBLE EN EL INTERIOR DE LA SALA	X		X		
	13	LA TIERRA DE PROTECCIÓN Y LA DE SERVICIO SON INDEPENDIENTES	X		X		
	14	EL CT DISPONE DE ELEMENTOS DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS	X		X		
	15	SE DISPONE DE EXTRACCIÓN FORZADA EN LA SALA	X		X		
	16	EN CASO DE DETECCIÓN DE INCENDIO LA EXTRACCIÓN FORZADA SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE	X		X		
	17	SE HAN DISPUESTO ELEMENTOS DE PROTECCION DIRECTA (REJA DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR CONTRA CONTACTOS DIRECTOS)	X		X		
	18	SE DISPONE DE BANQUETA, GUANTES, PERTIGA, INDICADOR DE TENSIÓN Y MANETA PARA REALIZAR DE FORMA SEGURA LAS MANIOBRAS EN A.T	X		X		
	19	SE DISPONE DE EXTINTOR EN LA SALA DE DIOXIDO DE CARBONO Y SU ESTADO Y PRESIÓN DE GAS ES ADECUADA	X			X	*1
	20	LA APERTURA DE LA SALA REQUIERE DE LLAVE, LA CUAL NO SE ENCUENTRA ACCESIBLE	X		X		

OBSERVACIONES

(1): Sala de Celdas

*1: No se encuentran ni en la sala ni en la puerta

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 10: Check list Centro de Transformación

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Poniente S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	10/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	3:00

ZONA REVISADA:			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
TRANSFORMADOR NA	1	LOS TRANSFORMADORES SON DEL TIPO Y POTENCIA INDICADOS EN LA DOCUMENTACIÓN					
	2	SU ESTADO ES CORRECTO Y NO EMITEN RUIDOS EXTRAÑOS					
	3	LOS TRANSFORMADORES SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE ACUÑADOS					
	4	LAS CONEXIONES DE LOS TRANSFORMADORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
PROTECCIONES	5	LAS CELDAS DE MEDIA TENSION SE ENCUENTRAN OPERATIVAS	X		X		
	6	EL ESQUEMA QUE FORMAN LAS CELDAS SE CORRESPONDE CON LO INDICADO EN LOS PLANOS Y DOCUMENTACIÓN	X		X		
	7	LA SEÑALIZACIÓN DE TENSIÓN POR PILOTOS Y DE INDICACIÓN DE APERTURA Y CIERRE ES CORRECTA	X		X		
CONDICIONES DE SEGURIDAD (1)	8	EN LUGAR VISIBLE SE DISPONE DE LAS INSTRUCCIONES PARA LA REANIMACIÓN DE SALVAMENTO	X		X		
	9	EN LUGAR VISIBLE SE DISPONE DE LA SECUENCIA SEGURA PARA EL TRABAJO EN ELEMENTOS SIN TENSIÓN	X		X		
	10	EL ANILLO DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN RODEA EL PERIMETRO INTERIOR DEL CT Y A ÉL ESTÁN CONECTADOS TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA SALA	X		X		
	11	LA TIERRA DE PROTECCIÓN DISPONE DE UN SECCIONADOR DE CORTE VISIBLE EN EL INTERIOR DE LA SALA	X		X		
	12	LA TIERRA DE SERVICIO DE LOS DOS TRANSFORMADORES DISPONE DE UN SECCIONADOR DE CORTE VISIBLE EN EL INTERIOR DE LA SALA	X		X		
	13	LA TIERRA DE PROTECCIÓN Y LA DE SERVICIO SON INDEPENDIENTES	X		X		
	14	EL CT DISPONE DE ELEMENTOS DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS	X		X		
	15	SE DISPONE DE EXTRACCIÓN FORZADA EN LA SALA	X		X		
	16	EN CASO DE DETECCIÓN DE INCENDIO LA EXTRACCIÓN FORZADA SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE	X		X		
	17	SE HAN DISPUESTO ELEMENTOS DE PROTECCION DIRECTA (REJA DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR CONTRA CONTACTOS DIRECTOS)	X		X		
	18	SE DISPONE DE BANQUETA, GUANTES, PERTIGA, INDICADOR DE TENSIÓN Y MANETA PARA REALIZAR DE FORMA SEGURA LAS MANIOBRAS EN A.T	X		X		
	19	SE DISPONE DE EXTINTOR EN LA SALA DE DIOXIDO DE CARBONO Y SU ESTADO Y PRESIÓN DE GAS ES ADECUADA	X		X		
	20	LA APERTURA DE LA SALA REQUIERE DE LLAVE, LA CUAL NO SE ENCUENTRA ACCESIBLE	X		X		

OBSERVACIONES

(1): Sala de Celdas

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 11: Check list Centro de Transformación

CENTRALES TÉRMICAS

Se han detectado las siguientes deficiencias:

1. Falta aislamiento en calderas de gas natural.

2. Deterioro en Enfriadoras.

    - Salta una alarma de presión de aceite en el control. Dicha incidencia se soluciona tras reseteo.

    - La cobertura de los compresores está deteriorada.



Ilustración 12: Cobertura de los compresores deteriorada

    - Las conexiones eléctricas por tubo con la enfriadora están deterioradas.



Ilustración 13: Conexión eléctrica y conducto deteriorado

3. Sistema de Bombeo.



Ilustración 14: Conexión deteriorada en bomba

4. Calorifugado no continuo. (Conductos, tuberías y válvulas).

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN

incosa

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	COD. PARTE:	-IF-CLI-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	FECHA:	13/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	11:20

ZONA REVISADA:			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
CALDERAS	1	LAS CALDERAS SE ENCUENTRAN EN DISPOSICIÓN DE FUNCIONAR	X		X		
	2	LAS CALDERAS FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADAS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X		X		
	3	EL ESTADO DE LA CALDERA ES CORRECTO	X		X		*2
	4	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS Y CHIMENEAS EN LA CALDERA ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	5	SE DISPONE DE UNA SETA DE EMERGENCIA EN EL EXTERIOR DE LA SALA DE CALDERA Y SU ACTIVACIÓN DETIENE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DE GAS A LA SALA DE CALDERAS.	X		X		
ENFRIADORAS	6	LAS ENFRIADORAS SE ENCUENTRAN EN DISPOSICIÓN DE FUNCIONAR	X		X		
	7	LAS ENFRIADORAS FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADAS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X		X		* 1
	8	EL ESTADO DE LA ENFRIADORA ES CORRECTO	X		X		*1
	9	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS CON LA ENFRIADORA ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X			X	*3
SISTEMAS DE BOMBEO	10	LAS BOMBAS SE ENCUENTRAN EN DISPOSICIÓN DE FUNCIONAR	X		X		
	11	LAS BOMBAS ESTÁN REGULADAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AUTOMÁTICO	X		X		
	12	LAS BOMBAS DESCANSAN SOBRE BANCADAS DE INERCIA O AISLADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS	X		X		*4
	13	NO SE APRECIAN FUGAS EN LAS CONEXIONES A LAS BOMBAS	X		X		
	14	LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL A LAS BOMBAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X			X	*3
TORRES DE REFRIGERACIÓN NA	15	LAS TORRES DE REFRIGERACIÓN SE ENCUENTRAN EN DISPOSICIÓN DE FUNCIONAR					
	16	LAS TORRES DE REFRIGERACIÓN SE ENCUENTRAN LIMPIO Y EN CORRECTO ESTADO					
EQUIPOS FRIGORÍFICOS NA	17	LOS EQUIPOS FRIGORÍFICOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE Y SU ESTADO ES CORRECTO					
	18	LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL A LOS EQUIPOS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
	19	LOS EQUIPOS FRIGORIFICOS DESCANSAN SOBRE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS					
	20	NO SE APRECIAN RUIDOS EXCESIVOS EN LA PROXIMIDAD DE LOS EQUIPOS INTERIORES Y EXTERIORES					
	21	LAS TUBERÍAS FRIGORÍFICAS ESTÁN CORRECTAMENTE UNIDAS A LOS EQUIOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE GAS O MANCHAS DE ACEITE					
	22	EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ES CORRECTO Y ESTE ES REGULADO POR LOS TERMOSTATOS DISPUESTOS A TAL FIN					
	23	LOS EQUIPOS FRIGORÍFICOS FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADAS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y VÁLVULAS	24	A LO LARGO DE LA INSTALACIÓN LAS TUBERÍAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y EL CALORIFUGADO ES CONTINUO EN TODO SU RECORRIDO	X			X	*6
	25	LAS VÁLVULAS DE CORTE Y REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	26	A LO LARGO DE LA INSTALACIÓN LOS CONDUCTOS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y EL CALORIFUGADO ES CONTINUO EN TODO SU RECORRIDO	X			X	*6

OBSERVACIONES

*1: Salta una alarma en el control. Presión de aceite. Se solucionó tras reseteo.

*2: Falta por aislar parte de la valvulería.

*3: Es Las conexiones con el racor están a mal estado.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 15: Check list Climatización

INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE

Se han detectado las siguientes anomalías en las Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs). Y en los fancoils (climatizadores) de la instalación.

1. Las UTAs 4, 26, 33 tienen válvulas sin aislante y necesidad de cambio de filtro.

UTA 4



Ilustración 16: Válvula UTA sin aislante. y oxidada

UTA 26



Ilustración 17: Aislante conducto U.T.A 26 dañado



Ilustración 18: Batería U.T.A 26



Ilustración 19: Motor U.T.A 26

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alastruó	**FECHA:**	13/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	12:00

ZONA REVISADA: UTA-4

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	X		X		
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS	X		X		
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*1
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X	X	
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES	X		X		
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X		X		
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	*2
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	NA		X		
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	NA		X		
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	X		X		

OBSERVACIONES

*1: Oxidados y con falta de aislante en la valvulería.

*2: Sobre ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Filtros sucios.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
[signature]	[signature]

Ilustración 20: Check list U.T.A 4

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	14/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	11:30

ZONA REVISADA: 33

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	X		X		
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS	X		X		
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X1
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES	X		X		
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X				
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X2
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	N/A				
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	N/A				
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	X		X		

OBSERVACIONES

X1: Válvulas sin aislante

X2: Filtros sucios

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 21: Check list U.T.A 33

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Perla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alastruey	**FECHA:**	13/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	13:15

ZONA REVISADA: 26

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	X		X		
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS	X		X		
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X_2
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES	X		X		
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X				
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X_1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	NA				
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	NA				
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	X		X		

OBSERVACIONES

X_1: Filtros sucios

X_2: Válvulas sin aislante o con el mismo deteriorado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 22: Check list U.T.A 26

2. Las UTAs 18 y 30 tienen válvula sin aislante.

UTA 18



Ilustración 23: Motor U.T.A 18

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla SA.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alcántara	**FECHA:**	13/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	13:00

ZONA REVISADA: 18

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X			X	*1
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	X		X		
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*2
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X				
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES	X		X		
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓	X			
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X		X		
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTAN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	NA				
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	NA				
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	X		X		

OBSERVACIONES

*1: Puerta sin pomo y otra imposible de abrir

*2: Válvulas sin aislar.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 24: Check list U.T.A 18

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Inspección y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Pardo SA	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Albiñana	**FECHA:**	14/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	11:40

ZONA REVISADA: 3a

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	X		X		
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS	X		X		
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X	X	*1
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES	X		X		
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X		X		
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	NA		NA		
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	NA		NA		
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	X		X		

OBSERVACIONES

*1: Válvula sin aislante

AUDITOR: Pedro

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 25: Check list U.T.A 30

3. Las UTAs 49 y 50 presentan válvulas no aisladas y filtros sucios. Además, la UTA 49 tiene la batería de frío deteriorada y la UTA 50 tiene la batería de calor deteriorada.

UTA 49



Ilustración 26: Batería deteriorada U.T.A 49

UTA 50



Ilustración 27: Filtros de aire sucios U.T.A 50

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Poniente S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alarcón	**FECHA:**	13/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	13:40

ZONA REVISADA: 49

			INSPECCIONADO SI	INSPECCIONADO NO	CONFORME SI	CONFORME NO	OBS.
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	X			X	X1
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X2
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES	X		X		
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X		X		
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X3
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	NA				
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	NA				
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	NA				

OBSERVACIONES

X1: Baterías de frío deterioradas

X2: Válvulas no aisladas.

X3: Filtro sucio

AUDITOR: Pedro A

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 28: Check list U.T.A 49

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alcaraz	**FECHA:**	13/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	12:30

ZONA REVISADA: SO

			INSPECCIONADO SI	INSPECCIONADO NO	CONFORME SI	CONFORME NO	OBS.
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	X			X	X_2
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X_3
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES	X		X		
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X		X		
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X_1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	NA				
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	NA				
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	NA				

OBSERVACIONES

X_1: Filtros sucios
X_2: Baterías de calor deterioradas
X_3: Válvulas no aisladas

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 29: Check list U.T.A 50

4. La UTA 27 presenta varias deficiencias en el interior en cuanto a suciedad, falta de aislamiento en conductos y mal estado de correas.

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla SA	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	María Gorelli León	**FECHA:**	13/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	13:15

ZONA REVISADA: 27

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE					
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X			X_1	
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO					
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS	X			X_4	
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X			X_3	
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X_2	
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES	X		X		
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X				
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X		X		
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	NA				
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	NA				
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	X		X		

OBSERVACIONES

X_1 = sucio
X_2 = aislar valvulerías y elementos accesorios. Tramo de tubería sin reponer (foto)
X_3 = mal estado. correas agrietadas (foto)
X_4 = bandeja sucia.

AUDITOR:

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 30: Check list U.T.A 27

5. La UTA 41 presenta varias deficiencias en el interior en cuanto a suciedad, óxido, falta de aislamiento y mal estado de correas.

UTA 41

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	MIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S A	COD. PARTE:	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alastruó	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	12:00

ZONA REVISADA: UTA-41

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	X		X		
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS	X		X		
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		(1)
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	(4)
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X			X	(5)
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES	X		X		
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X		X		
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X	X		X	(2)
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	(3)
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	X			X	(3)
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO		NA			
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO		NA			

OBSERVACIONES

(1) correa ventilador impulsión floja
(2) no tiene filtros. Solo tiene prefiltros
(3) filtros sucios. Se cambiaron en mayo por última vez
(4) valvulería y accesorios sin aislar
(5) filtros muy oxidados

AUDITOR: [signature]

RESP. DE LA INSTALACIÓN: [signature]

Ilustración 31: Check list U.T.A 41

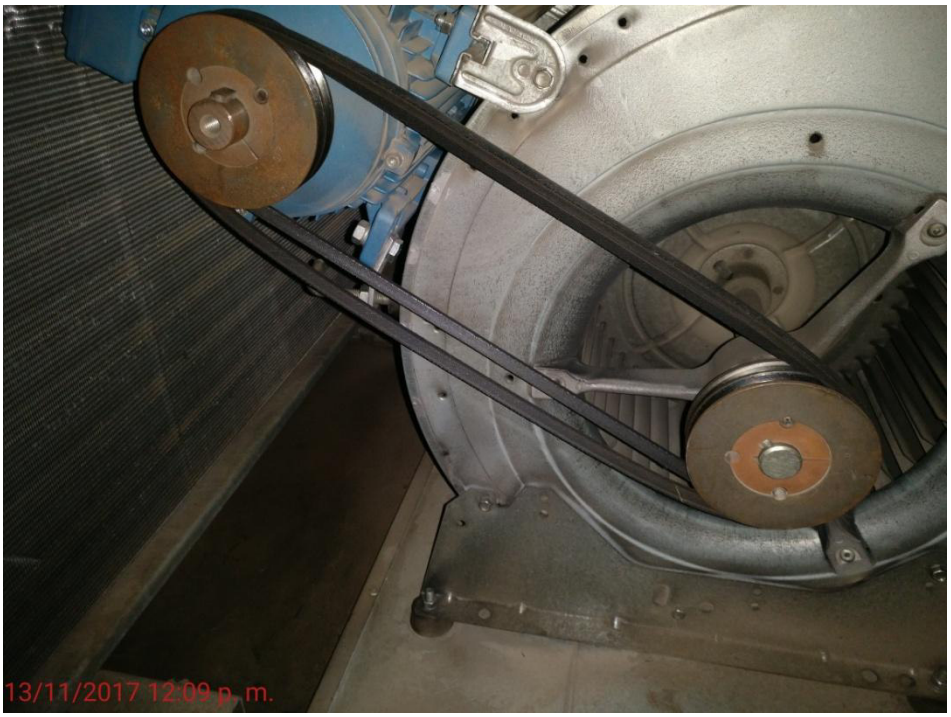

Ilustración 32: Correa en mal estado U.T.A 41

FANCOILS

1. Fan-Coil Sala de Espera Planta 1 Módulo B no funciona.

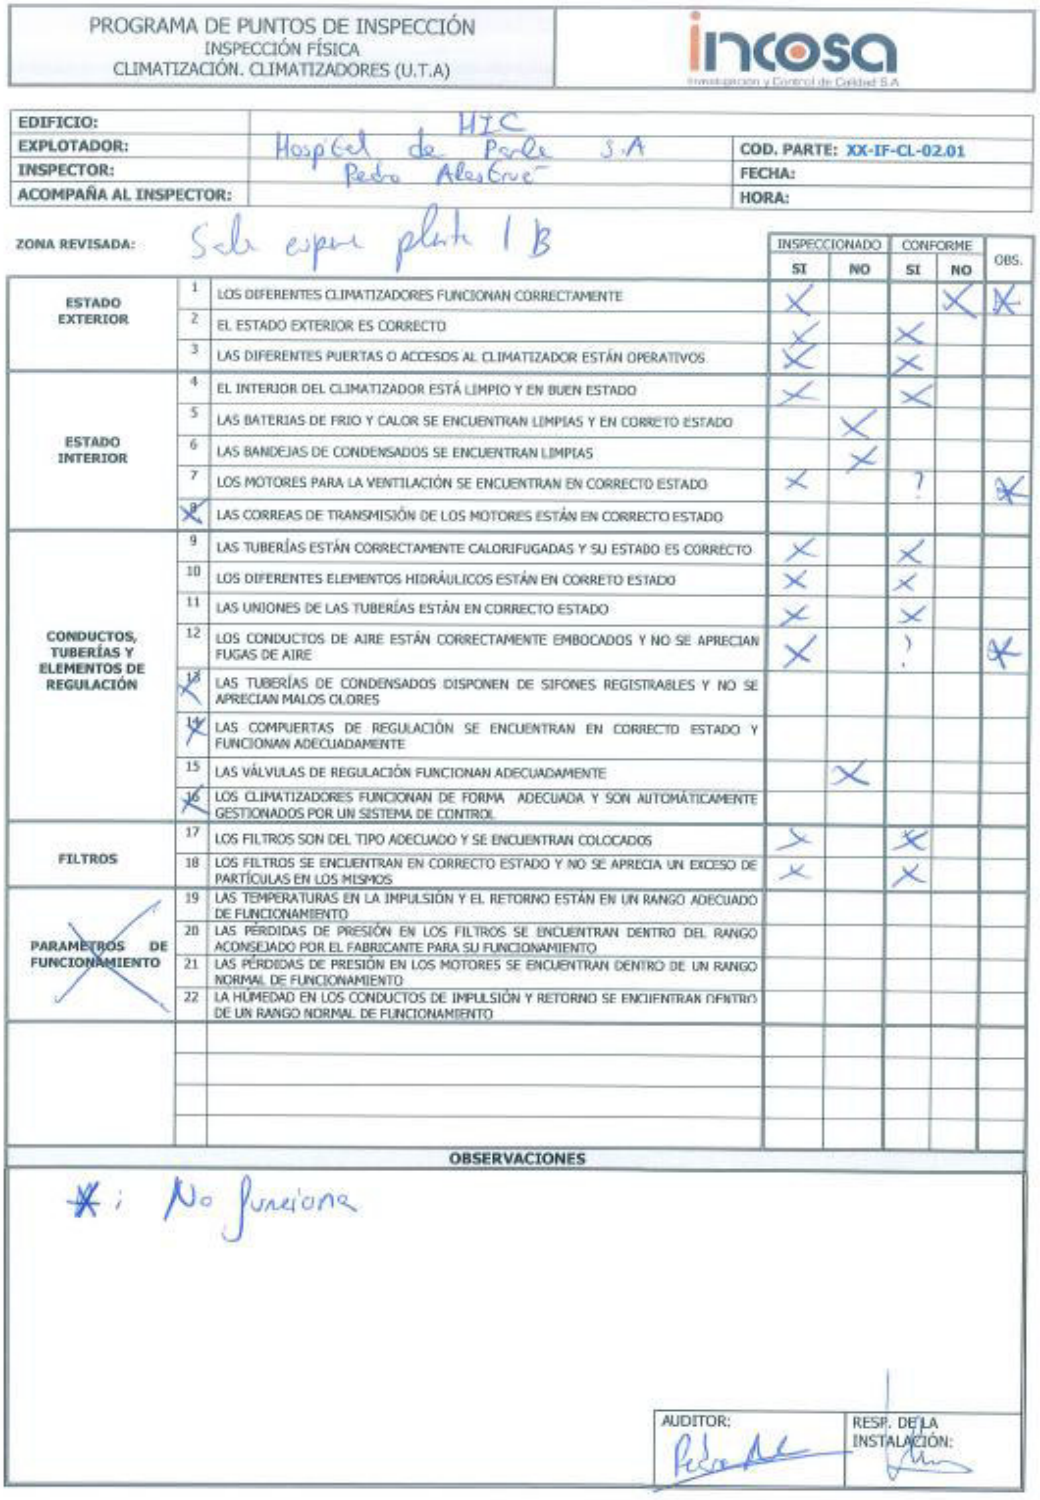

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:	HIC
EXPLOTADOR:	Hospital de Poniente S.A
INSPECTOR:	Pedro Alcaraz
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	
COD. PARTE: XX-IF-CL-02.01	
FECHA:	
HORA:	

ZONA REVISADA: Sala espera planta 1 B

			INSPECCIONADO SI	INSPECCIONADO NO	CONFORME SI	CONFORME NO	OBS.
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X			X	X
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		?		X
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		?		X
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X: No funciona

AUDITOR: Pedro Alc

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 33: Check list Fan-Coil sala de espera, planta 1, módulo B

2. Los siguientes Fan-Coils presentan agrietamiento en el aislante y necesidad de cambio de filtro.

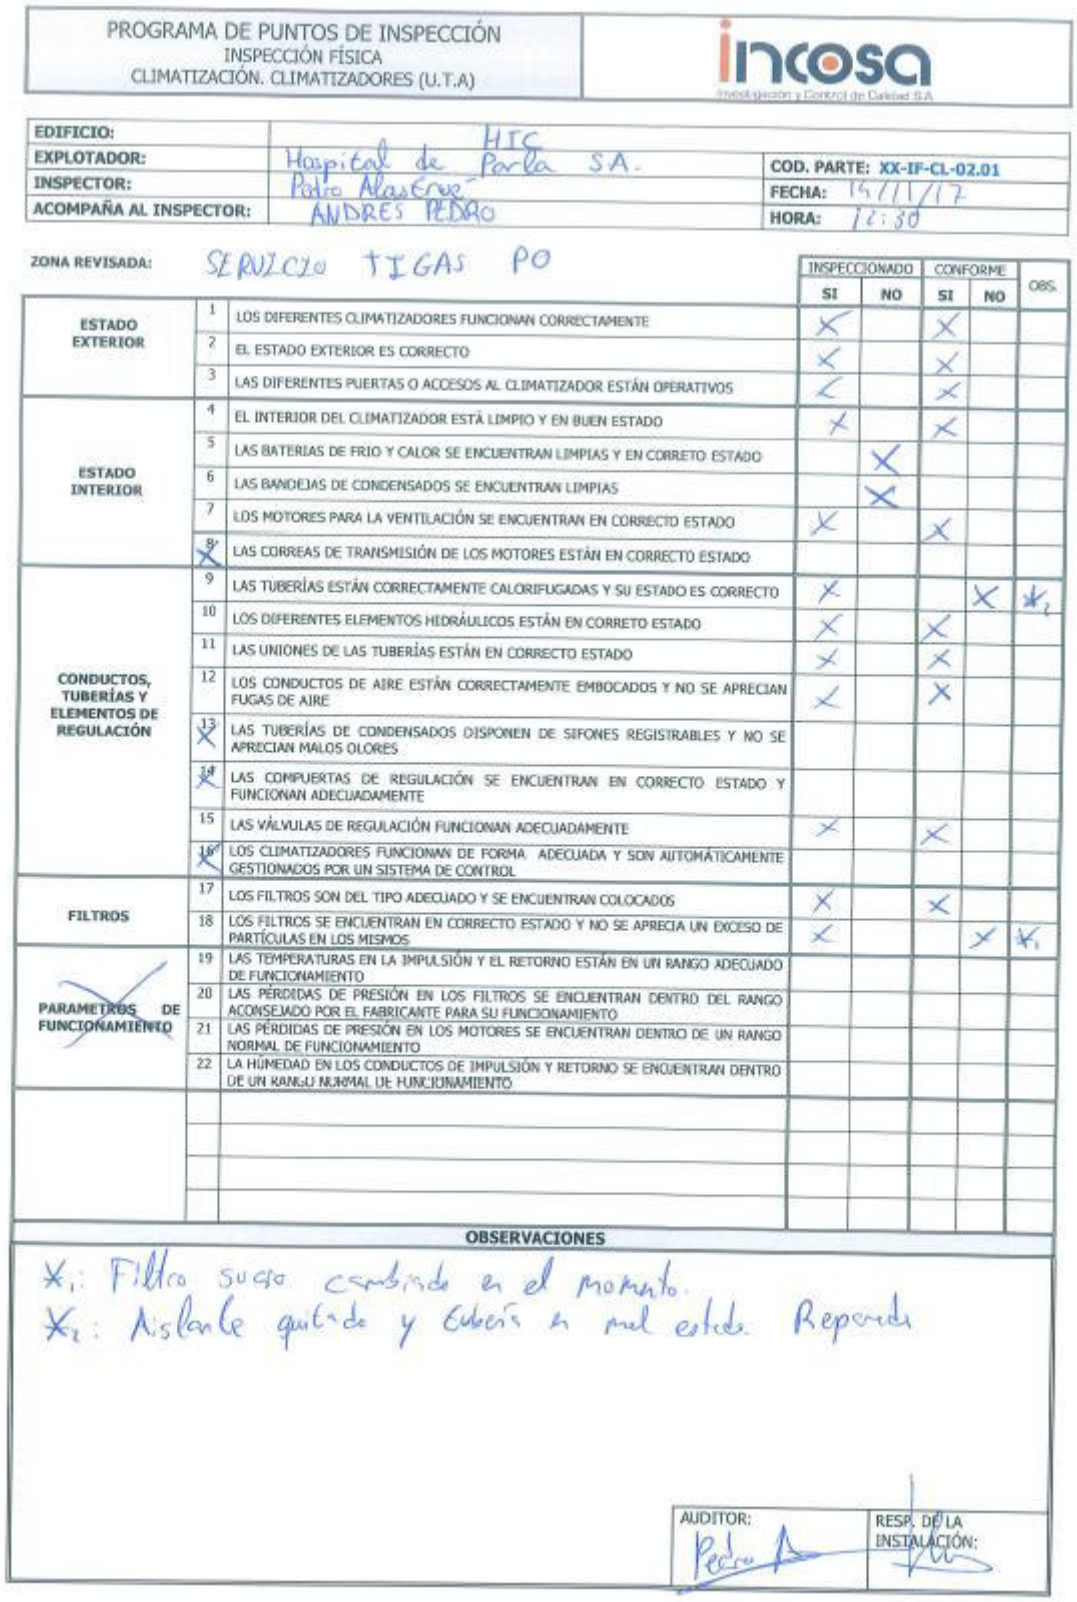

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:	HIC
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla SA.
INSPECTOR:	Pedro Alastrué
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO
COD. PARTE:	XX-IF-CL-02.01
FECHA:	14/11/17
HORA:	12:30

ZONA REVISADA: SERVICIO TIGAS PO

			INSPECCIONADO SI	INSPECCIONADO NO	CONFORME SI	CONFORME NO	OBS.
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X_2
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X_1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X_1: Filtro sucio cambiado en el momento.
X_2: Aislante quitado y tubería en mal estado. Reparado

AUDITOR: Pedro

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 34: Check list Fan-Coil servicio de TIGAS, planta 0

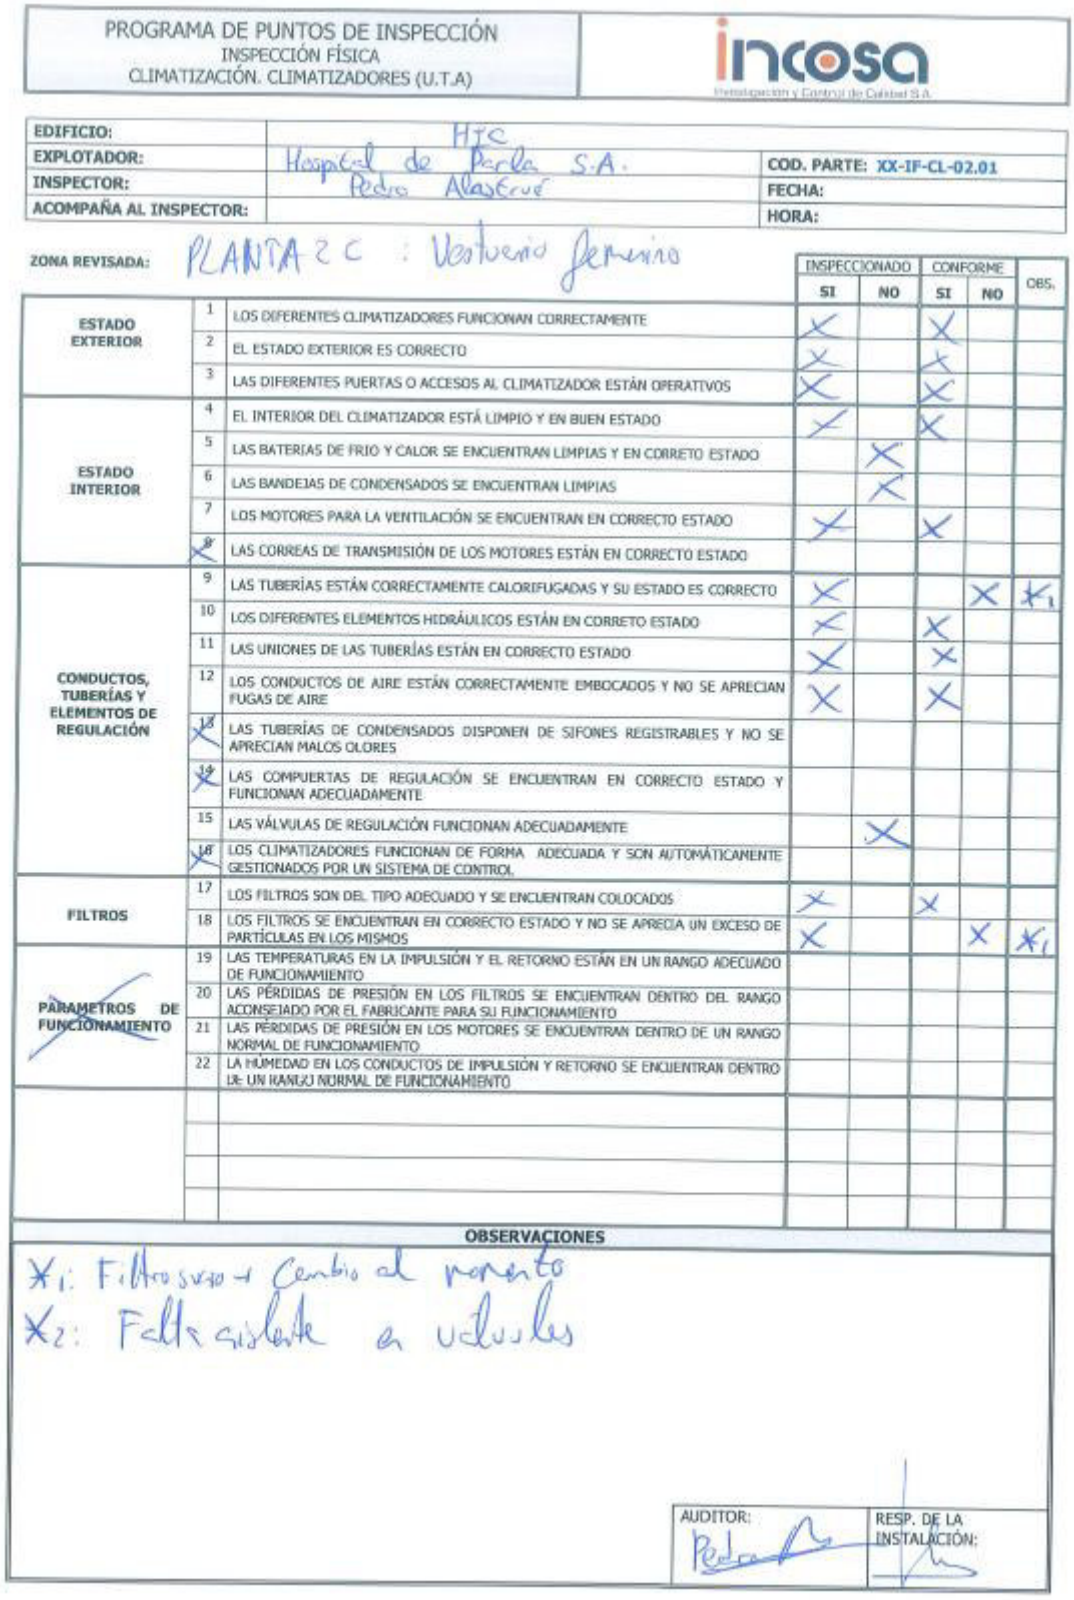

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	COD. PARTE:	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA REVISADA: PLANTA 2 C : Vestuario femenino

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X1
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X1
~~PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO~~	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X1: Filtro sucio → Cambio al momento
X2: Falta aislante en válvulas

AUDITOR: Pedro [signature]

RESP. DE LA INSTALACIÓN: [signature]

Ilustración 35: Check list Fan-Coil planta 2, módulo C, vestuario femenino

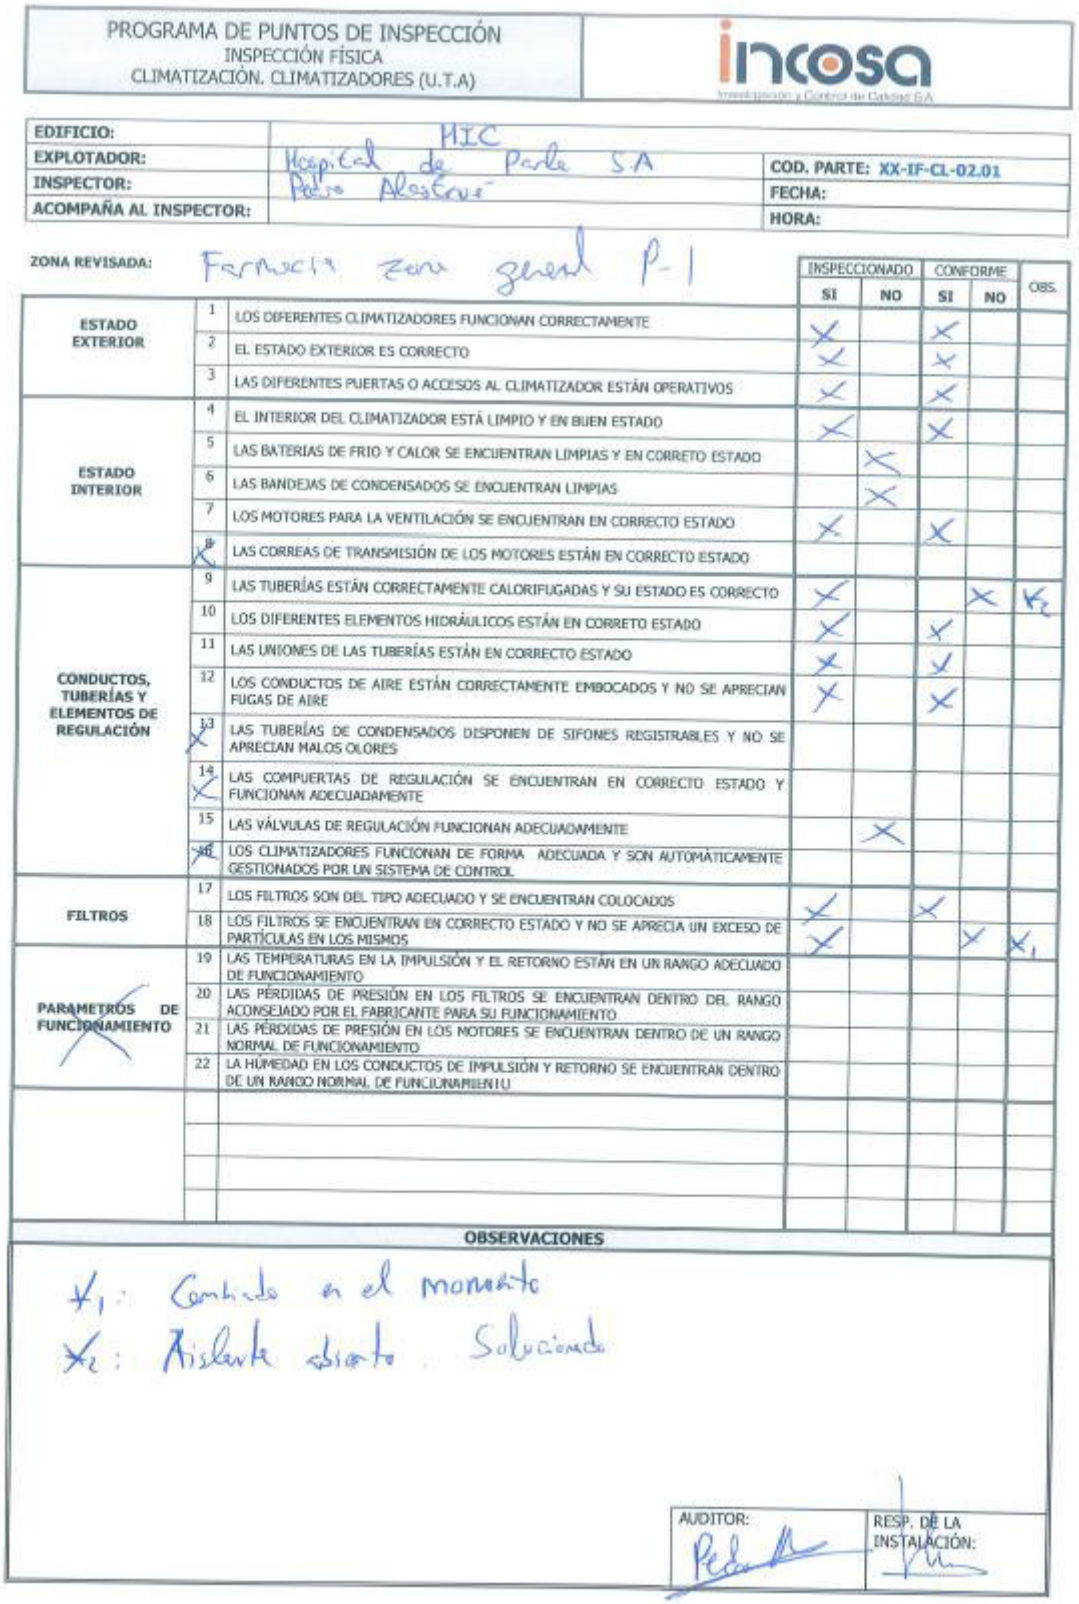

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla SA	COD. PARTE: XX-IF-CL-02.01	
INSPECTOR:	Pedro Alcántara	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA REVISADA: Farmacia zona general P-1

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X2
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X1: Cambiado en el momento

X2: Aislante disperso. Solucionado

AUDITOR: Pedro

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 36: Check list Fan-Coil planta -1, farmacia zona general

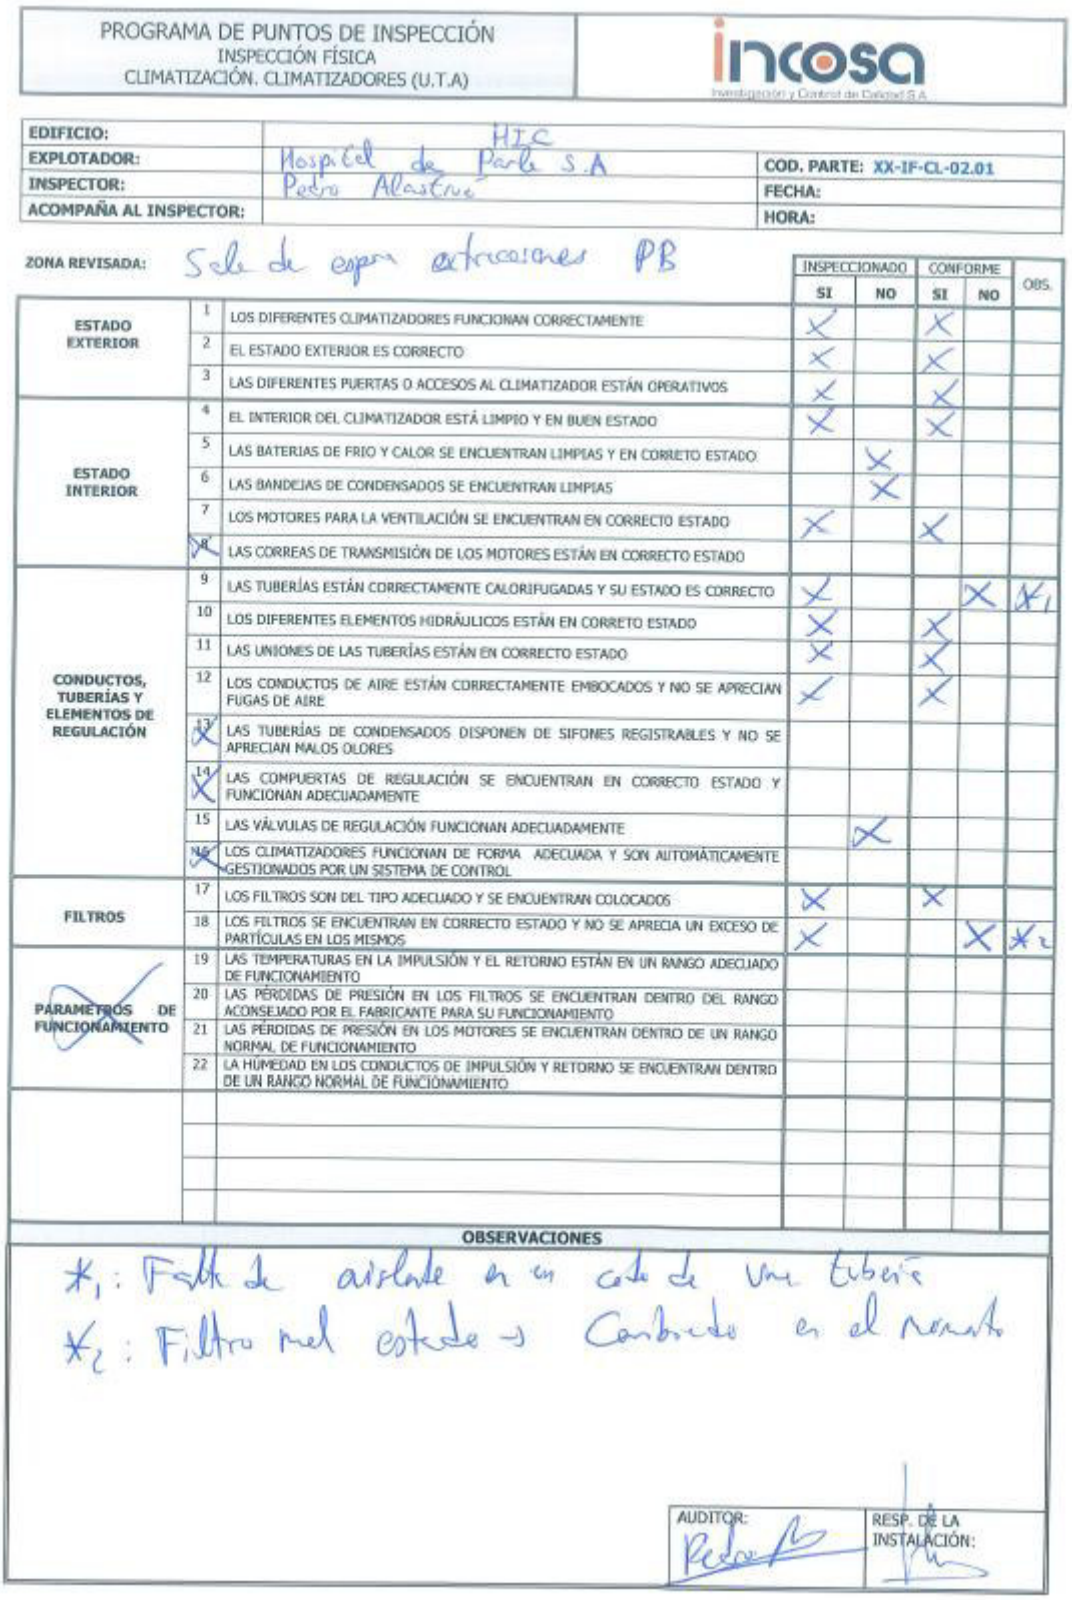

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	COD. PARTE:	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA REVISADA: Sala de espera extracciones PB

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	X	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*1
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	X	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	X	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	X	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	*2
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

*1: Falta de aislante en un codo de una tubería

*2: Filtro mal estado → Cambiado en el momento

AUDITOR: Pedro

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 37: Check list Fan-Coil planta baja, sala de espera extracciones

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Ponla SA.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alascruz	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRÉS PEDRO	**HORA:**	13:00

ZONA REVISADA: SALA ESPERA REGISTRO NACIMIENTO

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	X	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X_2
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	X	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	X	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	X	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X_1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X_1: Filtro se desmonta al sacarlo. Se cambia en el mismo

X_2: Válvulas sin aislante

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 38: Check list Fan-Coil sala de espera registro nacimiento

3. Los Fan-Coils de la Sala de Estar Polivalente, del despacho de supervisión suministros de la planta sótano -1 y del dormitorio de guardia del área de psiquiatría de la planta primera tienen las válvulas sin aislante.

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	COD. PARTE:	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alos Ever	FECHA:	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	HORA:	13:55

ZONA REVISADA: Sala estar polivalente

			INSPECCIONADO SI	INSPECCIONADO NO	CONFORME SI	CONFORME NO	OBS.
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*1
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	*2

OBSERVACIONES

*1: Válvulas sin aislar
*2: Filtro se desmonta al solic. Cambio al momento

AUDITOR:

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 39: Check list Fan-Coil sala de estar polivalente

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HFC		
EXPLOTADOR:	Hosp. Cat de Perla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pablo Alcalde	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: P.1 → Dormitorio guarda → psiquiatra

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓		✓		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	✓		✓		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	✓		✓		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	✓		✓		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		✓			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		✓			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	✓		✓		
	X	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	✓			✓	✓
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	✓		✓		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	✓		✓		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	✓		✓		
	X	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	X	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		✓			
	X	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	✓		✓		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	✓		✓		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X: Aislante Dañado → Solucionado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pablo	

Ilustración 40: Check list Fan-Coil planta 1 dormitorio de guarda psiquiatría

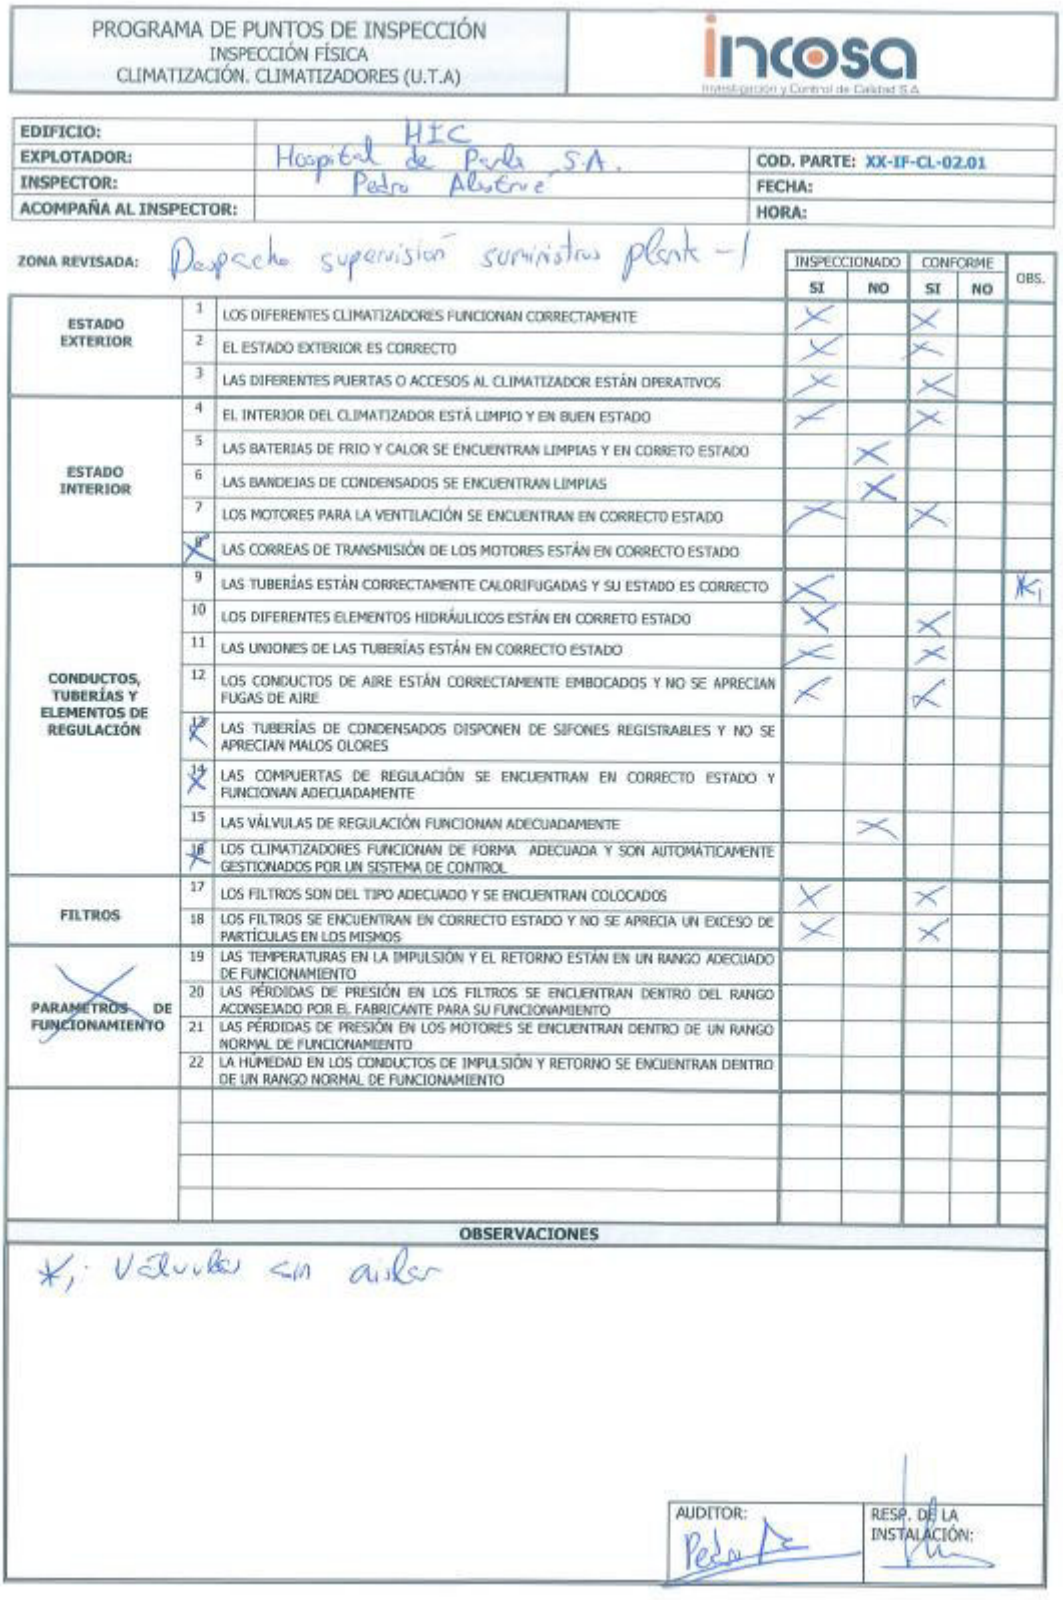

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Inspección y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Puerto Real, S.A.	COD. PARTE:	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alcaraz	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA REVISADA: Despacho supervisión suministros planta -1

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X				*1
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

*1: Válvulas sin aislar

AUDITOR: Pedro

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 41: Check list Fan-Coil planta -1 despacho de supervisor suministros

4. Los Fan-Coils del despacho 2 de la zona de diálisis y la habitación A010 de la planta baja presentan un ruido excesivo del equipo de climatización.

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	COD. PARTE: XX-IF-CL-02.01	
INSPECTOR:	Pablo Albertos	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA REVISADA: Despacho 2 → Zona diálisis

			INSPECCIONADO SI	INSPECCIONADO NO	CONFORME SI	CONFORME NO	OBS.
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X			X	*1
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

*1: Se aprecia un ruido de vibración → En la funda de las correas. Solucionado.

AUDITOR: Pablo A

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 42: Check list Fan-Coil zona de diálisis despacho nº2

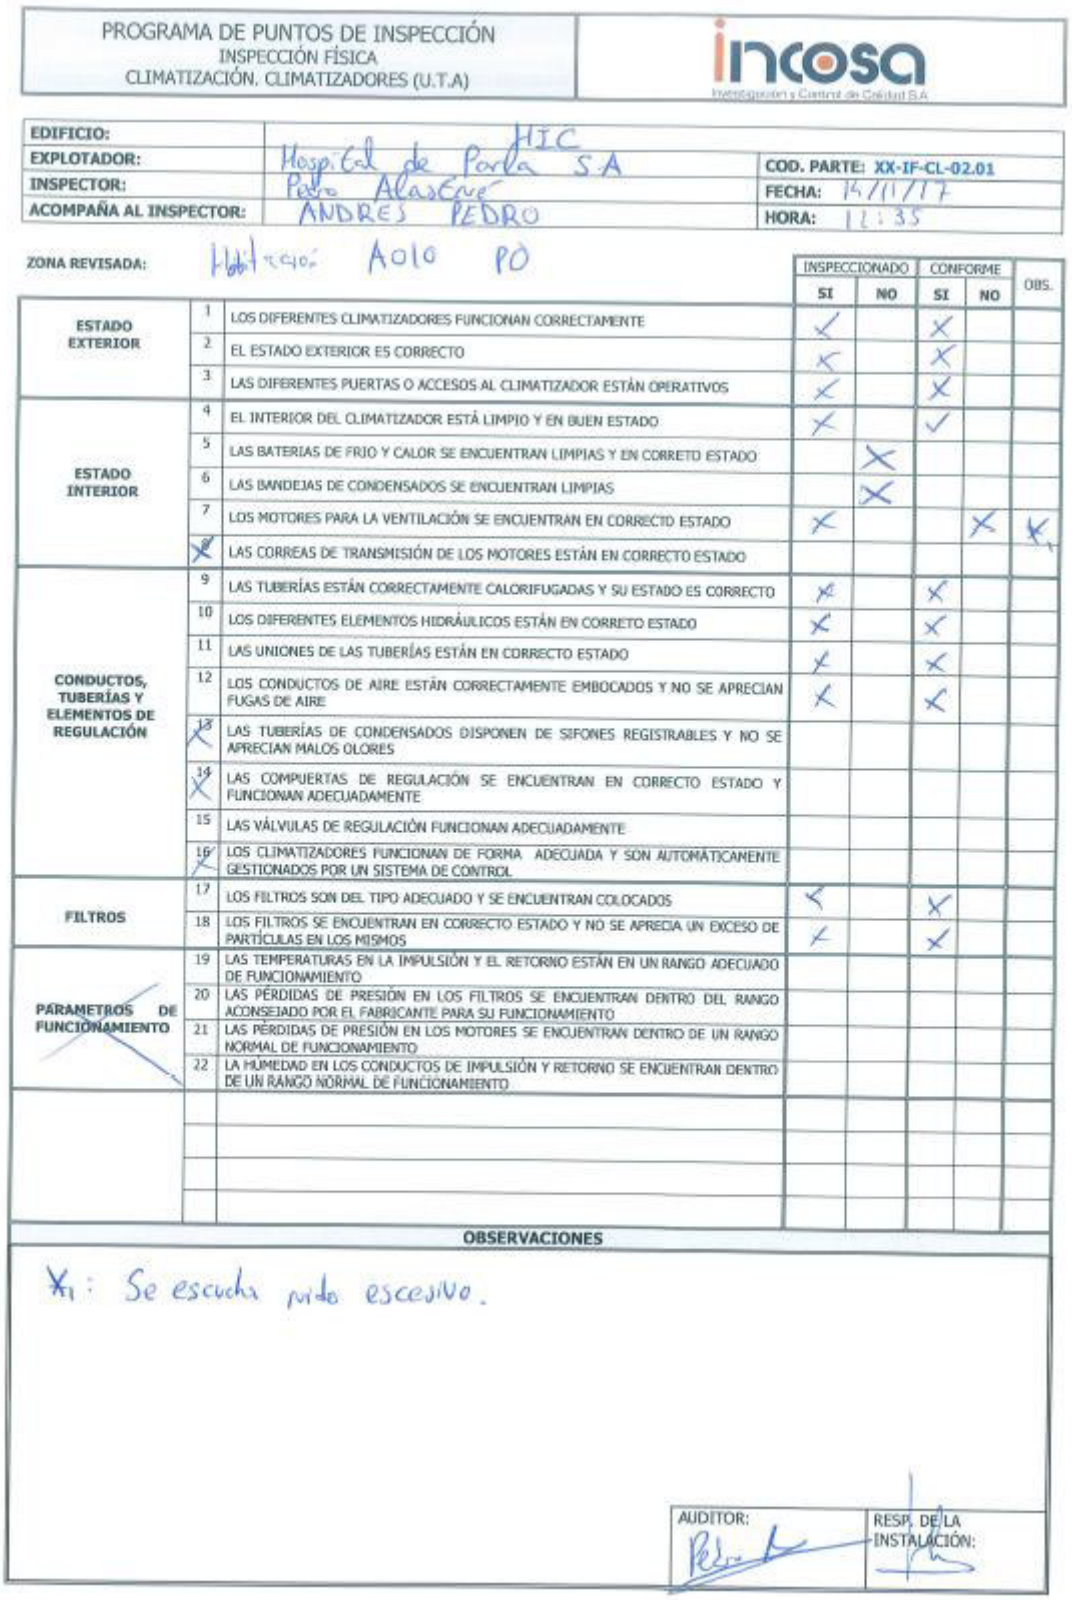

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Porta SA	COD. PARTE:	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alascue	FECHA:	14/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	HORA:	12:35

ZONA REVISADA: Habitación A010 PO

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		✓		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X			X	X1
	X	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	X	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	X	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	X	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	✓		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	✓		X		
PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X1: Se escucha ruido excesivo.

AUDITOR: Pedro

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 43: Check list Fan-Coil planta 0, módulo A, habitación 10

5. Los Fan-Coils de secretaria de farmacia en la planta sótano -1 y la habitación C289 tienen el conducto de aire suelto o caído. A mayores, presentan otras deficiencias como filtro en mal estado y falta de aislamiento térmico respectivamente.

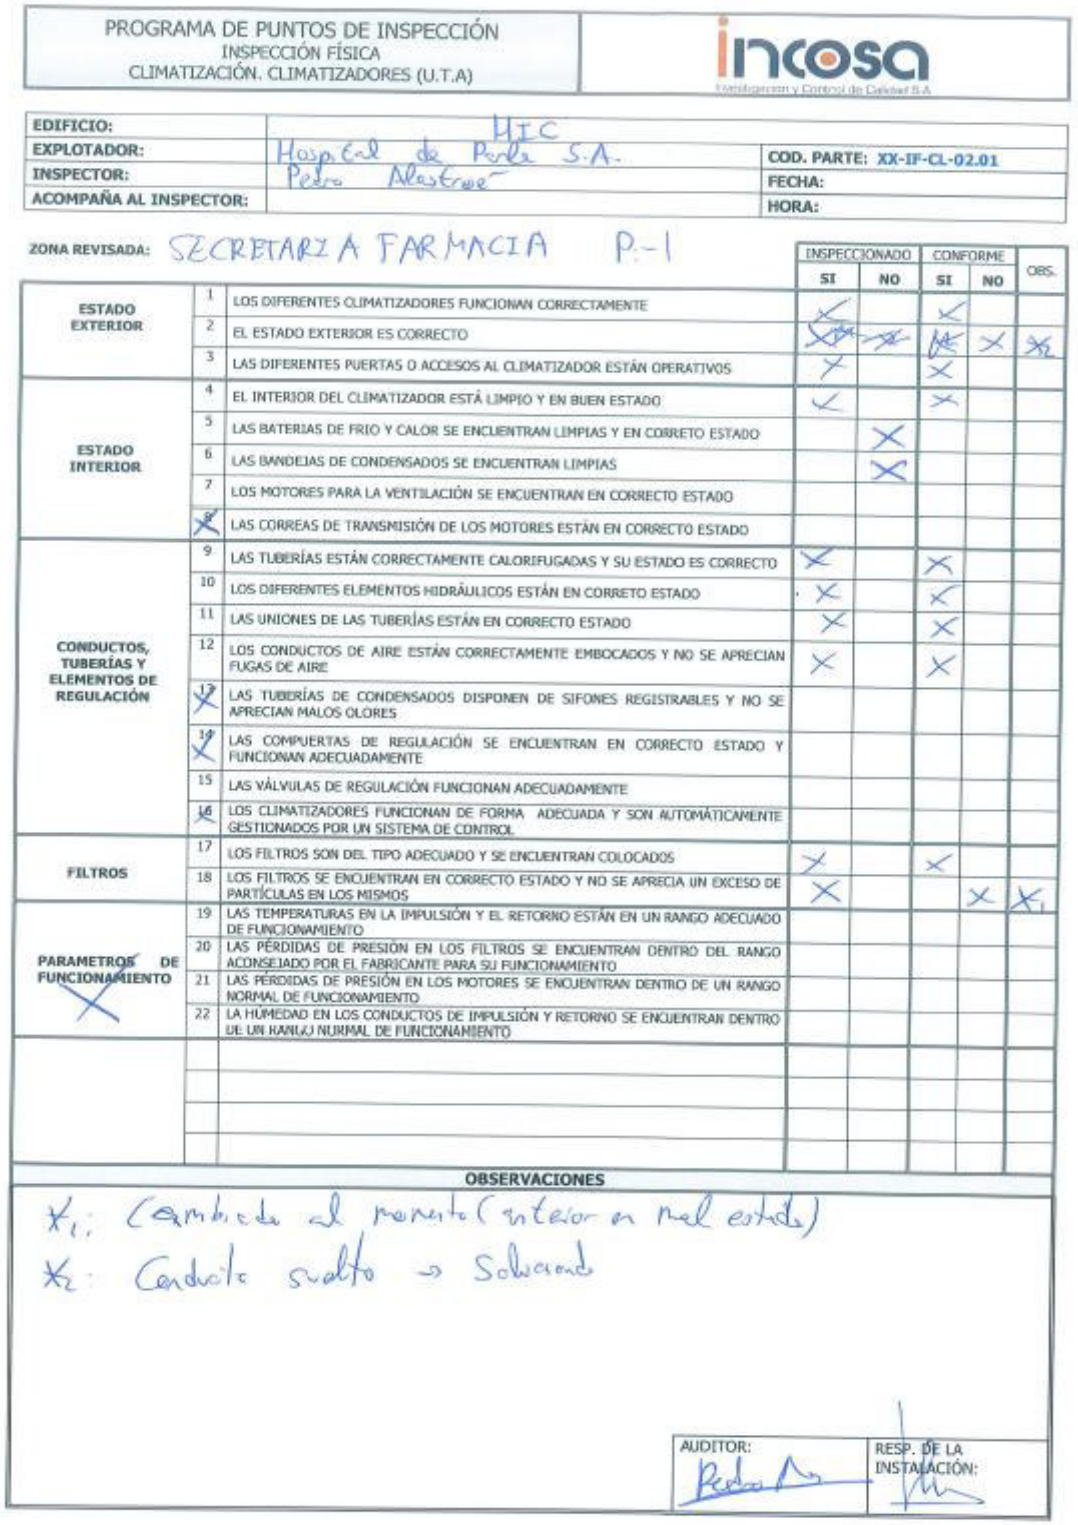

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Mantenimiento y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Porta S.A.	COD. PARTE:	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alestrué	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA REVISADA: SECRETARIA FARMACIA P.-1

			INSPECCIONADO SI	INSPECCIONADO NO	CONFORME SI	CONFORME NO	OBS.
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓		✓		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	✓		✓	X	X2
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	✓		✓		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X1: Cambiado al momento (anterior en mal estado)
X2: Conducto suelto → Solucionado

AUDITOR:

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 44: Check list Fan-Coil secretaria farmacia planta -1

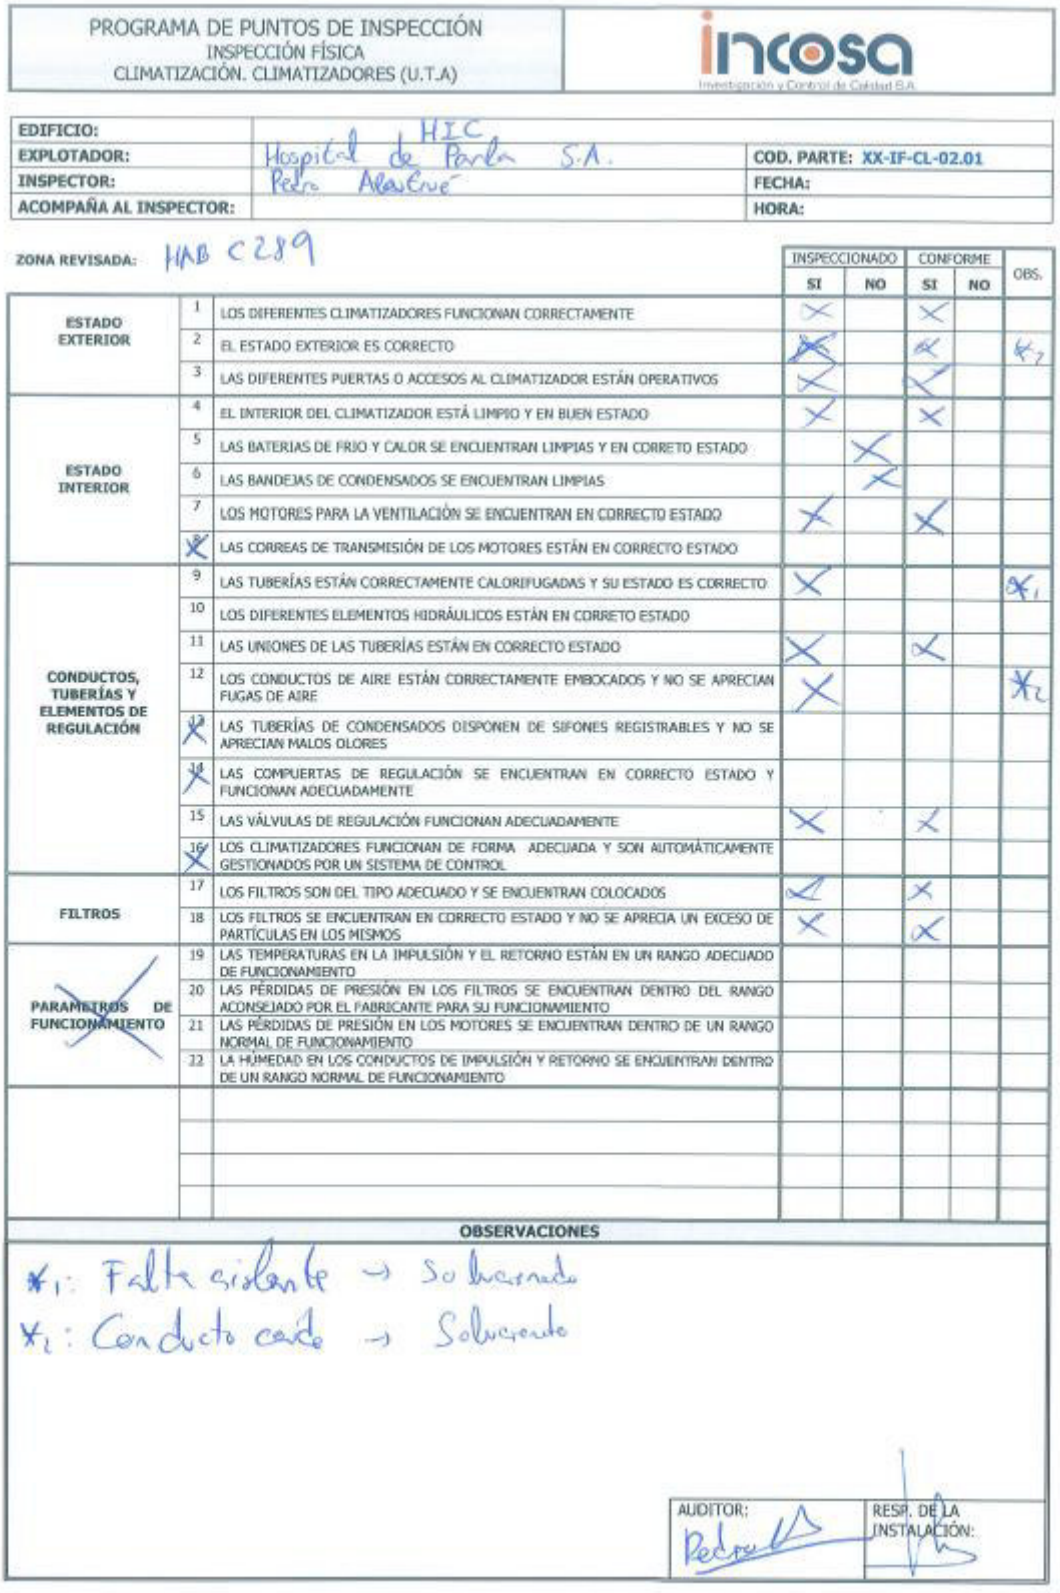

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	COD. PARTE:	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alarcué	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA REVISADA: HAB C289

			INSPECCIONADO SI	INSPECCIONADO NO	CONFORME SI	CONFORME NO	OBS.
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		X2
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X				X1
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO					
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X				X2
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X1: Falta aislante → Solucionado

X2: Conducto caído → Solucionado

AUDITOR: Pedro

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 45: Check list Fan-Coil Planta 2, módulo C, habitación 289

6. Los Fan-Coils de la zona de suministros de la planta sótano -1, de la zona polivalente de personal planta 1, del depósito de sillas de ruedas diálisis y de la sala de espera pediatría presentan filtros sucios.

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Puerta S.A.	COD. PARTE:	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alestrue	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA REVISADA: Zona Suministros Planta -1

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	*1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

*1: Filtro para cambiar → Cambiado

AUDITOR: Pedro Alestrue

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 46: Check list Fan-Coil zona de suministros planta -1

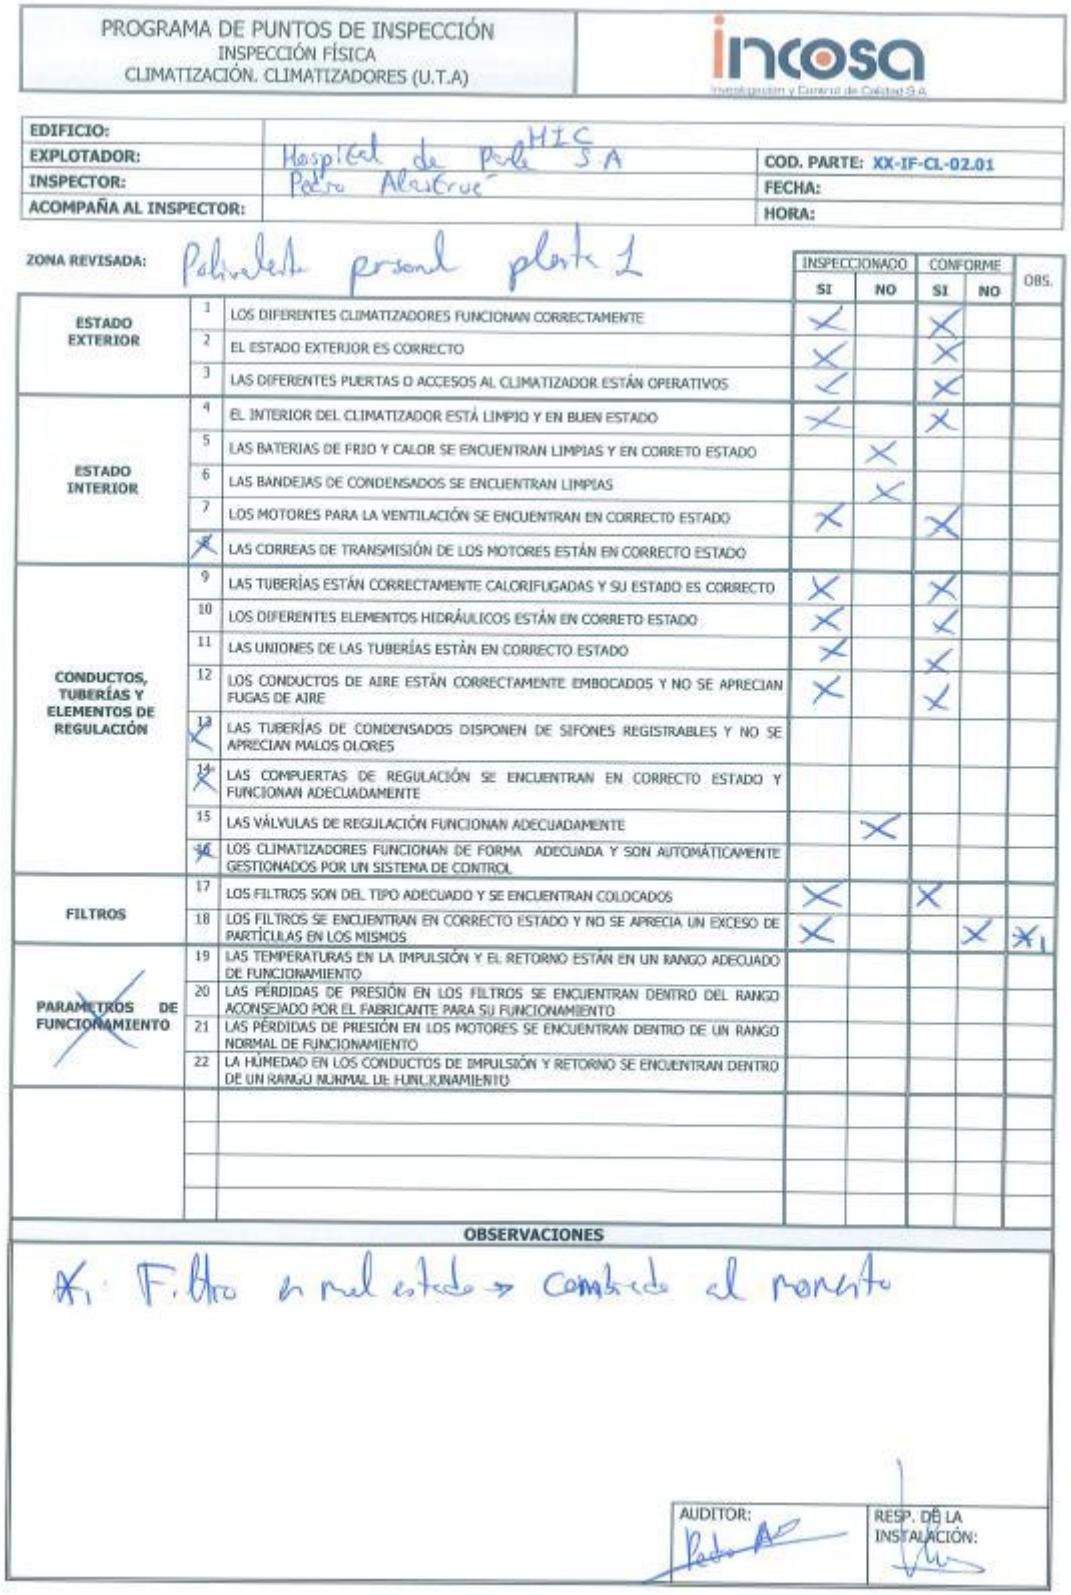

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:	Hospital de Palma HIC SA	COD. PARTE:	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alcalde	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA REVISADA: Polivalente personal planta 1

			INSPECCIONADO SI	INSPECCIONADO NO	CONFORME SI	CONFORME NO	OBS.
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	*1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

*1: Filtro en mal estado → Cambiado el momento

AUDITOR: Pedro A

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 47: Check list Fan-Coil planta 1, sala polivalente personal

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Inspección y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	COD. PARTE:	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA REVISADA: Deposito sillas de ruedas diálisis

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO					
	5	LAS BATERÍAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X	X	*1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

*1: Filtro para cambiar → Cambiados

AUDITOR: Pedro

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 48: Check list Fan-Coil deposito de silla de ruedas diálisis

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hosp. Cd de Parla SA.	COD. PARTE:	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro - Alcalde	FECHA:	14/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRÉS PEDRO	HORA:	12:50

ZONA REVISADA: Sala espera pediatría PO

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X1 : Filtro sucio. Cambiado en el momento

AUDITOR: Pedro A

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 49: Check list Fan-Coil sala de espera pediatría, planta 0

7. El Fan-Coil de la Zona de suministro de la Planta -1 presenta un filtro de aire con necesidad de cambio y aislante agrietado. Se realiza el cambio en el momento.

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Zona Suministros Planta -1

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X_2
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			✓	X_1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X_1: Filtro con necesidad de cambio → Cambiado en el mismo

X_2: Aislante agrietado → Solucionado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 50: Check list Fan-Coil planta -1, zona de suministros

8. El Fan-Coil de la Sala de Espera de la Planta 2 presenta un filtro de aire defectuoso. Se realiza el cambio en el momento.

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hosp. Cat de Perla S.A.	COD. PARTE:	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pablo Alcalde	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA REVISADA: SALA DE ESPERA PLANTA 2

			INSPECCIONADO SI	INSPECCIONADO NO	CONFORME SI	CONFORME NO	OBS.
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		X1
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		X1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X1 Filtro defectuoso → Cambio en el momento

AUDITOR: Pedro Ms

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 51: Check list Fan-Coil planta 2, sala de espera

9. El Fan-Coil del Despacho de Cirugía Soporte Médico 2 presenta un acceso difícil.

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Perla SA.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alcaraz	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Despacho Cirugía Soporte Médico 2.

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X				X1
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	X	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	X	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	X	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	X	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		X2
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	X	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	X	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	X	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	X	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X1: Difícil acceso

X2: Marca: Vaillant MMFCE
VF-PR/21
9 40x 215 x 6

AUDITOR:

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 52: Check list Fan-Coil despacho cirugía soporte médico 2

10. El Fan-Coil de la Habitación 155B de la Planta 1 presenta falta de limpieza en el interior del mismo. Se detectan también zonas de tubería con aislante roto. Ambas deficiencias se solucionan.

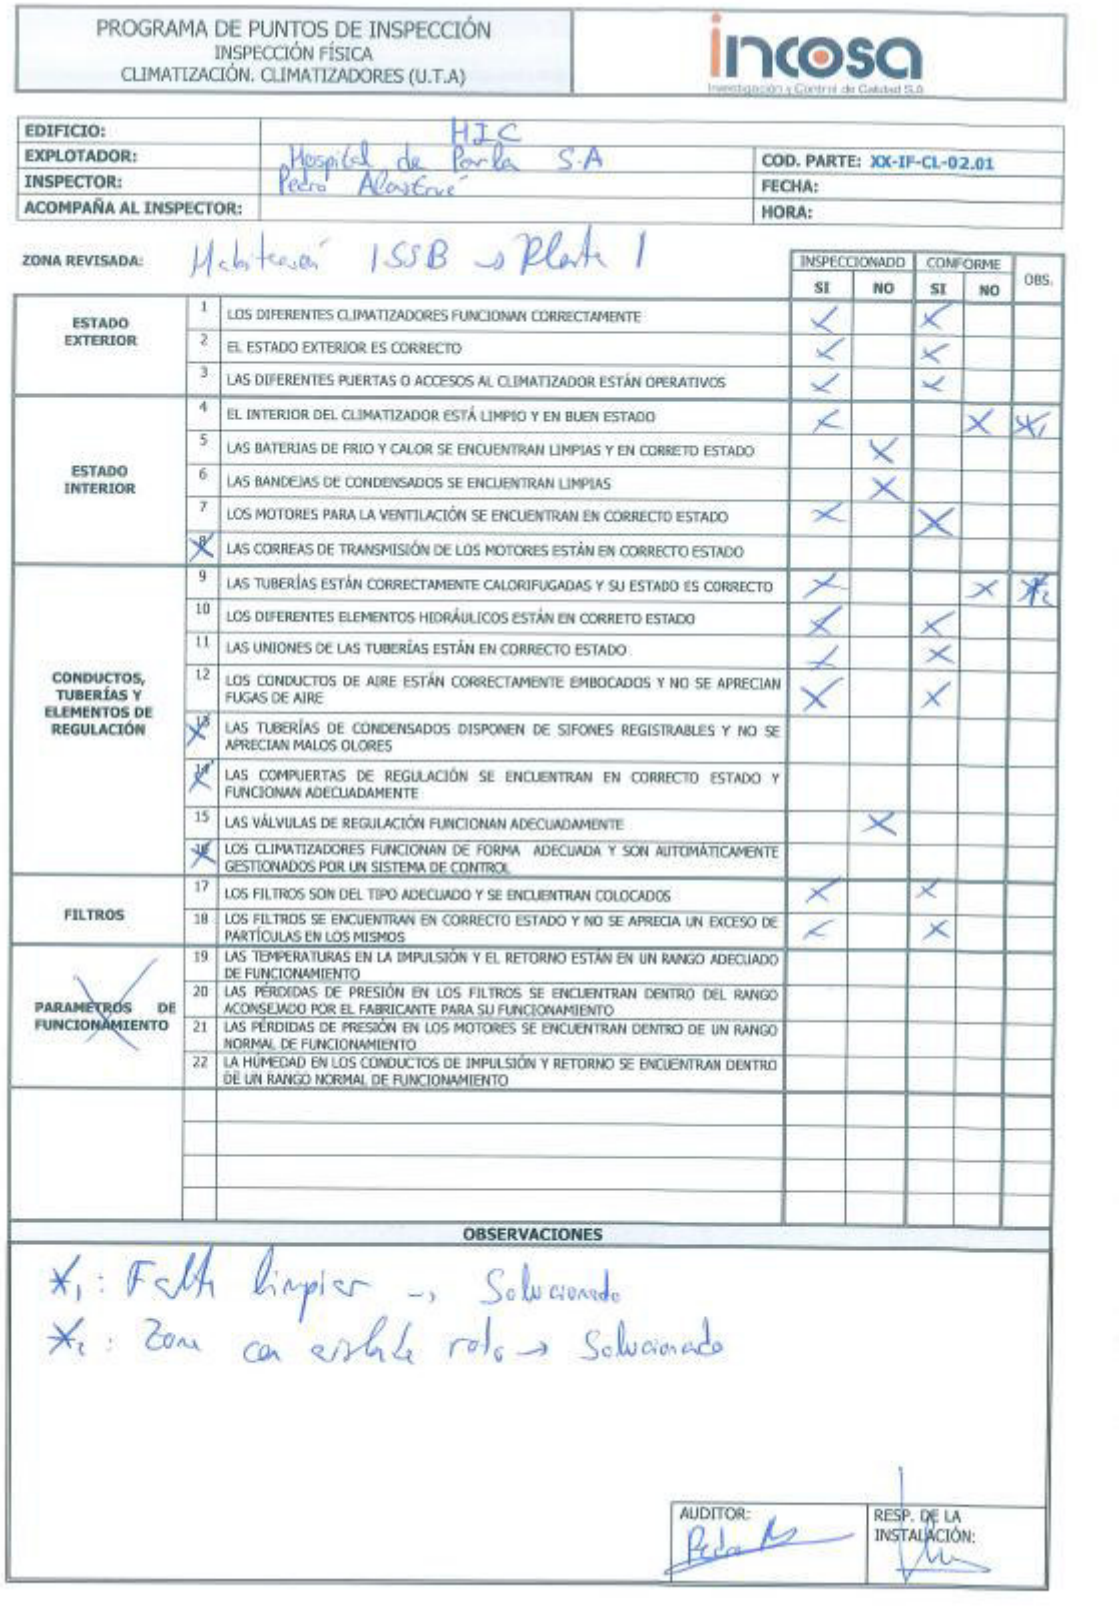

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	COD. PARTE:	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alcántara	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA REVISADA: Habitación 155B → Planta 1

			INSPECCIONADO SI	INSPECCIONADO NO	CONFORME SI	CONFORME NO	OBS.
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓		✓		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	✓		✓		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	✓		✓		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	✗			✗	✗1
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		✗			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		✗			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	✗		✗		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	✗			✗	✗2
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	✓		✓		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	✓		✓		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	✓		✓		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		✗			
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	✓		✓		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	✓		✓		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

✗1: Falta limpiar → Solucionado
✗2: Zona con aislante roto → Solucionado

AUDITOR:

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 53: Check list Fan-Coil planta 1, módulo B, habitación 155

11. El Fan-Coil de la Planta 1 Vestuario Número 2 de Consultas Externas presenta difícil acceso. También se aprecia mal estado del filtro de aire, el cual se cambia al momento.

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Instalaciones y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Palma S.A	COD. PARTE:	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alés Cruz	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA REVISADA: P1: Vestuario Nº 2 Consultas externas

			INSPECCIONADO SI	INSPECCIONADO NO	CONFORME SI	CONFORME NO	OBS.
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X			X	*1
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	*2
PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HUMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

*1: Difícil acceso
*2: Filtro para cambiar. Cambiado a el momento

AUDITOR: Pedro

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 54: Check list Fan-Coil vestuario nº2 consultas externas, planta 2

12. Los siguientes fancoils presentan las siguientes deficiencias, válvulas sin aislar y filtro defectuoso o sucio. Estos son los fancoils de las siguientes zonas:

- Sala de estar polivalente.
- Habitación 237 B.
- Habitación 246 B.
- Despacho Supervisor rehabilitación.
- Habitación 239 B.
- Sala de estar comedor segunda planta.
- Supervisión tarde segunda planta.
- Trabajo administrativo segunda planta.

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospitalet de Pons SA	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alcaraz	**FECHA:**	15/11/12
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	15:55

ZONA REVISADA: Sala estar polivalente

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*1
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	*2

OBSERVACIONES

*1: Válvulas sin aislar

*2: Filtro se desmonta al solic. Cambiado el momento

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 55: Check list Fan-Coil sala de estar polivalente

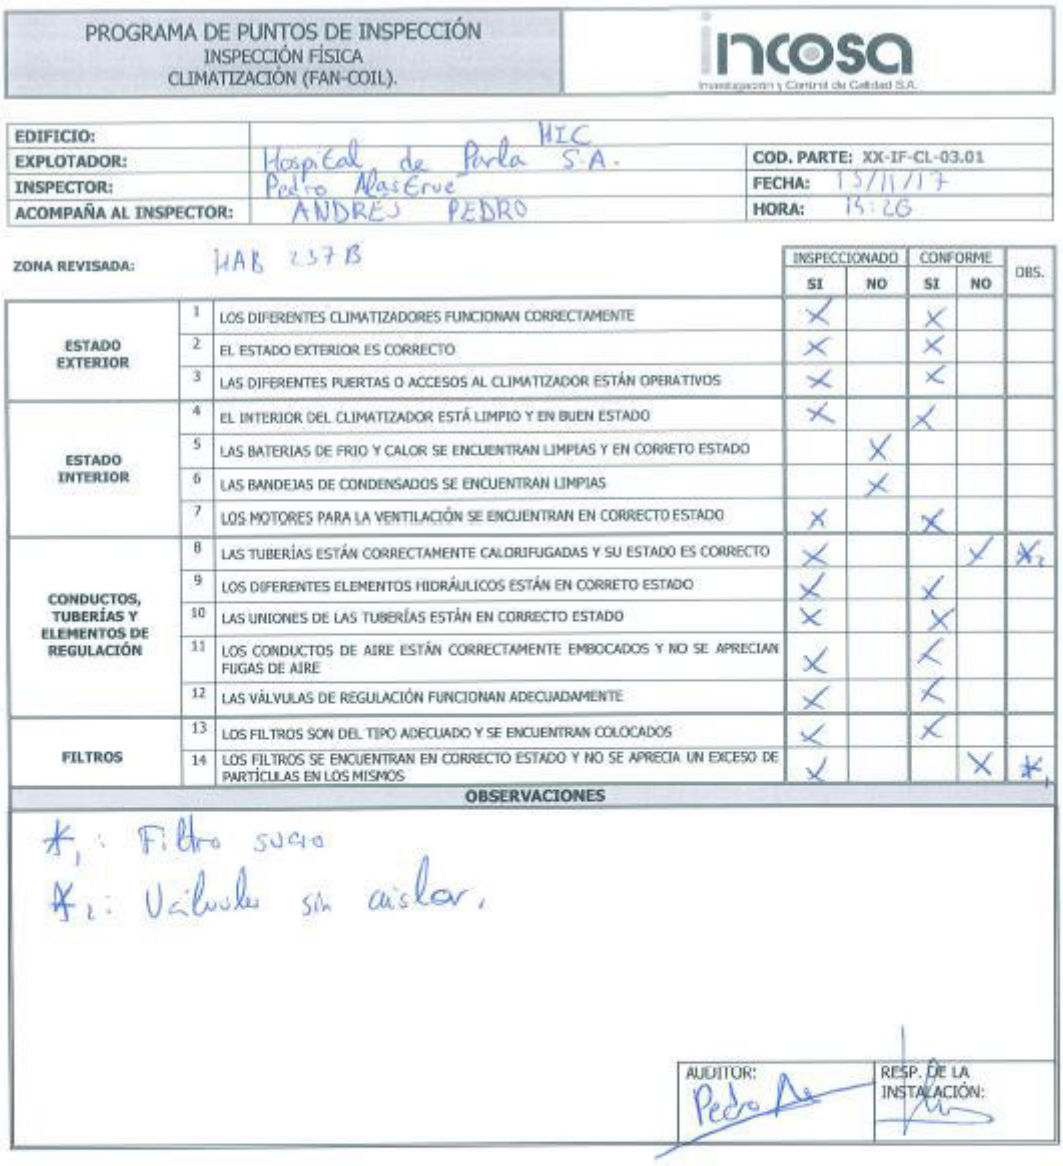

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	13:26

ZONA REVISADA: HAB 237 B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*2
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	*1

OBSERVACIONES

*1: Filtro sucio

*2: Válvulas sin aislar.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro A	

Ilustración 56: Check list Fan-Coil planta2, módulo B, habitación 237

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alarcue	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	14:50

ZONA REVISADA: HAB 246B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*2
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	*1

OBSERVACIONES

*1: Filtro sucio. Cambiado a el momento

*2: Válvula no aislada

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro A	

Ilustración 57: Check list Fan-Coil, planta 2, módulo B, habitación 246

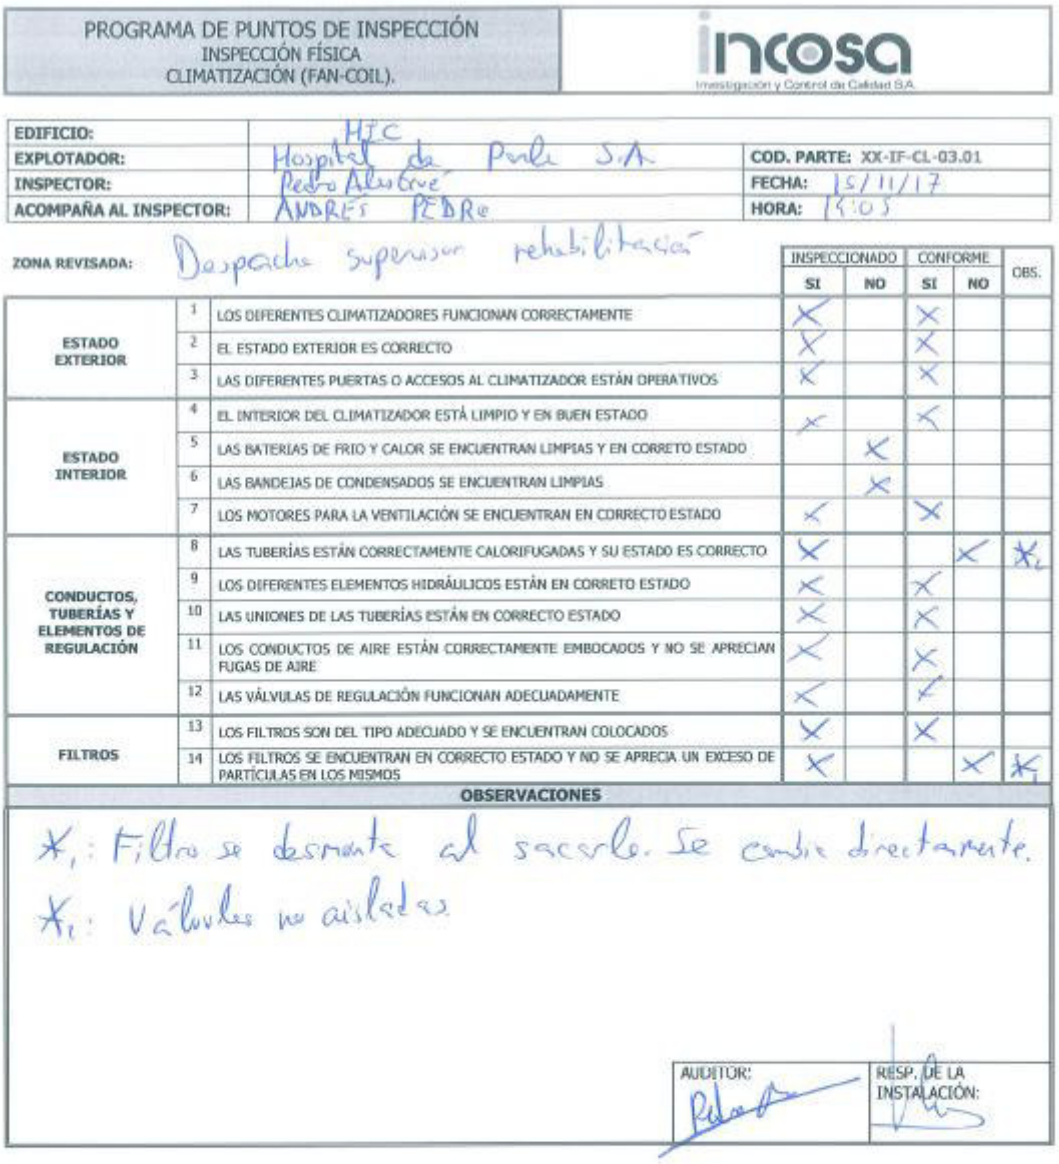

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Puerto S.A.	COD. PARTE:	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alvarez	FECHA:	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRÉS PEDRO	HORA:	13:05

ZONA REVISADA: Despacho supervisor rehabilitación

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERÍAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X_2
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X_1

OBSERVACIONES

X_1: Filtro se desmonta al sacarlo. Se cambia directamente.

X_2: Válvulas no aisladas

AUDITOR:

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 58: Check list Fan-Coil despacho supervisor rehabilitación

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alcaraz	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	14:57

ZONA REVISADA: HAB 239B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X1
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X1

OBSERVACIONES

X1: Filtro sucio. Cambiado en el momento

X2: Válvula sin cerrar

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro A	

Ilustración 59: Check list Fan-Coil planta 2, módulo B, habitación 239

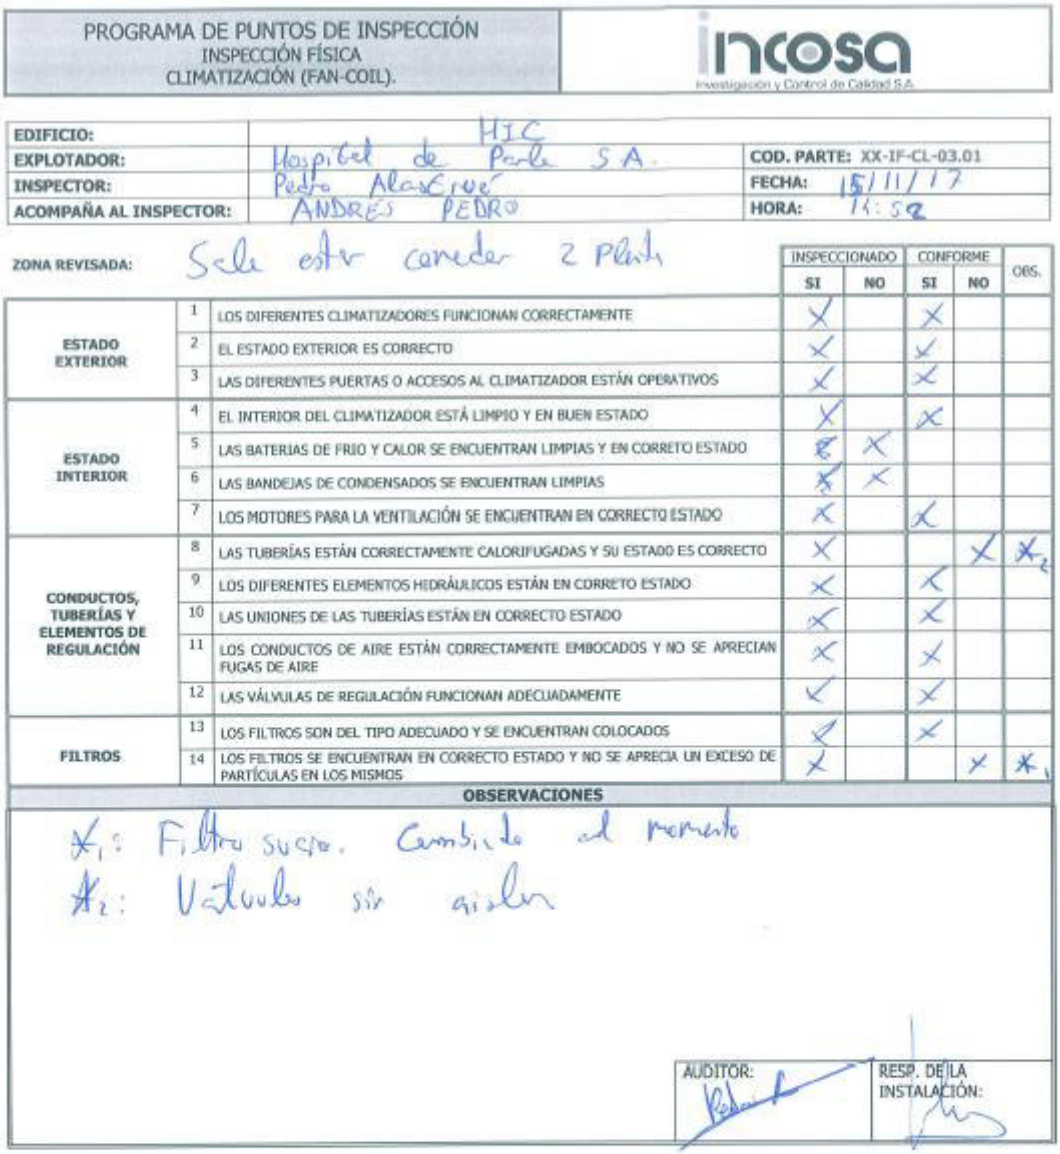

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospitet de Parla SA.	COD. PARTE:	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alascruz	FECHA:	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	HORA:	14:52

ZONA REVISADA: Sala estar comedor 2 Planta

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	X	X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS	X	X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X_2
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X_1

OBSERVACIONES

X_1: Filtro sucio. Cambiado el momento
X_2: Valvula sin aislar

AUDITOR:

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 60: Check list Fan-Coil planta 2, sala de estar comedor

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hosp. Cat de Porto SA	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Albacruz	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	15:00

ZONA REVISADA: Supervisión tarde 2 Planta

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X_1
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X	✓	
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X_1

OBSERVACIONES

X_1: Filtro sucio cambiado el mismo.

X_2: Válvula sin aislar.

AUDITOR: Pedro

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 61: Check list Fan-Coil supervisión tarde, planta 2

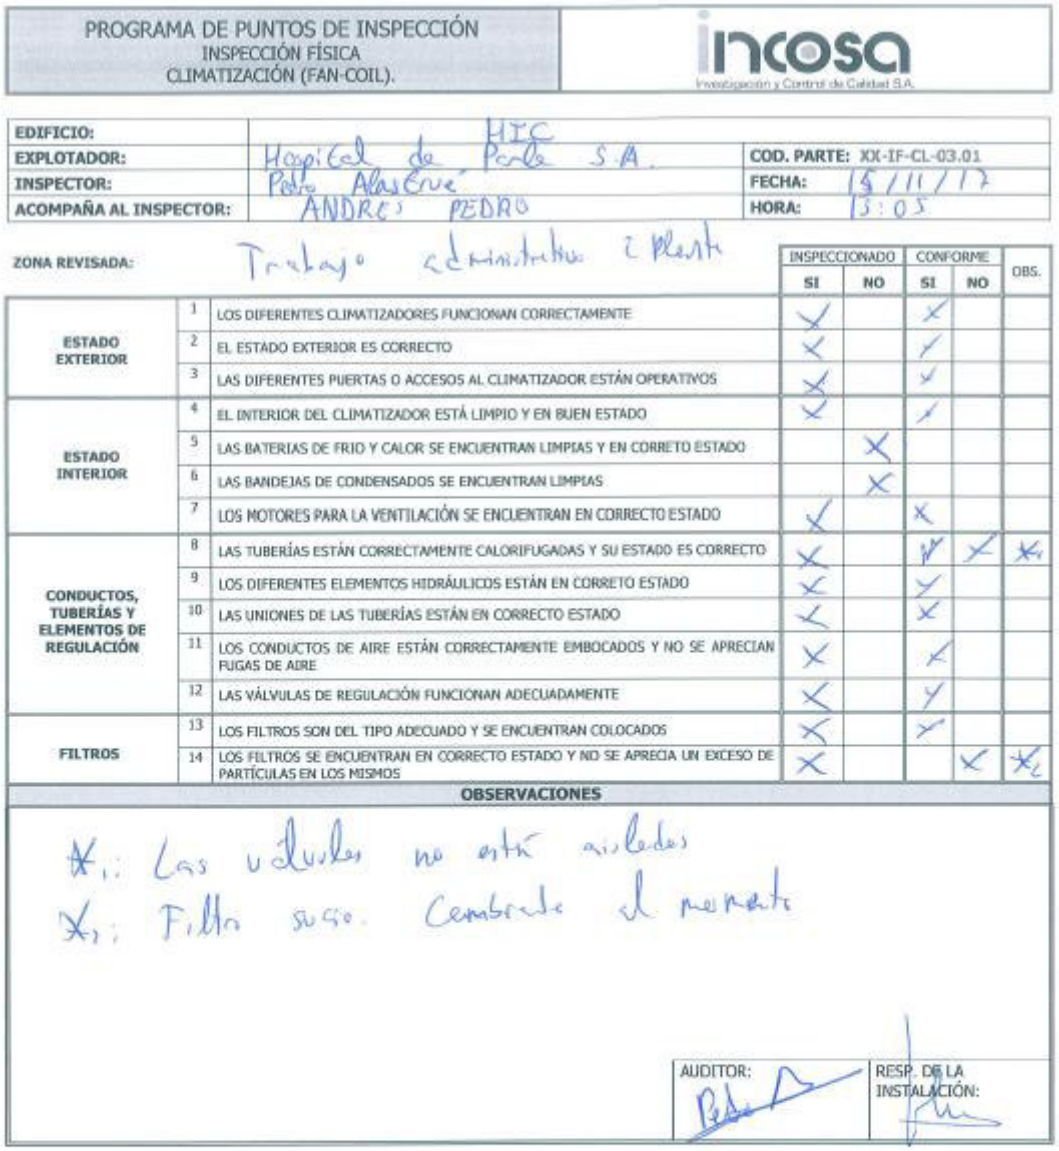

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	13:05

ZONA REVISADA: Trabajo administrativo 2 planta

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X	X	X1
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X2

OBSERVACIONES

X1: Las válvulas no están aisladas
X2: Filtro sucio. Cambiado al momento

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 62: Check list Fan-Coil, planta 2, trabajo administrativo

13. Los siguientes fancoils presentan válvulas sin recubrimiento con aislamiento térmico.

- Habitación 231 B.
- Habitación 257 B.
- Habitación 260 B.
- Habitación 254 B.
- Habitación 234 B.
- Habitación 250 B.
- Consulta Traumatología
- Sala de asociación 1

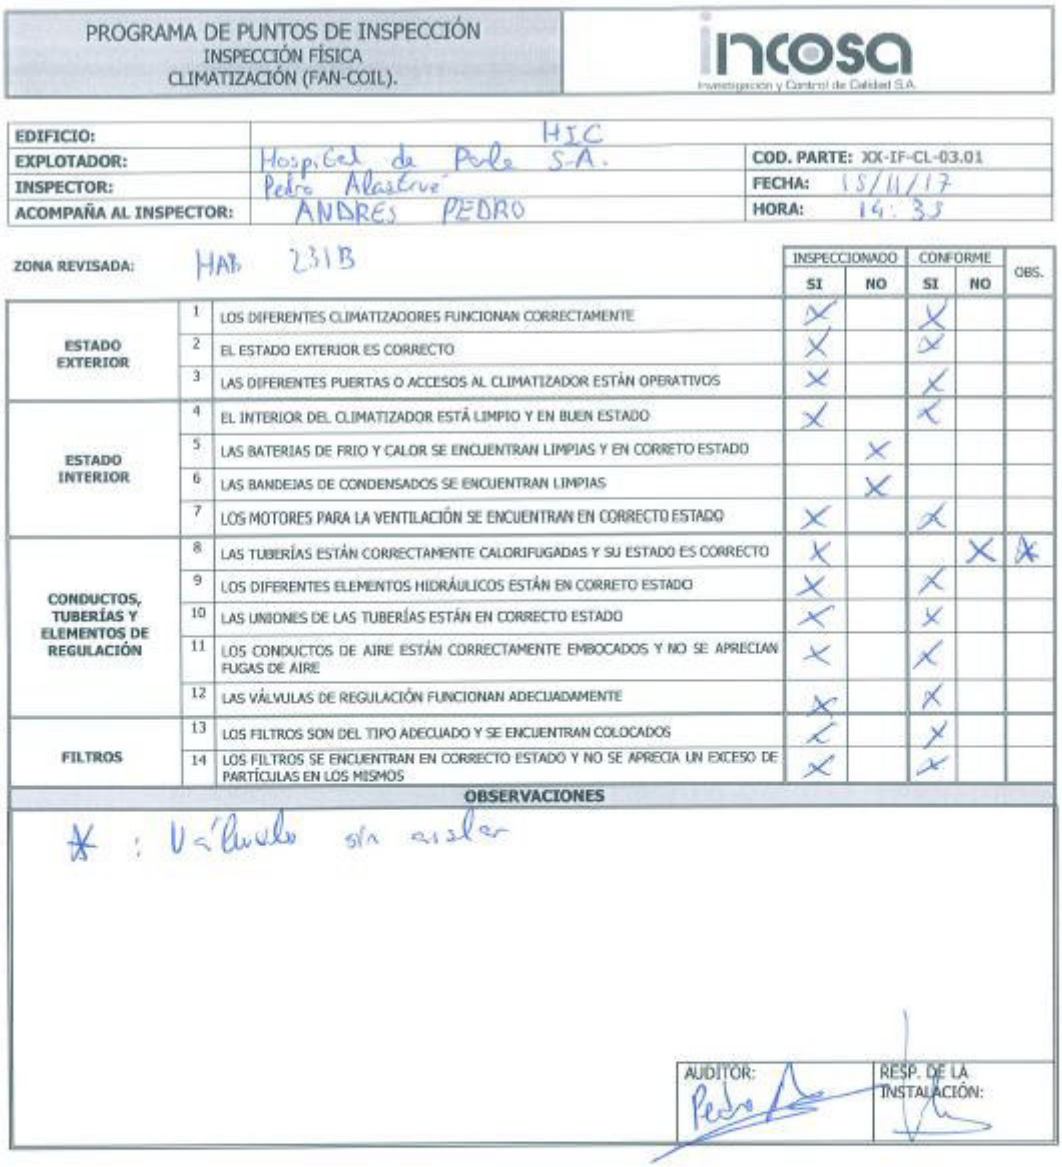

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	14:35

ZONA REVISADA: HAB 231B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		

OBSERVACIONES

* : Válvula sin aislar

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 63: Check list Fan-Coil planta 2, módulo B, habitación 231

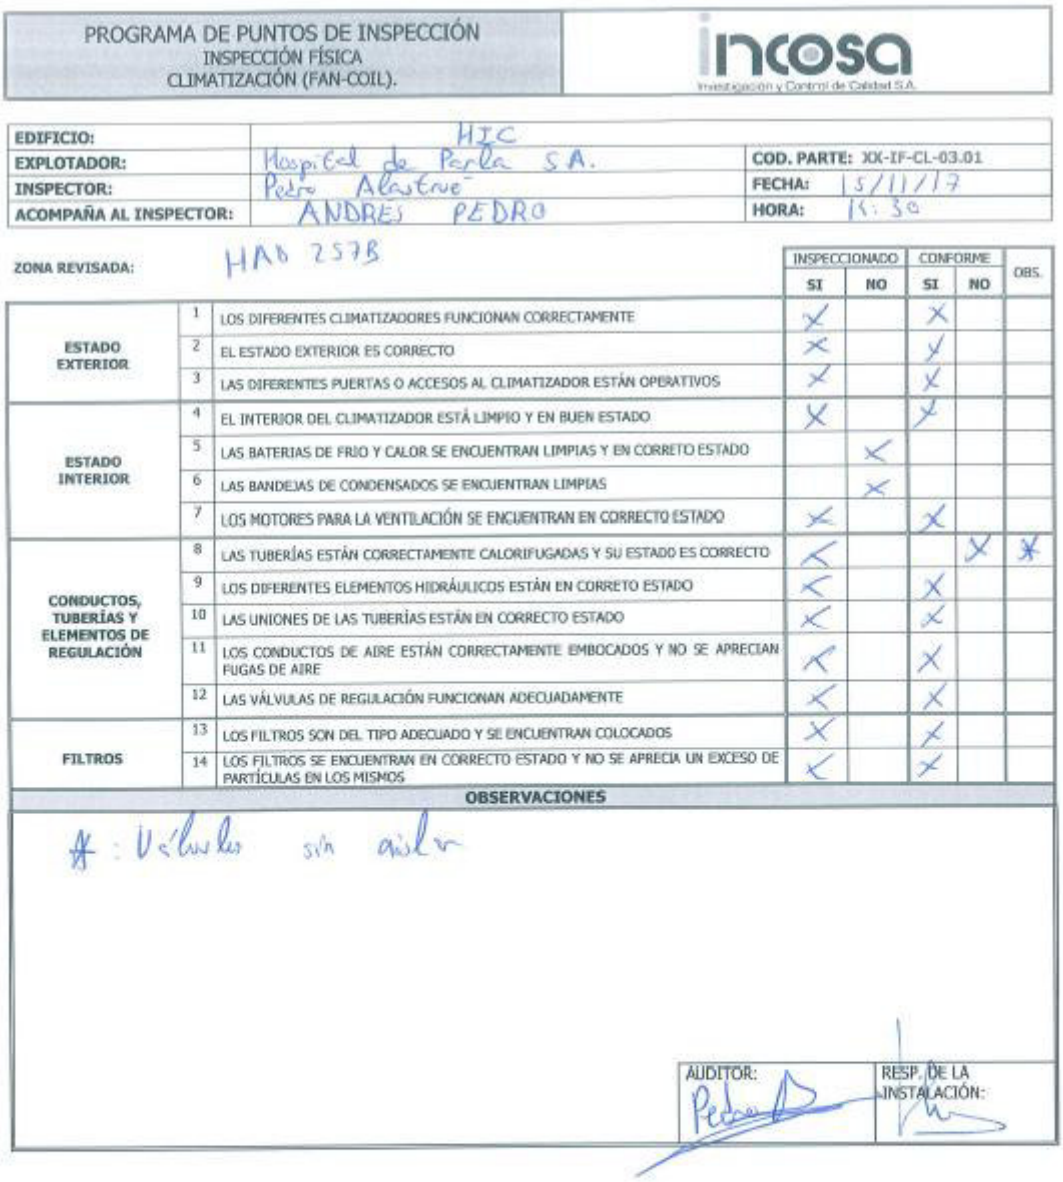

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	15:30

ZONA REVISADA: HAB 257B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		

OBSERVACIONES

*: Válvulas sin aislar

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 64: Check list Fan-Coil, planta 2, módulo b, habitación 257

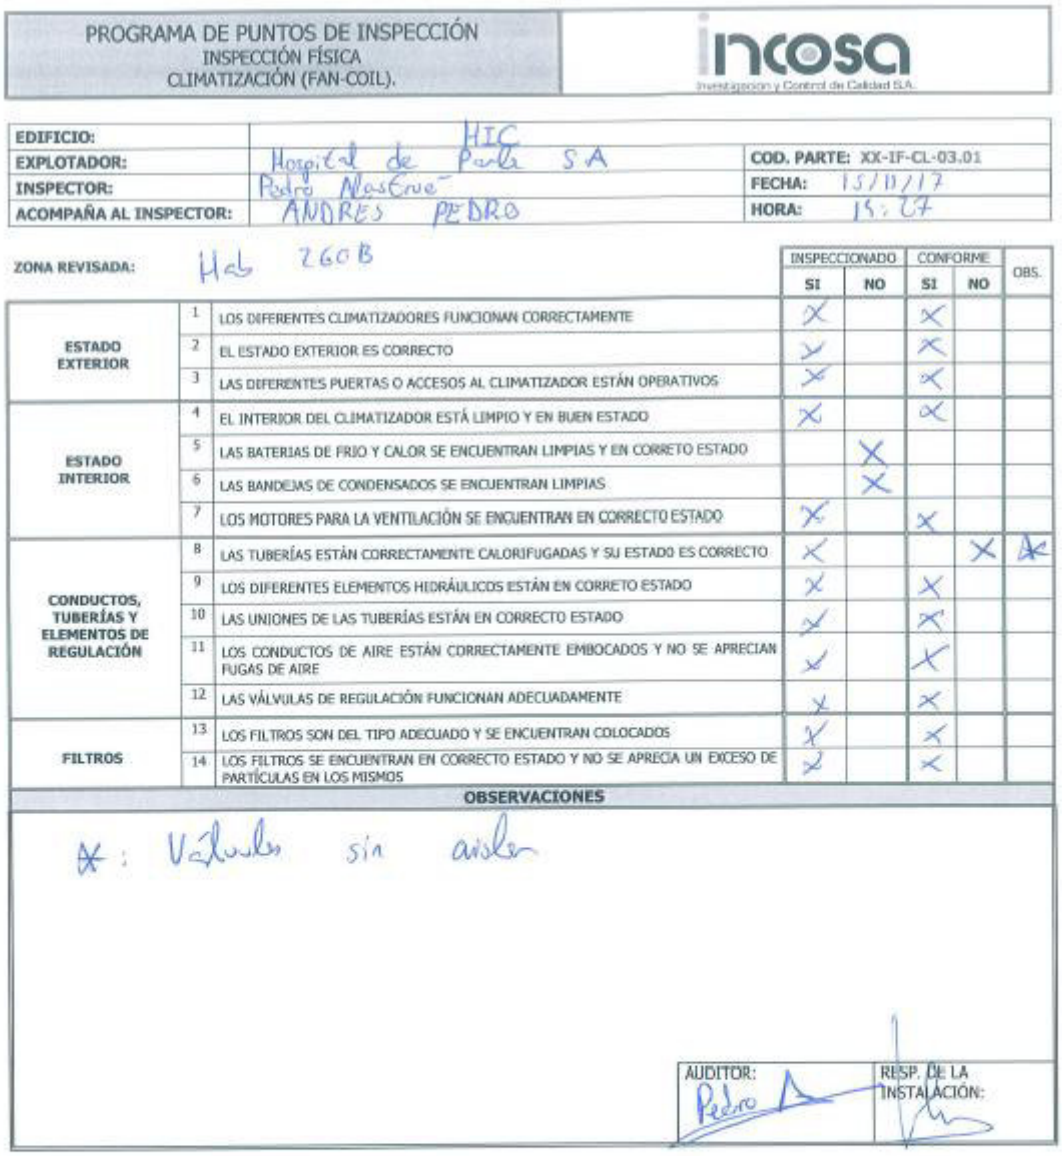

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Pula SA	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Mostrue	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	15:07

ZONA REVISADA: Hab 260B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		

OBSERVACIONES

*: Válvula sin aislar

AUDITOR: Pedro

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 65: Check list Fan-Coil planta 2, módulo B, habitación 260

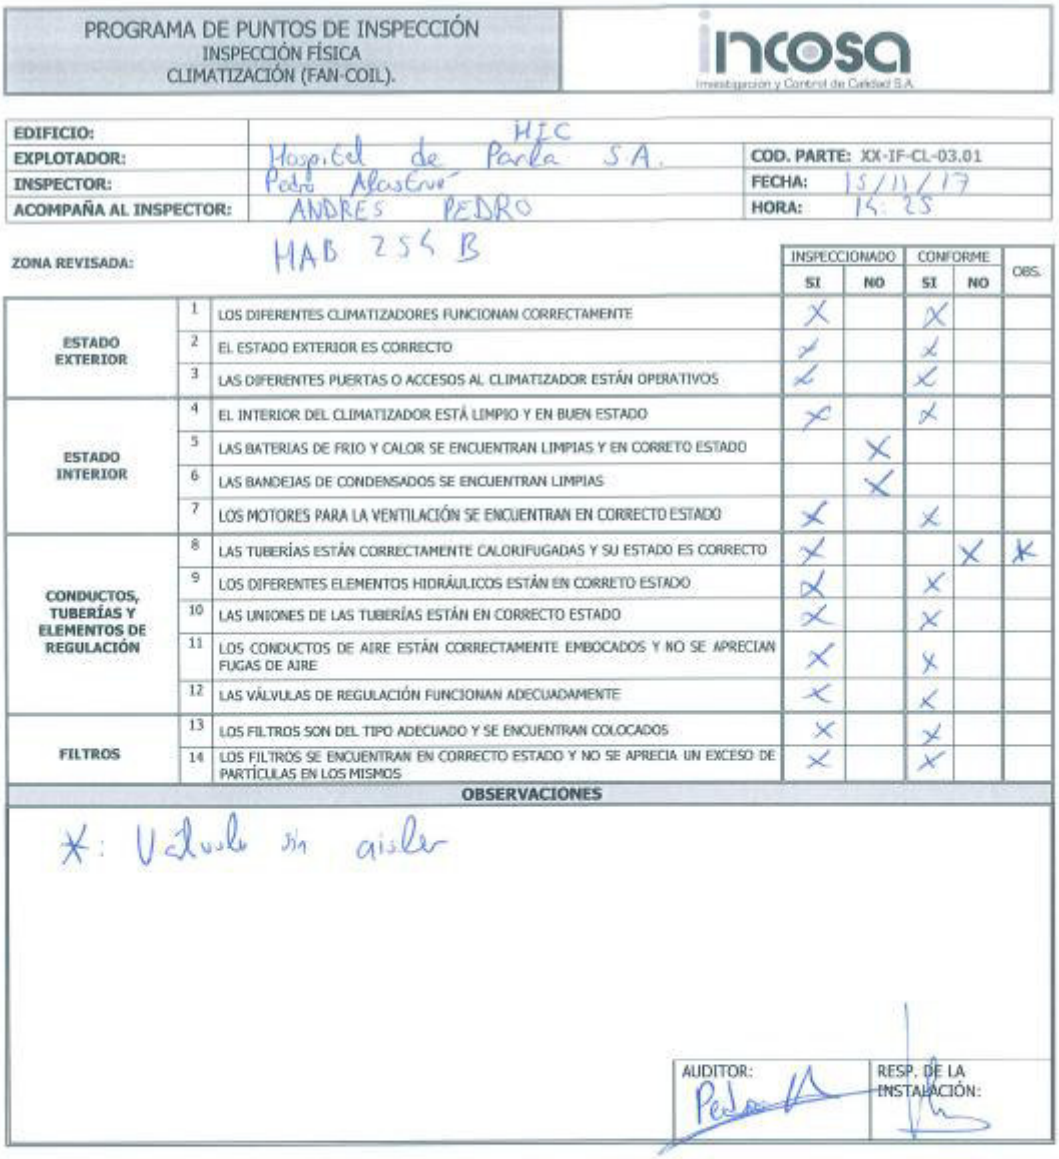

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	14:25

ZONA REVISADA: HAB 254 B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		

OBSERVACIONES

*: Válvula sin aislar

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro A	

Ilustración 66: Check list Fan-Coil planta 2, módulo B, habitación 254

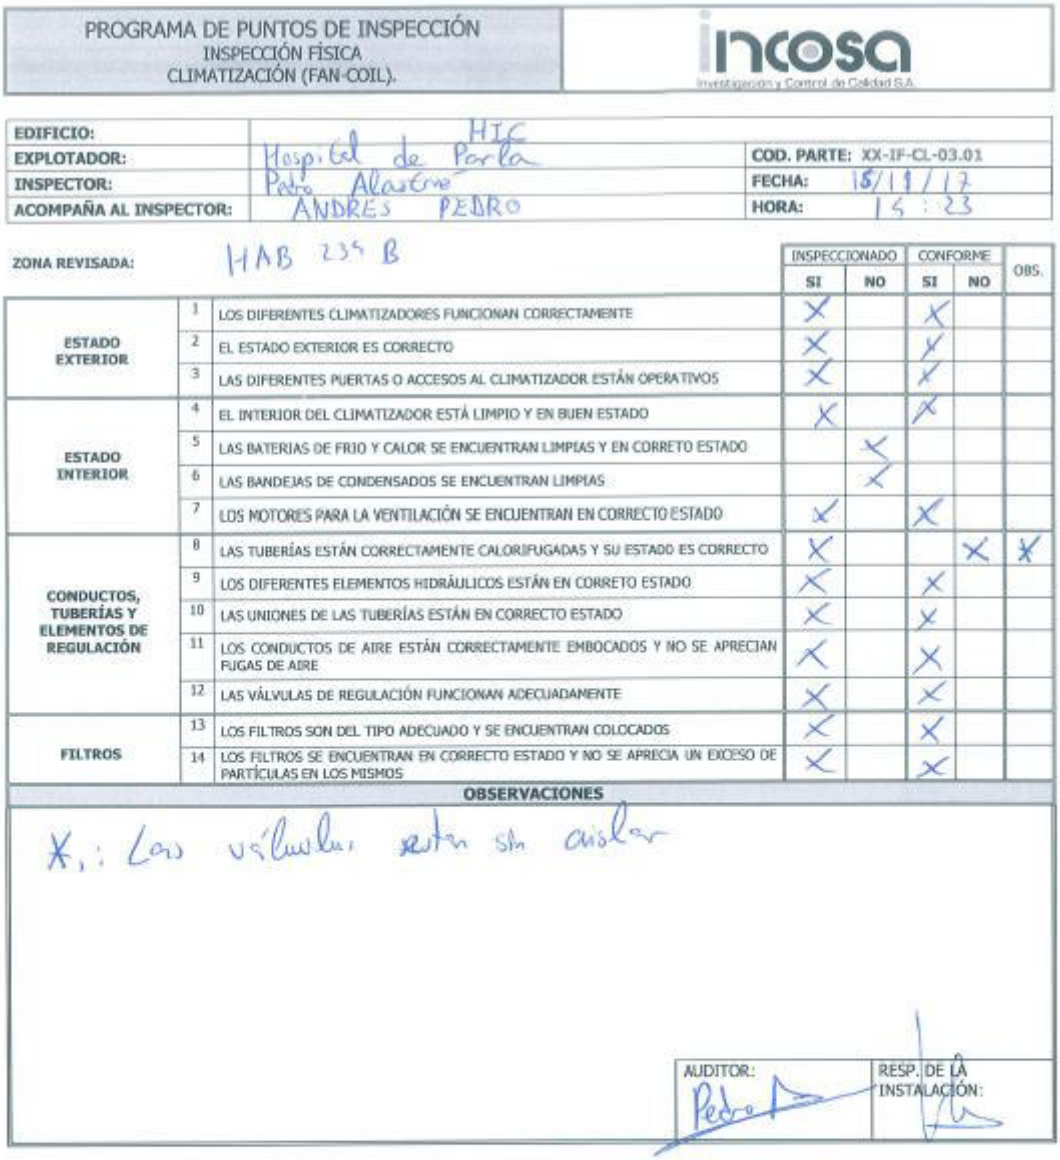

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alcaraz	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	15:23

ZONA REVISADA: HAB 234 B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		

OBSERVACIONES

X1: Las válvulas están sin aislar

AUDITOR: Pedro

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 67: Check list Fan-Coil planta 2, módulo B, habitación 234

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla SA.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	13:45

ZONA REVISADA: HAB 250B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		

OBSERVACIONES

*: Válvula no aislada

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 68: Check list Fan-Coil planta 2, módulo B, habitación 250

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla SA.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alcalde	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRÉS PEDRO	**HORA:**	14:12

ZONA REVISADA: Consulta trauma

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		

OBSERVACIONES

*: Válvulas no visibles

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 69: Check list Fan-Coil consulta traumatología

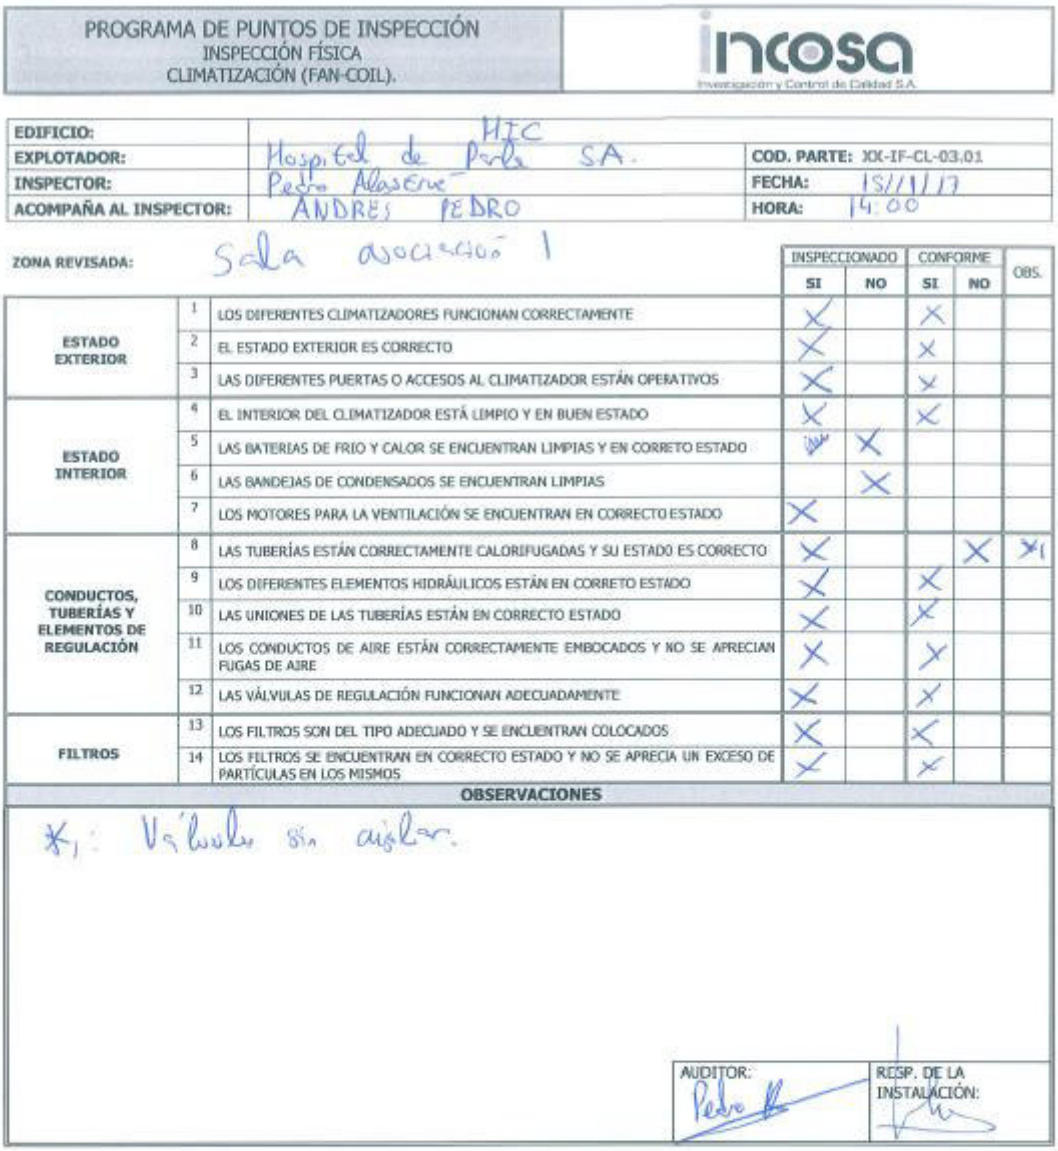

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alaserve	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	14:00

ZONA REVISADA: Sala asociación 1

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X				
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*1
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		

OBSERVACIONES

*1: Válvulas sin aislar.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro [signature]	[signature]

Ilustración 70: Check list Fan-Coil sala asociación 1

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACS

Se han detectado las siguientes deficiencias en las instalaciones de distribución de ACS.

1. Fugas en las bombas de distribución de ACS 1 y 3.



Ilustración 71: Fuga en bomba1 de distribución



Ilustración 72: Fuga en bomba 3 de distribución

INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

En cuanto a la instalación de almacenamiento de combustibles, no ha sido posible inspeccionar los depósitos de combustible porque están bajo tierra. Éstos se encuentran operativos. Tampoco ha sido posible observar el funcionamiento del sistema de bombeo puesto que al estar el depósito con un nivel de gasóleo correcto, las bombas no responden a la orden manual.

1. Seguridad almacenamiento de Combustibles.

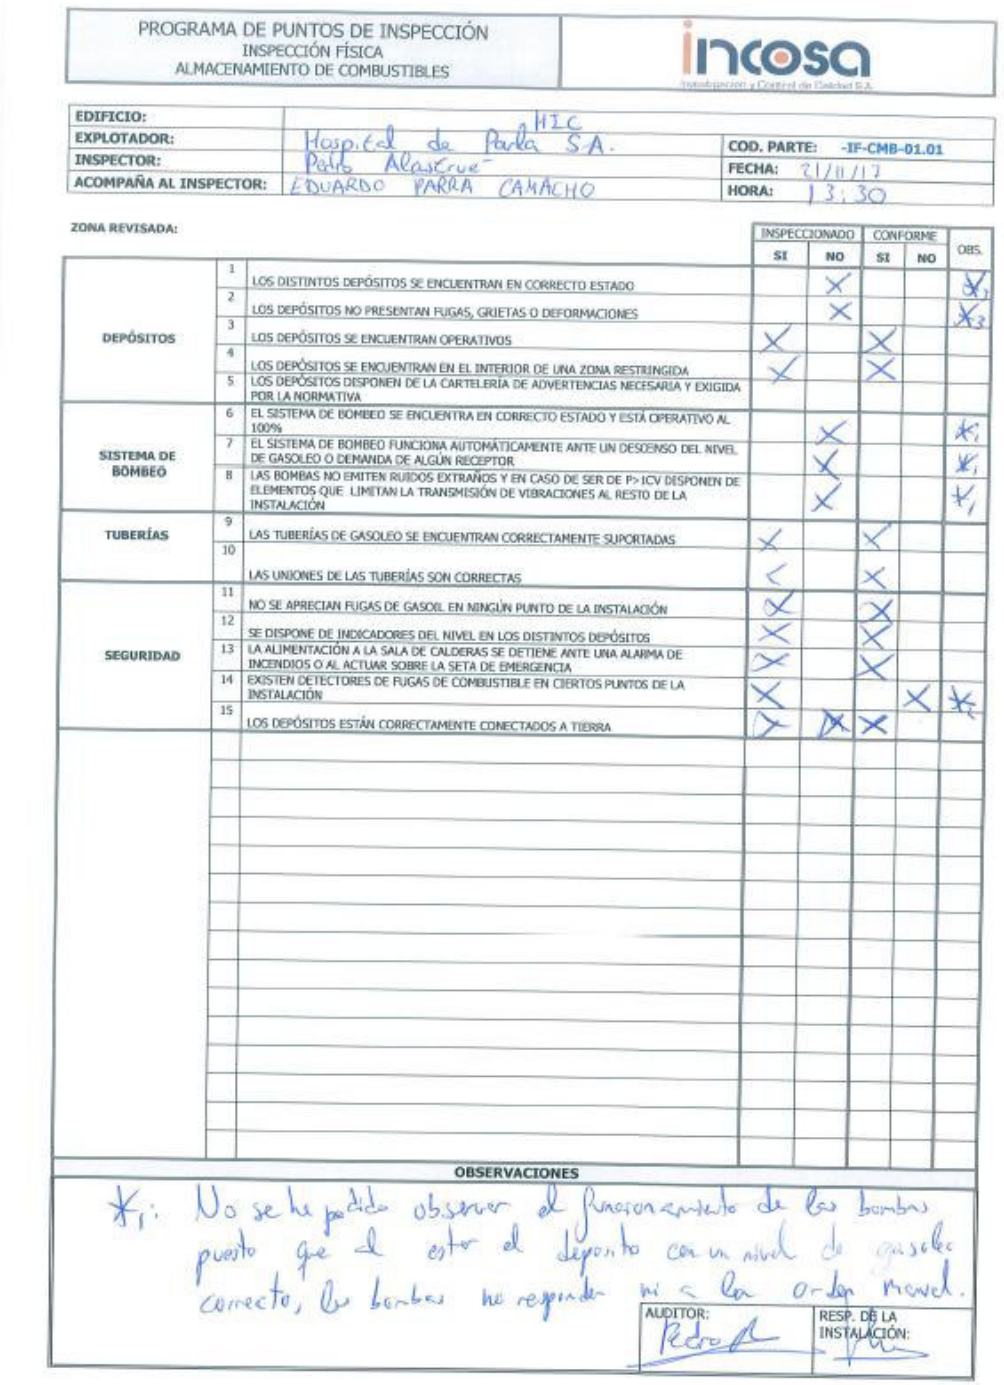

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES

incosa

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	COD. PARTE:	-IF-CMB-01.01
INSPECTOR:	Pablo Alastrue	FECHA:	21/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	EDUARDO PARRA CAMACHO	HORA:	13:30

ZONA REVISADA:			INSPECCIONADO SI	INSPECCIONADO NO	CONFORME SI	CONFORME NO	OBS.
DEPÓSITOS	1	LOS DISTINTOS DEPÓSITOS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO		X			*1
	2	LOS DEPÓSITOS NO PRESENTAN FUGAS, GRIETAS O DEFORMACIONES		X			*3
	3	LOS DEPÓSITOS SE ENCUENTRAN OPERATIVOS	X		X		
	4	LOS DEPÓSITOS SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DE UNA ZONA RESTRINGIDA	X		X		
	5	LOS DEPÓSITOS DISPONEN DE LA CARTELERÍA DE ADVERTENCIAS NECESARIA Y EXIGIDA POR LA NORMATIVA					
SISTEMA DE BOMBEO	6	EL SISTEMA DE BOMBEO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO Y ESTÁ OPERATIVO AL 100%		X			*1
	7	EL SISTEMA DE BOMBEO FUNCIONA AUTOMÁTICAMENTE ANTE UN DESCENSO DEL NIVEL DE GASOLEO O DEMANDA DE ALGÚN RECEPTOR		X			*1
	8	LAS BOMBAS NO EMITEN RUIDOS EXTRAÑOS Y EN CASO DE SER DE P> ICV DISPONEN DE ELEMENTOS QUE LIMITAN LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES AL RESTO DE LA INSTALACIÓN		X			*1
TUBERÍAS	9	LAS TUBERÍAS DE GASOLEO SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE SUPORTADAS	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS SON CORRECTAS	X		X		
SEGURIDAD	11	NO SE APRECIAN FUGAS DE GASOIL EN NINGÚN PUNTO DE LA INSTALACIÓN	X		X		
	12	SE DISPONE DE INDICADORES DEL NIVEL EN LOS DISTINTOS DEPÓSITOS	X		X		
	13	LA ALIMENTACIÓN A LA SALA DE CALDERAS SE DETIENE ANTE UNA ALARMA DE INCENDIOS O AL ACTUAR SOBRE LA SETA DE EMERGENCIA	X		X		
	14	EXISTEN DETECTORES DE FUGAS DE COMBUSTIBLE EN CIERTOS PUNTOS DE LA INSTALACIÓN	X			X	*2
	15	LOS DEPÓSITOS ESTÁN CORRECTAMENTE CONECTADOS A TIERRA	X	X	X		

OBSERVACIONES

*1: No se ha podido observar el funcionamiento de las bombas puesto que al estar el depósito con un nivel de gasóleo correcto, las bombas no responden a la orden manual.

AUDITOR: Pedro

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 73: Check list Almacenamiento de combustibles

1. Pequeña fuga en conexión de tubería con el muro.



Ilustración 74: Fuga entre conexión tubería y pared

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	H2C		
EXPLOTADOR:	Hospital de Pinto SA	**COD. PARTE:**	-IF-IF-01-01
INSPECTOR:	Pedro Alcalde	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
TUBERÍAS	1	LAS TUBERÍAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		S8
	2	EL AISLAMIENTO Y LA SUPORTACIÓN DE LAS TUBERÍAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	3	NO SE OBSERVAN FUGAS U OXIDACIÓNES EN LAS TUBERÍAS	X		X		
	4	SE EMPLEAN MANGUITOS FLEXIBLES Y JUNTAS ANTIVIBRATORIAS PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS A LAS TUBERÍAS	X		X		
VALVULERÍA Y GRIFERÍA	5	LAS VÁLVULAS DE CORTE FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	6	LA GRIFERÍA SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	7	LA GRIFERÍA Y RESTO DE ELEMENTOS DE CONSUMO SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y SU FUNCIONAMIENTO ES CORRECTO	X		X		
	8	LA PRESIÓN Y CAUDAL EN LOS ELEMENTOS DE CONSUMO ES ADECUADA	X		X		
EQUIPOS DE BOMBEO Y DEPÓSITOS	9	LOS ALGIBES SE ENCUENTRAN OPERTATIVOS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	EL SISTEMA DE LLENADO FUNCIONA Y REGULA ADECUADAMENTE EL LLENADO	X		X		
	11	EL SISTEMA DE CLORACIÓN SE APLICA SOBRE EL AGUA EN LOS DEPÓSITOS	X		X		
	12	EL SISTEMA DE BOMBEO SE ENCUENTRA OPERATIVO AL 100%	X		X		
	13	EL SISTEMA DE BOMBEO FUNCIONA CORRECTAMENTE TANTO EN MANUAL COMO EN AUTOMÁTICO	X		X		
	14	EL SISTEMA DE BOMBEO NO GENERA RUIDOS O VIBRACIONES EXTRAÑAS	X		X		
	15	LAS BOMBAS DESCANSAN SOBRE UNA BANCADA DE INCERCIA O ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS	X		X		
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						

OBSERVACIONES

Pequeña fuga en conexión de tubería con el muro.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 75: Check list agua fría de consumo humano

PARARRAYOS

1. Deterioro de los Pararrayos.



Ilustración 76: Recubrimiento pararrayos deteriorado



Ilustración 77: Falta de protección en el último metro y medio



Ilustración 78: Falta limpieza en arqueta

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. VARIOS	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-04.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	10/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	14:05

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
PARARRAYOS	1	EXISTE INSTALACION DE PARARRAYOS	X		X		
	2	ESTAN CORRECTAMENTE SUJETOS SUS ELEMENTOS Y SU INSTALACION ES ADECUADA	X		X		
	3	LA BAJANTE ESTÁ EN BUEN ESTADO Y SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE PROTEGIDA EN SU PARTE PRÓXIMA AL SUELO	X			X	(1) (2)
	4	SE HA DISPUESTO SECCIONADOR DE CORTE PARA MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA	X		X		(3) (4)
SAI (SERVICIO DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA)	5	LOS SAI SE ENCUENTRAN OPERTATIVOS					
	6	EL ESTADO DE LOS SAI ES CORRECTO Y LA CARGA INDICADA EN LOS MISMOS ES PRÓXIMA AL 100%					
	7	LOS SAI SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL					
Fecha: 10/11/17	8	LAS BATERIAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN OPERATIVAS	X		X		
	9	LAS BATERÍAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
BATERIA DE CONDENSADORES	10	EL COSENO DE FI INDICADO EN LAS BATERÍAS ES PRÓXIMO A LA UNIDAD	X		X		
Hora: 13:15	11	LAS BATERÍAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	X		X		
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA	12	LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN B.T ESTÁ EN CORRECTO ESTADO					
	13	SE DISPONE DE SECCIONADOR DEL CONDUCTOR DE TIERRA PARA POSIBILITAR LA MEDIDA					
CANALIZACIONES	14	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	15	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES ES LA ADECUADA					
	16	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN INSTALADAS DE FORMA QUE NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CABLES ELÉCTRICOS SIN EL USO DE HERRAMIENTAS					
ILUMINACIÓN	17	LAS LUMINARIAS INSTALADAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	18	NO SE APRECIAN LUMINARIAS FUNDIDAS					
	19	LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN ESTÁN ACORDE CON EL USO DE LA SALA ILUMINADA					
	20	LOS ENCENDIDOS O APAGADOS DE LAS LUMINARIAS SE REALIZAN TEMPORIZADA O CONTROLADA EN ZONAS DE ACCESO DE PÚBLICO					
MECANISMOS	21	LOS DISTINTOS MECANISMOS (TC, Interruptores, etc) SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	21	LOS MECANISMOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE					
	22	ESTOS ESTÁN CORRECTAMENTE SUJETOS A LOS PARAMENTOS					

OBSERVACIONES

(1) Último tramo de 2 metros de bajante NE sin proteger adecuadamente (del ed. Industrial)

(2) ~~Tubos~~ Recubrimientos de Cerrados → bajante NO y flexibles

(3) Limpieza de arqueta puesta tierra bajada SE

Nota: mirar en Ordenes de Trabajo si inspeccionan todas las tierras

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 79: Check list instalación eléctrica. Varios

APARATOS ELEVADORES

Se han detectado las siguientes anomalías en algunos de los ascensores.

1. Los ascensores 8, 20, 22 y 25 no emiten sonido de emergencia.

ASCENSOR 22



Ilustración 80: Ascensor

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
ELEMENTOS ELEVADORES

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Perla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-ASC-01.01
INSPECTOR:	Pablo Alcuaz	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Ascensor 8

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO GENERAL DEL APARATO ELEVADOR (A.E.)ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	DURANTE SU FUNCIONAMIENTO EL A.E. NO EMITE RUIDOS EXTRAÑOS O EXCESIVOS	X		X		
	3	LOS DISPLAYS DEL INTERIOR DE A.E. INDICAN CORRECTAMENTE LA PLANTA O DIRECCIÓN DE LA CABINA	X		X		
	4	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	5	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES ACTUAN SOBRE LOS A.E. DE FORMA CORRECTA	X		X		
	6	LA ILUMINACIÓN DE LA CABINA FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	7	EL BOTON DE EMERGENCIA GENERA UNA SEÑAL ACUSTICA PERCEPTIBLE DESDE EL EXTERIOR	X			X	
	8	EL BOTÓN DE APERTURA Y CIERRE DEL INTERIOR DE LA CABINA ACTUA ADECUADAMENTE SOBRE LA PUERTA	X		X		
	9	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL CORTAR LA BARRERA INFRARROJA	X		X		
	10	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL ENCONTRAR UN OBSTACULO	X		X		

OBSERVACIONES

No emite sonido. Arreglado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 81: Check list ascensor 8

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
ELEMENTOS ELEVADORES

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Porla SA.	**COD. PARTE:**	-IF-ASC-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastéruć	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Ascensor 20

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO GENERAL DEL APARATO ELEVADOR (A.E.)ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	DURANTE SU FUNCIONAMIENTO EL A.E. NO EMITE RUIDOS EXTRAÑOS O EXCESIVOS	X		X		
	3	LOS DISPLAYS DEL INTERIOR DE A.E. INDICAN CORRECTAMENTE LA PLANTA O DIRECCIÓN DE LA CABINA	X		X		
	4	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	5	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES ACTUAN SOBRE LOS A.E. DE FORMA CORRECTA	X		X		
	6	LA ILUMINACIÓN DE LA CABINA FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	7	EL BOTON DE EMERGENCIA GENERA UNA SEÑAL ACUSTICA PERCEPTIBLE DESDE EL EXTERIOR	X			X	*
	8	EL BOTÓN DE APERTURA Y CIERRE DEL INTERIOR DE LA CABINA ACTUA ADECUADAMENTE SOBRE LA PUERTA	X		X		
	9	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL CORTAR LA BARRERA INFRARROJA	X		X		
	10	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL ENCONTRAR UN OBSTACULO	X		X		

OBSERVACIONES

* No emite señal acústica

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 82: Check list ascensor 20

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
ELEMENTOS ELEVADORES

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Paula S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-ASC-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alesève	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Ascensor 22

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO GENERAL DEL APARATO ELEVADOR (A.E.)ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	DURANTE SU FUNCIONAMIENTO EL A.E. NO EMITE RUIDOS EXTRAÑOS O EXCESIVOS	X		X		
	3	LOS DISPLAYS DEL INTERIOR DE A.E. INDICAN CORRECTAMENTE LA PLANTA O DIRECCIÓN DE LA CABINA	X		X		
	4	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	5	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES ACTUAN SOBRE LOS A.E. DE FORMA CORRECTA	X		X		
	6	LA ILUMINACIÓN DE LA CABINA FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	7	EL BOTÓN DE EMERGENCIA GENERA UNA SEÑAL ACÚSTICA PERCEPTIBLE DESDE EL EXTERIOR	X			X	X
	8	EL BOTÓN DE APERTURA Y CIERRE DEL INTERIOR DE LA CABINA ACTUA ADECUADAMENTE SOBRE LA PUERTA	X		X		
	9	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL CORTAR LA BARRERA INFRARROJA	X		X		
	10	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL ENCONTRAR UN OBSTACULO	X		X		

OBSERVACIONES

Falta un embellecedor.
* No emite sonido. Arreglado

AUDITOR: Pedro

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 83: Check list ascensor 22

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
ELEMENTOS ELEVADORES

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-ASC-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alas Cruz	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Ascensor 25

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO GENERAL DEL APARATO ELEVADOR (A.E.)ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	DURANTE SU FUNCIONAMIENTO EL A.E. NO EMITE RUIDOS EXTRAÑOS O EXCESIVOS	X		X		
	3	LOS DISPLAYS DEL INTERIOR DE A.E. INDICAN CORRECTAMENTE LA PLANTA O DIRECCIÓN DE LA CABINA	X		X		
	4	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	5	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES ACTUAN SOBRE LOS A.E. DE FORMA CORRECTA	X		X		
	6	LA ILUMINACIÓN DE LA CABINA FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	7	EL BOTON DE EMERGENCIA GENERA UNA SEÑAL ACÚSTICA PERCEPTIBLE DESDE EL EXTERIOR	X			X	
	8	EL BOTÓN DE APERTURA Y CIERRE DEL INTERIOR DE LA CABINA ACTUA ADECUADAMENTE SOBRE LA PUERTA	X		X		
	9	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL CORTAR LA BARRERA INFRARROJA	X		X		
	10	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL ENCONTRAR UN OBSTACULO	X		X		

OBSERVACIONES

No emite sonido.

AUDITOR: Pedro A

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 84: Check list ascensor 25

2. En el ascensor 22 falta un embellecedor.

3. El ascensor 27 del edificio Industrial precisa limpieza.

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
ELEMENTOS ELEVADORES

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hosp. Cal de Perla S.A.	COD. PARTE:	-IF-ASC-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alcaraz	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA REVISADA: Ascensor 27 edificio Industrial

			INSPECCIONADO SI	INSPECCIONADO NO	CONFORME SI	CONFORME NO	OBS.
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO GENERAL DEL APARATO ELEVADOR (A.E.)ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	DURANTE SU FUNCIONAMIENTO EL A.E. NO EMITE RUIDOS EXTRAÑOS O EXCESIVOS	X		X		
	3	LOS DESPLAYS DEL INTERIOR DE A.E. INDICAN CORRECTAMENTE LA PLANTA O DIRECCIÓN DE LA CABINA	X		X		
	4	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	5	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES ACTUAN SOBRE LOS A.E. DE FORMA CORRECTA	X		X		
	6	LA ILUMINACIÓN DE LA CABINA FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	7	EL BOTON DE EMERGENCIA GENERA UNA SEÑAL ACUSTICA PERCEPTIBLE DESDE EL EXTERIOR	X		X		
	8	EL BOTÓN DE APERTURA Y CIERRE DEL INTERIOR DE LA CABINA ACTUA ADECUADAMENTE SOBRE LA PUERTA	X		X		
	9	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL CORTAR LA BARRERA INFRARROJA	X		X		
	10	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL ENCONTRAR UN OBSTACULO	X		X		

OBSERVACIONES

Precisa limpieza

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 85: Check list ascensor

INSTALACIONES ESPECIALES: QUIRÓFANOS, UVIS…

Se han detectado las siguientes incidencias en los quirófanos revisados.

-ZONA CMI (4 quirófanos)

1. Visualizador oxidado en los quirófanos 1, 2 y 4.



Ilustración 86: Visualizador con óxido

2. En quirófanos 2 y 3, el transformador del cuadro aislamiento está despegado.

3. Pulsador desconchado y toma de red de datos rota en Quirófano 2.

4. En el quirófano 1 el transformador del cuadro está sucio.



Ilustración 87: Quirófano cuadro de transformación sucio

5. En el quirófano 3 se ha observado que salta una alarma en el interior pero no fuera del mismo.

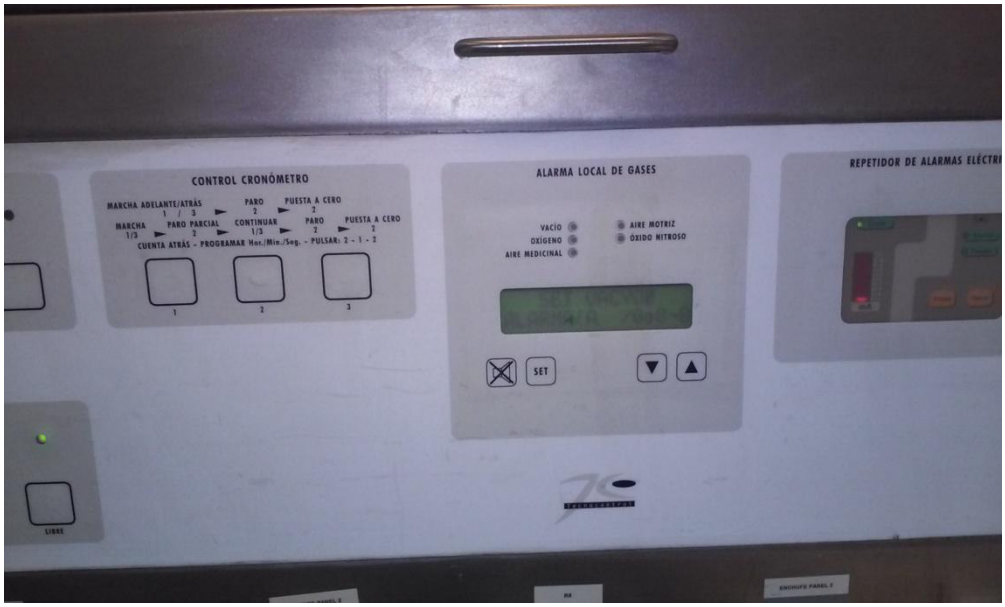

Ilustración 88: Quirófano cuadro de transformación

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
QUIRÓFANOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla HIC S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-QRF-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alcalde	**FECHA:**	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JUAN JOSE ADAN SANCHEZ	**HORA:**	15.00 - 17.00

ZONA REVISADA: Quirófano 1 CMI

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
SISTEMAS VARIOS	1	LA ILUMINANCIÓN DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	2	LOS DISTINTOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN PUESTOS A TIERRA	X		X		
	3	LAS CONEXIONES A TIERRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	4	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	5	LOS DISTINTOS DISPLAY DE LA SALA (Temperatura, nivel de aislamiento, etc) SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SU LECTURA SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
PROTECCIÓN ELÉCTRICA	6	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	7	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DISPONE DE CERRADURA QUE IMPIDE SU MANIPULACIÓN	X		X		
	8	EL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X	*1
	9	EL CUADRO DE PROTECCIÓN Y EL DEL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRAN LIMPIOS	X		X		
	10	LA CENTRAL DE AISLAMIENTO NO INDICA NINGUNA ALARMA	X		X		
	11	LA LECTURA EN EL DISPLAY DE LA CENTRAL DE AISLAMIENTO SE CORRESPONDE CON EL DISPLAY INTERIOR DE LA SALA	X		X		

OBSERVACIONES

*Visualizador con óxido

*1 Transformador cuadro sucio

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 89: Check list quirófano 1 CMI

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
QUIRÓFANOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-QRF-01.01
INSPECTOR:	Pedro Martínez	**FECHA:**	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JUANJOSE ADAN SÁNCHEZ	**HORA:**	15:00 - 19:00

ZONA REVISADA: Quirófano 2 CMI

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
SISTEMAS VARIOS	1	LA ILUMINANCIÓN DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	2	LOS DISTINTOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN PUESTOS A TIERRA	X		X		
	3	LAS CONEXIONES A TIERRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	4	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	5	LOS DISTINTOS DISPLAY DE LA SALA (Temperatura, nivel de aislamiento, etc) SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SU LECTURA SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
PROTECCIÓN ELÉCTRICA	6	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	7	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DISPONE DE CERRADURA QUE IMPIDE SU MANIPULACIÓN	X		X		
	8	EL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO				X	*1
	9	EL CUADRO DE PROTECCIÓN Y EL DEL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRAN LIMPIOS	X		X		
	10	LA CENTRAL DE AISLAMIENTO NO INDICA NINGUNA ALARMA	X		X	X	
	11	LA LECTURA EN EL DISPLAY DE LA CENTRAL DE AISLAMIENTO SE CORRESPONDE CON EL DISPLAY INTERIOR DE LA SALA					*2

OBSERVACIONES

* Visualizador oxidado.
* Toma de datos rota.
*1 Transformador dañado
* Pulsador desenchufado
*2 El display solo está en quirófano y en el controlador de la sala de control general.

AUDITOR: Pedro

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 90: Check list quirófano 2 CMI

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
QUIRÓFANOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Perla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-QRF-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alcaraz	**FECHA:**	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JUAN JOSÉ ADAN SÁNCHEZ	**HORA:**	15:00 – 17:00

ZONA REVISADA: Quirófano 5 CMI

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
SISTEMAS VARIOS	1	LA ILUMIANCIÓN DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	2	LOS DISTINTOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN PUESTOS A TIERRA	X		X		
	3	LAS CONEXIONES A TIERRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	4	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	5	LOS DISTINTOS DISPLAY DE LA SALA (Temperatura, nivel de aislamiento, etc) SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SU LECTURA SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
PROTECCIÓN ELÉCTRICA	6	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	7	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DISPONE DE CERRADURA QUE IMPIDE SU MANIPULACIÓN	X		X		
	8	EL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X	*1
	9	EL CUADRO DE PROTECCIÓN Y EL DEL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRAN LIMPIOS	X				
	10	LA CENTRAL DE AISLAMIENTO NO INDICA NINGUNA ALARMA	X			X	*2
	11	LA LECTURA EN EL DISPLAY DE LA CENTRAL DE AISLAMIENTO SE CORRESPONDE CON EL DISPLAY INTERIOR DE LA SALA					*3

OBSERVACIONES

*1 Transformador centro aislamiento desprogramado

*2 Salta una alarma en el quirófano pero no funciona.

*3 El display solo está en quirófano y en el controlador de la sala de control general.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 91: Check list quirófano 5 CMI

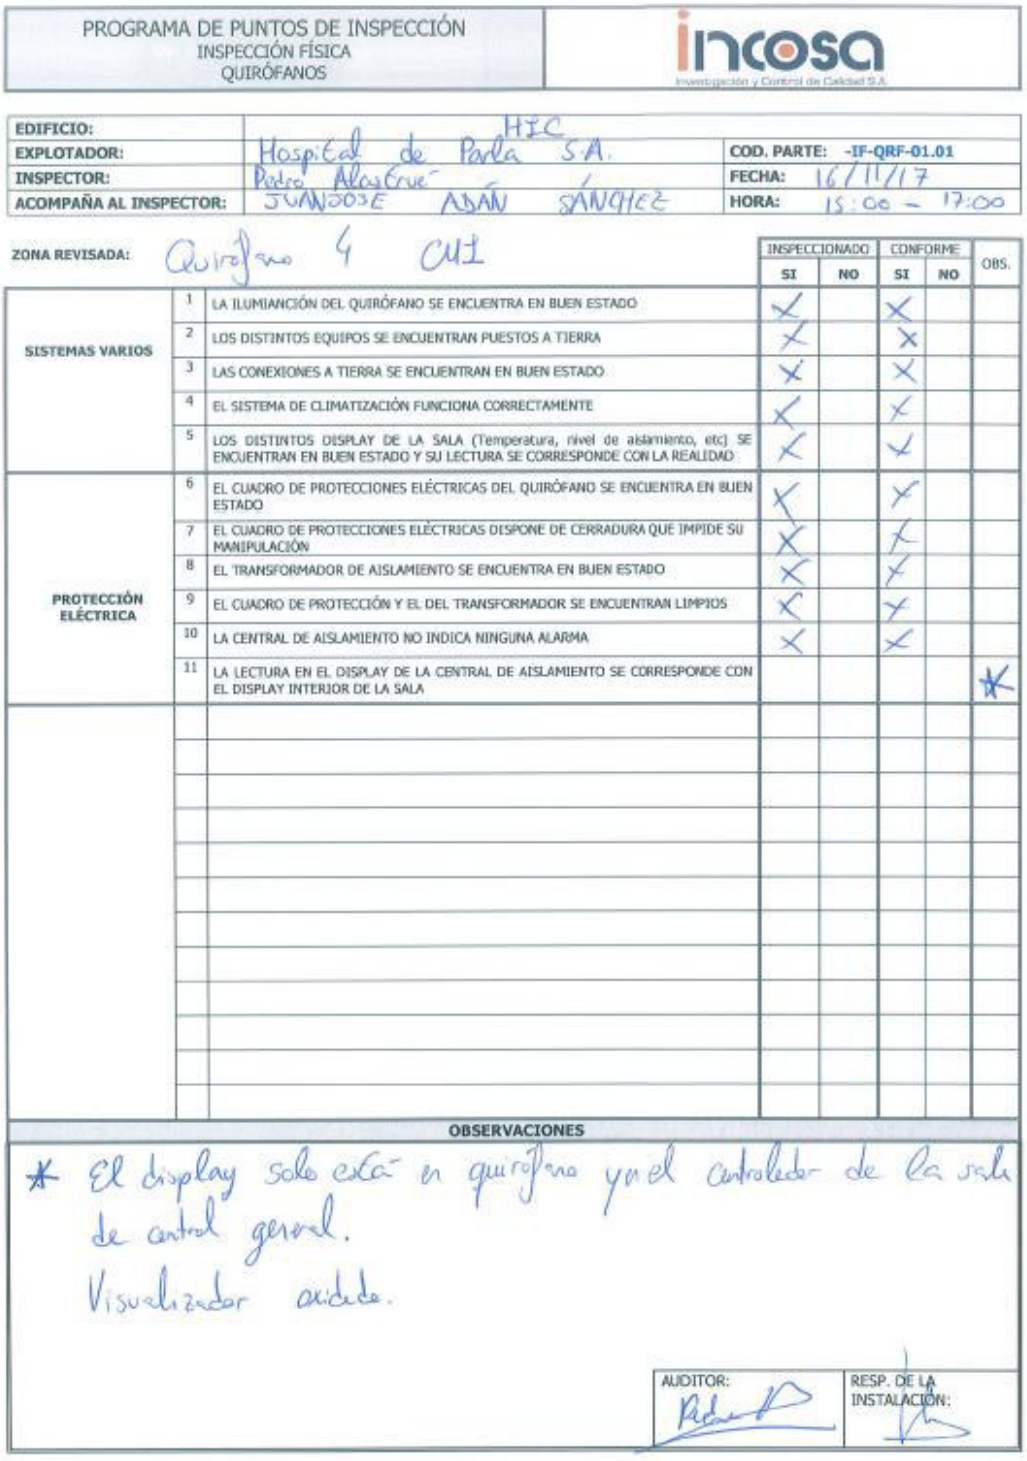

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
QUIRÓFANOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	COD. PARTE:	-IF-QRF-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alcayde	FECHA:	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JUAN JOSE ADÁN SÁNCHEZ	HORA:	15:00 – 17:00

ZONA REVISADA: Quirófano 4 CMI

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
SISTEMAS VARIOS	1	LA ILUMIANCIÓN DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	2	LOS DISTINTOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN PUESTOS A TIERRA	X		X		
	3	LAS CONEXIONES A TIERRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	4	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	5	LOS DISTINTOS DISPLAY DE LA SALA (Temperatura, nivel de aislamiento, etc) SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SU LECTURA SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
PROTECCIÓN ELÉCTRICA	6	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	7	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DISPONE DE CERRADURA QUE IMPIDE SU MANIPULACIÓN	X		X		
	8	EL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	9	EL CUADRO DE PROTECCIÓN Y EL DEL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRAN LIMPIOS	X		X		
	10	LA CENTRAL DE AISLAMIENTO NO INDICA NINGUNA ALARMA	X		X		
	11	LA LECTURA EN EL DISPLAY DE LA CENTRAL DE AISLAMIENTO SE CORRESPONDE CON EL DISPLAY INTERIOR DE LA SALA					*

OBSERVACIONES

* El display solo está en quirófano y el controlador de la sala de control general.
Visualizador oculto.

AUDITOR:

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 92: Check list quirófano 4 CMI

ZONA CMA (4 quirófanos)

1. Visualizador oxidado en los quirófanos 1, 2, 3 y 4.



Ilustración 93: Visualizador quirófano con óxido

2. En quirófanos 1 y 3, el transformador del cuadro aislamiento está despegado.

3. En el quirófano 4 se observa el techo desconchado en uniones



Ilustración 94: Desconchado uniones techo

4. En el quirófano 3 se observan otras deficiencias leves como mesa del quirófano con Óxido y tapa de la luz del brazo portátil de quirófano caída.



Ilustración 95: Unión luz con techo caída



Ilustración 96: Óxido en mesa quirófano

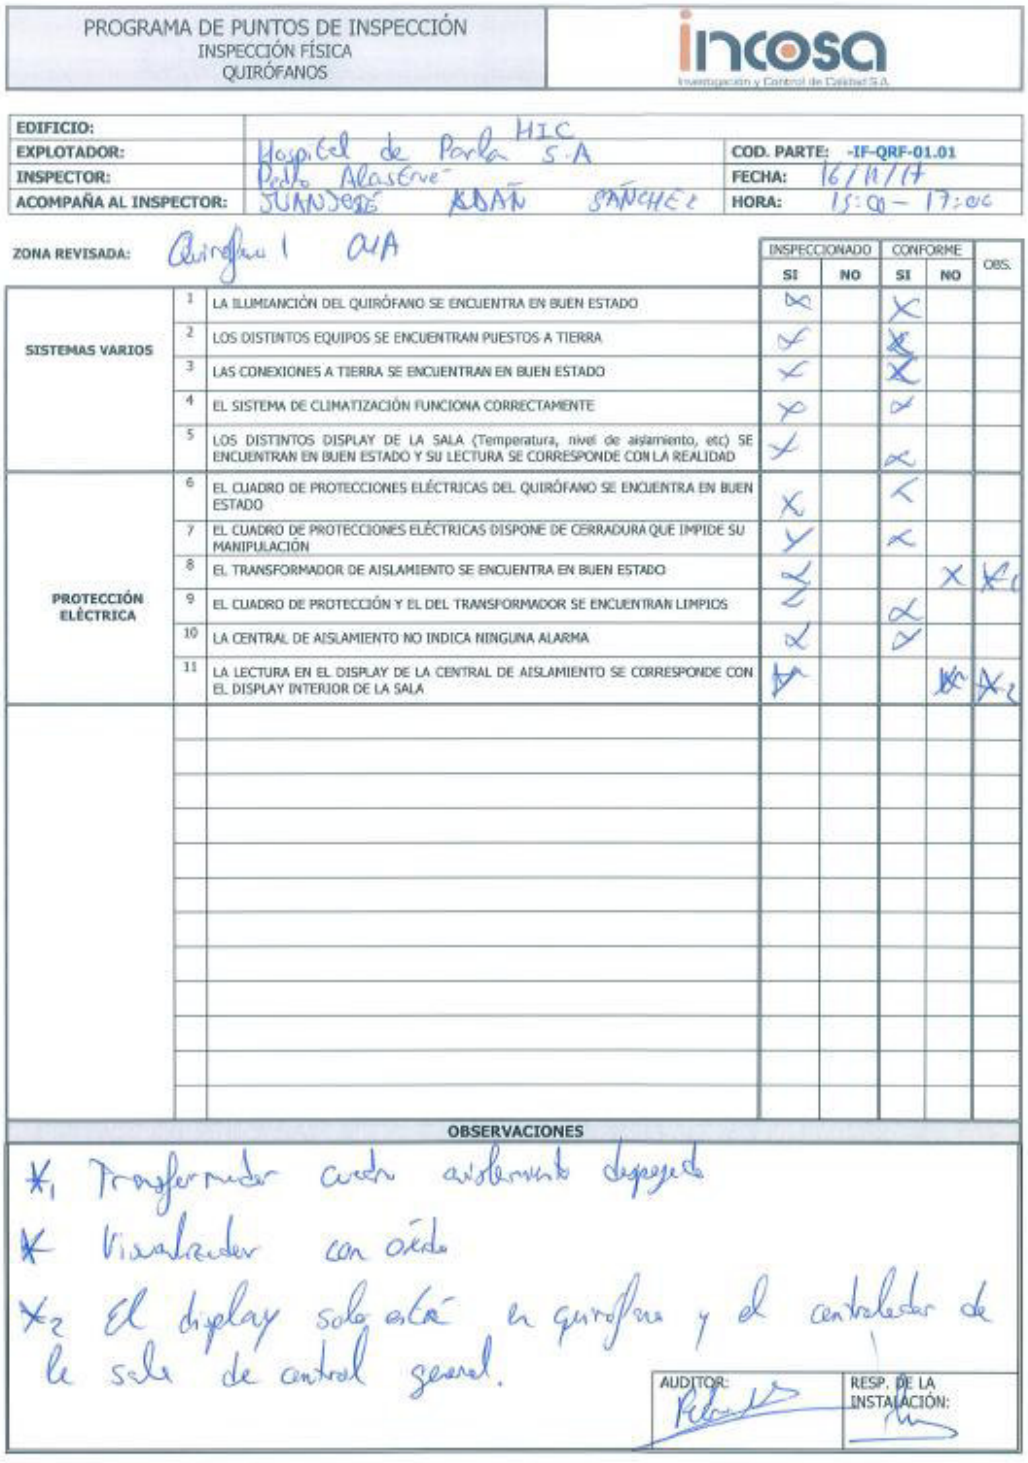

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA QUIRÓFANOS	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	**COD. PARTE:**	-IF-QRF-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JUAN JOSÉ ADÁN SÁNCHEZ	**HORA:**	15:00 – 17:00

ZONA REVISADA: Quirófano 1 CMA

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
SISTEMAS VARIOS	1	LA ILUMIANCIÓN DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	2	LOS DISTINTOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN PUESTOS A TIERRA	X		X		
	3	LAS CONEXIONES A TIERRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	4	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	5	LOS DISTINTOS DISPLAY DE LA SALA (Temperatura, nivel de aislamiento, etc) SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SU LECTURA SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
PROTECCIÓN ELÉCTRICA	6	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	7	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DISPONE DE CERRADURA QUE IMPIDE SU MANIPULACIÓN	X		X		
	8	EL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X	X1
	9	EL CUADRO DE PROTECCIÓN Y EL DEL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRAN LIMPIOS	X		X		
	10	LA CENTRAL DE AISLAMIENTO NO INDICA NINGUNA ALARMA	X		X		
	11	LA LECTURA EN EL DISPLAY DE LA CENTRAL DE AISLAMIENTO SE CORRESPONDE CON EL DISPLAY INTERIOR DE LA SALA	X			X	X2

OBSERVACIONES

X1 Transformador cuadro aislamiento despegado

X Visualizador con óxido

X2 El display solo está en quirófano y el controlador de la sala de control general.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
[signature]	[signature]

Ilustración 97: Check list quirófano 1 CMA

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
QUIRÓFANOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-QRF-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	14/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	15:00 - 17:00

ZONA REVISADA: Quirófano 2 CMA

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
SISTEMAS VARIOS	1	LA ILUMIANCIÓN DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	2	LOS DISTINTOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN PUESTOS A TIERRA	X		X		
	3	LAS CONEXIONES A TIERRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	4	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	5	LOS DISTINTOS DISPLAY DE LA SALA (Temperatura, nivel de aislamiento, etc) SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SU LECTURA SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
PROTECCIÓN ELÉCTRICA	6	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	7	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DISPONE DE CERRADURA QUE IMPIDE SU MANIPULACIÓN	X		X		
	8	EL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	9	EL CUADRO DE PROTECCIÓN Y EL DEL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRAN LIMPIOS	X		X		
	10	LA CENTRAL DE AISLAMIENTO NO INDICA NINGUNA ALARMA	X		X		
	11	LA LECTURA EN EL DISPLAY DE LA CENTRAL DE AISLAMIENTO SE CORRESPONDE CON EL DISPLAY INTERIOR DE LA SALA					*1

OBSERVACIONES

* Visualizador en cirugía.
*1 El display solo está en quirófano y en el cuadro de la sala de control general.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 98: Check list quirófano 2 CMA

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA QUIRÓFANOS	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-QRF-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JUAN JOSÉ ADÁN SÁNCHEZ	**HORA:**	15:00 - 17:00

ZONA REVISADA: Quirófano 3 . CMA

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
SISTEMAS VARIOS	1	LA ILUMIANCIÓN DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X	X2
	2	LOS DISTINTOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN PUESTOS A TIERRA	X		X		
	3	LAS CONEXIONES A TIERRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	4	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	5	LOS DISTINTOS DISPLAY DE LA SALA (Temperatura, nivel de aislamiento, etc) SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SU LECTURA SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
PROTECCIÓN ELÉCTRICA	6	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	7	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DISPONE DE CERRADURA QUE IMPIDE SU MANIPULACIÓN	X		X		
	8	EL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X	X1
	9	EL CUADRO DE PROTECCIÓN Y EL DEL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRAN LIMPIOS	X		X		
	10	LA CENTRAL DE AISLAMIENTO NO INDICA NINGUNA ALARMA	X		X		
	11	LA LECTURA EN EL DISPLAY DE LA CENTRAL DE AISLAMIENTO SE CORRESPONDE CON EL DISPLAY INTERIOR DE LA SALA					X3

OBSERVACIONES

* Mesa con óxido.
* Visualizador óxido.
*1 Transformador cuadro aislamiento despegado.
*2 Tapa luz quirófano caída
*3 El display solo está en quirófano y el controlador de la sala de control general.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro A	[signature]

Ilustración 99: Check list quirófano 3 CMA

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
QUIRÓFANOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Palma S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-QRF-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	15:00 ~ 17:00

ZONA REVISADA: Quirófano 4 CMA

			INSPECCIONADO SI	INSPECCIONADO NO	CONFORME SI	CONFORME NO	OBS.
SISTEMAS VARIOS	1	LA ILUMINANCIÓN DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	2	LOS DISTINTOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN PUESTOS A TIERRA	X		X		
	3	LAS CONEXIONES A TIERRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	4	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	5	LOS DISTINTOS DISPLAY DE LA SALA (Temperatura, nivel de aislamiento, etc) SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SU LECTURA SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
PROTECCIÓN ELÉCTRICA	6	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	7	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DISPONE DE CERRADURA QUE IMPIDE SU MANIPULACIÓN	X		X		
	8	EL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	9	EL CUADRO DE PROTECCIÓN Y EL DEL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRAN LIMPIOS	X		X		
	10	LA CENTRAL DE AISLAMIENTO NO INDICA NINGUNA ALARMA	X		X		
	11	LA LECTURA EN EL DISPLAY DE LA CENTRAL DE AISLAMIENTO SE CORRESPONDE CON EL DISPLAY INTERIOR DE LA SALA					*1

OBSERVACIONES

*Visualizador con avería
*Techo desconchado en uniones
*1 El display solo está en quirófano y el controlador de la sala de control general.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

Ilustración 100: Check list quirófano 4 CMA

ESTADO CONSTRUCTIVO DEL EDIFICIO

El Estado constructivo del edificio es correcto en general.

No obstante se han observado una serie de deficiencias en la cubierta del edificio, como son falta de pintura y enfoscado en diferentes zonas. Cabe mencionar que, existe un contrato de ejecución de obras para la impermeabilización de la cubierta, el cual se encuentra en proceso de ejecución actualmente. Se espera finalizar dicho contrato en 2020 ya que el alcance es mayor a las deficiencias que enunciaremos a continuación:

1. Degradación de la pintura y enfoscado de protección en los petos de obra.

2. Enfoscado degradado en los zócalos de obra.



Ilustración 101: Enfoscado degradado



Ilustración 102: Enfoscado degradado



Ilustración 103: Enfoscado degradado

3. Degradación de la pintura y oxidación en la red de distribución de agua.

4. Degradación de la pintura y oxidación en los conductos de climatización.



Ilustración 104: Óxido en conductos

5. Aislamiento térmico levantado en alguna tubería.



Ilustración 105: Aislamiento levantado

6. Inexistencia de la protección ignífuga en estructura metálica de luminarias.



Ilustración 106: Inexistencia de protección ignifuga

7. Falta de limpieza en ventiladores de cubierta.



Ilustración 107: Conducto de ventilación sucio

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA ESTADO GENERAL DEL EDIFICIO	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-EG-01.01
INSPECTOR:	Fco. Javier Balbás	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ZONAS EXTERIORES	1	EL ORDEN Y LIMPIEZA PREDOMINA EN TODAS LAS ZONAS EXTERIORES	X		X		
	2	LOS CERRAMIENTOS EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X	X	
	3	LOS PAVIMENTOS Y BORDILLOS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	4	LOS VIDRIOS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	5	NO SE OBSERVAN HUMEDADES O DESCONCHADOS EN LA PINTURA	X			X	
	6	LAS PLANTAS Y ZONAS AJARDINADAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	7	LA SEÑALITICA GENERAL DEL EDIFICIO Y SU CARTELERIA SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS PAPELERAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
APARCAMIENTO	9	LOS VIALES Y PLAZA DE APARCAMIENTO SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE SEÑALIZADAS	X		X		
	10	LAS MARQUESINAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	NO	HAY			
ZONAS INTERIORES	11	EL ORDEN Y LIMPIEZA PREDOMINA EN TODAS LAS ZONAS INTERIORES	X		X		
	12	NO SE OBSERVAN GRIETAS O DEFECTOS EN LOS MUROS Y TABIQUES INTERIORES	X		X		
	13	NO EXISTEN EQUIPOS NI ELEMENTOS AJENOS AL USO QUE DIFICULTEN EL PASO	X		X		
	14	LOS SUELOS Y RODAPIES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	15	LAS PUERTAS Y VENTANAS SE PUEDEN MANIOBRAR CORRECTAMENTE	X		X		
	16	LOS TECHOS ESTÁN LIMPIOS Y EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	17	CARTELES DE SALAS SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO Y SE CORRESPONDE CON EL USO DE LAS SALAS	X		X		
	18	LAS PLANTAS Y JARDINES INTERIORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	19	LA CARPINTERÍA DE HUECOS Y PUERTAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	20	EL ESTADO DE LA PINTURA INTERIOR, ES CORRECTA	X		X		
	21	LOS PROTECTORES DE PAREDES ESTÁN COLOCADOS Y SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		

OBSERVACIONES

Petos de lucernarios y zócalos de estructura de clima, degradados
Levantamiento de pintura y oxidación de " " "

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Fco. Javier Balbás Sánchez	

Ilustración 108: Check list estado general del edificio

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
ESTADO GENERAL DEL EDIFICIO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla SA.	**COD. PARTE:**	-IF-EG-02.01
INSPECTOR:	Fco Javier Bolbás Sánchez	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA:			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS	1	LAS DIFERENTES SALAS DEL EDIFICIO SE EMPLEAN SEGÚN EL USO PREVISTO	X		X		
	2	LA CARTELERÍA DE LAS ZONAS COMUNES Y EN EXTERIOR DE SALAS SE CORRESPONDEN CON EL USO QUE LAS ZONAS Y LAS SALAS TIENEN	X		X		
	3	LAS DISTINTAS SALAS DISPONEN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL USO QUE TIENEN PREVISTAS	X		X		
MOBILIARIO	4	EL MOBILIARIO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO PARA SU USO	VER	REVISIÓN	MOBILIARIO		
	5	LA CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL MOBILIARIO DISPONIBLE EN UNA SALA SE CORRESPONDE CON LO PREVISTO EN EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO APROBADO	"	"	"	"	"
	6	EL MOBILIARIO SE ENCUENTRA LIMPIO Y ACCESIBLE PARA SU USO	"	"	"	"	"
	7	LAS REPARACIONES EN EL MOBILIARIO SE HAN REALIZADO DE FORMA QUE NO SE APRECIA A PENAS LA REPARACIÓN (Cambios de colores, texturas, etc)	"	"	"	"	"
CONFORT, SEGURIDAD, RIESGOS Y PELIGROS	8	NO SE APRECIAN BRUSCOS CAMBIOS DE TEMPERATURA AL CAMBIAR DE SALAS EN EL EDIFICIO (A excepción de salas atemperadas especialmente)	X		X		
	9	EXISTE UN CONFORT VISUAL EN LAS DIFEREENTES SALAS, AUSENCIA DE DESLUMBRAMIENTOS, AUSENCIA DE ZONAS OSCURAS, UNIFORMIDAD GENERAL	X		X		
	10	NO SE APRECIAN RUIDOS EN EL NORMAL USO DEL EDIFICIO	X		X		
	11	LOS CUARTOS TÉCNICOS TIENEN ACCESO RESTRINGIDO Y SE RESPETA EL CIERRE Y APERTURA DE PUERTAS	X		X		
	12	EN LOS DISTINTOS CUARTOS TÉCNICOS, LOS ELEMENTOS EN TENSIÓN SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CONTRA CONTACTOS DIRECTOS O BIEN SEÑALIZADO	X		X		
	13	LOS ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES EN ZONAS DE PÚBLICO SE ENCUENTRAN SEÑALIZADOS E INACCESIBLES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	X		X		
	14	NO SE APRECIAN RIESGOS PARA LOS USUARIOS O TRABAJADORES DEL HOSPITAL DURANTE SU NORMAL USO	X		X		
	15	EN LAS ZONAS O SALAS DONDE EXISTA UN RIESGO INTRINSECO A SU USO, DICHO RIESGO SE ENCUENTRA ADVERTIDO EN LA ENTRADA (Salas de extinción por gas, CT)	X		X		
	16	NO SE DETECTAN ELEMENTOS, ZONAS O PROCESOS QUE GENEREN UN RIESGO PARA EL MEDIOAMBIENTE	X		X		

OBSERVACIONES

Algunos cajas de registro estaban sin tapa (son tapas de registro elevadas por lo que es difícil el contacto con ellas).

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Fco Javier Bolbás Sánchez	

Ilustración 109: Check list estado general del edificio

PUERTAS AUTOMÁTICAS

Se han detectado las siguientes deficiencias:

1. Las dos puertas de interior de urgencias (apertura mediante pulsador) carecen de sensor de movimiento.

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
PUERTAS AUTOMÁTICAS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	
EXPLOTADOR:	Hosp. Cal. de HIC Perla S.A.
INSPECTOR:	Pedro Alcaraz
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	
COD. PARTE:	-IF-PAT-01.01
FECHA:	
HORA:	

ZONA REVISADA: Puerta urgencias interior 2 (pulsador)

			INSPECCIONADO SI	INSPECCIONADO NO	CONFORME SI	CONFORME NO	OBS.
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO DE LAS PUERTAS Y DE TODOS SUS ELEMENTOS ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	LAS DISTINTAS PUERTAS AUTOMÁTICAS DE LAS QUE DISPONE EL CENTRO SE ENCUENTRAN OPERATIVAS	X		X		
	3	LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE, ABRIENDOSE AL APROXIMARSE UNA PERSONA O AL ACTUAR SOBRE LOS PULSADORES	X		X		
	4	EL CIERRE DE LAS PUERTAS ES CORRECTO, SELLANDO COMPLETAMENTE EL PASO A SU CIERRE	X		X		
	5	EN CASO DE DETECTAR UN OBSTACULO, LAS PUERTAS DETIENEN SU CIERRE	X			X	X
	6	EN CASO DE QUEDARSE SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO LAS PUERTAS NO QUEDAN BLOQUEADAS. SU APERTURA MANUAL ES POSIBLE	X		X		

OBSERVACIONES

X Se hicieron sin tener de movimiento de obra.

AUDITOR:

RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 110: Check list puerta automática urgencia interior 2

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
PUERTAS AUTOMÁTICAS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-PAT-01.01
INSPECTOR:	Pablo Alcalde	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Puerta urgencia interior 1 (pulsador)

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO DE LAS PUERTAS Y DE TODOS SUS ELEMENTOS ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	LAS DISTINTAS PUERTAS AUTOMÁTICAS DE LAS QUE DISPONE EL CENTRO SE ENCUENTRAN OPERATIVAS	X		X		
	3	LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE, ABRIENDOSE AL APROXIMARSE UNA PERSONA O AL ACTUAR SOBRE LOS PULSADORES	X		X		
	4	EL CIERRE DE LAS PUERTAS ES CORRECTO, SELLANDO COMPLETAMENTE EL PASO A SU CIERRE	X		X		
	5	EN CASO DE DETECTAR UN OBSTACULO, LAS PUERTAS DETIENEN SU CIERRE	X			X	X
	6	EN CASO DE QUEDARSE SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO LAS PUERTAS NO QUEDAN BLOQUEADAS. SU APERTURA MANUAL ES POSIBLE	X		X		

OBSERVACIONES

X Se hicieron sin sensor de movimiento de obra

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 111: Check list puerta automática urgencia interior 2

TRANSPORTE NEUMÁTICO

Se detectan las siguientes incidencias en la instalación de transporte neumático:

1. Falta de placa de protección en estación de envío de balas.

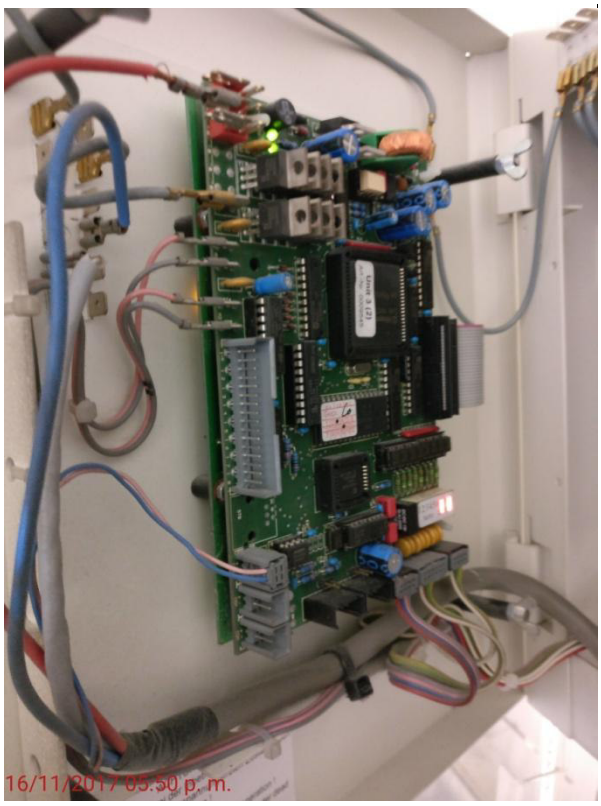

Ilustración 112: Estación envío balas sin protección



Ilustración 113: Estación envío balas con protección

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA TRANSPORTE NEUMÁTICO	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Avila S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-TRN-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JUAN JOSÉ ADÁN SÁNCHEZ	**HORA:**	12.48

ZONA REVISADA: Urgencias Control 1

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO GENERAL	1	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO	X				
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X				
	3	NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE O TRAMOS DE CONDUCTO EN MAL ESTADO	X				
	4	LAS CENTRALES DE ENVÍO ESTÁN EN CORRECTO ESTADO Y OPERATIVAS	X				
	5	EL ENVÍO DE BALAS DE ENVÍO SE REALIZA SIN INCIDENCIAS	X				
	6	EL SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO NO GENERA RUIDOS EXTRAÑOS	X				

OBSERVACIONES

Falta placa de protección.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 114: Check list transporte neumático control 1 urgencias

INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA

Se detectan las siguientes deficiencias en la instalación solar térmica.

1. Numerosos fallos de aislamiento en la instalación solar térmica.
2. Renovación o limpieza de colectores.
3. Oxidación de las bombas de recirculación.

Recubrimiento eléctrico y aislante defectuoso



Ilustración 115: Recubrimiento con óxido



Ilustración 116: Protección conducto dañada

Cobertura desenganchada



Ilustración 117: Defecto en uniones recubrimiento de conductos

Bomba con óxido

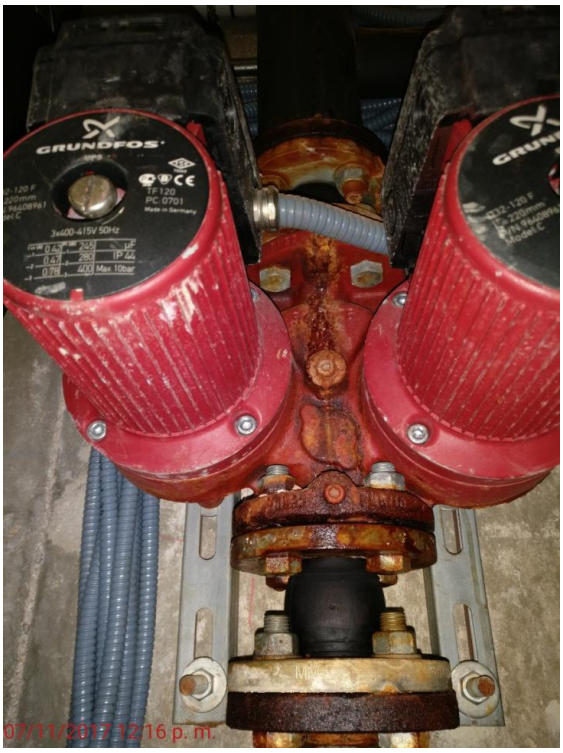

Ilustración 118: Bomba con óxido

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN DE SOLAR TÉRMICA PARA APOYO AL ACS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:			
INSPECTOR:		**COD. PARTE:**	-IF-SO-01.01
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**FECHA:**	
		HORA:	

ZONA REVISADA: Colectores Instalación solar Térmica

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
CAPTADORES	1	LOS COLECTORES SOLARES ESTÁN CORRECTAMENTE MONTADOS Y ORIENTADOS	X		X		
	2	LOS COLECTORES NO PRESENTAN NINGÚN DETERIORO	X			X	*1
ACUMULADORES SOLARES	3	LOS ACUMULADORES PARA EL AGUA CALIENTE SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO.	X		X		
	4	EL VOLUMEN DE ACUMULACIÓN PERMITE UN CORRECTO APROVECHAMIENTO DE LA INSTALACIÓN	X		X		
TUBERÍAS Y LLAVES DE PASO	5	LA CONEXIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ELEMENTOS ES ADECUADA Y NO SE DETECTAN FUGAS	X		X		
	6	LAS TUBERÍAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y SU SUPORTACIÓN Y AISLAMIENTO ES ADECUADO	X			X	*2
	7	LAS TUBERÍAS EN ZONAS EXTERIORES MANTIENE SU PROTECCIÓN U.V Y TÉRMICA EN BUEN ESTADO	X			X	*2
SISTEMAS VARIOS (IMPULSION, SEGURIDAD, CONTROL Y REGULACIÓN)		LA VALVULERÍA Y LLAVES DE CORTE PERMITEN UNA MANIOBRABILIDAD ADECUADA	X		X		
	8	LA INSTALACIÓN DISPONE DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO	X		X		
	9	LAS BOMBAS DE RECIRCULACIÓN FUNCIÓNAN CORRECTAMENTE Y SU ESTADO ES ADECUADO	X			X	*3
	10	LA CENTRAL DE REGULACIÓN GESTIONA CORRECTAMENTE LA INSTALACIÓN Y PERMITE UN ADECUADO APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR	X		X		
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						

OBSERVACIONES

*1: Hay algún colector que necesita ser renovado y algún otro limpiado.

*2: Numerosos fallos de aislamiento, sobretodo en la unión de la tubería con el colector.

*3: Una de las bombas presenta óxido debido a una filtración de agua.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

Ilustración 119: Check list instalación solar térmica

I.2 TOTAL CHECK LIST DE INSPECCIONES FÍSICAS CUMPLIMENTADOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
ESTADO GENERAL DEL EDIFICIO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-EG-01.01
INSPECTOR:	Fco. Javier Balbás	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ZONAS EXTERIORES	1	EL ORDEN Y LIMPIEZA PREDOMINA EN TODAS LAS ZONAS EXTERIORES	X		X		
	2	LOS CERRAMIENTOS EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X	X	
	3	LOS PAVIMENTOS Y BORDILLOS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	4	LOS VIDRIOS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	5	NO SE OBSERVAN HUMEDADES O DESCONCHADOS EN LA PINTURA	X			X	
	6	LAS PLANTAS Y ZONAS AJARDINADAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	7	LA SEÑALITICA GENERAL DEL EDIFICIO Y SU CARTELERIA SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS PAPELERAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
APARCAMIENTO	9	LOS VIALES Y PLAZA DE APARCAMIENTO SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE SEÑALIZADAS	X		X		
	10	LAS MARQUESINAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	NO	HAY			
ZONAS INTERIORES	11	EL ORDEN Y LIMPIEZA PREDOMINA EN TODAS LAS ZONAS INTERIORES	X		X		
	12	NO SE OBSERVAN GRIETAS O DEFECTOS EN LOS MUROS Y TABIQUES INTERIORES	X		X		
	13	NO EXISTEN EQUIPOS NI ELEMENTOS AJENOS AL USO QUE DIFICULTEN EL PASO	X		X		
	14	LOS SUELOS Y RODAPIES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	15	LAS PUERTAS Y VENTANAS SE PUEDEN MANIOBRAR CORRECTAMENTE	X		X		
	16	LOS TECHOS ESTÁN LIMPIOS Y EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	17	CARTELES DE SALAS SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO Y SE CORRESPONDE CON EL USO DE LAS SALAS	X		X		
	18	LAS PLANTAS Y JARDINES INTERIORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	19	LA CARPINTERÍA DE HUECOS Y PUERTAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	20	EL ESTADO DE LA PINTURA INTERIOR, ES CORRECTA	X		X		
	21	LOS PROTECTORES DE PAREDES ESTÁN COLOCADOS Y SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		

OBSERVACIONES

Petos de lucernarios y zócalos de estructura de clima, degradados
Levantamiento de pintura y oxidación de " " "

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Fco Javier Balbás Sánchez	

Balbás

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
ESTADO GENERAL DEL EDIFICIO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**-IF-EG-02.01**
INSPECTOR:	Fco. Javier Balbás Sánchez	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS	1	LAS DIFERENTES SALAS DEL EDIFICIO SE EMPLEAN SEGÚN EL USO PREVISTO	X		X		
	2	LA CARTELERÍA DE LAS ZONAS COMUNES Y EN EXTERIOR DE SALAS SE CORRESPONDEN CON EL USO QUE LAS ZONAS Y LAS SALAS TIENEN	X		X		
	3	LAS DISTINTAS SALAS DISPONEN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL USO QUE TIENEN PREVISTAS	X		X		
MOBILIARIO	4	EL MOBILIARIO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO PARA SU USO	VER	REVISIÓN	MOBILIARIO		
	5	LA CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL MOBILIARIO DISPONIBLE EN UNA SALA SE CORRESPONDE CON LO PREVISTO EN EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO APROBADO	"	"	"	"	"
	6	EL MOBILIARIO SE ENCUENTRA LIMPIO Y ACCESIBLE PARA SU USO	"	"	"	"	"
	7	LAS REPARACIONES EN EL MOBILIARIO SE HAN REALIZADO DE FORMA QUE NO SE APRECIA A PENAS LA REPARACIÓN (Cambios de colores, texturas, etc)	"	"	"	"	"
CONFORT, SEGURIDAD, RIESGOS Y PELIGROS	8	NO SE APRECIAN BRUSCOS CAMBIOS DE TEMPERATURA AL CAMBIAR DE SALAS EN EL EDIFICIO (A excepción de salas atemperadas especialmente)	X		X		
	9	EXISTE UN CONFORT VISUAL EN LAS DIFEREENTES SALAS. AUSENCIA DE DESLUMBRAMIENTOS, AUSENCIA DE ZONAS OSCURAS, UNIFORMIDAD GENERAL	X		X		
	10	NO SE APRECIAN RUIDOS EN EL NORMAL USO DEL EDIFICIO	X		X		
	11	LOS CUARTOS TÉCNICOS TIENEN ACCESO RESTRINGIDO Y SE RESPETA EL CIERRE Y APERTURA DE PUERTAS	X		X		
	12	EN LOS DISTINTOS CUARTOS TÉCNICOS, LOS ELEMENTOS EN TENSIÓN SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CONTRA CONTACTOS DIRECTOS O BIEN SEÑALIZADO	X		X		
	13	LOS ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES EN ZONAS DE PÚBLICO SE ENCUENTRAN SEÑALIZADOS E INACCESIBLES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	X		X		
	14	NO SE APRECIAN RIESGOS PARA LOS USUARIOS O TRABAJADORES DEL HOSPITAL DURANTE SU NORMAL USO	X		X		
	15	EN LAS ZONAS O SALAS DONDE EXISTA UN RIESGO INTRINSECO A SU USO, DICHO RIESGO SE ENCUENTRA ADVERTIDO EN LA ENTRADA (Salas de extinción por gas, CT)	X		X		
	16	NO SE DETECTAN ELEMENTOS, ZONAS O PROCESOS QUE GENEREN UN RIESGO PARA EL MEDIOAMBIENTE	X		X		

OBSERVACIONES

Algunas cajas de registro están sin tapar (son tapas de registro elevadas por lo que es difícil el contacto con ellas).

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Fco Javier Balbás Sánchez	

Balbás

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-CLI-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	13/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	11:20

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
CALDERAS	1	LAS CALDERAS SE ENCUENTRAN EN DISPOSICIÓN DE FUNCIONAR	X		X		
	2	LAS CALDERAS FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADAS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X		X		
	3	EL ESTADO DE LA CALDERA ES CORRECTO	X		X		X2
	4	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS Y CHIMENEAS EN LA CALDERA ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	5	SE DISPONE DE UNA SETA DE EMERGENCIA EN EL EXTERIOR DE LA SALA DE CALDERA Y SU ACTIVACIÓN DETIENE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DE GAS A LA SALA DE CALDERAS.	X		X		
ENFRIADORAS	6	LAS ENFRIADORAS SE ENCUENTRAN EN DISPOSICIÓN DE FUNCIONAR	X		X		
	7	LAS ENFRIADORAS FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADAS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X		X		X1
	8	EL ESTADO DE LA ENFRIADORA ES CORRECTO	X		X		X4
	9	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS CON LA ENFRIADORA ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X			X	X5
SISTEMAS DE BOMBEO	10	LAS BOMBAS SE ENCUENTRAN EN DISPOSICIÓN DE FUNCIONAR	X		X		
	11	LAS BOMBAS ESTÁN REGULADAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AUTOMÁTICO	X		X		
	12	LAS BOMBAS DESCANSAN SOBRE BANCADAS DE INERCIA O AISLADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS	X		X		X7
	13	NO SE APRECIAN FUGAS EN LAS CONEXIONES A LAS BOMBAS	X		X		
	14	LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL A LAS BOMBAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X			X	X3
TORRES DE REFRIGERACIÓN NA	15	LAS TORRES DE REFRIGERACIÓN SE ENCUENTRAN EN DISPOSICIÓN DE FUNCIONAR					
	16	LAS TORRES DE REFRIGERACIÓN SE ENCUENTRAN LIMPIO Y EN CORRECTO ESTADO					
EQUIPOS FRIGORÍFICOS NA	17	LOS EQUIPOS FRIGORÍFICOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE Y SU ESTADO ES CORRECTO					
	18	LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL A LOS EQUIPOS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
	19	LOS EQUPOS FRIGORIFICOS DESCANSAN SOBRE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS					
	20	NO SE APRECIAN RUIDOS EXCESIVOS EN LA PROXIMIDAD DE LOS EQUIPOS INTERIORES Y EXTERIORES					
	21	LAS TUBERÍAS FRIGORÍFICAS ESTÁN CORRECTAMENTE UNIDAS A LOS EQUIOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE GAS O MANCHAS DE ACEITE					
	22	EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ES CORRECTO Y ESTE ES REGULADO POR LOS TERMOSTATOS DISPUESTOS A TAL FIN					
	23	LOS EQUIPOS FRIGORÍFICOS FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADAS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y VÁLVULAS	24	A LO LARGO DE LA INSTALACIÓN LAS TUBERÍAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y EL CALORIFUGADO ES CONTINUO EN TODO SU RECORRIDO	X			X	X6
	25	LAS VÁLVULAS DE CORTE Y REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	26	A LO LARGO DE LA INSTALACIÓN LOS CONDUCTOS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y EL CALORIFUGADO ES CONTINUO EN TODO SU RECORRIDO	X			X	X6

OBSERVACIONES

X1: Salta una alarma en el control. Presión de aceite. Se solucione tras reseteo.

X2: Falta por aislar parte de la valvulería.

X3: Es Las conexiones con el racor están a mal estado.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	13/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	13:15

ZONA REVISADA: 26

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	X		X		
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS	X		X		
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X_2
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES	X		X		
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X				
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X_1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	NA				
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	NA				
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	X		X		

OBSERVACIONES

X_1: Filtros sucios

X_2: Válvulas sin aislante o con el mismo deteriorado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	14/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRÉS PEDRO	**HORA:**	11:30

ZONA REVISADA: 33

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	X		X		
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS	X		X		
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X_1
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES	X		X		
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X				
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X_2
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	N/A				
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	N/A				
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	X		X		

OBSERVACIONES

X_1: Válvulas sin aislante

X_2: Filtros sucios

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	13/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	12:00

ZONA REVISADA: UTA-4

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	X		X		
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS	X		X		
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*1
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X	X	
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES	X		X		
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X		X		
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	*2
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	NA		X		
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	NA		X		
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	X		X		

OBSERVACIONES

*1: Oxidado y con falta de aislante en la valvulería.

*2: ~~Sucesivo~~ ~~Se encuent~~ ~~Ha de ser cambiado~~ Filtros sucios.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
[signature]	[signature]

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla SA.	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	13/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	13:00

ZONA REVISADA: 18

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X			X	*1
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	X		X		
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*2
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X				
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES	X		X		
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X		X		
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	NA				
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	NA				
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	X		X		

OBSERVACIONES

*1: Puerta sin pomo y otra imposible de abrir

*2: Válvulas sin aislar.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla SA	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alcaide	**FECHA:**	14/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	11:50

ZONA REVISADA: 3a

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	X		X		
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS	X		X		
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X	X	*1
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES	X		X		
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X		X		
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	NA		X		
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	NA		X		
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	X		X		

OBSERVACIONES

*1: Válvulas sin aislante

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alastuey	**FECHA:**	13/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	12:40

ZONA REVISADA: 49

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	X			X	X1
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X2
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES	X		X		
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X		X		
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X3
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	NA				
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	NA				
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	NA				

OBSERVACIONES

X1: Batería de frío deteriorada

X2: Válvulas no aisladas.

X3: Filtro sucio

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	13/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	12:30

ZONA REVISADA: SO

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	X			X	X_2
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X_3
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES	X		X		
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X		X		
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X_1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	NA				
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	NA				
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	NA				

OBSERVACIONES

X_1: Filtros sucios

X_2: Bateria de calor detenorada

X_3: Valvula no aisladas

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	María Goretti Leon	**FECHA:**	13/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	13:15

ZONA REVISADA: 27

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE					
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X			X_1	
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO					
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS	X			X_4	
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X			X_3	
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X_2	
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES	X		X		
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X				
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X		X		
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	NA				
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	NA				
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	X		X		

OBSERVACIONES

X_1 = sucio

X_2 = aislar valvulerias y elementos accesorios. Tramo de tubería sin reponer (foto)

X_3 = mal estado, correas agrietadas (foto)

X_4 = bandeja sucia.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:	MIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alcañiz	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	12:00

ZONA REVISADA: UTA-41

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	X		X		
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS	X		X		
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		(1)
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	(4)
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X			X	(5)
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES	X		X		
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X		X		
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X	X		X	(2)
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	(3)
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	X			X	(3)
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO		NA			
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO		NA			

OBSERVACIONES

(1) correa ventilador impulsión floja
(2) no tiene filtros. Solo tiene prefiltros
(3) filtros sucios. Se cambiaron en mayo por última vez
(4) valvulería y accesorios sin aislar
(5) filtro muy oxidado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	14/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	11:30

ZONA REVISADA: 32

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	X		X		
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS	X		X		
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES	X		X		
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL	X		X		
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	NA				
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	NA				
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alesbue	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Sala espera planta 1 B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X			X	*
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		?		*
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		)		*
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

*: No funciona

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro Ale	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alas Ereñ	**FECHA:**	14/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	12:30

ZONA REVISADA: SERVICIO TIGAS PO

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*2
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	*1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

*1: Filtro sucio cambiado en el momento.
*2: Aislante quitado y tubería en mal estado. Reparado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HJC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Perla S.A.	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: PLANTA 2 C : Vestuario femenino

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	X 8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X1
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	X 13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	X 14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	X 16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X1
~~**PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO**~~	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X1: Filtro sucio → Cambio al momento

X2: Falta aislante en uduales

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	MIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alestruey	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Farmacia zona general P-1

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X2
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X1: Cambiado en el momento

X2: Aislante abierto. Solucionado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Sala de espera extracciones PB

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*1
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	*2
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

*1: Falta de aislante en un codo de una tubería

*2: Filtro mal estado → Cambiado en el momento

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	14/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	12:25

ZONA REVISADA: Sala descanso comedor PO

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X_1
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X_2
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X_1: Válvulas sin aislar

X_2: Filtro sucio. Cambiado en el momento

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Ponla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	14/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRÉS PEDRO	**HORA:**	13:00

ZONA REVISADA: SALA ESPERA REGISTRO NACIMIENTOS

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	X 8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X2
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	X 13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	X 14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	X 16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X1
PARAMETROS X DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X1: Filtro se desmonta al sacarlo. Se cambia en el momento

X2: Válvulas sin aislante

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Martínez	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: P.1 → Dormitorio grande → pasillo

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	#1
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

#1: Aislante Dañado → Solucionado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro M	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Perla S.A.	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alsteré	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Despacho supervisión suministros planta -1

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	X 8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X				*1
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	X 13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	X 14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	X 16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
X PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

*1: Válvulas sin aislar

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro A.	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Perla S.A.	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Despacho 2 → Zona directiva

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X			X	X1
	X 8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	X 13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	X 14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	X 16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO X	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X1: Se aprecia un ruido de vibración → En la funda de las correas. Solucionado.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla SA	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alastué	**FECHA:**	14/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	12:35

ZONA REVISADA: Habitación Aislamiento PO

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓		✓		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	✓		✓		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	✓		✓		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	✓		✓		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		✓			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		✓			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	✓			✓	X1
	X 8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	✓		✓		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	✓		✓		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	✓		✓		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	✓		✓		
	X 13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	X 14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	X 16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	✓		✓		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	✓		✓		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X1: Se escucha ruido excesivo.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Perla S.A.	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alestruey	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: SECRETARIA FARMACIA P.-1

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓		✓		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	✓		✓	✓	X2
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	✓		✓		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	✓		✓		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		✓			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		✓			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	✓		✓		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	✓		✓		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	✓		✓		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	✓		✓		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	✓		✓		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	✓			✓	X1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X1: Cambiado al momento (anterior en mal estado)

X2: Conducto suelto → Solucionado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: HAB C289

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		X2
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	X 8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X				X1
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO					
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X				X2
	X 13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	X 14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	X 16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X1: Falta aislante → Solucionado

X2: Conducto caído → Solucionado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC	
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:** XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alestrué	**FECHA:**
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**

ZONA REVISADA: Zona Suministros Planta -1

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8 X	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13 X	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14 X	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	16 X	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	*1
~~**PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO**~~	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

*1: Filtro para cambiar → Cambiado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro Al	[signature]

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:	Hospital de Perla HIC S.A	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Polivalente personal planta 1

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	X 8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	X 13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	X 14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	X 16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	*1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

*1: Filtro en mal estado → Cambiado el momento

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro A	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Deposito sillas de ruedas diálisis

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO					
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	X 8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	X 13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	X 14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	X 16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X	X	X1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO X	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X1: Filtro para cambiar → Cambiado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro -MasCuvé-	**FECHA:**	14/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRÉS PEDRO	**HORA:**	12:50

ZONA REVISADA: Sala espera pediatría PO

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X1 : Filtro sucio. Cambiado en el momento

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HLC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Zona suministro Planta -1

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X_2
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X_1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

X_1: Filtro con necesidad de cambio → Cambiado en el momento

X_2: Aislante agrietado → Solucionado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alcalde	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: SALA DE ESPERA PLANTA 2

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	X 8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	X 13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	X 14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	X 16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		X *1
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		X *1
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

*1 Filtro defectuoso → Cambio en el momento

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Perla S.A.	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alestruey	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Despacho Cirugía Soporte Médico 2.

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X				*1
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	X 8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	X 13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	X 14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	X 16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		*2
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	X 19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	X 20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	X 21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	X 22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

*1: Difícil acceso

*2: Marca: Vafilter MMFCE
VF - PR/21
9 40x 215 x 6

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Porta S.A	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastaré	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Habitación ISSB → Planta 1

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓		✓		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	✓		✓		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	✓		✓		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	✓			✗	✗1
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		✗			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		✗			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	✓		✓		
	~~8~~	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	✓			✗	✗2
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	✓		✓		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	✓		✓		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	✓		✓		
	~~13~~	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	~~14~~	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		✗			
	~~16~~	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	✓		✓		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	✓		✓		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

✗1: Falta limpiar → Solucionado

✗2: Zona con rotulo → Solucionado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alestrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: P1: Vestuario Nº 2 Consultas externas

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X			X	*1
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	X 8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	X 13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	X 14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	X 16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	*2
X PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

*1: Difícil acceso

*2: Filtro para cambiar. Cambiado a el momento

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alas Ervé	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRÉS PEDRO	**HORA:**	14:26

ZONA REVISADA: HAB 237 B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*2
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	*1

OBSERVACIONES

*1: Filtro sucio

*2: Válvulas sin aislar.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	14:50

ZONA REVISADA: MAB 256B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*2
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	*1

OBSERVACIONES

*1: Filtro sucio. Cambiado en el momento

*2: Válvula no aislada

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Poniente S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alustiza	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRÉS PEDRO	**HORA:**	13:05

ZONA REVISADA: Despacho supervisor rehabilitación

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	$*_2$
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	$*_1$

OBSERVACIONES

$*_1$: Filtro se desmonta al sacarlo. Se cambia directamente.

$*_2$: Válvulas no aisladas.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alestré	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRÉS PEDRO	**HORA:**	13:47

ZONA REVISADA: MAD 239 B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X_2
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X_1

OBSERVACIONES

X_1: Filtro sucio. Cambiado en el momento

X_2: Válvula sin aislar

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro A	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alascruz	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRÉS PEDRO	**HORA:**	14:58

ZONA REVISADA: Sala estar caredor 2 Planta

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	X	X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS	X	X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X_2
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X_1

OBSERVACIONES

X_1: Filtro sucio. Cambiado al momento

X_2: Valvulas sin aislar

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hosp. Gral de Parla SA	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alós Cruz	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	15:00

ZONA REVISADA: Supervisión tarde 2 Planta

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X_1
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X	NA	
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X_1

OBSERVACIONES

X_1: Filtro sucio cambiado al momento.

X_2: Válvulas sin aislar.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alas Ervé	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	13:05

ZONA REVISADA: Trabajo administrativo i Planta

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X	X	X1
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X			X	X2

OBSERVACIONES

X1: Las válvulas no están aisladas

X2: Filtro sucio. Cambiado el momento

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Poniente S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	14:35

ZONA REVISADA: HAB 231B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		

OBSERVACIONES

* : Válvulas sin aislar

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	13:30

ZONA REVISADA: HAB 257B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		

OBSERVACIONES

*: Válvulas sin aislar

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla SA	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	14:27

ZONA REVISADA: Hab 260B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	A
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		

OBSERVACIONES

A: Válvulas sin aislar

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HJC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alastruey	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	14:25

ZONA REVISADA: MAB 254 B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		

OBSERVACIONES

*: Valvula sin aislar

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	14:23

ZONA REVISADA: HAB 235 B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	X
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		

OBSERVACIONES

X1: Las válvulas están sin aislar

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alas Ervé	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRÉS PEDRO	**HORA:**	15:45

ZONA REVISADA: HAB 2508

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		

OBSERVACIONES

*: Válvula no aislada

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alasgue	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRÉS PEDRO	**HORA:**	14:12

ZONA REVISADA: Consulta trauma

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		

OBSERVACIONES

*: Válvulas no visibles

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro A	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HJC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Jerez S.A.	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	14:00

ZONA REVISADA: Sala asociación 1

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	~~X~~	X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X				
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	*1
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		

OBSERVACIONES

*1: Válvulas sin aislar.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES ~~(U.T.A)~~ FANCOIL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Pola SA	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alcalde	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: LABORATORIO DESPACHO Soporte Medico 4

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO	X	X	X		
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS	X	X	X		
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	~~8~~	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	~~13~~	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	~~14~~	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X	X			
	~~16~~	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	~~19~~	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	~~20~~	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	~~21~~	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	~~22~~	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC	
EXPLOTADOR:	Hospital de Perla S.A.	**COD. PARTE: XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**

ZONA REVISADA: Sala extracciones PB

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	X 8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	X 13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	X 14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	NA	X			
	X 16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC	
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE: XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alas Ervier	**FECHA:**
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**

ZONA REVISADA: Exteriores pedestre. PB

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC	
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE: XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**

ZONA REVISADA: P1 → Sala ester comedor.

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alesver	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Planta 1 : Radiología Dormitorio guardia.

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro Alesver	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (U.T.A)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Puerta S.A	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alcobre	**FECHA:**	14/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	12:12

ZONA REVISADA: VESTUARIO MASCULINO PO

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	8	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	13	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	14	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	16	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	X		X		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	19	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	20	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	21	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	22	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN (FAN-COIL).

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	**COD. PARTE:**	XX-IF-CL-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alos Cruz	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANDRES PEDRO	**HORA:**	14:55

ZONA REVISADA: Sala estar polivalente

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		X		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	X		X		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	X		X		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	X		X		
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X			
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		X			
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	8	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X			X	$*_1$
	9	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	11	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	X		X		
	12	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
FILTROS	13	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	X		X		
	14	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	Y			X	$*_2$

OBSERVACIONES

$*_1$: Válvulas sin aislar

$*_2$: Filtro se desmonta el sábado. Cambiado el momento

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

1.1
1.2

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CLIMATIZACIÓN. CLIMATIZADORES (~~U.T.A~~) FANCOIL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**XX-IF-CL-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alestrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: SALA Reuniones Soporte Medico 4.

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EXTERIOR	1	LOS DIFERENTES CLIMATIZADORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓		✓		
	2	EL ESTADO EXTERIOR ES CORRECTO	✓		✓		
	3	LAS DIFERENTES PUERTAS O ACCESOS AL CLIMATIZADOR ESTÁN OPERATIVOS	✓		✓		
ESTADO INTERIOR	4	EL INTERIOR DEL CLIMATIZADOR ESTÁ LIMPIO Y EN BUEN ESTADO	✓		✓	~~✓~~	*1
	5	LAS BATERIAS DE FRIO Y CALOR SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRETO ESTADO		X		~~✓~~	
	6	LAS BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS		✓		~~✓~~	
	7	LOS MOTORES PARA LA VENTILACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	✓		✓		
	~~8~~	LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DE LOS MOTORES ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	~~✓~~		~~✓~~		
CONDUCTOS, TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN	9	LAS TUBERÍAS ESTÁN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS Y SU ESTADO ES CORRECTO	✓		✓		
	10	LOS DIFERENTES ELEMENTOS HIDRÁULICOS ESTÁN EN CORRETO ESTADO	✓		✓		
	11	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	✓		✓		
	12	LOS CONDUCTOS DE AIRE ESTÁN CORRECTAMENTE EMBOCADOS Y NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE	✓		✓		
	~~13~~	LAS TUBERÍAS DE CONDENSADOS DISPONEN DE SIFONES REGISTRABLES Y NO SE APRECIAN MALOS OLORES					
	~~14~~	LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAN ADECUADAMENTE					
	15	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X		X	
	~~16~~	LOS CLIMATIZADORES FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA Y SON AUTOMÁTICAMENTE GESTIONADOS POR UN SISTEMA DE CONTROL					
FILTROS	17	LOS FILTROS SON DEL TIPO ADECUADO Y SE ENCUENTRAN COLOCADOS	✓		✓		
	18	LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO SE APRECIA UN EXCESO DE PARTÍCULAS EN LOS MISMOS	✓		✓		
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	~~19~~	LAS TEMPERATURAS EN LA IMPULSIÓN Y EL RETORNO ESTÁN EN UN RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO					
	~~20~~	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACONSEJADO POR EL FABRICANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO					
	~~21~~	LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MOTORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					
	~~22~~	LA HÚMEDAD EN LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RANGO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO					

OBSERVACIONES

*1 Se observa polvo. Solucionado.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
EQUIPOS FRIGORÍFICOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**-IF-FRG-01.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	LOS EQUIPOS FRIGORÍFICOS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	2	LOS EQUIPOS FRIGORÍFICOS SE ENCUENTRAN EN DISPOSICIÓN DE FUNCIONAR	X		X		
	3	LOS EQUIPOS FRIGORÍFICOS NO PRESENTAN FUGAS DE ACEITE O GAS	X		X		
	4	LOS ELEMENTOS QUE PRODUCEN VIBRACIONES SE ENCUENTRAN AISLADOS PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN DE LA VIBRACIÓN	X		X		
	5	LOS EQUIPOS FR. SE ENCUENTRAN ADECUADAMENTE CALORIFUGADOS, EVITANDO LA PÉRDIDA DE ENERGÍA	X		X		
	6	LAS TUBERÍAS FRIGORÍFICAS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE CALORIFUGADAS	X		X		
	7	LOS EQUIPOS FR. SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PERSONAL NO AUTORIZADO	X		X		
	8	LAS BATERÍAS Y BANDEJAS DE CONDENSADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y EN CORRECTO ESTADO		X			
FUNCIONAMIENTO GENERAL	9	LAS TEMPERATURAS DE IMPULSIÓN SE ENCUENTRAN EN UN RANGO NORMAL SEGÚN LA TEMPERATURA AMBIENTE Y LA DE CONSIGNA		X			
	10	LOS EQUIPOS FR. NO EMITEN RUIDOS MOLESTOS O EXCESIVOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. GRUPO ELECTRÓGENO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	Industrial (HIC)		
EXPLOTADOR:	Hospital de Porla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-02.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	10/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER RUIZ	**HORA:**	11:50

ZONA REVISADA: E. Industrial

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EN REPOSO	1	NO EXISTE NINGÚN PILOTO DE ALRMA ENCENDIDO	X		X		
	2	EL CALENTADOR DEL CARTER FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	3	EL ESTADO DE LAS BATERÍAS DE ARRANQUE Y EL NIVEL DEL EECTROLITO ES CORRECTO	X		X		
	4	EL NIVEL DEL AGUA DEL RADIADOR Y DE ACEITE EN EL CÁRTER ES CORRECTO	X		X		
		EL NIVEL DE COMBUSTIBLE SE ENCUENTRA POR ENCIMA DEL NIVEL MÍNIMO MARCADO POR EL PPT	X		X		
	5	EL ESTADO DEL G.E. Y DE LOS ELEMENTOS CONECTADOS A ÉL SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO (Tubería de gasóleo, depósito nodriza, tubo de escape, bandejas eléctricas)	X		X		
ARRANQUE Y CONMUTACIÓN	6	SE CORTA LA ALIMENTACIÓN DE RED Y SE REALIZA LA CONMUTACIÓN DE INTERRUPTORES SIN PROBLEMAS (SI PROCEDE)		X			
	7	EL TIEMPO DE ARRANQUE DEL GRUPO DESPUÉS DE LA MANIOBRA DE CORTE DE RED SE ENCUENTRA EN RANGO	X	X	X		
	8	EL TIEMPO DE CONMUTACIÓN A GRUPO DESPUÉS DEL CORTE DE SUMINISTRO DE RED SE ENCUENTRA EN RANGO		X			
	9	EL EQUIPO ARRANCA EN POSICIÓN AUTOMÁTICO DURANTE 10 MINUTOS SIN CARGA Y SU FUNCIONAMIENTO ES CORRECTO		X			
FUNCIONAMIENTO DEL G.E.	10	LAS TENSIONES, FRECUENCIA, PRESIONES Y TEMPERATURA SEGÚN HOJA DE PROTOCOLO SON NORMALES	X		X		
	11	LA TEMPERATURA DEL BLOQUE ES CORRECTA	X		X		
	12	LA BOMBA DE CIRCULACIÓN DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	13	LOS VENTILADORES DE LA SALA ARRANCAN SIMULTANEAMENTE AL GE (SI PROCEDE)	NP				
	14	NO SE OBSERVAN FUGAS DE COMBUSTIBLE, AGUA, REFRIGERANTE O ACEITE LUBRICANTE	X		X		
	15	EN CASO DE TEMPERATURA BAJA EN EL TERMOSTATO DE LOS CALENTADORES, SE CONECTAN LAS RESISTENCIAS DE CALDEO	X		X		
	16	EL G.E. NO EMITE RUIDOS EXTRAÑOS O EXCESIVOS	X		X		
	17	LOS HUMOS DE ESCAPE SE CONDUCEN AL EXTERIOR DE FORMA CORRECTA	X		X		

OBSERVACIONES

Pot.: 700 kVA
Tipo: MLAS7001

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. GRUPO ELECTRÓGENO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HJC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-02.01
INSPECTOR:	Pablo Alastrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER	**HORA:**	

ZONA REVISADA: A

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EN REPOSO	1	NO EXISTE NINGÚN PILOTO DE ALRMA ENCENDIDO	X		X		
	2	EL CALENTADOR DEL CARTER FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	3	EL ESTADO DE LAS BATERÍAS DE ARRANQUE Y EL NIVEL DEL EECTROLITO ES CORRECTO	X		X		
	4	EL NIVEL DEL AGUA DEL RADIADOR Y DE ACEITE EN EL CÁRTER ES CORRECTO	X		X		
		EL NIVEL DE COMBUSTIBLE SE ENCUENTRA POR ENCIMA DEL NIVEL MÍNIMO MARCADO POR EL PPT	X		X		
	5	EL ESTADO DEL G.E. Y DE LOS ELEMENTOS CONECTADOS A ÉL SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO (Tubería de gasóleo, depósito nodriza, tubo de escape, bandejas eléctricas)	X		X		
ARRANQUE Y CONMUTACIÓN	6	SE CORTA LA ALIMENTACIÓN DE RED Y SE REALIZA LA CONMUTACIÓN DE INTERRUPTORES SIN PROBLEMAS (SI PROCEDE)	NA				
	7	EL TIEMPO DE ARRANQUE DEL GRUPO DESPUÉS DE LA MANIOBRA DE CORTE DE RED SE ENCUENTRA EN RANGO	NA				
	8	EL TIEMPO DE CONMUTACIÓN A GRUPO DESPUÉS DEL CORTE DE SUMINISTRO DE RED SE ENCUENTRA EN RANGO	NA				
	9	EL EQUIPO ARRANCA EN POSICIÓN AUTOMÁTICO DURANTE 10 MINUTOS SIN CARGA Y SU FUNCIONAMIENTO ES CORRECTO	NA				
FUNCIONAMIENTO DEL G.E.	10	LAS TENSIONES, FRECUENCIA, PRESIONES Y TEMPERATURA SEGÚN HOJA DE PROTOCOLO SON NORMALES	X		X		
	11	LA TEMPERATURA DEL BLOQUE ES CORRECTA	X		X		
	12	LA BOMBA DE CIRCULACIÓN DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	13	LOS VENTILADORES DE LA SALA ARRANCAN SIMULTANEAMENTE AL GE (SI PROCEDE)	NA		X		
	14	NO SE OBSERVAN FUGAS DE COMBUSTIBLE, AGUA, REFRIGERANTE O ACEITE LUBRICANTE	X		X		
	15	EN CASO DE TEMPERATURA BAJA EN EL TERMOSTATO DE LOS CALENTADORES, SE CONECTAN LAS RESISTENCIAS DE CALDEO	X		X		
	16	EL G.E. NO EMITE RUIDOS EXTRAÑOS O EXCESIVOS	X		X		
	17	LOS HUMOS DE ESCAPE SE CONDUCEN AL EXTERIOR DE FORMA CORRECTA	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pablo	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. GRUPO ELECTRÓGENO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**-IF-IE-02.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER	**HORA:**	

ZONA REVISADA: B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO EN REPOSO	1	NO EXISTE NINGÚN PILOTO DE ALRMA ENCENDIDO	X		X		*
	2	EL CALENTADOR DEL CARTER FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	3	EL ESTADO DE LAS BATERÍAS DE ARRANQUE Y EL NIVEL DEL EECTROLITO ES CORRECTO	X		X		
	4	EL NIVEL DEL AGUA DEL RADIADOR Y DE ACEITE EN EL CÁRTER ES CORRECTO	X		X		
		EL NIVEL DE COMBUSTIBLE SE ENCUENTRA POR ENCIMA DEL NIVEL MÍNIMO MARCADO POR EL PPT	X		X		
	5	EL ESTADO DEL G.E. Y DE LOS ELEMENTOS CONECTADOS A ÉL SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO (Tubería de gasóleo, depósito nodriza, tubo de escape, bandejas eléctricas)	X		X		
ARRANQUE Y CONMUTACIÓN	6	SE CORTA LA ALIMENTACIÓN DE RED Y SE REALIZA LA CONMUTACIÓN DE INTERRUPTORES SIN PROBLEMAS (SI PROCEDE)	NA				
	7	EL TIEMPO DE ARRANQUE DEL GRUPO DESPUÉS DE LA MANIOBRA DE CORTE DE RED SE ENCUENTRA EN RANGO	NA				
	8	EL TIEMPO DE CONMUTACIÓN A GRUPO DESPUÉS DEL CORTE DE SUMINISTRO DE RED SE ENCUENTRA EN RANGO	NA				
	9	EL EQUIPO ARRANCA EN POSICIÓN AUTOMÁTICO DURANTE 10 MINUTOS SIN CARGA Y SU FUNCIONAMIENTO ES CORRECTO	NA				
FUNCIONAMIENTO DEL G.E.	10	LAS TENSIONES, FRECUENCIA, PRESIONES Y TEMPERATURA SEGÚN HOJA DE PROTOCOLO SON NORMALES	X		X		
	11	LA TEMPERATURA DEL BLOQUE ES CORRECTA	X		X		
	12	LA BOMBA DE CIRCULACIÓN DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	13	LOS VENTILADORES DE LA SALA ARRANCAN SIMULTANEAMENTE AL GE (SI PROCEDE)	NA				
	14	NO SE OBSERVAN FUGAS DE COMBUSTIBLE, AGUA, REFRIGERANTE O ACEITE LUBRICANTE	X		X		
	15	EN CASO DE TEMPERATURA BAJA EN EL TERMOSTATO DE LOS CALENTADORES, SE CONECTAN LAS RESISTENCIAS DE CALDEO	X		X		
	16	EL G.E. NO EMITE RUIDOS EXTRAÑOS O EXCESIVOS	X		X		
	17	LOS HUMOS DE ESCAPE SE CONDUCEN AL EXTERIOR DE FORMA CORRECTA	X		X		

OBSERVACIONES

* Prealarma de Tª de agua.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alas Ervé	**FECHA:**	10/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	12:10

ZONA REVISADA: EDIFICIO INDUSTRIAL

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
TRANSFORMADOR NA	1	LOS TRANSFORMADORES SON DEL TIPO Y POTENCIA INDICADOS EN LA DOCUMENTACIÓN					
	2	SU ESTADO ES CORRECTO Y NO EMITEN RUIDOS EXTRAÑOS					
	3	LOS TRANSFORMADORES SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE ACUÑADOS					
	4	LAS CONEXIONES DE LOS TRANSFORMADORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
PROTECCIONES	5	LAS CELDAS DE MEDIA TENSION SE ENCUENTRAN OPERATIVAS	X		X		
	6	EL ESQUEMA QUE FORMAN LAS CELDAS SE CORRESPONDE CON LO INDICADO EN LOS PLANOS Y DOCUMENTACIÓN	X		X		
	7	LA SEÑALIZACIÓN DE TENSIÓN POR PILOTOS Y DE INDICACIÓN DE APERTURA Y CIERRE ES CORRECTA	X		X		
CONDICIONES DE SEGURIDAD 1	8	EN LUGAR VISIBLE SE DISPONE DE LAS INSTRUCCIONES PARA LA REANIMACIÓN DE SALVAMENTO	X		X		
	9	EN LUGAR VISIBLE SE DISPONE DE LA SECUENCIA SEGURA PARA EL TRABAJO EN ELEMENTOS SIN TENSIÓN	X		X		
	10	EL ANILLO DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN RODEA EL PERIMETRO INTERIOR DEL CT Y A ÉL ESTÁN CONECTADOS TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA SALA	X		X		
	11	LA TIERRA DE PROTECCIÓN DISPONE DE UN SECCIONADOR DE CORTE VISIBLE EN EL INTERIOR DE LA SALA	X		X		
	12	LA TIERRA DE SERVICIO DE LOS DOS TRANSFORMADORES DISPONE DE UN SECCIONADOR DE CORTE VISIBLE EN EL INTERIOR DE LA SALA	X		X		
	13	LA TIERRA DE PROTECCIÓN Y LA DE SERVICIO SON INDEPENDIENTES	X		X		
	14	EL CT DISPONE DE ELEMENTOS DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS	X		X		
	15	SE DISPONE DE EXTRACCIÓN FORZADA EN LA SALA	X		X		
	16	EN CASO DE DETECCIÓN DE INCENDIO LA EXTRACCIÓN FORZADA SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE	X		X		
	17	SE HAN DISPUESTO ELEMENTOS DE PROTECCION DIRECTA (REJA DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR CONTRA CONTACTOS DIRECTOS)	X		X		
	18	SE DISPONE DE BANQUETA, GUANTES, PERTIGA, INDICADOR DE TENSIÓN Y MANETA PARA REALIZAR DE FORMA SEGURA LAS MANIOBRAS EN A.T	X		X		
	19	SE DISPONE DE EXTINTOR EN LA SALA DE DIOXIDO DE CARBONO Y SU ESTADO Y PRESIÓN DE GAS ES ADECUADA	X		X		
	20	LA APERTURA DE LA SALA REQUIERE DE LLAVE, LA CUAL NO SE ENCUENTRA ACCESIBLE	X		X		

OBSERVACIONES

La inspección solo se ha realizado en la sala de celdas debido a que para ~~proseguir la inspección~~ acceder el propio C.T. es necesario realizar un corte de tensión.

1: Sala de celdas

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HJC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alas Ever	**FECHA:**	10/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	17:50

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
TRANSFORMADOR NA	1	LOS TRANSFORMADORES SON DEL TIPO Y POTENCIA INDICADOS EN LA DOCUMENTACIÓN					
	2	SU ESTADO ES CORRECTO Y NO EMITEN RUIDOS EXTRAÑOS					
	3	LOS TRANSFORMADORES SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE ACUÑADOS					
	4	LAS CONEXIONES DE LOS TRANSFORMADORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
PROTECCIONES	5	LAS CELDAS DE MEDIA TENSION SE ENCUENTRAN OPERATIVAS	X		X		
	6	EL ESQUEMA QUE FORMAN LAS CELDAS SE CORRESPONDE CON LO INDICADO EN LOS PLANOS Y DOCUMENTACIÓN	X		X		
	7	LA SEÑALIZACIÓN DE TENSIÓN POR PILOTOS Y DE INDICACIÓN DE APERTURA Y CIERRE ES CORRECTA	X		X		
CONDICIONES DE SEGURIDAD (1)	8	EN LUGAR VISIBLE SE DISPONE DE LAS INSTRUCCIONES PARA LA REANIMACIÓN DE SALVAMENTO	X		X		
	9	EN LUGAR VISIBLE SE DISPONE DE LA SECUENCIA SEGURA PARA EL TRABAJO EN ELEMENTOS SIN TENSIÓN	X		X		
	10	EL ANILLO DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN RODEA EL PERIMETRO INTERIOR DEL CT Y A ÉL ESTÁN CONECTADOS TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA SALA	X		X		
	11	LA TIERRA DE PROTECCIÓN DISPONE DE UN SECCIONADOR DE CORTE VISIBLE EN EL INTERIOR DE LA SALA	X		X		
	12	LA TIERRA DE SERVICIO DE LOS DOS TRANSFORMADORES DISPONE DE UN SECCIONADOR DE CORTE VISIBLE EN EL INTERIOR DE LA SALA	X		X		
	13	LA TIERRA DE PROTECCIÓN Y LA DE SERVICIO SON INDEPENDIENTES	X		X		
	14	EL CT DISPONE DE ELEMENTOS DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS	X		X		
	15	SE DISPONE DE EXTRACCIÓN FORZADA EN LA SALA	X		X		
	16	EN CASO DE DETECCIÓN DE INCENDIO LA EXTRACCIÓN FORZADA SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE	X		X		
	17	SE HAN DISPUESTO ELEMENTOS DE PROTECCION DIRECTA (REJA DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR CONTRA CONTACTOS DIRECTOS)	X		X		
	18	SE DISPONE DE BANQUETA, GUANTES, PERTIGA, INDICADOR DE TENSIÓN Y MANETA PARA REALIZAR DE FORMA SEGURA LAS MANIOBRAS EN A.T	X		X		
	19	SE DISPONE DE EXTINTOR EN LA SALA DE DIOXIDO DE CARBONO Y SU ESTADO Y PRESIÓN DE GAS ES ADECUADA	X			X	X_1
	20	LA APERTURA DE LA SALA REQUIERE DE LLAVE, LA CUAL NO SE ENCUENTRA ACCESIBLE	X		X		

OBSERVACIONES

(1): Sala de Celdas

X_1: No se encuentran ni en la sala ni en la puerta

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-03.01
INSPECTOR:	Pedro Alcaraz	**FECHA:**	10/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	13:00

ZONA REVISADA:			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
TRANSFORMADOR NA	1	LOS TRANSFORMADORES SON DEL TIPO Y POTENCIA INDICADOS EN LA DOCUMENTACIÓN					
	2	SU ESTADO ES CORRECTO Y NO EMITEN RUIDOS EXTRAÑOS					
	3	LOS TRANSFORMADORES SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE ACUÑADOS					
	4	LAS CONEXIONES DE LOS TRANSFORMADORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
PROTECCIONES	5	LAS CELDAS DE MEDIA TENSION SE ENCUENTRAN OPERATIVAS	X		X		
	6	EL ESQUEMA QUE FORMAN LAS CELDAS SE CORRESPONDE CON LO INDICADO EN LOS PLANOS Y DOCUMENTACIÓN	X		X		
	7	LA SEÑALIZACIÓN DE TENSIÓN POR PILOTOS Y DE INDICACIÓN DE APERTURA Y CIERRE ES CORRECTA	X		X		
CONDICIONES DE SEGURIDAD (1)	8	EN LUGAR VISIBLE SE DISPONE DE LAS INSTRUCCIONES PARA LA REANIMACIÓN DE SALVAMENTO	X		X		
	9	EN LUGAR VISIBLE SE DISPONE DE LA SECUENCIA SEGURA PARA EL TRABAJO EN ELEMENTOS SIN TENSIÓN	X		X		
	10	EL ANILLO DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN RODEA EL PERIMETRO INTERIOR DEL CT Y A ÉL ESTÁN CONECTADOS TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA SALA	X		X		
	11	LA TIERRA DE PROTECCIÓN DISPONE DE UN SECCIONADOR DE CORTE VISIBLE EN EL INTERIOR DE LA SALA	X		X		
	12	LA TIERRA DE SERVICIO DE LOS DOS TRANSFORMADORES DISPONE DE UN SECCIONADOR DE CORTE VISIBLE EN EL INTERIOR DE LA SALA	X		X		
	13	LA TIERRA DE PROTECCIÓN Y LA DE SERVICIO SON INDEPENDIENTES	X		X		
	14	EL CT DISPONE DE ELEMENTOS DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS	X		X		
	15	SE DISPONE DE EXTRACCIÓN FORZADA EN LA SALA	X		X		
	16	EN CASO DE DETECCIÓN DE INCENDIO LA EXTRACCIÓN FORZADA SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE	X		X		
	17	SE HAN DISPUESTO ELEMENTOS DE PROTECCION DIRECTA (REJA DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR CONTRA CONTACTOS DIRECTOS)	X		X		
	18	SE DISPONE DE BANQUETA, GUANTES, PERTIGA, INDICADOR DE TENSIÓN Y MANETA PARA REALIZAR DE FORMA SEGURA LAS MANIOBRAS EN A.T	X		X		
	19	SE DISPONE DE EXTINTOR EN LA SALA DE DIOXIDO DE CARBONO Y SU ESTADO Y PRESIÓN DE GAS ES ADECUADA	X		X		
	20	LA APERTURA DE LA SALA REQUIERE DE LLAVE, LA CUAL NO SE ENCUENTRA ACCESIBLE	X		X		

OBSERVACIONES

(1): Sala de Celdas

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro A.	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. VARIOS	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-04.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	10/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	14:05

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
PARARRAYOS	1	EXISTE INSTALACION DE PARARRAYOS	X		X		
	2	ESTAN CORRECTAMENTE SUJETOS SUS ELEMENTOS Y SU INSTALACION ES ADECUADA	X		X		
	3	LA BAJANTE ESTÁ EN BUEN ESTADO Y SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE PROTEGIDA EN SU PARTE PRÓXIMA AL SUELO	X			X	(1) (2)
	4	SE HA DISPUESTO SECCIONADOR DE CORTE PARA MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA	X		X		(3) (4)
SAI (SERVICIO DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA)	5	LOS SAI SE ENCUENTRAN OPERTATIVOS					
	6	EL ESTADO DE LOS SAI ES CORRECTO Y LA CARGA INDICADA EN LOS MISMOS ES PRÓXIMA AL 100%					
	7	LOS SAI SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL					
Fecha: 10/11/17	8	LAS BATERIAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN OPERATIVAS	X		X		
BATERIA DE CONDENSADORES	9	LAS BATERÍAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	10	EL COSENO DE FI INDICADO EN LAS BATERÍAS ES PRÓXIMO A LA UNIDAD	X		X		
Hora: 13:15	11	LAS BATERÍAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	X		X		
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA	12	LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN B.T ESTÁ EN CORRECTO ESTADO					
	13	SE DISPONE DE SECCIONADOR DEL CONDUCTOR DE TIERRA PARA POSIBILITAR LA MEDIDA					
CANALIZACIONES	14	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	15	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES ES LA ADECUADA					
	16	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN INSTALADAS DE FORMA QUE NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CABLES ELÉCTRICOS SIN EL USO DE HERRAMIENTAS					
ILUMINACIÓN	17	LAS LUMINARIAS INSTALADAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	18	NO SE APRECIAN LUMINARIAS FUNDIDAS					
	19	LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN ESTÁN ACORDE CON EL USO DE LA SALA ILUMINADA					
	20	LOS ENCENDIDOS O APAGADOS DE LAS LUMINARIAS SE REALIZAN TEMPORIZADA O CONTROLADA EN ZONAS DE ACCESO DE PÚBLICO					
MECANISMOS	21	LOS DISTINTOS MECANISMOS (TC, Interruptores, etc) SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	21	LOS MECANISMOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE					
	22	ESTOS ESTÁN CORRECTAMENTE SUJETOS A LOS PARAMENTOS					

OBSERVACIONES

(1) Ultimo tramo de 2 metros de bajante NE sin proteger adecuadamente (del ed. Industria)

(2) ~~Tubos~~ Recubrimientos deteriorados → bajante NO y flexibles

(3) Limpieza de arqueta puesta tierra bajada SE

Nota: mirar en Ordenes de Trabajo si inspeccionan todas las tierras

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro [signature]	[signature]

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. VARIOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HJC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**-IF-IE-04.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
PARARRAYOS	1	EXISTE INSTALACION DE PARARRAYOS					
	2	ESTAN CORRECTAMENTE SUJETOS SUS ELEMENTOS Y SU INSTALACION ES ADECUADA					
	3	LA BAJANTE ESTÁ EN BUEN ESTADO Y SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE PROTEGIDA EN SU PARTE PRÓXIMA AL SUELO					
	4	SE HA DISPUESTO SECCIONADOR DE CORTE PARA MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA					
SAI (SERVICIO DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA)	5	LOS SAI SE ENCUENTRAN OPERTATIVOS					
	6	EL ESTADO DE LOS SAI ES CORRECTO Y LA CARGA INDICADA EN LOS MISMOS ES PRÓXIMA AL 100%					
	7	LOS SAI SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL					
Fecha: 10/11/17 **BATERIA DE CONDENSADORES** Hora: 13:08	8	LAS BATERIAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN OPERATIVAS	X		X		
	9	LAS BATERÍAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	10	EL COSENO DE FI INDICADO EN LAS BATERÍAS ES PRÓXIMO A LA UNIDAD	X		X		
	11	LAS BATERÍAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	X		X		
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA	12	LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN B.T ESTÁ EN CORRECTO ESTADO					
	13	SE DISPONE DE SECCIONADOR DEL CONDUCTOR DE TIERRA PARA POSIBILITAR LA MEDIDA					
CANALIZACIONES	14	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	15	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES ES LA ADECUADA					
	16	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN INSTALADAS DE FORMA QUE NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CABLES ELÉCTRICOS SIN EL USO DE HERRAMIENTAS					
ILUMINACIÓN	17	LAS LUMINARIAS INSTALADAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	18	NO SE APRECIAN LUMINARIAS FUNDIDAS					
	19	LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN ESTÁN ACORDE CON EL USO DE LA SALA ILUMINADA					
	20	LOS ENCENDIDOS O APAGADOS DE LAS LUMINARIAS SE REALIZAN TEMPORIZADA O CONTROLADA EN ZONAS DE ACCESO DE PÚBLICO					
MECANISMOS	21	LOS DISTINTOS MECANISMOS (TC, Interruptores, etc) SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	21	LOS MECANISMOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE					
	22	ESTOS ESTÁN CORRECTAMENTE SUJETOS A LOS PARAMENTOS					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. VARIOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HJC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**-IF-IE-04.01**
INSPECTOR:	Pedro Alas Erve	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
PARARRAYOS	1	EXISTE INSTALACION DE PARARRAYOS					
	2	ESTAN CORRECTAMENTE SUJETOS SUS ELEMENTOS Y SU INSTALACION ES ADECUADA					
	3	LA BAJANTE ESTÁ EN BUEN ESTADO Y SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE PROTEGIDA EN SU PARTE PRÓXIMA AL SUELO					
	4	SE HA DISPUESTO SECCIONADOR DE CORTE PARA MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA					
SAI (SERVICIO DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA)	5	LOS SAI SE ENCUENTRAN OPERTATIVOS					
	6	EL ESTADO DE LOS SAI ES CORRECTO Y LA CARGA INDICADA EN LOS MISMOS ES PRÓXIMA AL 100%					
	7	LOS SAI SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL					
Fecha: 10/11/17 **BATERIA DE CONDENSADORES** Hora: 13:05	8	LAS BATERIAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN OPERATIVAS	X		X		
	9	LAS BATERÍAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	10	EL COSENO DE FI INDICADO EN LAS BATERÍAS ES PRÓXIMO A LA UNIDAD	X		X		
	11	LAS BATERÍAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	X		X		
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA	12	LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN B.T ESTÁ EN CORRECTO ESTADO					
	13	SE DISPONE DE SECCIONADOR DEL CONDUCTOR DE TIERRA PARA POSIBILITAR LA MEDIDA					
CANALIZACIONES	14	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	15	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES ES LA ADECUADA					
	16	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN INSTALADAS DE FORMA QUE NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CABLES ELÉCTRICOS SIN EL USO DE HERRAMIENTAS					
ILUMINACIÓN	17	LAS LUMINARIAS INSTALADAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	18	NO SE APRECIAN LUMINARIAS FUNDIDAS					
	19	LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN ESTÁN ACORDE CON EL USO DE LA SALA ILUMINADA					
	20	LOS ENCENDIDOS O APAGADOS DE LAS LUMINARIAS SE REALIZAN TEMPORIZADA O CONTROLADA EN ZONAS DE ACCESO DE PÚBLICO					
MECANISMOS	21	LOS DISTINTOS MECANISMOS (TC, Interruptores, etc) SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	21	LOS MECANISMOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE					
	22	ESTOS ESTÁN CORRECTAMENTE SUJETOS A LOS PARAMENTOS					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. VARIOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**-IF-IE-04.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	14:30

ZONA REVISADA: Diálisis

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
PARARRAYOS	1	EXISTE INSTALACION DE PARARRAYOS					
	2	ESTAN CORRECTAMENTE SUJETOS SUS ELEMENTOS Y SU INSTALACION ES ADECUADA					
	3	LA BAJANTE ESTÁ EN BUEN ESTADO Y SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE PROTEGIDA EN SU PARTE PRÓXIMA AL SUELO					
	4	SE HA DISPUESTO SECCIONADOR DE CORTE PARA MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA					
SAI (SERVICIO DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA)	5	LOS SAI SE ENCUENTRAN OPERTATIVOS	X		X		
	6	EL ESTADO DE LOS SAI ES CORRECTO Y LA CARGA INDICADA EN LOS MISMOS ES PRÓXIMA AL 100%	X		X		
	7	LOS SAI SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	X		X		
BATERIA DE CONDENSADORES	8	LAS BATERIAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN OPERATIVAS					
	9	LAS BATERÍAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO					
	10	EL COSENO DE FI INDICADO EN LAS BATERÍAS ES PRÓXIMO A LA UNIDAD					
	11	LAS BATERÍAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL					
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA	12	LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN B.T ESTÁ EN CORRECTO ESTADO					
	13	SE DISPONE DE SECCIONADOR DEL CONDUCTOR DE TIERRA PARA POSIBILITAR LA MEDIDA					
CANALIZACIONES	14	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	15	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES ES LA ADECUADA					
	16	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN INSTALADAS DE FORMA QUE NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CABLES ELÉCTRICOS SIN EL USO DE HERRAMIENTAS					
ILUMINACIÓN	17	LAS LUMINARIAS INSTALADAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	18	NO SE APRECIAN LUMINARIAS FUNDIDAS					
	19	LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN ESTÁN ACORDE CON EL USO DE LA SALA ILUMINADA					
	20	LOS ENCENDIDOS O APAGADOS DE LAS LUMINARIAS SE REALIZAN TEMPORIZADA O CONTROLADA EN ZONAS DE ACCESO DE PÚBLICO					
MECANISMOS	21	LOS DISTINTOS MECANISMOS (TC, Interruptores, etc) SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	21	LOS MECANISMOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE					
	22	ESTOS ESTÁN CORRECTAMENTE SUJETOS A LOS PARAMENTOS					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. VARIOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-04.01
INSPECTOR:	Pedro Alascue	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	15:30

ZONA REVISADA: Polivalente Personal 3

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
PARARRAYOS	1	EXISTE INSTALACION DE PARARRAYOS					
	2	ESTAN CORRECTAMENTE SUJETOS SUS ELEMENTOS Y SU INSTALACION ES ADECUADA					
	3	LA BAJANTE ESTÁ EN BUEN ESTADO Y SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE PROTEGIDA EN SU PARTE PRÓXIMA AL SUELO					
	4	SE HA DISPUESTO SECCIONADOR DE CORTE PARA MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA					
SAI (SERVICIO DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA)	5	LOS SAI SE ENCUENTRAN OPERTATIVOS	✓		✓		
	6	EL ESTADO DE LOS SAI ES CORRECTO Y LA CARGA INDICADA EN LOS MISMOS ES PRÓXIMA AL 100%	✓		✓		
	7	LOS SAI SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	✓		✓		
BATERIA DE CONDENSADORES	8	LAS BATERIAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN OPERATIVAS					
	9	LAS BATERÍAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO					
	10	EL COSENO DE FI INDICADO EN LAS BATERÍAS ES PRÓXIMO A LA UNIDAD					
	11	LAS BATERÍAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL					
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA	12	LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN B.T ESTÁ EN CORRECTO ESTADO					
	13	SE DISPONE DE SECCIONADOR DEL CONDUCTOR DE TIERRA PARA POSIBILITAR LA MEDIDA					
CANALIZACIONES	14	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	15	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES ES LA ADECUADA					
	16	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN INSTALADAS DE FORMA QUE NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CABLES ELÉCTRICOS SIN EL USO DE HERRAMIENTAS					
ILUMINACIÓN	17	LAS LUMINARIAS INSTALADAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	18	NO SE APRECIAN LUMINARIAS FUNDIDAS					
	19	LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN ESTÁN ACORDE CON EL USO DE LA SALA ILUMINADA					
	20	LOS ENCENDIDOS O APAGADOS DE LAS LUMINARIAS SE REALIZAN TEMPORIZADA O CONTROLADA EN ZONAS DE ACCESO DE PÚBLICO					
MECANISMOS	21	LOS DISTINTOS MECANISMOS (TC, Interruptores, etc) SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	21	LOS MECANISMOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE					
	22	ESTOS ESTÁN CORRECTAMENTE SUJETOS A LOS PARAMENTOS					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. VARIOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	**COD. PARTE:**	-IF-IE-04.01
INSPECTOR:	Pedro Alastaye	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	14:30

ZONA REVISADA: Instalaciones hospital de día

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
PARARRAYOS	1	EXISTE INSTALACION DE PARARRAYOS					
	2	ESTAN CORRECTAMENTE SUJETOS SUS ELEMENTOS Y SU INSTALACION ES ADECUADA					
	3	LA BAJANTE ESTÁ EN BUEN ESTADO Y SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE PROTEGIDA EN SU PARTE PRÓXIMA AL SUELO					
	4	SE HA DISPUESTO SECCIONADOR DE CORTE PARA MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA					
SAI (SERVICIO DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA)	5	LOS SAI SE ENCUENTRAN OPERTATIVOS	X		X		
	6	EL ESTADO DE LOS SAI ES CORRECTO Y LA CARGA INDICADA EN LOS MISMOS ES PRÓXIMA AL 100%	X		X		
	7	LOS SAI SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	X		X		
BATERIA DE CONDENSADORES	8	LAS BATERIAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN OPERATIVAS					
	9	LAS BATERÍAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO					
	10	EL COSENO DE FI INDICADO EN LAS BATERÍAS ES PRÓXIMO A LA UNIDAD					
	11	LAS BATERÍAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL					
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA	12	LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN B.T ESTÁ EN CORRECTO ESTADO					
	13	SE DISPONE DE SECCIONADOR DEL CONDUCTOR DE TIERRA PARA POSIBILITAR LA MEDIDA					
CANALIZACIONES	14	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	15	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES ES LA ADECUADA					
	16	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN INSTALADAS DE FORMA QUE NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CABLES ELÉCTRICOS SIN EL USO DE HERRAMIENTAS					
ILUMINACIÓN	17	LAS LUMINARIAS INSTALADAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	18	NO SE APRECIAN LUMINARIAS FUNDIDAS					
	19	LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN ESTÁN ACORDE CON EL USO DE LA SALA ILUMINADA					
	20	LOS ENCENDIDOS O APAGADOS DE LAS LUMINARIAS SE REALIZAN TEMPORIZADA O CONTROLADA EN ZONAS DE ACCESO DE PÚBLICO					
MECANISMOS	21	LOS DISTINTOS MECANISMOS (TC, Interruptores, etc) SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	21	LOS MECANISMOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE					
	22	ESTOS ESTÁN CORRECTAMENTE SUJETOS A LOS PARAMENTOS					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Ped.	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. VARIOS	incosa Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-04.01
INSPECTOR:	Pedro Alestruz	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	15:45

ZONA REVISADA: CMI 1

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
PARARRAYOS	1	EXISTE INSTALACION DE PARARRAYOS					
	2	ESTAN CORRECTAMENTE SUJETOS SUS ELEMENTOS Y SU INSTALACION ES ADECUADA					
	3	LA BAJANTE ESTÁ EN BUEN ESTADO Y SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE PROTEGIDA EN SU PARTE PRÓXIMA AL SUELO					
	4	SE HA DISPUESTO SECCIONADOR DE CORTE PARA MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA					
SAI (SERVICIO DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA)	5	LOS SAI SE ENCUENTRAN OPERTATIVOS	X		X		
	6	EL ESTADO DE LOS SAI ES CORRECTO Y LA CARGA INDICADA EN LOS MISMOS ES PRÓXIMA AL 100%	X		X		
	7	LOS SAI SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	X		X		
BATERIA DE CONDENSADORES	8	LAS BATERIAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN OPERATIVAS					
	9	LAS BATERÍAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO					
	10	EL COSENO DE FI INDICADO EN LAS BATERÍAS ES PRÓXIMO A LA UNIDAD					
	11	LAS BATERÍAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL					
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA	12	LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN B.T ESTÁ EN CORRECTO ESTADO					
	13	SE DISPONE DE SECCIONADOR DEL CONDUCTOR DE TIERRA PARA POSIBILITAR LA MEDIDA					
CANALIZACIONES	14	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	15	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES ES LA ADECUADA					
	16	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN INSTALADAS DE FORMA QUE NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CABLES ELÉCTRICOS SIN EL USO DE HERRAMIENTAS					
ILUMINACIÓN	17	LAS LUMINARIAS INSTALADAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	18	NO SE APRECIAN LUMINARIAS FUNDIDAS					
	19	LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN ESTÁN ACORDE CON EL USO DE LA SALA ILUMINADA					
	20	LOS ENCENDIDOS O APAGADOS DE LAS LUMINARIAS SE REALIZAN TEMPORIZADA O CONTROLADA EN ZONAS DE ACCESO DE PÚBLICO					
MECANISMOS	21	LOS DISTINTOS MECANISMOS (TC, Interruptores, etc) SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	21	LOS MECANISMOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE					
	22	ESTOS ESTÁN CORRECTAMENTE SUJETOS A LOS PARAMENTOS					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro Al	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. VARIOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-04.01
INSPECTOR:	Pedro Alés Gué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	13:55

ZONA REVISADA: CMI 2

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
PARARRAYOS	1	EXISTE INSTALACION DE PARARRAYOS					
	2	ESTAN CORRECTAMENTE SUJETOS SUS ELEMENTOS Y SU INSTALACION ES ADECUADA					
	3	LA BAJANTE ESTÁ EN BUEN ESTADO Y SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE PROTEGIDA EN SU PARTE PRÓXIMA AL SUELO					
	4	SE HA DISPUESTO SECCIONADOR DE CORTE PARA MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA					
SAI (SERVICIO DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA)	5	LOS SAI SE ENCUENTRAN OPERTATIVOS	X		X		
	6	EL ESTADO DE LOS SAI ES CORRECTO Y LA CARGA INDICADA EN LOS MISMOS ES PRÓXIMA AL 100%	X		X		
	7	LOS SAI SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	X		X		
BATERIA DE CONDENSADORES	8	LAS BATERIAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN OPERATIVAS					
	9	LAS BATERÍAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO					
	10	EL COSENO DE FI INDICADO EN LAS BATERÍAS ES PRÓXIMO A LA UNIDAD					
	11	LAS BATERÍAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL					
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA	12	LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN B.T ESTÁ EN CORRECTO ESTADO					
	13	SE DISPONE DE SECCIONADOR DEL CONDUCTOR DE TIERRA PARA POSIBILITAR LA MEDIDA					
CANALIZACIONES	14	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	15	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES ES LA ADECUADA					
	16	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN INSTALADAS DE FORMA QUE NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CABLES ELÉCTRICOS SIN EL USO DE HERRAMIENTAS					
ILUMINACIÓN	17	LAS LUMINARIAS INSTALADAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	18	NO SE APRECIAN LUMINARIAS FUNDIDAS					
	19	LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN ESTÁN ACORDE CON EL USO DE LA SALA ILUMINADA					
	20	LOS ENCENDIDOS O APAGADOS DE LAS LUMINARIAS SE REALIZAN TEMPORIZADA O CONTROLADA EN ZONAS DE ACCESO DE PÚBLICO					
MECANISMOS	21	LOS DISTINTOS MECANISMOS (TC, Interruptores, etc) SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	21	LOS MECANISMOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE					
	22	ESTOS ESTÁN CORRECTAMENTE SUJETOS A LOS PARAMENTOS					

OBSERVACIONES

AUDITOR: Pedro Alés	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. VARIOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-04.01
INSPECTOR:	Pedro Alas Ervé	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	14:55

ZONA REVISADA: CMI 4

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
PARARRAYOS	1	EXISTE INSTALACION DE PARARRAYOS					
	2	ESTAN CORRECTAMENTE SUJETOS SUS ELEMENTOS Y SU INSTALACION ES ADECUADA					
	3	LA BAJANTE ESTÁ EN BUEN ESTADO Y SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE PROTEGIDA EN SU PARTE PRÓXIMA AL SUELO					
	4	SE HA DISPUESTO SECCIONADOR DE CORTE PARA MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA					
SAI (SERVICIO DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA)	5	LOS SAI SE ENCUENTRAN OPERTATIVOS	X		X		
	6	EL ESTADO DE LOS SAI ES CORRECTO Y LA CARGA INDICADA EN LOS MISMOS ES PRÓXIMA AL 100%	X		X		
	7	LOS SAI SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	X		X		
BATERIA DE CONDENSADORES	8	LAS BATERIAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN OPERATIVAS					
	9	LAS BATERÍAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO					
	10	EL COSENO DE FI INDICADO EN LAS BATERÍAS ES PRÓXIMO A LA UNIDAD					
	11	LAS BATERÍAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL					
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA	12	LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN B.T ESTÁ EN CORRECTO ESTADO					
	13	SE DISPONE DE SECCIONADOR DEL CONDUCTOR DE TIERRA PARA POSIBILITAR LA MEDIDA					
CANALIZACIONES	14	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	15	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES ES LA ADECUADA					
	16	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN INSTALADAS DE FORMA QUE NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CABLES ELÉCTRICOS SIN EL USO DE HERRAMIENTAS					
ILUMINACIÓN	17	LAS LUMINARIAS INSTALADAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	18	NO SE APRECIAN LUMINARIAS FUNDIDAS					
	19	LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN ESTÁN ACORDE CON EL USO DE LA SALA ILUMINADA					
	20	LOS ENCENDIDOS O APAGADOS DE LAS LUMINARIAS SE REALIZAN TEMPORIZADA O CONTROLADA EN ZONAS DE ACCESO DE PÚBLICO					
MECANISMOS	21	LOS DISTINTOS MECANISMOS (TC, Interruptores, etc) SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	21	LOS MECANISMOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE					
	22	ESTOS ESTÁN CORRECTAMENTE SUJETOS A LOS PARAMENTOS					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. VARIOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Ponla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-04.01
INSPECTOR:	Pedro Alestrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	14:45

ZONA REVISADA: CMA 1

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
PARARRAYOS	1	EXISTE INSTALACION DE PARARRAYOS					
	2	ESTAN CORRECTAMENTE SUJETOS SUS ELEMENTOS Y SU INSTALACION ES ADECUADA					
	3	LA BAJANTE ESTÁ EN BUEN ESTADO Y SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE PROTEGIDA EN SU PARTE PRÓXIMA AL SUELO					
	4	SE HA DISPUESTO SECCIONADOR DE CORTE PARA MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA					
SAI (SERVICIO DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA)	5	LOS SAI SE ENCUENTRAN OPERTATIVOS	X		X		
	6	EL ESTADO DE LOS SAI ES CORRECTO Y LA CARGA INDICADA EN LOS MISMOS ES PRÓXIMA AL 100%	X		X		
	7	LOS SAI SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	X		X		
BATERIA DE CONDENSADORES	8	LAS BATERIAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN OPERATIVAS					
	9	LAS BATERÍAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO					
	10	EL COSENO DE FI INDICADO EN LAS BATERÍAS ES PRÓXIMO A LA UNIDAD					
	11	LAS BATERÍAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL					
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA	12	LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN B.T ESTÁ EN CORRECTO ESTADO					
	13	SE DISPONE DE SECCIONADOR DEL CONDUCTOR DE TIERRA PARA POSIBILITAR LA MEDIDA					
CANALIZACIONES	14	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	15	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES ES LA ADECUADA					
	16	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN INSTALADAS DE FORMA QUE NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CABLES ELÉCTRICOS SIN EL USO DE HERRAMIENTAS					
ILUMINACIÓN	17	LAS LUMINARIAS INSTALADAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	18	NO SE APRECIAN LUMINARIAS FUNDIDAS					
	19	LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN ESTÁN ACORDE CON EL USO DE LA SALA ILUMINADA					
	20	LOS ENCENDIDOS O APAGADOS DE LAS LUMINARIAS SE REALIZAN TEMPORIZADA O CONTROLADA EN ZONAS DE ACCESO DE PÚBLICO					
MECANISMOS	21	LOS DISTINTOS MECANISMOS (TC, Interruptores, etc) SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	21	LOS MECANISMOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE					
	22	ESTOS ESTÁN CORRECTAMENTE SUJETOS A LOS PARAMENTOS					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. VARIOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-04.01
INSPECTOR:	Pedro Alcaraz	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	13:55

ZONA REVISADA: EMA 2

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
PARARRAYOS	1	EXISTE INSTALACION DE PARARRAYOS					
	2	ESTAN CORRECTAMENTE SUJETOS SUS ELEMENTOS Y SU INSTALACION ES ADECUADA					
	3	LA BAJANTE ESTÁ EN BUEN ESTADO Y SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE PROTEGIDA EN SU PARTE PRÓXIMA AL SUELO					
	4	SE HA DISPUESTO SECCIONADOR DE CORTE PARA MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA					
SAI (SERVICIO DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA)	5	LOS SAI SE ENCUENTRAN OPERTATIVOS	X		X		
	6	EL ESTADO DE LOS SAI ES CORRECTO Y LA CARGA INDICADA EN LOS MISMOS ES PRÓXIMA AL 100%	X		X		
	7	LOS SAI SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	X		X		
BATERIA DE CONDENSADORES	8	LAS BATERIAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN OPERATIVAS					
	9	LAS BATERÍAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO					
	10	EL COSENO DE FI INDICADO EN LAS BATERÍAS ES PRÓXIMO A LA UNIDAD					
	11	LAS BATERÍAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL					
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA	12	LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN B.T ESTÁ EN CORRECTO ESTADO					
	13	SE DISPONE DE SECCIONADOR DEL CONDUCTOR DE TIERRA PARA POSIBILITAR LA MEDIDA					
CANALIZACIONES	14	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	15	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES ES LA ADECUADA					
	16	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN INSTALADAS DE FORMA QUE NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CABLES ELÉCTRICOS SIN EL USO DE HERRAMIENTAS					
ILUMINACIÓN	17	LAS LUMINARIAS INSTALADAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	18	NO SE APRECIAN LUMINARIAS FUNDIDAS					
	19	LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN ESTÁN ACORDE CON EL USO DE LA SALA ILUMINADA					
	20	LOS ENCENDIDOS O APAGADOS DE LAS LUMINARIAS SE REALIZAN TEMPORIZADA O CONTROLADA EN ZONAS DE ACCESO DE PÚBLICO					
MECANISMOS	21	LOS DISTINTOS MECANISMOS (TC, Interruptores, etc) SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	21	LOS MECANISMOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE					
	22	ESTOS ESTÁN CORRECTAMENTE SUJETOS A LOS PARAMENTOS					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. VARIOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-04.01
INSPECTOR:	Pedro Alas Ervé	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	13:55

ZONA REVISADA: CMA 3

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
PARARRAYOS	1	EXISTE INSTALACION DE PARARRAYOS					
	2	ESTAN CORRECTAMENTE SUJETOS SUS ELEMENTOS Y SU INSTALACION ES ADECUADA					
	3	LA BAJANTE ESTÁ EN BUEN ESTADO Y SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE PROTEGIDA EN SU PARTE PRÓXIMA AL SUELO					
	4	SE HA DISPUESTO SECCIONADOR DE CORTE PARA MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA					
SAI (SERVICIO DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA)	5	LOS SAI SE ENCUENTRAN OPERTATIVOS	X		X		
	6	EL ESTADO DE LOS SAI ES CORRECTO Y LA CARGA INDICADA EN LOS MISMOS ES PRÓXIMA AL 100%	X		X		
	7	LOS SAI SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	X		X		
BATERIA DE CONDENSADORES	8	LAS BATERIAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN OPERATIVAS					
	9	LAS BATERÍAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO					
	10	EL COSENO DE FI INDICADO EN LAS BATERÍAS ES PRÓXIMO A LA UNIDAD					
	11	LAS BATERÍAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL					
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA	12	LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN B.T ESTÁ EN CORRECTO ESTADO					
	13	SE DISPONE DE SECCIONADOR DEL CONDUCTOR DE TIERRA PARA POSIBILITAR LA MEDIDA					
CANALIZACIONES	14	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	15	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES ES LA ADECUADA					
	16	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN INSTALADAS DE FORMA QUE NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CABLES ELÉCTRICOS SIN EL USO DE HERRAMIENTAS					
ILUMINACIÓN	17	LAS LUMINARIAS INSTALADAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	18	NO SE APRECIAN LUMINARIAS FUNDIDAS					
	19	LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN ESTÁN ACORDE CON EL USO DE LA SALA ILUMINADA					
	20	LOS ENCENDIDOS O APAGADOS DE LAS LUMINARIAS SE REALIZAN TEMPORIZADA O CONTROLADA EN ZONAS DE ACCESO DE PÚBLICO					
MECANISMOS	21	LOS DISTINTOS MECANISMOS (TC, Interruptores, etc) SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	21	LOS MECANISMOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE					
	22	ESTOS ESTÁN CORRECTAMENTE SUJETOS A LOS PARAMENTOS					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. VARIOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-04.01
INSPECTOR:	Pedro Alestre	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	14:35

ZONA REVISADA: CMA4

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
PARARRAYOS	1	EXISTE INSTALACION DE PARARRAYOS					
	2	ESTAN CORRECTAMENTE SUJETOS SUS ELEMENTOS Y SU INSTALACION ES ADECUADA					
	3	LA BAJANTE ESTÁ EN BUEN ESTADO Y SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE PROTEGIDA EN SU PARTE PRÓXIMA AL SUELO					
	4	SE HA DISPUESTO SECCIONADOR DE CORTE PARA MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA					
SAI (SERVICIO DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA)	5	LOS SAI SE ENCUENTRAN OPERTATIVOS	X		X		
	6	EL ESTADO DE LOS SAI ES CORRECTO Y LA CARGA INDICADA EN LOS MISMOS ES PRÓXIMA AL 100%	X		X		
	7	LOS SAI SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	X		X		
BATERIA DE CONDENSADORES	8	LAS BATERIAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN OPERATIVAS					
	9	LAS BATERÍAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO					
	10	EL COSENO DE FI INDICADO EN LAS BATERÍAS ES PRÓXIMO A LA UNIDAD					
	11	LAS BATERÍAS DE CONDENSADORES SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL					
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA	12	LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN B.T ESTÁ EN CORRECTO ESTADO					
	13	SE DISPONE DE SECCIONADOR DEL CONDUCTOR DE TIERRA PARA POSIBILITAR LA MEDIDA					
CANALIZACIONES	14	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	15	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES ES LA ADECUADA					
	16	LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTRAN INSTALADAS DE FORMA QUE NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CABLES ELÉCTRICOS SIN EL USO DE HERRAMIENTAS					
ILUMINACIÓN	17	LAS LUMINARIAS INSTALADAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	18	NO SE APRECIAN LUMINARIAS FUNDIDAS					
	19	LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN ESTÁN ACORDE CON EL USO DE LA SALA ILUMINADA					
	20	LOS ENCENDIDOS O APAGADOS DE LAS LUMINARIAS SE REALIZAN TEMPORIZADA O CONTROLADA EN ZONAS DE ACCESO DE PÚBLICO					
MECANISMOS	21	LOS DISTINTOS MECANISMOS (TC, Interruptores, etc) SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO					
	21	LOS MECANISMOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE					
	22	ESTOS ESTÁN CORRECTAMENTE SUJETOS A LOS PARAMENTOS					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: CSEII-2-I

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	X		X		
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO	NA				X
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	NA				X
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X			X	$*_2$
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS	X		X		
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

* : Zona en desuso del hospital.

$*_2$: Una de las fases salta 31'9 mA y debería saltar a 30mA de máxima. del diferencial de alumbrado 3 (30mA, 25A, 4P)

solucionado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alcaraz	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: CPE 2 - S1 - SUM

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	X		X		
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO	X			X	1
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	X		X		
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	NA				
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS	X		X		
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

*La rotulación externa no se corresponde con el cuadro interno

1: Fase S superior, son circuitos de tomas de fuerza y puede ser que tenga más cargas conectadas.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Perla S.A	**COD. PARTE:**	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alonso Cruz	**FECHA:**	22/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER	**HORA:**	11:50

ZONA REVISADA: CPNI-2-14

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		*1
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	X		X		
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO		X			
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO		X			
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In		X			
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS	X		X		
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

*1: Puerta suelta (si que cierra)

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alestrue	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER	**HORA:**	

ZONA REVISADA: CSE 1-1-5

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	✓		✓		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	✓		✓		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	✓		✓		
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	✓		✓		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	✓		✓		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO	NA				
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	NA				
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	✓		✓		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	✓		✓		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	✓		✓		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓	*1
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	✓		✓		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS	✓		✓		
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	✓		✓		

OBSERVACIONES

*1: Diferencial de 30mA que alimenta cuadros de habitaciones donde también son de 30mA.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: CGBT Industrial

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	X		X		1
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO		X			2
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO		X			2
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	NA				
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS	X		X		
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

* Actúa como cuadro secundario por lo que el nombre no es el apropiado.

1: Se ha ampliado el ~~circuito~~ cuadro y no se ha actualizado el unifilar.

2: No se ha podido medir debido a imposibilidad de poner la pinza.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**-IF-IE-01.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastuey	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: CSE2-2-C

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X				#1
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	X		X		
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO	X		X		
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	X		X		
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	N/A				
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS	X		X		
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

#1 → Manchado y con falta de Escallera. Solucionado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**-IF-IE-01.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: CPN 2-1-F

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	X		X		
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X				
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO	NA	X			
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	NA	X			
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	NA	NA			
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO					
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS	X		X		
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS					

OBSERVACIONES

* Foto C1 : Cables mal cintedos. Se ha solucionado posteriormente sustituyendo los cables mal cintedos por una reserva.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla HIC S.A	**COD. PARTE:**	**-IF-IE-01.01**
INSPECTOR:	Pedro Alos Eve	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: CPE 1-2-E

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	X		X		
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO	X		X		
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	X		X		
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	NA				
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS		X		X	
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**-IF-IE-01.01**
INSPECTOR:	Pedro Alcaraz	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: CPL 2-1-G

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	X		X		
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO		X			
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO		X			
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	NA				
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS	X		X		
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN FÍSICA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**-IF-IE-01.01**
INSPECTOR:	Pedro Alestruer	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER	**HORA:**	

ZONA REVISADA: HAB. 109

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	NA		NA		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	NA		NA		
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO	NA		NA		
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	X		X		
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS	X		X		
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
[signature]	[signature]

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**-IF-IE-01.01**
INSPECTOR:	Pedro Alcaraz	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER	**HORA:**	

ZONA REVISADA: CPE 2-B-G

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	X		X		
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO	X		X		
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	X		X		
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	NA				
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS	X		X		
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	22/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER	**HORA:**	11:15

ZONA REVISADA: Cuadro Centro de transformación

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	X		X		
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO	X	X	X		
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	X	X	X		
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS		X			
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	**COD. PARTE:**	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alestrué	**FECHA:**	27/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER	**HORA:**	11:30

ZONA REVISADA: CPE 1-1-I

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	X		X		
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO		X			
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO		X			
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In		X			
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS	X		X		
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HJC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	17/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER RUIZ GARCIA	**HORA:**	12:00

ZONA REVISADA: HAB. 252-B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE		X			
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO		X			
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	X		X		
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS		X			
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUTOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	**COD. PARTE:**	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alcalde Cruz	**FECHA:**	17/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER RUIZ GARCIA	**HORA:**	12:08

ZONA REVISADA: MAB. 237-B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE		X			
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO		X			
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	X		X		
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS		X			
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Pena S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alesón	**FECHA:**	17/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER RUIZ GARCIA	**HORA:**	12:20

ZONA REVISADA: HAB 232-B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE		X			
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO		X			
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	X		X		
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS		X			
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Poniente S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alcaraz	**FECHA:**	17/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER RUIZ GARCIA	**HORA:**	12:25

ZONA REVISADA: HAB. 238B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE		X			
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO		X			
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	X		X		
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS		X			
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro Alcaraz	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HJC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	22/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	12:25

ZONA REVISADA: CPN2-C-F

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE	X		X		
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO	X		X		
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	X		X		
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE		X			
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS	X		X		
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alesbaez	**FECHA:**	17/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER RUIZ GARCIA	**HORA:**	12:30

ZONA REVISADA: HAB. 257B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE		X			
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO		X			
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	X		X		
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS		X			
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Pera S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-IE-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alas Cruz	**FECHA:**	17/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER RUIZ GARCIA	**HORA:**	12:35

ZONA REVISADA: MAB 242 B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ASPECTOS GENERALES	1	EL ESTADO GENERAL DE CUADRO ES CORRECTO. PUERTA, TAPAS, OBTURADORES, LIMPIEZA, ETC	X		X		
	2	EL CUADRO DISPONE DE CERRADURA SI SE ENCUENTRA EN UNA ZONA AL PUBLICO	X		X		
	3	EL ESQUEMA UNIFILAR SE ENCUENTRA JUNTO AL CUADRO Y SE CORRESPONDE CON ESTE		X			
	4	LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS ES CORRECTA Y SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
FUNCIONAMIENTO	5	EL ESTADO DE LA APARAMENTA ES CORRECTO	X		X		
	6	EL REPARTO DE CARGAS EN LAS 3 FASES ESTÁ CORRECTAMENTE REALIZADO		X			
	7	NO EXISTE NINGÚN CIRCUITO SOBRECARGADO	X		X		
SEGURIDAD NORMATIVA	8	LAS CARGAS QUE CUELGAN DE LOS DIFERENCIALES NO SUPERERAN SU In	X		X		
	9	LOS PUENTES PARA ALIMENTACIÓN DE PROTECCIONES DE CABECERAS SON DE LA SECCIÓN APROPIADA	X		X		
	10	LA SECCIÓN DE SALIDA DE LOS CIRCUITOS SE CORRESPONDE CON LA In DE LA PROTECCIÓN DE LA QUE CUELGA	X		X		
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN	11	EN CASO DE PODER DISPARAR LOS DIFERENCIALES, ESTOS FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	12	NO EXISTEN BORNAS SUELTAS EN EL CUADRO	X		X		
	13	LAS TIERRAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS DE FORMA SEGURA EN EL EMBARRADO DE TIERRAS		X			
	14	LAS CONEXIONES Y CABLEADO ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
PUERTAS AUTOMÁTICAS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:	Hospital de HIC Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-PAT-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alcalde	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Puerta urgencias interior 2 (pulsador)

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO DE LAS PUERTAS Y DE TODOS SUS ELEMENTOS ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	LAS DISTINTAS PUERTAS AUTOMÁTICAS DE LAS QUE DISPONE EL CENTRO SE ENCUENTRAN OPERATIVAS	X		X		
	3	LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE, ABRIENDOSE AL APROXIMARSE UNA PERSONA O AL ACTUAR SOBRE LOS PULSADORES	X		X		
	4	EL CIERRE DE LAS PUERTAS ES CORRECTO, SELLANDO COMPLETAMENTE EL PASO A SU CIERRE	X		X		
	5	EN CASO DE DETECTAR UN OBSTACULO, LAS PUERTAS DETIENEN SU CIERRE	X			X	*
	6	EN CASO DE QUEDARSE SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO LAS PUERTAS NO QUEDAN BLOQUEADAS. SU APERTURA MANUAL ES POSIBLE	X		X		

OBSERVACIONES

* Se hicieron sin sensor de movimiento de obra.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
PUERTAS AUTOMÁTICAS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-PAT-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Puerta urgencia interior 1 (pulsador)

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO DE LAS PUERTAS Y DE TODOS SUS ELEMENTOS ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	LAS DISTINTAS PUERTAS AUTOMÁTICAS DE LAS QUE DISPONE EL CENTRO SE ENCUENTRAN OPERATIVAS	X		X		
	3	LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE, ABRIENDOSE AL APROXIMARSE UNA PERSONA O AL ACTUAR SOBRE LOS PULSADORES	X		X		
	4	EL CIERRE DE LAS PUERTAS ES CORRECTO, SELLANDO COMPLETAMENTE EL PASO A SU CIERRE	X		X		
	5	EN CASO DE DETECTAR UN OBSTACULO, LAS PUERTAS DETIENEN SU CIERRE	X			X	X
	6	EN CASO DE QUEDARSE SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO LAS PUERTAS NO QUEDAN BLOQUEADAS. SU APERTURA MANUAL ES POSIBLE	X		X		

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
PUERTAS AUTOMÁTICAS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HJC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-PAT-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alascue	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Rsa Entrada principal

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO DE LAS PUERTAS Y DE TODOS SUS ELEMENTOS ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	LAS DISTINTAS PUERTAS AUTOMÁTICAS DE LAS QUE DISPONE EL CENTRO SE ENCUENTRAN OPERATIVAS	X		X		
	3	LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE, ABRIENDOSE AL APROXIMARSE UNA PERSONA O AL ACTUAR SOBRE LOS PULSADORES	X		X		
	4	EL CIERRE DE LAS PUERTAS ES CORRECTO, SELLANDO COMPLETAMENTE EL PASO A SU CIERRE	X		X		
	5	EN CASO DE DETECTAR UN OBSTACULO, LAS PUERTAS DETIENEN SU CIERRE	X		X		
	6	EN CASO DE QUEDARSE SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO LAS PUERTAS NO QUEDAN BLOQUEADAS. SU APERTURA MANUAL ES POSIBLE	X		X		*

OBSERVACIONES

* Existe una palanca para ese fin pero no ha sido probada

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
PUERTAS AUTOMÁTICAS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla HIC S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-PAT-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alestrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Puerta urgencias intermedia

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO DE LAS PUERTAS Y DE TODOS SUS ELEMENTOS ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	LAS DISTINTAS PUERTAS AUTOMÁTICAS DE LAS QUE DISPONE EL CENTRO SE ENCUENTRAN OPERATIVAS	X		X		
	3	LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE, ABRIENDOSE AL APROXIMARSE UNA PERSONA O AL ACTUAR SOBRE LOS PULSADORES	X		X		
	4	EL CIERRE DE LAS PUERTAS ES CORRECTO, SELLANDO COMPLETAMENTE EL PASO A SU CIERRE	X		X		
	5	EN CASO DE DETECTAR UN OBSTACULO, LAS PUERTAS DETIENEN SU CIERRE	X		X		
	6	EN CASO DE QUEDARSE SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO LAS PUERTAS NO QUEDAN BLOQUEADAS. SU APERTURA MANUAL ES POSIBLE	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
PUERTAS AUTOMÁTICAS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:	Hospital de Pedro Alastrué HIC Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-PAT-01.01
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Puertas urgencias

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO DE LAS PUERTAS Y DE TODOS SUS ELEMENTOS ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	LAS DISTINTAS PUERTAS AUTOMÁTICAS DE LAS QUE DISPONE EL CENTRO SE ENCUENTRAN OPERATIVAS	X		X		
	3	LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE, ABRIENDOSE AL APROXIMARSE UNA PERSONA O AL ACTUAR SOBRE LOS PULSADORES	X		X		
	4	EL CIERRE DE LAS PUERTAS ES CORRECTO, SELLANDO COMPLETAMENTE EL PASO A SU CIERRE	X		X		
	5	EN CASO DE DETECTAR UN OBSTACULO, LAS PUERTAS DETIENEN SU CIERRE	X		X		
	6	EN CASO DE QUEDARSE SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO LAS PUERTAS NO QUEDAN BLOQUEADAS. SU APERTURA MANUAL ES POSIBLE	X		X		

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
PUERTAS AUTOMÁTICAS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-PAT-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Puertas diálisis

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO DE LAS PUERTAS Y DE TODOS SUS ELEMENTOS ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	LAS DISTINTAS PUERTAS AUTOMÁTICAS DE LAS QUE DISPONE EL CENTRO SE ENCUENTRAN OPERATIVAS	X		X		
	3	LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE, ABRIENDOSE AL APROXIMARSE UNA PERSONA O AL ACTUAR SOBRE LOS PULSADORES	X		X		
	4	EL CIERRE DE LAS PUERTAS ES CORRECTO, SELLANDO COMPLETAMENTE EL PASO A SU CIERRE	X		X		
	5	EN CASO DE DETECTAR UN OBSTACULO, LAS PUERTAS DETIENEN SU CIERRE	X		X		
	6	EN CASO DE QUEDARSE SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO LAS PUERTAS NO QUEDAN BLOQUEADAS. SU APERTURA MANUAL ES POSIBLE	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
PUERTAS AUTOMÁTICAS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla HIC S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-PAT-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastuey	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Puerta urgencias personal autorizado

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO DE LAS PUERTAS Y DE TODOS SUS ELEMENTOS ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	LAS DISTINTAS PUERTAS AUTOMÁTICAS DE LAS QUE DISPONE EL CENTRO SE ENCUENTRAN OPERATIVAS	X		X		
	3	LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE, ABRIENDOSE AL APROXIMARSE UNA PERSONA O AL ACTUAR SOBRE LOS PULSADORES	X		X		
	4	EL CIERRE DE LAS PUERTAS ES CORRECTO, SELLANDO COMPLETAMENTE EL PASO A SU CIERRE	X		X		
	5	EN CASO DE DETECTAR UN OBSTACULO, LAS PUERTAS DETIENEN SU CIERRE	X		X		
	6	EN CASO DE QUEDARSE SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO LAS PUERTAS NO QUEDAN BLOQUEADAS. SU APERTURA MANUAL ES POSIBLE	X		X		

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINCIÓN

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-PCI-01-01
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	15/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	FRAN	**HORA:**	12:10

ZONA REVISADA:			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
TUBERÍAS	1	LAS TUBERÍAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	2	LA SUPORTACIÓN DE LAS TUBERÍAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	3	NO SE OBSERVAN FUGAS U OXIDACIÓNES EN LAS TUBERÍAS	X		X		
BIES	4	EL ESTADO DE LAS BIES ES CORRECTO. SU APERTURA SE REALIZA DE FORMA SENCILLA Y LA MANGUERA SE MANIOBRA SIN PROBLEMAS	X		X		
	5	LA PRESIÓN EN LOS MANÓMETROS DE LAS BIES ES ADECUADA	X		X		
HIDRANTES	6	LOS HIDRANTES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	7	LOS HIDRANTES SON ACCESIBLES Y FACILMENTE VISIBLES	X		X		
EXTINTORES	8	LOS EXTINTORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	9	LA ALTURA DE LA EMPUÑADURA NO ESTÁ A MAS DE 150CM DEL SUELO	X		X		
	10	LA PRESIÓN EN LOS MISMOS ESTÁ DENTRO DEL RANGO ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		
	11	LOS EXTINTORES DISPONEN DE ANILLA E IDENTIFICADOR DEL USO DEL MISMO	X		X		
DEPÓSITOS Y GRUPOS COMPRESORES	12	LOS DEPÓSITOS SE ENCUENTRAN LLENOS Y NO SE APRECIAN FUGAS	X		X		
	13	LAS VÁLVULAS DE CORTE PERMITEN UNA CORRECTA MANIOBRABILIDAD	X		X		
	14	NO SE APRECIAN DEFECTOS O ALARMAS EN EL CUADRO DE GESTIÓN Y ALARMA DEL GRUPO DE PRESIÓN DE INCENDIOS (GPI)	X		X		
	15	EL GPI FUNCIONA CORRECTAMENTE Y LA PRESIÓN Y CAUDAL GENERADOS ESTÁN DENTRO DEL RANGO DE FUNCIONAMIENTO NORMATIVO DEL EDIFICIO	X		X		
	16	LA BOMBA JOCKEY NO PRESENTA ARRANQUES NO CONTROLADOS, SINTOMA DE FUGAS EN LA INSTALACIÓN	X		X		
	17	LAS BOMBAS PRINCIPALES Y JOCKEY FUNCIONAN CORRECTAMENTE EN MANUAL Y AUTOMÁTICO	X		X		
	18	AL ARRANCAR LAS BOMBAS PRINCIPALES, SUENA UNA ALARMA ACÚSTICA Y LA PARADA DEL GRUPO ES POSIBLE SOLO EN MANUAL	X		X		
	19	NO SE APRECIAN RUIDOS O VIBRACIONES ANOMALOS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO	X		X		
	20	EL CONTADOR DE ARRANQUES DE LA BOMBA JOCKEY FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
EXTINCIÓN POR ROCIADORES	21	LOS ROCIADORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	22	NO SE APRECIAN FUGAS EN LOS ROCIADORES	X		X		
	23	LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN DE AGUA NEBULIZADA SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	24	LAS SALAS DE EXTINCIÓN POR GAS SE ENCUENTRAN IDENTIFICADAS COMO TALES A LA SALIDA Y A LA ENTRADA	X		X		
EXTINCIÓN POR GAS	25	LA RED DE TUBERÍAS DE EXTINCIÓN SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	26	LA PRESIÓN EN LAS BOMBONAS DE GAS ES CORRECTA	X		X		
	27	LOS PULSADORES DE ACTIVACIÓN DE LA EXTINCIÓN SE ENCUENTRAN FUERA DE LA SALA	X		X		
	28	EXISTE UN CARTEL DE SEÑALIZACIÓN DE EXTINCIÓN DISPARADA FUERA Y DENTRO DE LA SALA	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
AGUA CALIENTE SANITARIA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	**COD. PARTE:**	-IF-ACS-01-01
INSPECTOR:	Pedro Alestre	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
TUBERÍAS	1	LAS TUBERÍAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	2	EL AISLAMIENTO Y LA SUPORTACIÓN DE LAS TUBERÍAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		SI
	3	NO SE OBSERVAN FUGAS U OXIDACIÓNES EN LAS TUBERÍAS	X		X		
	4	SE EMPLEAN MANGUITOS FLEXIBLES Y JUNTAS ANTIVIBRATORIAS PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS A LAS TUBERÍAS DESDE LAS BOMBAS	X		X		
	5	EN TRAMOS LARGOS DE TUBERÍAS (>25M) SE ENCUENTRAN INSTALADOS DILATADORES PARA ABSORVER LAS VARIACIONES DE LONGITUD DE LA TUBERÍA	X		X		
VALVULERÍA, GRIFERÍA Y EQUILIBRADO	6	LAS VÁLVULAS DE CORTE FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	7	LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN SE ENCUENTRAN INSTALADAS	X		X		
	8	LA GRIFERÍA Y RESTO DE ELEMENTOS DE CONSUMO SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y SU FUNCIONAMIENTO ES CORRECTO	X		X		
	9	LA PRESIÓN, CAUDAL EN LOS ELEMENTOS DE CONSUMO ES ADECUADA	X		X		
	10	EL TIEMPO DESDE LA APERTURA DE UN GRIFO HASTA QUE EL AGUA ALCANZA UNA TEMPERATURA ELEVADA (>30º) ESTA EN UN RANGO ACEPTABLE	X		X		
	11	LA TEMPERATURA EN GRIFOS SUPERA LOS 50º	X		X		
BOMBAS Y DEPÓSITOS	12	LOS DEPÓSITOS SE ENCUENTRAN OPERTATIVOS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	13	LOS DEPÓSITOS DISPONEN DE UNA LLAVE DE PURGA EN SU PARTE BAJA	X		X		
	14	EL SISTEMA DE BOMBEO SE ENCUENTRA OPERATIVO AL 100%	X			X	SI
	15	LAS BOMBAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE Y SU FUNCIONAMIENTO ES AUTOMÁTICO MANTENIENDO EL AGUA DE LOS DEPÓSITOS POR ENCIMA DE LOS 65º	X			X	
	16	EL SISTEMA DE SOLAR SE ENCUENTRA INTEGRADO EN EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ACS REDUCIENDO EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES CONVENCIONALES	X		X		

OBSERVACIONES

La bomba 1 y 3 están paradas por fugas.
Alguna zona puntual en planta sótano está con el aislamiento levantado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla SA	**COD. PARTE:**	-IF-IF-01-01
INSPECTOR:	Pedro Alcaraz	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
TUBERÍAS	1	LAS TUBERÍAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		S8
	2	EL AISLAMIENTO Y LA SUPORTACIÓN DE LAS TUBERÍAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	3	NO SE OBSERVAN FUGAS U OXIDACIÓNES EN LAS TUBERÍAS	X		X		
	4	SE EMPLEAN MANGUITOS FLEXIBLES Y JUNTAS ANTIVIBRATORIAS PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS A LAS TUBERÍAS	X		X		
VALVULERÍA Y GRIFERÍA	5	LAS VÁLVULAS DE CORTE FUNCIONAN ADECUADAMENTE	X		X		
	6	LA GRIFERÍA SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	7	LA GRIFERÍA Y RESTO DE ELEMENTOS DE CONSUMO SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y SU FUNCIONAMIENTO ES CORRECTO	X		X		
	8	LA PRESIÓN Y CAUDAL EN LOS ELEMENTOS DE CONSUMO ES ADECUADA	X		X		
EQUIPOS DE BOMBEO Y DEPÓSITOS	9	LOS ALGIBES SE ENCUENTRAN OPERTATIVOS Y SU ESTADO ES CORRECTO	X		X		
	10	EL SISTEMA DE LLENADO FUNCIONA Y REGULA ADECUADAMENTE EL LLENADO	X		X		
	11	EL SISTEMA DE CLORACIÓN SE APLICA SOBRE EL AGUA EN LOS DEPÓSITOS	X		X		
	12	EL SISTEMA DE BOMBEO SE ENCUENTRA OPERATIVO AL 100%	X		X		
	13	EL SISTEMA DE BOMBEO FUNCIONA CORRECTAMENTE TANTO EN MANUAL COMO EN AUTOMÁTICO	X		X		
	14	EL SISTEMA DE BOMBEO NO GENERA RUIDOS O VIBRACIONES EXTRAÑAS	X		X		
	15	LAS BOMBAS DESCANSAN SOBRE UNA BANCADA DE INCERCIA O ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS	X		X		
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						

OBSERVACIONES

Pequeña fuga en conexión de tubería con el muro.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla HIC S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-SAN-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alcalde	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN	1	LOS DESAGÜES DE LOS ELEMENTOS INDIVIDUALES ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADOS (ENSAMBLES, SUJECIONES, PENDIENTES)	X		X		
	2	ESTÁN CORRECTAMENTE COLOCADOS LOS BOTES SIFÓNICOS O LOS SIFONES DE CADA ELEMENTO	X		X		
	3	EL DESAGÜE SE PRODUCE EN UN TIEMPO RAZONABLE	X		X		
	4	NO SE APRECIAN MALOS OLORES O RUIDOS AL EVACUAR AGUA POR LOS SANITARIOS	X		X		
RED DE SANEAMIENTO VERTICAL, HORIZONTAL, ENTERRADA Y COLGADA	5	EL ESTADO DE LAS TUBERÍAS ES ADECUADO Y NO SE APRECIAN FUGAS O GOTERAS	X		X		
	6	LA SUJECIÓN DE LAS TUBERÍAS ES CORRECTA	X		X		
	7	NO SE APRECIAN MALOS OLORES O RUIDOS EXCESIVOS EN LAS PROXIMIADES DE LAS REDES DE SANEAMIENTO	X		X		
	8	LA PENDIENTE DE LOS TRAMOS HORIZONTALES QUE QUEDAN A LA VISTA ES CORRECTA	X		X		
ARQUETAS Y ELEMENTOS DE RECOGIDA DE PLUVIALES	9	ESTÁN LAS ARQUETAS EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	10	LAS TAPAS DE ARQUETAS SON DE LOS MATERIALES ADECUADOS	X		X		
	11	ESTÁN LOS SUMIDIEROS, RIGOLAS O IMBORNALES EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	12	NO SE APRECIAN MALOS OLORES EN LAS PROXIMIADES DE ESTOS	X		X		
SEPARADOR DE GRASAS Y SISTEMA DE BOMBEO	13	EXISTE UN SEPARADOR DE HIDROCARBUROS EN LA INSTALACIÓN	X		X		
	14	DISPONE ÉSTE DE UN ACCESO APROPIADO PARA SU LIMPIEZA	X		X		
	15	EL ESTADO DEL MISMO ES CORRECTO	X		X		
	16	LOS SISTEMAS DE BOMBEO A PRESIÓN DESDE LOS POZOS DE RECOGIDA FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
INSTALACIÓN DE SOLAR TÉRMICA PARA APOYO AL ACS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-SO-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Colectores Instalación solar Térmica

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
CAPTADORES	1	LOS COLECTORES SOLARES ESTÁN CORRECTAMENTE MONTADOS Y ORIENTADOS	X		X		
	2	LOS COLECTORES NO PRESENTAN NINGÚN DETERIORO	X			X	*1
ACUMULADORES SOLARES	3	LOS ACUMULADORES PARA EL AGUA CALIENTE SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO.	X		X		
	4	EL VOLUMEN DE ACUMULACIÓN PERMITE UN CORRECTO APROVECHAMIENTO DE LA INSTALACIÓN	X		X		
TUBERÍAS Y LLAVES DE PASO	5	LA CONEXIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ELEMENTOS ES ADECUADA Y NO SE DETECTAN FUGAS	X		X		
	6	LAS TUBERÍAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y SU SUPORTACIÓN Y AISLAMIENTO ES ADECUADO	X			X	*2
	7	LAS TUBERÍAS EN ZONAS EXTERIORES MANTIENE SU PROTECCIÓN U.V Y TÉRMICA EN BUEN ESTADO	X			X	*2
SISTEMAS VARIOS (IMPULSION, SEGURIDAD, CONTROL Y REGULACIÓN)		LA VALVULERÍA Y LLAVES DE CORTE PERMITEN UNA MANIOBRABILIDAD ADECUADA	X		X		
	8	LA INSTALACIÓN DISPONE DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO	X		X		
	9	LAS BOMBAS DE RECIRCULACIÓN FUNCIÓNAN CORRECTAMENTE Y SU ESTADO ES ADECUADO	X			X	*3
	10	LA CENTRAL DE REGULACIÓN GESTIONA CORRECTAMENTE LA INSTALACIÓN Y PERMITE UN ADECUADO APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR	X		X		
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						

OBSERVACIONES

*1: Hay algún colector que necesita ser renovado y algún otro limpiado.

*2: Números fallos de aislamiento, sobre todo en la unión de la tubería con el colector.

*3: Una de las bombas presenta óxido debido a una filtración de agua.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro A	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
CONTROL Y VIGILANCIA

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HJC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-VIG-01-01
INSPECTOR:	Pedro Alvarez	**FECHA:**	21/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	ANGEL LOPEZ - NARANJO JARENO	**HORA:**	14:30

ZONA REVISADA: Cuarto vigilancia.

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
CANALIZACIONES Y CABLEADO	1	LOS CONDUCTORES Y CANALIZACIONEES EMPLEADOS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	2	LOS CONDUCTORES DISCURREN DE FORMA NO ACCESIBLE AL PÚBLICO GENERAL	X		X		
	3	EL RACK DE VIGILANCIA Y LA MESA DE CONTROL ESTÁN CABLEADOS DE UNA FORMA ORDENADA, QUE EVITA FALLOS O DESCONEXIONES	X		X		
ELEMENTOS DE DETECCIÓN	4	LOS DETECTORES MAGNÉTICOS O VOLUMÉTRICOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SU FUNCIONAMIENTO ES CORRECTO	X		X		
	5	LOS ELEMENTOS DE DETECCIÓN PROTEGEN ADECUADAMENTE LAS ENTRADAS A ZONAS RESTRINGIDAS	X		X		
	6	EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS ES CORRECTO	X		X		
	7	LAS CÁMARAS PERMITEN ZOOM O MOVIMIENTO DE TAL FORMA QUE CONSIGUEN UN CONTROL TOTAL DE LAS ÁREAS SENSIBLES	X		X		
GRABACIÓN	8	EL VISIONADO DE LAS IMÁGENES CAPTADAS POR LAS CÁMARAS SE HACE DE FORMA CORRECTA PERMITIENDO CONTROLAR CUALQUIER SITUACIÓN ANÓMALA	X		X		
	9	SE REALIZA UN GRABADO DE LAS IMÁGENES CAPTADAS POR LAS CÁMARAS, CON SUFICENTE CAPACIDAD PARA DISPONER ALMACENADO DE UN TIEMPO APROPIADO	X		X		
	10	LAS IMÁGENES CAPTADAS, DESPUÉS DE UN TIEMPO PRUDENCIAL SON BORRADAS	X		X		
	11	LA GRABACIÓN SE REALIZA CON UN SISTEMA DUPLICADO QUE EVITE CUALQUIER PÉRDIDA DE IMÁGENES		X			
GESTIÓN DEL SISTEMA	12	EXISTE UNA PERSONA CONTINUAMENTE VIGILANDO EL VISIONADO DE LAS CÁMARAS O EL SISTEMA LE AVISA AUTOMÁTICAMENTE EN CASO DE INCIDENCIA	X		X		
	13	EL SISTEMA EN CASO DE INTRUSIÓN NO AUTORIZADA AVISA AUTOMÁTICAMENTE A LOS VIGILANTES	X		X		
	14	LA CENTRAL DE ALARMA DE INTRUSIÓN NO PRESENTA INCIDENCIAS	X		X		
	15	LA CENTRAL DE ALARMA DE INTRUSIÓN PERMITE LA VISUALIZACIÓN DE UN HISTÓRICO DE INCIDENCIAS					
	16	EN CASO DE FALLO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, TANTO EL SISTEMA DE CCTV COMO EL DE INTRUSIÓN, EMITE UNA ALARMA AUTOMÁTICA	X		X		
	17	EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS HUMANOS Y TÉCNICOS DE VIGILANCIA ESTÁN CORDINADOS DE FORMA QUE DAN UNA PRONTA RESPUESTA ANTE UNA INTRUSIÓN O SITUACIÓN ANÓMALA	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION
INSPECCIÓN FÍSICA
RED DE DATOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	**COD. PARTE:**	-IF-DTA-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alestruey	**FECHA:**	17/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER RUIZ GARCIA	**HORA:**	11:35

ZONA REVISADA: Repartidor Sótano 7

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
CABLEADO Y CANALIZACIONES	1	LAS CANALIZACIONES DE LA RED DE DATOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO					
	2	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES DE DATOS SON ADECUADAS					
	3	NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CONDUCTORES EN EL INTERIOR DE LAS CANALIZACIONES SIN EMPLEAR ALGÚN TIPO DE HERRAMIENTAS					
	4	EL CABLEADO DE LA INSTALACIÓN SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y NO SE OBSERVAN RETORCIMIENTOS O PELADURAS EN LAS CUBIERTAS DE LOS MISMOS					
	5	EL CABLEADO ACCEDE DE FORMA ORDENADA AL INTERIOR DE LOS RACK					
RACKS	6	LOS RACK SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	X		X		
	7	LOS RACK SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	8	LOS RACK SE ENCUENTRAN BIEN IDENTIFICADOS	X		X		
	9	LAS CONEXIONES A LOS DISTINTOS ELEMENTOS ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADAS	X		X		
	10	ESTÁN CORRECTAMENTE CRIMPADOS LOS CABLES DENTRO DEL RACK	X		X		
	11	LOS RACK SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PERSONAL AJENO A LA INSTALACIÓN	X		X		
TOMAS DE DATOS	12	LAS TOMAS DE DATOS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
	13	LAS TOMAS DE DATOS PERMITEN UNA FACIL CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN					
	14	LAS TOMAS DE DATOS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE IDENTIFICADAS					
CPD	15	EL CPD SE ENCUENTRA EN SALA INDEPENDIENTE Y SU ACCESO ES RESTRINGIDO					
	16	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN EL CPD FUNCIONA CORRECTAMENTE					
	17	EL CPD DISPONE DE SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro B	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
RED DE DATOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HJC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	**-IF-DTA-01.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	17/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER RUIZ GARCIA	**HORA:**	

ZONA REVISADA: CPD y Repetidor satélite 1

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
CABLEADO Y CANALIZACIONES	1	LAS CANALIZACIONES DE LA RED DE DATOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO					
	2	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES DE DATOS SON ADECUADAS					
	3	NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CONDUCTORES EN EL INTERIOR DE LAS CANALIZACIONES SIN EMPLEAR ALGÚN TIPO DE HERRAMIENTAS					
	4	EL CABLEADO DE LA INSTALACIÓN SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y NO SE OBSERVAN RETORCIMIENTOS O PELADURAS EN LAS CUBIERTAS DE LOS MISMOS					
	5	EL CABLEADO ACCEDE DE FORMA ORDENADA AL INTERIOR DE LOS RACK					
RACKS 11:12	6	LOS RACK SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	X		X		
	7	LOS RACK SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	8	LOS RACK SE ENCUENTRAN BIEN IDENTIFICADOS	X		X		
	9	LAS CONEXIONES A LOS DISTINTOS ELEMENTOS ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADAS	X		X		
	10	ESTÁN CORRECTAMENTE CRIMPADOS LOS CABLES DENTRO DEL RACK	X		X		
	11	LOS RACK SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PERSONAL AJENO A LA INSTALACIÓN	X		X		
TOMAS DE DATOS	12	LAS TOMAS DE DATOS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
	13	LAS TOMAS DE DATOS PERMITEN UNA FACIL CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN					
	14	LAS TOMAS DE DATOS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE IDENTIFICADAS					
CPD 11:08	15	EL CPD SE ENCUENTRA EN SALA INDEPENDIENTE Y SU ACCESO ES RESTRINGIDO	X		X		
	16	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN EL CPD FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	17	EL CPD DISPONE DE SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro A.	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
RED DE DATOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	**COD. PARTE:**	-IF-DTA-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alés Cruz	**FECHA:**	17/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER RUIZ GARCIA	**HORA:**	11:13

ZONA REVISADA: Repartidor satélites

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
CABLEADO Y CANALIZACIONES	1	LAS CANALIZACIONES DE LA RED DE DATOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO					
	2	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES DE DATOS SON ADECUADAS					
	3	NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CONDUCTORES EN EL INTERIOR DE LAS CANALIZACIONES SIN EMPLEAR ALGÚN TIPO DE HERRAMIENTAS					
	4	EL CABLEADO DE LA INSTALACIÓN SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y NO SE OBSERVAN RETORCIMIENTOS O PELADURAS EN LAS CUBIERTAS DE LOS MISMOS					
	5	EL CABLEADO ACCEDE DE FORMA ORDENADA AL INTERIOR DE LOS RACK					
RACKS	6	LOS RACK SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	X		X		
	7	LOS RACK SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	8	LOS RACK SE ENCUENTRAN BIEN IDENTIFICADOS	X		X		
	9	LAS CONEXIONES A LOS DISTINTOS ELEMENTOS ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADAS	X		X		
	10	ESTÁN CORRECTAMENTE CRIMPADOS LOS CABLES DENTRO DEL RACK	X		X		
	11	LOS RACK SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PERSONAL AJENO A LA INSTALACIÓN	X		X		
TOMAS DE DATOS	12	LAS TOMAS DE DATOS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
	13	LAS TOMAS DE DATOS PERMITEN UNA FACIL CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN					
	14	LAS TOMAS DE DATOS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE IDENTIFICADAS					
CPD	15	EL CPD SE ENCUENTRA EN SALA INDEPENDIENTE Y SU ACCESO ES RESTRINGIDO					
	16	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN EL CPD FUNCIONA CORRECTAMENTE					
	17	EL CPD DISPONE DE SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
RED DE DATOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HJC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-DTA-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alegre	**FECHA:**	17/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER RUIZ GARCIA	**HORA:**	11:17

ZONA REVISADA: Repartidor Satélite 3

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
CABLEADO Y CANALIZACIONES	1	LAS CANALIZACIONES DE LA RED DE DATOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO					
	2	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES DE DATOS SON ADECUADAS					
	3	NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CONDUCTORES EN EL INTERIOR DE LAS CANALIZACIONES SIN EMPLEAR ALGÚN TIPO DE HERRAMIENTAS					
	4	EL CABLEADO DE LA INSTALACIÓN SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y NO SE OBSERVAN RETORCIMIENTOS O PELADURAS EN LAS CUBIERTAS DE LOS MISMOS					
	5	EL CABLEADO ACCEDE DE FORMA ORDENADA AL INTERIOR DE LOS RACK					
RACKS	6	LOS RACK SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	X		X		
	7	LOS RACK SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	8	LOS RACK SE ENCUENTRAN BIEN IDENTIFICADOS	X		X		
	9	LAS CONEXIONES A LOS DISTINTOS ELEMENTOS ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADAS	X		X		
	10	ESTÁN CORRECTAMENTE CRIMPADOS LOS CABLES DENTRO DEL RACK	X		X		
	11	LOS RACK SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PERSONAL AJENO A LA INSTALACIÓN	X		X		
TOMAS DE DATOS	12	LAS TOMAS DE DATOS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
	13	LAS TOMAS DE DATOS PERMITEN UNA FACIL CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN					
	14	LAS TOMAS DE DATOS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE IDENTIFICADAS					
CPD	15	EL CPD SE ENCUENTRA EN SALA INDEPENDIENTE Y SU ACCESO ES RESTRINGIDO					
	16	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN EL CPD FUNCIONA CORRECTAMENTE					
	17	EL CPD DISPONE DE SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro Alegre	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
RED DE DATOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:	Hospital de Pedro Alegre HIC Perla S.A.	**COD. PARTE:**	**-IF-DTA-01.01**
INSPECTOR:		**FECHA:**	17/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER RUIZ GARCIA	**HORA:**	11:20

ZONA REVISADA: R. Secilite 4

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
CABLEADO Y CANALIZACIONES	1	LAS CANALIZACIONES DE LA RED DE DATOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO					
	2	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES DE DATOS SON ADECUADAS					
	3	NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CONDUCTORES EN EL INTERIOR DE LAS CANALIZACIONES SIN EMPLEAR ALGÚN TIPO DE HERRAMIENTAS					
	4	EL CABLEADO DE LA INSTALACIÓN SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y NO SE OBSERVAN RETORCIMIENTOS O PELADURAS EN LAS CUBIERTAS DE LOS MISMOS					
	5	EL CABLEADO ACCEDE DE FORMA ORDENADA AL INTERIOR DE LOS RACK					
RACKS	6	LOS RACK SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	✓		X		
	7	LOS RACK SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	8	LOS RACK SE ENCUENTRAN BIEN IDENTIFICADOS	X		X		
	9	LAS CONEXIONES A LOS DISTINTOS ELEMENTOS ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADAS	X		X		
	10	ESTÁN CORRECTAMENTE CRIMPADOS LOS CABLES DENTRO DEL RACK	X		X		
	11	LOS RACK SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PERSONAL AJENO A LA INSTALACIÓN	X		X		
TOMAS DE DATOS	12	LAS TOMAS DE DATOS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
	13	LAS TOMAS DE DATOS PERMITEN UNA FACIL CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN					
	14	LAS TOMAS DE DATOS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE IDENTIFICADAS					
CPD	15	EL CPD SE ENCUENTRA EN SALA INDEPENDIENTE Y SU ACCESO ES RESTRINGIDO					
	16	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN EL CPD FUNCIONA CORRECTAMENTE					
	17	EL CPD DISPONE DE SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
RED DE DATOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Pardo S.A.	**COD. PARTE:**	**-IF-DTA-01.01**
INSPECTOR:	Pedro Alcaraz	**FECHA:**	17/1/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	11:25

ZONA REVISADA: Repartidor Satélites 5

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
CABLEADO Y CANALIZACIONES	1	LAS CANALIZACIONES DE LA RED DE DATOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO					
	2	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES DE DATOS SON ADECUADAS					
	3	NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CONDUCTORES EN EL INTERIOR DE LAS CANALIZACIONES SIN EMPLEAR ALGÚN TIPO DE HERRAMIENTAS					
	4	EL CABLEADO DE LA INSTALACIÓN SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y NO SE OBSERVAN RETORCIMIENTOS O PELADURAS EN LAS CUBIERTAS DE LOS MISMOS					
	5	EL CABLEADO ACCEDE DE FORMA ORDENADA AL INTERIOR DE LOS RACK					
RACKS	6	LOS RACK SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	X		X		
	7	LOS RACK SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	8	LOS RACK SE ENCUENTRAN BIEN IDENTIFICADOS	X		X		
	9	LAS CONEXIONES A LOS DISTINTOS ELEMENTOS ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADAS	X		X		
	10	ESTÁN CORRECTAMENTE CRIMPADOS LOS CABLES DENTRO DEL RACK	X		X		
	11	LOS RACK SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PERSONAL AJENO A LA INSTALACIÓN	X		X		
TOMAS DE DATOS	12	LAS TOMAS DE DATOS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
	13	LAS TOMAS DE DATOS PERMITEN UNA FACIL CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN					
	14	LAS TOMAS DE DATOS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE IDENTIFICADAS					
CPD	15	EL CPD SE ENCUENTRA EN SALA INDEPENDIENTE Y SU ACCESO ES RESTRINGIDO					
	16	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN EL CPD FUNCIONA CORRECTAMENTE					
	17	EL CPD DISPONE DE SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
RED DE DATOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Ponte S.A.	**COD. PARTE:**	**-IF-DTA-01.01**
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	17/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER RUIZ GARCIA	**HORA:**	14:30

ZONA REVISADA: Repartidor satélite 6

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
CABLEADO Y CANALIZACIONES	1	LAS CANALIZACIONES DE LA RED DE DATOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	2	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES DE DATOS SON ADECUADAS	X		X		
	3	NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CONDUCTORES EN EL INTERIOR DE LAS CANALIZACIONES SIN EMPLEAR ALGÚN TIPO DE HERRAMIENTAS	X		X		
	4	EL CABLEADO DE LA INSTALACIÓN SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y NO SE OBSERVAN RETORCIMIENTOS O PELADURAS EN LAS CUBIERTAS DE LOS MISMOS	X		X		
	5	EL CABLEADO ACCEDE DE FORMA ORDENADA AL INTERIOR DE LOS RACK	X		X		
RACKS	6	LOS RACK SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	X		X		
	7	LOS RACK SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	8	LOS RACK SE ENCUENTRAN BIEN IDENTIFICADOS	X		X		
	9	LAS CONEXIONES A LOS DISTINTOS ELEMENTOS ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADAS	X		X		
	10	ESTÁN CORRECTAMENTE CRIMPADOS LOS CABLES DENTRO DEL RACK	X		X		
	11	LOS RACK SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PERSONAL AJENO A LA INSTALACIÓN	X		X		
TOMAS DE DATOS	12	LAS TOMAS DE DATOS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	13	LAS TOMAS DE DATOS PERMITEN UNA FACIL CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN	X		X		
	14	LAS TOMAS DE DATOS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE IDENTIFICADAS	X		X		
CPD	15	EL CPD SE ENCUENTRA EN SALA INDEPENDIENTE Y SU ACCESO ES RESTRINGIDO					
	16	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN EL CPD FUNCIONA CORRECTAMENTE					
	17	EL CPD DISPONE DE SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
RED DE DATOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-DTA-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alaseré	**FECHA:**	17/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JAVIER RUIZ GARCIA	**HORA:**	11:40

ZONA REVISADA: Edf. Industrial

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
CABLEADO Y CANALIZACIONES	1	LAS CANALIZACIONES DE LA RED DE DATOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO					
	2	LA SUPORTACIÓN DE LAS CANALIZACIONES DE DATOS SON ADECUADAS					
	3	NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CONDUCTORES EN EL INTERIOR DE LAS CANALIZACIONES SIN EMPLEAR ALGÚN TIPO DE HERRAMIENTAS					
	4	EL CABLEADO DE LA INSTALACIÓN SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y NO SE OBSERVAN RETORCIMIENTOS O PELADURAS EN LAS CUBIERTAS DE LOS MISMOS					
	5	EL CABLEADO ACCEDE DE FORMA ORDENADA AL INTERIOR DE LOS RACK					
RACKS	6	LOS RACK SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PÚBLICO GENERAL	X		X		
	7	LOS RACK SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	8	LOS RACK SE ENCUENTRAN BIEN IDENTIFICADOS	X		X		
	9	LAS CONEXIONES A LOS DISTINTOS ELEMENTOS ESTÁN CORRECTAMENTE EJECUTADAS	X		X		
	10	ESTÁN CORRECTAMENTE CRIMPADOS LOS CABLES DENTRO DEL RACK	X		X		
	11	LOS RACK SE ENCUENTRAN FUERA DEL ALCANCE DEL PERSONAL AJENO A LA INSTALACIÓN	X		X		
TOMAS DE DATOS	12	LAS TOMAS DE DATOS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO					
	13	LAS TOMAS DE DATOS PERMITEN UNA FACIL CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN					
	14	LAS TOMAS DE DATOS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE IDENTIFICADAS					
CPD	15	EL CPD SE ENCUENTRA EN SALA INDEPENDIENTE Y SU ACCESO ES RESTRINGIDO					
	16	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN EL CPD FUNCIONA CORRECTAMENTE					
	17	EL CPD DISPONE DE SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS					

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
TRANSPORTE NEUMÁTICO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-TRN-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alasérué	**FECHA:**	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JUAN JOSÉ ADÁN SÁNCHEZ	**HORA:**	17:48

ZONA REVISADA: Urgencias Central 1

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO	X				
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X				
	3	NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE O TRAMOS DE CONDUCTO EN MAL ESTADO	X				
	4	LAS CENTRALES DE ENVÍO ESTÁN EN CORRECTO ESTADO Y OPERATIVAS	X				
	5	EL ENVÍO DE BALAS DE ENVÍO SE REALIZA SIN INCIDENCIAS	X				
	6	EL SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO NO GENERA RUIDOS EXTRAÑOS	X				

OBSERVACIONES

Falta placa de protección.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
TRANSPORTE NEUMÁTICO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	**COD. PARTE:**	-IF-TRN-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JUAN JOSE ADAN SANCHEZ	**HORA:**	17:41

ZONA REVISADA: UCI

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	3	NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE O TRAMOS DE CONDUCTO EN MAL ESTADO	X		X		
	4	LAS CENTRALES DE ENVÍO ESTÁN EN CORRECTO ESTADO Y OPERATIVAS	X		X		
	5	EL ENVÍO DE BALAS DE ENVÍO SE REALIZA SIN INCIDENCIAS	X		X		
	6	EL SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO NO GENERA RUIDOS EXTRAÑOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
TRANSPORTE NEUMÁTICO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-TRN-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	21/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	EDUARDO PARRA CAMACHO	**HORA:**	12:30

ZONA REVISADA: Planta 1 - Bloque B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	3	NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE O TRAMOS DE CONDUCTO EN MAL ESTADO	X		X		
	4	LAS CENTRALES DE ENVÍO ESTÁN EN CORRECTO ESTADO Y OPERATIVAS	X		X		
	5	EL ENVÍO DE BALAS DE ENVÍO SE REALIZA SIN INCIDENCIAS	X		X		
	6	EL SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO NO GENERA RUIDOS EXTRAÑOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
TRANSPORTE NEUMÁTICO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Porla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-TRN-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alcaraz	**FECHA:**	21/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	EDUARDO PARRA CAMACHO	**HORA:**	12:30

ZONA REVISADA: Maternidad

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	3	NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE O TRAMOS DE CONDUCTO EN MAL ESTADO	X		X		
	4	LAS CENTRALES DE ENVÍO ESTÁN EN CORRECTO ESTADO Y OPERATIVAS	X		X		
	5	EL ENVÍO DE BALAS DE ENVÍO SE REALIZA SIN INCIDENCIAS	X		X		
	6	EL SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO NO GENERA RUIDOS EXTRAÑOS	X		X		

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
TRANSPORTE NEUMÁTICO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Perla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-TRN-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alas Cruz	**FECHA:**	21/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	EDUARDO PARRA CAMACHO	**HORA:**	12:25

ZONA REVISADA: Pediatría

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	3	NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE O TRAMOS DE CONDUCTO EN MAL ESTADO	X		X		
	4	LAS CENTRALES DE ENVÍO ESTÁN EN CORRECTO ESTADO Y OPERATIVAS	X		X		
	5	EL ENVÍO DE BALAS DE ENVÍO SE REALIZA SIN INCIDENCIAS	X		X		
	6	EL SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO NO GENERA RUIDOS EXTRAÑOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
TRANSPORTE NEUMÁTICO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-TRN-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	21/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	EDUARDO PARRA CAMACHO	**HORA:**	12:12

ZONA REVISADA: Extracciones

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	3	NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE O TRAMOS DE CONDUCTO EN MAL ESTADO	X		X		
	4	LAS CENTRALES DE ENVÍO ESTÁN EN CORRECTO ESTADO Y OPERATIVAS	X		X		
	5	EL ENVÍO DE BALAS DE ENVÍO SE REALIZA SIN INCIDENCIAS	X		X		
	6	EL SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO NO GENERA RUIDOS EXTRAÑOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
TRANSPORTE NEUMÁTICO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-TRN-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JUAN JOSÉ ADAN SÁNCHEZ	**HORA:**	17:30

ZONA REVISADA: Laboratorio

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	3	NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE O TRAMOS DE CONDUCTO EN MAL ESTADO	X		X		
	4	LAS CENTRALES DE ENVÍO ESTÁN EN CORRECTO ESTADO Y OPERATIVAS	X		X		
	5	EL ENVÍO DE BALAS DE ENVÍO SE REALIZA SIN INCIDENCIAS	X		X		
	6	EL SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO NO GENERA RUIDOS EXTRAÑOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
TRANSPORTE NEUMÁTICO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-TRN-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alascué	**FECHA:**	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JUAN JOSÉ ADÁN SÁNCHEZ	**HORA:**	18:02

ZONA REVISADA: FARMACIA

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	3	NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE O TRAMOS DE CONDUCTO EN MAL ESTADO	X		X		
	4	LAS CENTRALES DE ENVÍO ESTÁN EN CORRECTO ESTADO Y OPERATIVAS	X		X		
	5	EL ENVÍO DE BALAS DE ENVÍO SE REALIZA SIN INCIDENCIAS	X		X		
	6	EL SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO NO GENERA RUIDOS EXTRAÑOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
TRANSPORTE NEUMÁTICO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	MIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-TRN-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alaiz Gruet	**FECHA:**	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JUAN JOSÉ ADÁN SÁNCHEZ	**HORA:**	17:44

ZONA REVISADA: Urgencias Central 2.

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	3	NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE O TRAMOS DE CONDUCTO EN MAL ESTADO	X		X		
	4	LAS CENTRALES DE ENVÍO ESTÁN EN CORRECTO ESTADO Y OPERATIVAS	X		X		
	5	EL ENVÍO DE BALAS DE ENVÍO SE REALIZA SIN INCIDENCIAS	X		X		
	6	EL SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO NO GENERA RUIDOS EXTRAÑOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
TRANSPORTE NEUMÁTICO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-TRN-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alas Cruz	**FECHA:**	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JUAN JOSÉ ASÁN SÁNCHEZ	**HORA:**	17:33

ZONA REVISADA: Central enfermera 2B

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	LA CENTRAL DE IMPULSIÓN/ABSORCIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	3	NO SE APRECIAN FUGAS DE AIRE O TRAMOS DE CONDUCTO EN MAL ESTADO	X		X		
	4	LAS CENTRALES DE ENVÍO ESTÁN EN CORRECTO ESTADO Y OPERATIVAS	X		X		
	5	EL ENVÍO DE BALAS DE ENVÍO SE REALIZA SIN INCIDENCIAS	X		X		
	6	EL SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO NO GENERA RUIDOS EXTRAÑOS	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
ELEMENTOS ELEVADORES

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Perla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-ASC-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alcuéne	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Ascensor 8

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO GENERAL DEL APARATO ELEVADOR (A.E.)ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	DURANTE SU FUNCIONAMIENTO EL A.E. NO EMITE RUIDOS EXTRAÑOS O EXCESIVOS	X		X		
	3	LOS DISPLAYS DEL INTERIOR DE A.E. INDICAN CORRECTAMENTE LA PLANTA O DIRECCIÓN DE LA CABINA	X		X		
	4	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	5	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES ACTUAN SOBRE LOS A.E. DE FORMA CORRECTA	X		X		
	6	LA ILUMINACIÓN DE LA CABINA FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	7	EL BOTON DE EMERGENCIA GENERA UNA SEÑAL ACÚSTICA PERCEPTIBLE DESDE EL EXTERIOR	X			X	
	8	EL BOTÓN DE APERTURA Y CIERRE DEL INTERIOR DE LA CABINA ACTUA ADECUADAMENTE SOBRE LA PUERTA	X		X		
	9	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL CORTAR LA BARRERA INFRARROJA	X		X		
	10	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL ENCONTRAR UN OBSTACULO	X		X		

OBSERVACIONES

No emite sonido. Arreglado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
ELEMENTOS ELEVADORES

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla SA.	**COD. PARTE:**	-IF-ASC-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Ascensor 20

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO GENERAL DEL APARATO ELEVADOR (A.E.)ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	DURANTE SU FUNCIONAMIENTO EL A.E. NO EMITE RUIDOS EXTRAÑOS O EXCESIVOS	X		X		
	3	LOS DISPLAYS DEL INTERIOR DE A.E. INDICAN CORRECTAMENTE LA PLANTA O DIRECCIÓN DE LA CABINA	X		X		
	4	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	5	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES ACTUAN SOBRE LOS A.E. DE FORMA CORRECTA	X		X		
	6	LA ILUMINACIÓN DE LA CABINA FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	7	EL BOTON DE EMERGENCIA GENERA UNA SEÑAL ACÚSTICA PERCEPTIBLE DESDE EL EXTERIOR	X			X	*
	8	EL BOTÓN DE APERTURA Y CIERRE DEL INTERIOR DE LA CABINA ACTUA ADECUADAMENTE SOBRE LA PUERTA	X		X		
	9	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL CORTAR LA BARRERA INFRARROJA	X		X		
	10	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL ENCONTRAR UN OBSTACULO	X		X		

OBSERVACIONES

* No emite señal acustica

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
ELEMENTOS ELEVADORES

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HJC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-ASC-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alesteve	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Ascensor 22

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO GENERAL DEL APARATO ELEVADOR (A.E.)ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	DURANTE SU FUNCIONAMIENTO EL A.E. NO EMITE RUIDOS EXTRAÑOS O EXCESIVOS	X		X		
	3	LOS DISPLAYS DEL INTERIOR DE A.E. INDICAN CORRECTAMENTE LA PLANTA O DIRECCIÓN DE LA CABINA	X		X		
	4	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	5	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES ACTUAN SOBRE LOS A.E. DE FORMA CORRECTA	X		X		
	6	LA ILUMINACIÓN DE LA CABINA FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	7	EL BOTON DE EMERGENCIA GENERA UNA SEÑAL ACÚSTICA PERCEPTIBLE DESDE EL EXTERIOR	X			X	*
	8	EL BOTÓN DE APERTURA Y CIERRE DEL INTERIOR DE LA CABINA ACTUA ADECUADAMENTE SOBRE LA PUERTA	X		X		
	9	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL CORTAR LA BARRERA INFRARROJA	X		X		
	10	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL ENCONTRAR UN OBSTACULO	X		X		

OBSERVACIONES

Falta un embellecedor.

* No emite sonido. Arreglado

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
ELEMENTOS ELEVADORES

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla HIC S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-ASC-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alas Ervé	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Ascensor 25

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO GENERAL DEL APARATO ELEVADOR (A.E.)ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	DURANTE SU FUNCIONAMIENTO EL A.E. NO EMITE RUIDOS EXTRAÑOS O EXCESIVOS	X		X		
	3	LOS DISPLAYS DEL INTERIOR DE A.E. INDICAN CORRECTAMENTE LA PLANTA O DIRECCIÓN DE LA CABINA	X		X		
	4	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	5	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES ACTUAN SOBRE LOS A.E. DE FORMA CORRECTA	X		X		
	6	LA ILUMINACIÓN DE LA CABINA FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	7	EL BOTON DE EMERGENCIA GENERA UNA SEÑAL ACÚSTICA PERCEPTIBLE DESDE EL EXTERIOR	X			X	
	8	EL BOTÓN DE APERTURA Y CIERRE DEL INTERIOR DE LA CABINA ACTUA ADECUADAMENTE SOBRE LA PUERTA	X		X		
	9	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL CORTAR LA BARRERA INFRARROJA	X		X		
	10	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL ENCONTRAR UN OBSTACULO	X		X		

OBSERVACIONES

No emite sonido.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
ELEMENTOS ELEVADORES

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-ASC-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Ascensor 24

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO GENERAL DEL APARATO ELEVADOR (A.E.)ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	DURANTE SU FUNCIONAMIENTO EL A.E. NO EMITE RUIDOS EXTRAÑOS O EXCESIVOS	X		X		
	3	LOS DISPLAYS DEL INTERIOR DE A.E. INDICAN CORRECTAMENTE LA PLANTA O DIRECCIÓN DE LA CABINA	X		X		
	4	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	5	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES ACTUAN SOBRE LOS A.E. DE FORMA CORRECTA	X		X		
	6	LA ILUMINACIÓN DE LA CABINA FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	7	EL BOTON DE EMERGENCIA GENERA UNA SEÑAL ACÚSTICA PERCEPTIBLE DESDE EL EXTERIOR	X		X		
	8	EL BOTÓN DE APERTURA Y CIERRE DEL INTERIOR DE LA CABINA ACTUA ADECUADAMENTE SOBRE LA PUERTA	X		X		
	9	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL CORTAR LA BARRERA INFRARROJA	X		X		
	10	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL ENCONTRAR UN OBSTACULO	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro A	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
ELEMENTOS ELEVADORES

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HJC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-ASC-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alas Ervé	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Ascensor 21

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO GENERAL DEL APARATO ELEVADOR (A.E.)ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	DURANTE SU FUNCIONAMIENTO EL A.E. NO EMITE RUIDOS EXTRAÑOS O EXCESIVOS	X		X		
	3	LOS DISPLAYS DEL INTERIOR DE A.E. INDICAN CORRECTAMENTE LA PLANTA O DIRECCIÓN DE LA CABINA	X		X		
	4	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	5	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES ACTUAN SOBRE LOS A.E. DE FORMA CORRECTA	X		X		
	6	LA ILUMINACIÓN DE LA CABINA FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	7	EL BOTON DE EMERGENCIA GENERA UNA SEÑAL ACÚSTICA PERCEPTIBLE DESDE EL EXTERIOR	X		X		
	8	EL BOTÓN DE APERTURA Y CIERRE DEL INTERIOR DE LA CABINA ACTUA ADECUADAMENTE SOBRE LA PUERTA	X		X		
	9	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL CORTAR LA BARRERA INFRARROJA	X		X		
	10	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL ENCONTRAR UN OBSTACULO	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
ELEMENTOS ELEVADORES

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Perla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-ASC-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastruey	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Ascensor 5

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO GENERAL DEL APARATO ELEVADOR (A.E.)ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	DURANTE SU FUNCIONAMIENTO EL A.E. NO EMITE RUIDOS EXTRAÑOS O EXCESIVOS	X		X		
	3	LOS DISPLAYS DEL INTERIOR DE A.E. INDICAN CORRECTAMENTE LA PLANTA O DIRECCIÓN DE LA CABINA	X		X		
	4	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	5	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES ACTUAN SOBRE LOS A.E. DE FORMA CORRECTA	X		X		
	6	LA ILUMINACIÓN DE LA CABINA FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	7	EL BOTON DE EMERGENCIA GENERA UNA SEÑAL ACÚSTICA PERCEPTIBLE DESDE EL EXTERIOR	X		X		
	8	EL BOTÓN DE APERTURA Y CIERRE DEL INTERIOR DE LA CABINA ACTUA ADECUADAMENTE SOBRE LA PUERTA	X		X		
	9	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL CORTAR LA BARRERA INFRARROJA	X		X		
	10	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL ENCONTRAR UN OBSTACULO	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
ELEMENTOS ELEVADORES

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla HIC S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-ASC-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alesève	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Ascensor 12

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO GENERAL DEL APARATO ELEVADOR (A.E.)ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	DURANTE SU FUNCIONAMIENTO EL A.E. NO EMITE RUIDOS EXTRAÑOS O EXCESIVOS	X		X		
	3	LOS DISPLAYS DEL INTERIOR DE A.E. INDICAN CORRECTAMENTE LA PLANTA O DIRECCIÓN DE LA CABINA	X		X		
	4	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	5	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES ACTUAN SOBRE LOS A.E. DE FORMA CORRECTA	X		X		
	6	LA ILUMINACIÓN DE LA CABINA FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	7	EL BOTON DE EMERGENCIA GENERA UNA SEÑAL ACÚSTICA PERCEPTIBLE DESDE EL EXTERIOR	X		X		
	8	EL BOTÓN DE APERTURA Y CIERRE DEL INTERIOR DE LA CABINA ACTUA ADECUADAMENTE SOBRE LA PUERTA	X		X		
	9	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL CORTAR LA BARRERA INFRARROJA	X		X		
	10	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL ENCONTRAR UN OBSTACULO	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
ELEMENTOS ELEVADORES

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Perla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-ASC-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Ascensor 19

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO GENERAL DEL APARATO ELEVADOR (A.E.)ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	DURANTE SU FUNCIONAMIENTO EL A.E. NO EMITE RUIDOS EXTRAÑOS O EXCESIVOS	X		X		
	3	LOS DISPLAYS DEL INTERIOR DE A.E. INDICAN CORRECTAMENTE LA PLANTA O DIRECCIÓN DE LA CABINA	X		X		
	4	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	5	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES ACTUAN SOBRE LOS A.E. DE FORMA CORRECTA	X		X		
	6	LA ILUMINACIÓN DE LA CABINA FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	7	EL BOTON DE EMERGENCIA GENERA UNA SEÑAL ACÚSTICA PERCEPTIBLE DESDE EL EXTERIOR	X		X		
	8	EL BOTÓN DE APERTURA Y CIERRE DEL INTERIOR DE LA CABINA ACTUA ADECUADAMENTE SOBRE LA PUERTA	X		X		
	9	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL CORTAR LA BARRERA INFRARROJA	X		X		
	10	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL ENCONTRAR UN OBSTACULO	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro A	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
ELEMENTOS ELEVADORES

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Perla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-ASC-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA: Ascensor 27 edificio Industrial

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ESTADO GENERAL	1	EL ESTADO GENERAL DEL APARATO ELEVADOR (A.E.)ES CORRECTO	X		X		
FUNCIONAMIENTO GENERAL	2	DURANTE SU FUNCIONAMIENTO EL A.E. NO EMITE RUIDOS EXTRAÑOS O EXCESIVOS	X		X		
	3	LOS DISPLAYS DEL INTERIOR DE A.E. INDICAN CORRECTAMENTE LA PLANTA O DIRECCIÓN DE LA CABINA	X		X		
	4	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	5	LAS BOTONERAS INTERIORES Y EXTERIORES ACTUAN SOBRE LOS A.E. DE FORMA CORRECTA	X		X		
	6	LA ILUMINACIÓN DE LA CABINA FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	7	EL BOTON DE EMERGENCIA GENERA UNA SEÑAL ACÚSTICA PERCEPTIBLE DESDE EL EXTERIOR	X		X		
	8	EL BOTÓN DE APERTURA Y CIERRE DEL INTERIOR DE LA CABINA ACTUA ADECUADAMENTE SOBRE LA PUERTA	X		X		
	9	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL CORTAR LA BARRERA INFRARROJA	X		X		
	10	EL CIERRE DE PUERTAS SE DETIENE AL ENCONTRAR UN OBSTACULO	X		X		

OBSERVACIONES

Precisa limpieza

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro A	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
GASES MEDICINALES

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-GM-01-01
INSPECTOR:	Pedro Alas Ervé	**FECHA:**	21/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	EDUARDO PARRA CAMACHO	**HORA:**	13:00

ZONA REVISADA: Sala de gases y diversos centrales

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
TUBERÍAS	1	LAS TUBERÍAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	2	LA SUPORTACIÓN DE LAS TUBERÍAS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO	X		X		
	3	NO SE OBSERVAN FUGAS U OXIDACIÓNES EN LAS TUBERÍAS	X		X		
	4	LAS TUBERÍAS SE ENCUENTRAN BIEN IDENTIFICADAS, TANTO EL TIPO DE GAS COMO LA DIRECCIÓN DEL MISMO	X		X		
VALVULERÍA, GRIFERÍA Y EQUILIBRADO	5	LAS VÁLVULAS DE CORTE PERMITEN UNA CORRECTA MANIOBRABILIDAD	X		X		
	6	EN LAS DIFERENTES PLANTAS SE ENCUENTRAN LAS CENTRALES DE ALARMA DE ZONA	X		X		
	7	LAS CENTRALES DE ZONA GENERAN ALARMAS EN CASO DE INCIDENCIA EN LA PRESIÓN DE LOS GASES	X		X		
DEPÓSITOS Y GRUPOS COMPRESORES	8	EXISTEN RAMPAS DE BOMBONAS DE GAS PREPARADAS PARA ATENDER EL SERVICIO AUTOMÁTICAMENTE EN CASO DE FALLO DE LOS DEPÓSITOS PRINCIPALES	X		X		
	9	LOS DEPÓSITOS DE GAS EMITEN ALARMAS AUTOMÁTICAS EN CASO DE QUE SUS RESERVAS ESTÉN POR DEBAJO DE UN VALOR LÍMITE	X		X		
	10	LAS SALAS DE GASES SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y BIEN VENTILADAS	X		X		
	11	LOS SISTEMAS DE COMPRESIÓN SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO Y NO EMITEN RUIDOS EXTRAÑOS	X		X		
	12	EL ESTADO DE LOS FILTROS ES ADECUADO Y SE REALIZA SU SUSTITUCIÓN PERIÓDICAMENTE		X			*
	13	TODAS LAS SALAS VISITADAS DISPONEN DE UN SERVICIO CORRECTO DE GAS	X		X		

OBSERVACIONES

*: No se ha podido ver los filtros.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-CMB-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	21/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	EDUARDO PARRA CAMACHO	**HORA:**	13:30

ZONA REVISADA:			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
DEPÓSITOS	1	LOS DISTINTOS DEPÓSITOS SE ENCUENTRAN EN CORRECTO ESTADO		X			*3
	2	LOS DEPÓSITOS NO PRESENTAN FUGAS, GRIETAS O DEFORMACIONES		X			*3
	3	LOS DEPÓSITOS SE ENCUENTRAN OPERATIVOS	X		X		
	4	LOS DEPÓSITOS SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DE UNA ZONA RESTRINGIDA	X		X		
	5	LOS DEPÓSITOS DISPONEN DE LA CARTELERÍA DE ADVERTENCIAS NECESARIA Y EXIGIDA POR LA NORMATIVA					
SISTEMA DE BOMBEO	6	EL SISTEMA DE BOMBEO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO Y ESTÁ OPERATIVO AL 100%		X			*1
	7	EL SISTEMA DE BOMBEO FUNCIONA AUTOMÁTICAMENTE ANTE UN DESCENSO DEL NIVEL DE GASOLEO O DEMANDA DE ALGÚN RECEPTOR		X			*1
	8	LAS BOMBAS NO EMITEN RUIDOS EXTRAÑOS Y EN CASO DE SER DE P>1CV DISPONEN DE ELEMENTOS QUE LIMITAN LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES AL RESTO DE LA INSTALACIÓN		X			*1
TUBERÍAS	9	LAS TUBERÍAS DE GASOLEO SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE SUPORTADAS	X		X		
	10	LAS UNIONES DE LAS TUBERÍAS SON CORRECTAS	X		X		
SEGURIDAD	11	NO SE APRECIAN FUGAS DE GASOIL EN NINGÚN PUNTO DE LA INSTALACIÓN	X		X		
	12	SE DISPONE DE INDICADORES DEL NIVEL EN LOS DISTINTOS DEPÓSITOS	X		X		
	13	LA ALIMENTACIÓN A LA SALA DE CALDERAS SE DETIENE ANTE UNA ALARMA DE INCENDIOS O AL ACTUAR SOBRE LA SETA DE EMERGENCIA	X		X		
	14	EXISTEN DETECTORES DE FUGAS DE COMBUSTIBLE EN CIERTOS PUNTOS DE LA INSTALACIÓN	X			X	*2
	15	LOS DEPÓSITOS ESTÁN CORRECTAMENTE CONECTADOS A TIERRA	X	X	X		

OBSERVACIONES

*1: No se ha podido observar el funcionamiento de las bombas puesto que al estar el depósito con un nivel de gasoleo correcto, las bombas no responden ni a la orden manual.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
GESTIÓN DE INSTALACIONES

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-BMS-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alasérve	**FECHA:**	21/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	EDUARDO PARRA CAMACHO	**HORA:**	14:00

ZONA REVISADA:			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
VISUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS CONTROLADOS	1	EL SISTEMA PERMITE UNA VISUALIZACIÓN CLARA DE LOS ELEMENTOS CONTROLADOS DE LA INSTALACIÓN	X		X		
	2	EL SISTEMA SE REFRESCA CON UNA PERIODICIDAD ADECUADA	X		X		
	3	EL SISTEMA PERMITE LA VISUALIZACIÓN DE DATOS HISTÓRICOS DE LOS PARÁMETROS		X			
	4	LOS DATOS MOSTRADOS POR EL SISTEMA SE CORRESPONDEN CON LOS PARÁMETROS REALES DE LAS INSTALACIONES	X		X		
ACCESOS AL SISTEMA	5	EL SISTEMA DISPONE DE DIFERENTES JERARQUÍAS DE ACCESO LAS CUALES PERMITEN MÁS O MENOS ACTUACIONES	X		X		
	6	EL SISTEMA SE PUEDE VISUALIZAR DE FORMA REMOTA		X			
ALARMAS	7	EL SISTEMA GENERA ALARMAS EN CASO DE FUNCIONAMIENTO ANÓMALO DE ALGÚN ELEMENTO	X		X		
	8	EL SISTEMA DISPONE DE UN HISTÓRICO DE ALARMAS VISUALIZABLE	X		X		
	9	EL SISTEMA PERMITE LA EXPORTACIÓN DE LOS DATOS PARA SU ENVÍO O USO FUERA DE LA APLICACIÓN	X		X		
FUNCIONAMIENTO	10	EL SISTEMA PERMITE UNA FÁCIL ACTUACIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN	X		X		
	11	EL SISTEMA GESTIONA DE FORMA CORRECTA Y SIN INCIDENCIAS LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
GESTIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-GEN-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alasgrué	**FECHA:**	21/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	EDUARDO PARRA CAMACHO	**HORA:**	14:00

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS CONTROLADOS	1	EL SISTEMA PERMITE UNA VISUALIZACIÓN CLARA DE LOS DATOS CONTROLADOS	X		X		
	2	EL SISTEMA SE REFRESCA CON UNA PERIODICIDAD ADECUADA	X		X		
	3	EL SISTEMA PERMITE LA VISUALIZACIÓN DE DATOS HISTÓRICOS DE LOS PARÁMETROS					
	4	LOS DATOS MOSTRADOS POR EL SISTEMA SE CORRESPONDEN CON LAS LECTURAS REALES DE LAS INSTALACIONES	X		X		
ACCESOS AL SISTEMA	5	EL SISTEMA DISPONE DE DIFERENTES JERARQUÍAS DE ACCESO LAS CUALES PERMITEN MÁS O MENOS LECTURAS	X		X		
	6	EL SISTEMA SE PUEDE VISUALIZAR DE FORMA REMOTA		X			
ALARMAS	7	EL SISTEMA GENERA ALARMAS EN CASO DE LECTURAS ANÓMALAS DE ALGUNA INSTALACIÓN	X		X		
	8	EL SISTEMA DISPONE DE UN HISTÓRICO DE ALARMAS VISUALIZABLE	X		X		
MANEJO DE LOS DATOS	9	EL SISTEMA PERMITE LA EXPORTACIÓN DE LOS DATOS PARA SU ENVÍO O USO FUERA DE LA APLICACIÓN	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro A	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-GMA-01-01
INSPECTOR:	Pedro Alas Cruz	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	1	EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL EXISTE Y ES COHERENTE TÉCNICA Y LEGALMENTE	X		X		
	2	LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIARIAS, MENSUALES Y ANUALES SE CORRESPONDEN CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL	X		X		
FUNCIONAMIENTO GMAO	3	EL GMAO ESTA IMPLANTADO Y PLANIFICA DE FORMA RACIONAL EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	X		X		
	4	EL GMAO EMITE DE FORMA PERIÓDICA LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR	X		X		
GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO	5	EL RESULTADO DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUEDAN REGISTRADAS	X		X		
	6	EXISTE UN HISTÓRICO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REALIZAR Y LOS TIEMPOS DE SUBSANACIÓN	X		X		
	7	LOS TIEMPOS DE REPARACIÓN DE LOS CORRECTIVOS SE ENCUENTRAN EN UN RANGO ACEPTABLE, EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD Y CRITICIDAD DEL AREA O ELEMENTO	X		X		
	8	LA GESTIÓN DE MATERIALES O ELEMENTOS A COMPRAR PARA SUBSANAR LOS CORRECTIVOS SE REALIZA DE FORMA RACIONAL	X		X		
	9	LA GESTIÓN DE MATERIALES O ELEMENTOS A COMPRAR PARA REALIZAR LAS TAREAS DEL M. PREVENTIVO SE REALIZA DE FORMA RACIONAL	X		X		
	10	LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS SE REALIZA DE FORMA RACIONAL Y LA MISMA MINIMIZA LOS TIEMPOS DE SUBSANACIÓN	X		X		
	11	LAS AVERÍAS URGENTES O MANIOBRAS URGENTES SE COMUNICAN DE FORMA ÁGIL Y SE SUBSANAN DE FORMA INMEDIATA	X		X		
	12	EXISTE UN REGISTRO DE LAS TAREAS DE M. PREVENTIVO Y DE M. CORRECTIVO VINCULADAS CON CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES	X		X		
	13	SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS HUMANOS DE FORMA RACIONAL PARA CUBRIR LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO	X		X		

OBSERVACIONES

Prisma 3 | SPS
Comunicación por correo
O correctivos detectados en los correctivos.

6 a 7 durante el día.

5 M
2 T
1 N

FONDO 1+1+1.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
QUIRÓFANOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-QRF-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrue	**FECHA:**	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JUAN JOSE ~~ADÁN~~ SÁNCHEZ	**HORA:**	15:00 - 17:00

ZONA REVISADA: Quirófano 1 CMI

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
SISTEMAS VARIOS	1	LA ILUMIANCIÓN DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	2	LOS DISTINTOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN PUESTOS A TIERRA	X		X		
	3	LAS CONEXIONES A TIERRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	4	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	5	LOS DISTINTOS DISPLAY DE LA SALA (Temperatura, nivel de aislamiento, etc) SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SU LECTURA SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
PROTECCIÓN ELÉCTRICA	6	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	7	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DISPONE DE CERRADURA QUE IMPIDE SU MANIPULACIÓN	X		X		
	8	EL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X	*1
	9	EL CUADRO DE PROTECCIÓN Y EL DEL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRAN LIMPIOS	X		X		
	10	LA CENTRAL DE AISLAMIENTO NO INDICA NINGUNA ALARMA	X		X		
	11	LA LECTURA EN EL DISPLAY DE LA CENTRAL DE AISLAMIENTO SE CORRESPONDE CON EL DISPLAY INTERIOR DE LA SALA	X		X		

OBSERVACIONES

*Visualizador con óxido

*1 Transformador cuadro sucio

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
QUIRÓFANOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Perla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-QRF-01.01
INSPECTOR:	Pedro Mestre	**FECHA:**	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JUANJOSÉ ADAN SÁNCHEZ	**HORA:**	15:00 - 17:00

ZONA REVISADA: Quirófano 2 CML

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
SISTEMAS VARIOS	1	LA ILUMIANCIÓN DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	2	LOS DISTINTOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN PUESTOS A TIERRA	X		X		
	3	LAS CONEXIONES A TIERRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	4	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	5	LOS DISTINTOS DISPLAY DE LA SALA (Temperatura, nivel de aislamiento, etc) SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SU LECTURA SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
PROTECCIÓN ELÉCTRICA	6	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	7	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DISPONE DE CERRADURA QUE IMPIDE SU MANIPULACIÓN	X		X		
	8	EL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO				X	*1
	9	EL CUADRO DE PROTECCIÓN Y EL DEL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRAN LIMPIOS	X		X		
	10	LA CENTRAL DE AISLAMIENTO NO INDICA NINGUNA ALARMA	X		X	X*	
	11	LA LECTURA EN EL DISPLAY DE LA CENTRAL DE AISLAMIENTO SE CORRESPONDE CON EL DISPLAY INTERIOR DE LA SALA					*2

OBSERVACIONES

* Visualizador caído.
* Toma de datos rota.
*1 Transformador desgastado
* Pulsador desenchufado
*2 El display solo está en quirófano y en el controlador de la sala de control general.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
QUIRÓFANOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-QRF-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alas Cruz	**FECHA:**	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JUANJOSE ADÁN SÁNCHEZ	**HORA:**	15:00 - 17:00

ZONA REVISADA: Quirófano 4 CMI

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
SISTEMAS VARIOS	1	LA ILUMIANCIÓN DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	2	LOS DISTINTOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN PUESTOS A TIERRA	X		X		
	3	LAS CONEXIONES A TIERRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	4	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	5	LOS DISTINTOS DISPLAY DE LA SALA (Temperatura, nivel de aislamiento, etc) SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SU LECTURA SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
PROTECCIÓN ELÉCTRICA	6	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	7	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DISPONE DE CERRADURA QUE IMPIDE SU MANIPULACIÓN	X		X		
	8	EL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	9	EL CUADRO DE PROTECCIÓN Y EL DEL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRAN LIMPIOS	X		X		
	10	LA CENTRAL DE AISLAMIENTO NO INDICA NINGUNA ALARMA	X		X		
	11	LA LECTURA EN EL DISPLAY DE LA CENTRAL DE AISLAMIENTO SE CORRESPONDE CON EL DISPLAY INTERIOR DE LA SALA					*

OBSERVACIONES

* El display solo está en quirófano y en el controlador de la sala de control general.
Visualizador oxidado.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
QUIRÓFANOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-QRF-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JUAN JOSE ADAN SÁNCHEZ	**HORA:**	15:00 – 17:00

ZONA REVISADA: Quirófano 5 CMI

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
SISTEMAS VARIOS	1	LA ILUMIANCIÓN DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	2	LOS DISTINTOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN PUESTOS A TIERRA	X		X		
	3	LAS CONEXIONES A TIERRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	4	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	5	LOS DISTINTOS DISPLAY DE LA SALA (Temperatura, nivel de aislamiento, etc) SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SU LECTURA SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
PROTECCIÓN ELÉCTRICA	6	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	7	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DISPONE DE CERRADURA QUE IMPIDE SU MANIPULACIÓN	X		X		
	8	EL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X	*1
	9	EL CUADRO DE PROTECCIÓN Y EL DEL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRAN LIMPIOS	X				
	10	LA CENTRAL DE AISLAMIENTO NO INDICA NINGUNA ALARMA	X			X	*2
	11	LA LECTURA EN EL DISPLAY DE LA CENTRAL DE AISLAMIENTO SE CORRESPONDE CON EL DISPLAY INTERIOR DE LA SALA					*3

OBSERVACIONES

*1 Transformador cuadro aislamiento despegado

*2 Salta una alarma en el quirófano pero no funciona.

*3 El display solo está en quirófano y en el controlador de la sala de control general.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
QUIRÓFANOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A	**COD. PARTE:**	-IF-QRF-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alas Erve	**FECHA:**	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JUAN JOSÉ ADÁN SÁNCHEZ	**HORA:**	15:00 – 17:00

ZONA REVISADA: Quirófano 1 CUA

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
SISTEMAS VARIOS	1	LA ILUMIANCIÓN DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		
	2	LOS DISTINTOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN PUESTOS A TIERRA	✓		✓		
	3	LAS CONEXIONES A TIERRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	✓		✓		
	4	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	✓		✓		
	5	LOS DISTINTOS DISPLAY DE LA SALA (Temperatura, nivel de aislamiento, etc) SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SU LECTURA SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	✓		✓		
PROTECCIÓN ELÉCTRICA	6	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		
	7	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DISPONE DE CERRADURA QUE IMPIDE SU MANIPULACIÓN	✓		✓		
	8	EL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓			X	X1
	9	EL CUADRO DE PROTECCIÓN Y EL DEL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRAN LIMPIOS	✓		✓		
	10	LA CENTRAL DE AISLAMIENTO NO INDICA NINGUNA ALARMA	✓		✓		
	11	LA LECTURA EN EL DISPLAY DE LA CENTRAL DE AISLAMIENTO SE CORRESPONDE CON EL DISPLAY INTERIOR DE LA SALA	✓			X	X2

OBSERVACIONES

X1 Transformador cuadro aislamiento desprogramado

X Visualizador con óxido

X2 El display solo está en quirófano y el controlador de la sala de control general.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
QUIRÓFANOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-QRF-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	12/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	15:00 - 17:00

ZONA REVISADA: Quirófano 2 CMA

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
SISTEMAS VARIOS	1	LA ILUMIANCIÓN DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	2	LOS DISTINTOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN PUESTOS A TIERRA	X		X		
	3	LAS CONEXIONES A TIERRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	4	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	5	LOS DISTINTOS DISPLAY DE LA SALA (Temperatura, nivel de aislamiento, etc) SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SU LECTURA SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
PROTECCIÓN ELÉCTRICA	6	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	7	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DISPONE DE CERRADURA QUE IMPIDE SU MANIPULACIÓN	X		X		
	8	EL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	9	EL CUADRO DE PROTECCIÓN Y EL DEL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRAN LIMPIOS	X		X		
	10	LA CENTRAL DE AISLAMIENTO NO INDICA NINGUNA ALARMA	X		X		
	11	LA LECTURA EN EL DISPLAY DE LA CENTRAL DE AISLAMIENTO SE CORRESPONDE CON EL DISPLAY INTERIOR DE LA SALA					*1

OBSERVACIONES

*Visualizador en cirugía.

*1 El display solo está en quirófano y en el controlador de la sala de control general

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
QUIRÓFANOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-QRF-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alas Ervé	**FECHA:**	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	JUAN JOSE ADAN SÁNCHEZ	**HORA:**	15:00 - 17:00

ZONA REVISADA: Quirófano 3. CMA

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
SISTEMAS VARIOS	1	LA ILUMIANCIÓN DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X	X2
	2	LOS DISTINTOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN PUESTOS A TIERRA	X		X		
	3	LAS CONEXIONES A TIERRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	4	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	5	LOS DISTINTOS DISPLAY DE LA SALA (Temperatura, nivel de aislamiento, etc) SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SU LECTURA SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
PROTECCIÓN ELÉCTRICA	6	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	7	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DISPONE DE CERRADURA QUE IMPIDE SU MANIPULACIÓN	X		X		
	8	EL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X	X1
	9	EL CUADRO DE PROTECCIÓN Y EL DEL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRAN LIMPIOS	X		X		
	10	LA CENTRAL DE AISLAMIENTO NO INDICA NINGUNA ALARMA	X		X		
	11	LA LECTURA EN EL DISPLAY DE LA CENTRAL DE AISLAMIENTO SE CORRESPONDE CON EL DISPLAY INTERIOR DE LA SALA					X3

OBSERVACIONES

* Mesa con cáido.
* Visualizador cáido.
*1 Transformador cuadro aislamiento despegado.
*2 Tapa luz quirófano caída
*3 el display solo está en quirófano y el controlador de la sala de control general.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN FÍSICA
QUIRÓFANOS

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-IF-QRF-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alas Cruz	**FECHA:**	16/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	15:00 – 17:00

ZONA REVISADA: Quirófano 4 CMA

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
SISTEMAS VARIOS	1	LA ILUMIANCIÓN DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	2	LOS DISTINTOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN PUESTOS A TIERRA	X		X		
	3	LAS CONEXIONES A TIERRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	X		X		
	4	EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		X		
	5	LOS DISTINTOS DISPLAY DE LA SALA (Temperatura, nivel de aislamiento, etc) SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SU LECTURA SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD	X		X		
PROTECCIÓN ELÉCTRICA	6	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DEL QUIRÓFANO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	7	EL CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DISPONE DE CERRADURA QUE IMPIDE SU MANIPULACIÓN	X		X		
	8	EL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		
	9	EL CUADRO DE PROTECCIÓN Y EL DEL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRAN LIMPIOS	X		X		
	10	LA CENTRAL DE AISLAMIENTO NO INDICA NINGUNA ALARMA	X		X		
	11	LA LECTURA EN EL DISPLAY DE LA CENTRAL DE AISLAMIENTO SE CORRESPONDE CON EL DISPLAY INTERIOR DE LA SALA					*1

OBSERVACIONES

*Visualizador con óxido

*Techo desconchado en uniones

*1 El display solo está en quirófano y el controlador de la sala de control general.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Pedro	

II. ANEXOS A LA AUDITORÍA DE LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA SEGÚN PPTE

II.1 COMPROBACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA SEGÚN PPTE

PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Se aportan la siguiente comprobación para el análisis de la presente documentación:

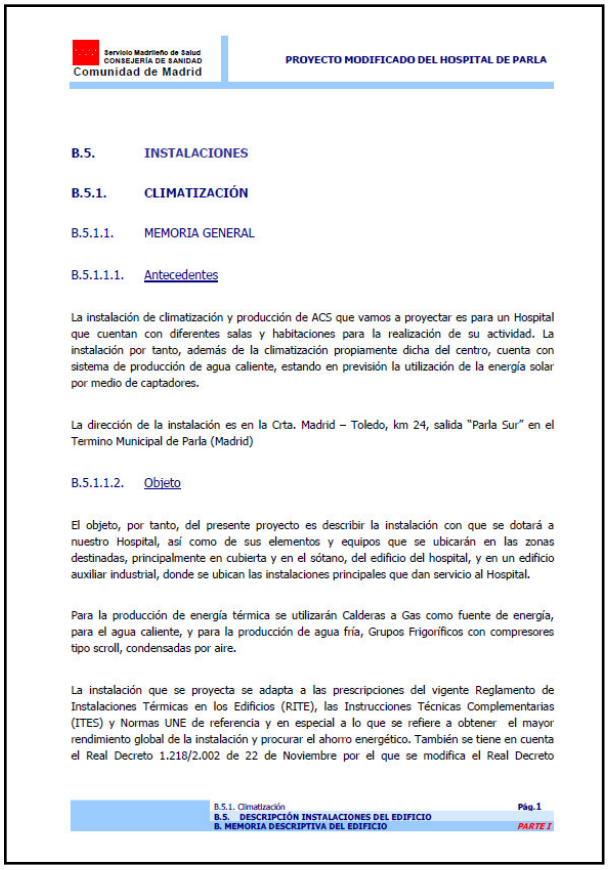

Servicio Madrileño de Salud
CONSEJERÍA DE SANIDAD
Comunidad de Madrid

PROYECTO MODIFICADO DEL HOSPITAL DE PARLA

B.5. INSTALACIONES

B.5.1. CLIMATIZACIÓN

B.5.1.1. MEMORIA GENERAL

B.5.1.1.1. Antecedentes

La instalación de climatización y producción de ACS que vamos a proyectar es para un Hospital que cuentan con diferentes salas y habitaciones para la realización de su actividad. La instalación por tanto, además de la climatización propiamente dicha del centro, cuenta con sistema de producción de agua caliente, estando en previsión la utilización de la energía solar por medio de captadores.

La dirección de la instalación es en la Crta. Madrid – Toledo, km 24, salida "Parla Sur" en el Termino Municipal de Parla (Madrid)

B.5.1.1.2. Objeto

El objeto, por tanto, del presente proyecto es describir la instalación con que se dotará a nuestro Hospital, así como de sus elementos y equipos que se ubicarán en las zonas destinadas, principalmente en cubierta y en el sótano, del edificio del hospital, y en un edificio auxiliar industrial, donde se ubican las instalaciones principales que dan servicio al Hospital.

Para la producción de energía térmica se utilizarán Calderas a Gas como fuente de energía, para el agua caliente, y para la producción de agua fría, Grupos Frigoríficos con compresores tipo scroll, condensadas por aire.

La instalación que se proyecta se adapta a las prescripciones del vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITES) y Normas UNE de referencia y en especial a lo que se refiere a obtener el mayor rendimiento global de la instalación y procurar el ahorro energético. También se tiene en cuenta el Real Decreto 1.218/2.002 de 22 de Noviembre por el que se modifica el Real Decreto

B.5.1. Climatización Pág.1
B.5. DESCRIPCIÓN INSTALACIONES DEL EDIFICIO
B. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EDIFICIO PARTE I

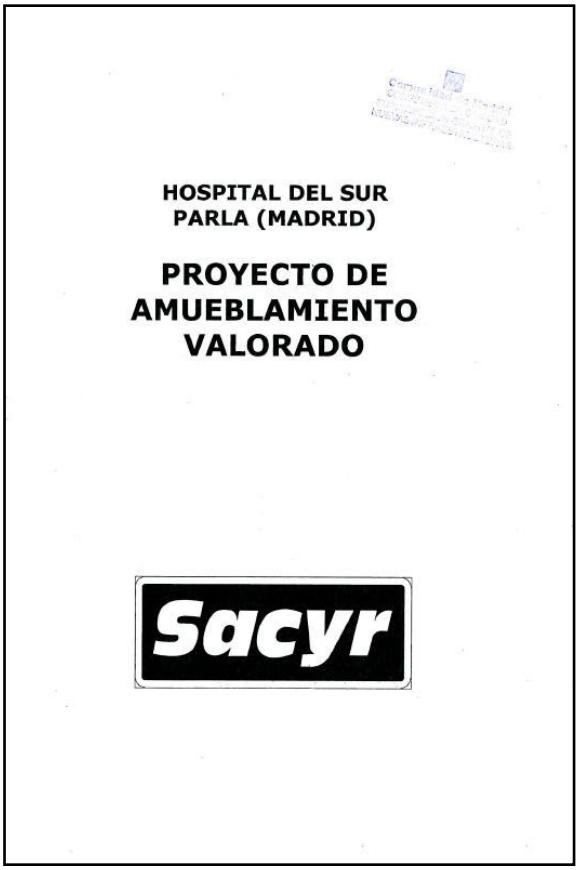

HOSPITAL DEL SUR
PARLA (MADRID)

PROYECTO DE AMUEBLAMIENTO VALORADO

Sacyr

PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Se aportan la siguiente comprobación para el análisis de la presente documentación:

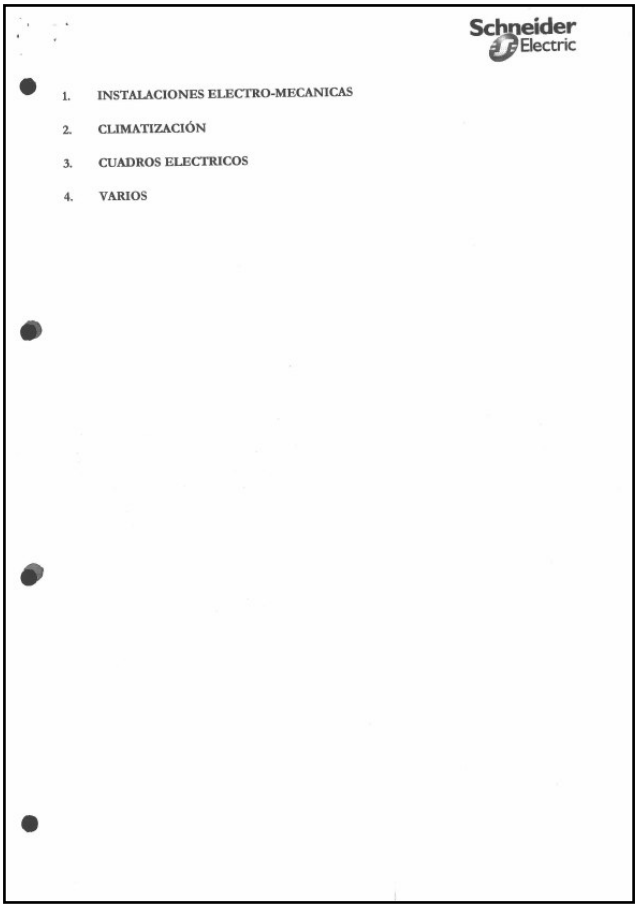

Schneider Electric

1. INSTALACIONES ELECTRO-MECANICAS
2. CLIMATIZACIÓN
3. CUADROS ELECTRICOS
4. VARIOS

INVENTARIO ACTUALIZADO DE LOS EQUIPOS PRESENTES EN CADA INSTALACIÓN

Se aportan la siguiente comprobación para el análisis de la presente documentación:

UNIDADES	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	VIDA ÚTIL	PRECIO POR UNIDAD
1	SISTEMA DE AGUA	GRUPO DE BOMBEO Y AGUA TRATADA	GRUPOS DE BOMBEO FONTANERIA MODELO EPVAE 4VLX804T ITUF	ACTIVO	100,00%	39.133,16 €
1	SISTEMA DE AGUA	GRUPO DE BOMBEO Y AGUA TRATADA	GRUPOS DE BOMBEO FLUXORES MODELO EPVAE 3VLX6503 ITUF	ACTIVO	100,00%	37.533,00 €
1	SISTEMA DE AGUA	GRUPO DE BOMBEO Y AGUA TRATADA	GRUPOS DE BOMBEO RIEGO EPVAE 2VLX3205 ITUR	ACTIVO	100,00%	16.465,67 €
1	SISTEMA DE AGUA	GRUPO DE BOMBEO Y AGUA TRATADA	Central para tratamiento de agua y osmosis inversa. Diálisis.	ACTIVO	200,00%	43.089,35 €
1	SISTEMA DE AGUA	GRUPO DE BOMBEO Y AGUA TRATADA	Anillo de distribución de agua tratada.Diálisis.	ACTIVO	100,00%	13.057,38 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	ENFRIADORA PRINCIPAL DE AGUA CON COMPRESOR DE TORNILLO	ACTIVO	80,00%	128.343,40 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	ENFRIADORA PRINCIPAL DE AGUA CON COMPRESOR DE TORNILLO	ACTIVO	80,00%	128.343,40 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	ENFRIADORA PRINCIPAL DE AGUA CON COMPRESOR DE TORNILLO	ACTIVO	80,00%	128.343,40 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	ENFRIADORA PRINCIPAL DE AGUA CON COMPRESOR DE TORNILLO	ACTIVO	80,00%	128.343,40 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENTRIFUGA MONO EN BANCADA VELOCIDAD CONSTANTE (192 M3/H	ACTIVO	160,00%	5.227,53 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENTRIFUGA MONO EN BANCADA VELOCIDAD CONSTANTE (192 M3/H	ACTIVO	160,00%	5.227,53 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENTRIFUGA MONO EN BANCADA VELOCIDAD CONSTANTE (192 M3/H	ACTIVO	160,00%	5.227,53 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENTRIFUGA MONO EN BANCADA VELOCIDAD CONSTANTE (192 M3/H	ACTIVO	160,00%	5.227,53 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENTRIFUGA MONO EN BANCADA VELOCIDAD CONSTANTE (192 M3/H	ACTIVO	160,00%	5.227,53 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENTRIFUGA MONO EN BANCADA VELOCIDAD CONSTANTE (192 M3/H	ACTIVO	160,00%	5.227,53 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE FANCOIL(150 m3/h	ACTIVO	160,00%	5.015,05 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE FANCOIL(150 m3/h	ACTIVO	160,00%	5.015,05 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE FANCOIL(150 m3/h	ACTIVO	160,00%	5.015,05 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE FANCOIL(150 m3/h	ACTIVO	160,00%	5.015,05 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE UTA´S (95 m3/h	ACTIVO	160,00%	4.578,01 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE UTA´S (95 m3/h	ACTIVO	160,00%	4.578,01 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE UTA´S (95 m3/h	ACTIVO	160,00%	4.578,01 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE UTA´S (95 m3/h	ACTIVO	160,00%	4.578,01 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA DE ROTOR ENCAPSULADA. RECIRCULACION FRIO (7 m3/h	ACTIVO	160,00%	1.376,00 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 1, HOSPITALIZACIÓN	ACTIVO	80,00%	24.140,97 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 2, HOSPITALIZACIÓN	ACTIVO	80,00%	21.368,49 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 3, HOSPITALIZACIÓN	ACTIVO	80,00%	23.797,39 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 4, DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN BAJA D	ACTIVO	80,00%	9.839,33 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA5 UCI PRIMERA D	ACTIVO	80,00%	17.184,88 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA6 BLOQUE OBSTÉTRICO SEGUNDA D	ACTIVO	80,00%	9.979,95 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 7 RADIOLOGÍA	ACTIVO	80,00%	8.052,78 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 8, COMUNES HOSPITAL DE DIA RADIOLOGIA.	ACTIVO	80,00%	1.169,00 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 9, NEONATOLOGÍA	ACTIVO	80,00%	7.534,50 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 10, SUMINISTROS Y MORTUORIO	ACTIVO	80,00%	6.774,62 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 11, PASILLO LIMPIO Y SUCIO SEGUNDA E	ACTIVO	80,00%	7.821,99 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 12, QUIROFANOS CMI 1	ACTIVO	80,00%	3.245,74 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 13, QUIROFANOS CMI 2	ACTIVO	80,00%	3.245,74 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 14, QUIROFANOS CMI 3	ACTIVO	80,00%	3.245,74 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 15, QUIROFANOS CMI 4	ACTIVO	80,00%	3.245,74 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 16, QUIROFANOS CMI 5	ACTIVO	80,00%	3.245,74 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 17, URGENCIAS, PASILLO PREVIO A PASILLOS SEGUNDA F,	ACTIVO	80,00%	8.197,47 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 18, OBSERVACION DE URGENCIAS BAJA F	ACTIVO	80,00%	7.854,79 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 19, NEUROLOGÍA, ENDOSCOPIAS... TODA PRIMERA F	ACTIVO	80,00%	8.722,29 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 20, ADAPTACIÓN AL MEDIO SEGUNDA F	ACTIVO	80,00%	4.876,67 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 21, PASILLO LIMPIO Y SUCIO SEGUNDA F	ACTIVO	80,00%	6.636,59 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 22, QUIROFANOS CMA 1	ACTIVO	80,00%	3.245,74 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 23, QUIROFANOS CMA 2	ACTIVO	80,00%	3.245,74 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 24, QUIROFANOS CMA 3	ACTIVO	80,00%	3.245,74 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 25, QUIROFANOS CMA 4	ACTIVO	80,00%	3.245,74 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 26, ENTRADA URGENCIAS Y ESPERA DE FAMILIARES BAJA N	ACTIVO	80,00%	9.308,41 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 27, PRIMERA Y SEGUNDA N	ACTIVO	80,00%	8.404,14 €
1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 28, CONSULTAS PRIMERA Y VESTUARIOS	ACTIVO	80,00%	3.007,72 €

REGISTRO DE QUEJAS Y RESPUESTA

Se aportan la siguiente comprobación para el análisis de la presente documentación:



Hospital Universitario
Infanta Cristina
SaludMadrid

REGISTRO DE SALIDA
Ref:07/643088.9/17 Fecha:12/05/2017 12:51
Registro del Servicio Madrileño de Salud
Registro Servicio Madrileño de Salud
Destino: Hospital de Parla, S.A.

GE17_29

Exp. 08_2012

Att. Dª Violeta Paniagua.
Hospital de Parla S.A.
Avda. 9 de Junio nº 2 PARLA

Estimados señores,

Adjunto remitimos reclamación de la paciente Celia Blanco Menendez relacionado con el incidente sufrido por la rotura de un banco en la consulta de Oftalmología el día 17 de abril de 2017.

Rogamos procedan a iniciar expediente conforme con su Seguro de Responsabilidad Civil y nos informen del proceso del mismo.

Atentamente.

En Parla, a 11 de mayo de 2017

HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA
Director Gerente

Hospital Universitario Infanta Cristina
SaludMadrid
Avda. 9 Junio, n.º 2 - Tel. 91 191 90 00
28981 PARLA (Madrid)

Fdo.: D. Carlos Mingo Rodríguez

Recibí 15.5.2017, 12:30 h.

PLANES DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Se aportan la siguiente comprobación para el análisis de la presente documentación:

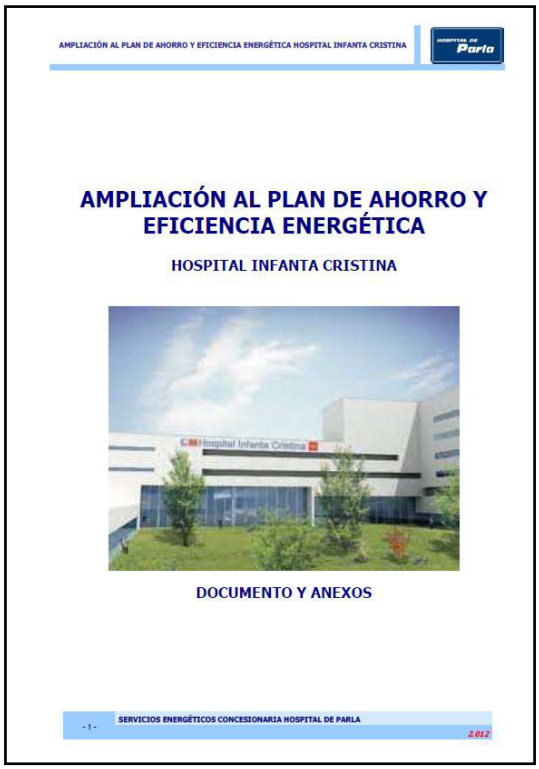

AMPLIACIÓN AL PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA HOSPITAL INFANTA CRISTINA

Parla

AMPLIACIÓN AL PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

HOSPITAL INFANTA CRISTINA

DOCUMENTO Y ANEXOS

SERVICIOS ENERGÉTICOS CONCESIONARIA HOSPITAL DE PARLA

- 1 -

2012

PLAN DE EMERGENCIA/CONTINGENCIA O PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Se aportan la siguiente comprobación para el análisis de la presente documentación:


NOVASA

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Hospital Universitario Infanta Cristina

Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias

Hospital Universitario Infanta Cristina
SaludMadrid
Comunidad de Madrid

Elaborado por: Novasa Desarrollo

Diciembre 2014
Edición: 5.0

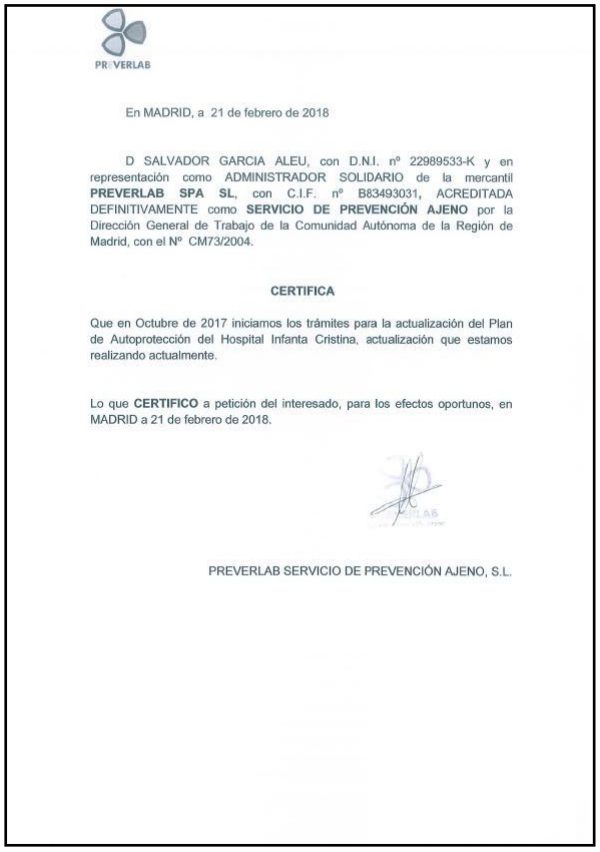
PREVERLAB

En MADRID, a 21 de febrero de 2018

D SALVADOR GARCIA ALEU, con D.N.I. nº 22989533-K y en representación como ADMINISTRADOR SOLIDARIO de la mercantil **PREVERLAB SPA SL**, con C.I.F. nº B83493031, ACREDITADA DEFINITIVAMENTE como **SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO** por la Dirección General de Trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Madrid, con el Nº CM73/2004.

CERTIFICA

Que en Octubre de 2017 iniciamos los trámites para la actualización del Plan de Autoprotección del Hospital Infanta Cristina, actualización que estamos realizando actualmente.

Lo que **CERTIFICO** a petición del interesado, para los efectos oportunos, en MADRID a 21 de febrero de 2018.

PREVERLAB SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, S.L.

La última versión que se nos ha facilitado del manual de emergencia/contingencia o manual de autoprotección es de diciembre de 2014.

Según la normativa correspondiente, “REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia”, la vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión: El Plan de Autoprotección tendrá vigencia indeterminada; se mantendrá adecuadamente actualizado, y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años.

Se debería disponer de un documento con menos de tres años de vigencia, por tanto, se debería de disponer de la última actualización con fecha a diciembre de 2017 y todavía no se dispone de la misma. No obstante, en octubre de 2017 se han iniciado los tramites para la actualización del Plan de Autoprotección.

LIBROS DE MANTENIMIENTO EN SOPORTE FÍSICO

Se comprueba su existencia in situ.

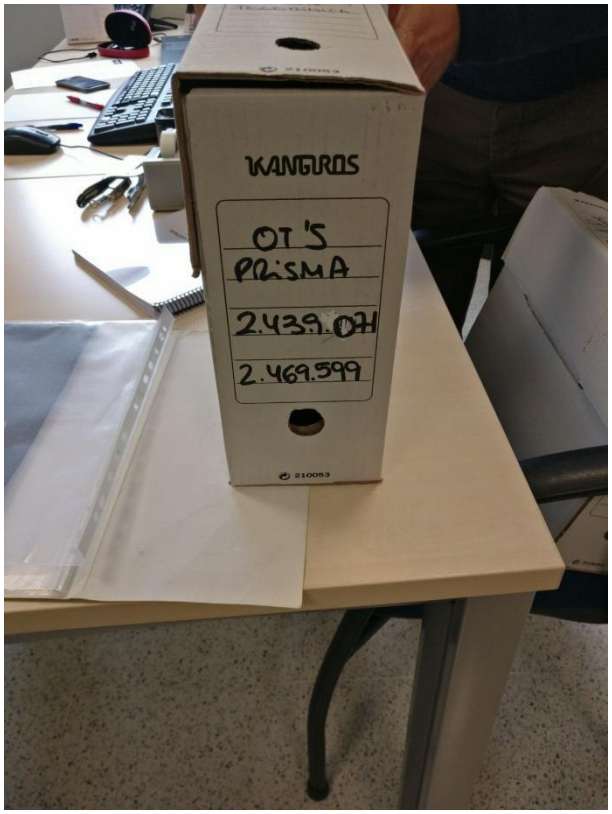

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO

Se aportan la siguiente comprobación para el análisis de la presente documentación:



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
IIOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO

CAPITULO: 01. PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

TITULO: 01. PROCEDIMIENTOS GENERALES

APROBACION

		REDACTADO	REVISADO	APROBADO
EDICION	FECHA EFECTIVIDAD		05/09/2011	
		Gonzalo Centrón	Candido Caletrio Gonzalo Centrón	

NATURALEZA DE LOS CAMBIOS RESPECTO A LA EDICION ANTERIOR:

Actualización

Dicha documentación se ha validado por parte de la administración. El documento es una actualización respecto al manual de procedimientos generales del servicio de mantenimiento inicial.

APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

La aplicación informática para gestión del mantenimiento es PRISMA III

APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA GESTIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES

La aplicación informática para gestión de las instalaciones es SILTROL.

CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

Se analiza en este apartado los medios humanos puestos a disposición del servicio de mantenimiento del Hospital Universitario Infanta Cristina, atendiendo a los pilares que conforman un equipo de trabajo: cualificación, cantidad y organización.

Cualificación

La formación y experiencia de los distintos técnicos que forman el equipo de mantenimiento se considera adecuadas.

Los técnicos del servicio de mantenimiento disponen de la formación adecuada para realizar el mantenimiento del hospital.

Han recibido una buena cantidad de cursos de formación enfocados a mejorar sus competencias en el ámbito del mantenimiento de hospitales.

Todos disponen de una experiencia que varía entre 1 y 5 años, lo cual implica un buen bagaje. Todos llevan en la empresa más de un año, desde el comienzo del funcionamiento del Hospital, lo cual redunda en una buena cohesión de equipo, conocimiento de debilidades y fortalezas de los miembros del equipo, etc.

Cantidad

La cantidad de técnicos asignados por turnos y por tareas se considera adecuada.

La cantidad de personal por turno la fija el encargado de mantenimiento. El mínimo de personal por turno es 1, incluso en festivos o nocturnos.

Durante los turnos de fin de semana o nocturnos, los técnicos tienen como prioridad las tareas correctivas, sobre todo en el caso de subsanaciones de elementos importantes de las instalaciones.

En caso de no tener ninguna acción correctiva pendiente se encargan de tareas de mantenimiento preventivo.

Durante los turnos diarios entre semana suelen haber por lo menos 2 técnicos para correctivos y 1 para preventivos. Por las mañanas se dispone de 6 oficiales polivalentes a disposición para correctivos y preventivos. Por la tarde se dispone de 2.

Las tareas de mantenimiento conductivo (rondas de revisión de las instalaciones) son realizadas en todos los turnos de trabajo.

Cabe mencionar que la organización de los turnos es la siguiente:

- Horario del turno de mañana: de 07:00 a las 15.00 horas.
- Horario del turno de tarde: de 15:00 a las 23:00 horas.
- Horario del turno de noche: de 23:00 a las 07:00 horas.
- Horario del turno partido: de 08:00 a 14.00 y de 16:00 a 18:00 horas.

Organización

La organización del servicio de mantenimiento es buena. La misma tiene un recorrido de un año, desde la apertura del Hospital, por lo que cada técnico conoce bien su cometido. Los distintos procedimientos de trabajo y gestión son conocidos por todos.

En cuanto al cumplimiento de resolución de incidencias propias del mantenimiento correctivo, no se ha podido constatar la capacidad de respuesta del equipo, ya que los tiempos reflejados por los operarios en las órdenes de trabajo corresponden con los tiempos de actuación, estando excluidos los tiempos de espera, tiempos de suministro de repuestos, tiempos de aviso, etc.

MEDIOS TÉCNICOS, GESTIÓN DE ALMACENES Y STOCK

Se ha realizado un análisis de los medios y materiales a disposición del servicio de mantenimiento, distinguiendo 3 bloques diferenciados:

- **Medios técnicos generales**. Se trata de aquellos medios que son necesarios para la realización del servicio, no siendo específicos de la propia actividad de mantenimiento de cada instalación, como equipos informáticos, sistemas de comunicación, material de oficina, etc.

  En este caso, se observó un buen estado y cantidad de los medios a disposición del personal encargado del trabajo.

- **Medios técnicos específicos**. Se trata de aquellos medios necesarios para realizar las diferentes tareas encomendadas en los partes de trabajo de mantenimiento preventivo, correctivo o conductivo, estando incluidos en este bloque: herramientas diversas de montaje y desmontaje, taladros, sierras, instrumentación de medida como polímetros, detectores de tensión, sondas de temperatura, anemómetros, etc. El material observado durante la inspección se considera suficiente para las labores a realizar habituales de mantenimiento y verificación.

- **Materiales y equipos almacenados.** Se trata de todo el stock a disposición del mantenimiento correctivo, principalmente, como es el caso de equipos muy numerosos (p. ejemplo protecciones eléctricas, válvulas de corte más comunes), equipos o materiales con necesidad de sustitución periódica por desgaste (p. ejemplo juntas, rodamientos) y por otro lado materiales fungibles (p. ejemplo lámparas, pre-filtros desechables)

Durante la visita a los distintos almacenes de que dispone el mantenedor se pudo observar que en los mismos predominaba el orden y la limpieza.

III. ANEXOS A LA AUDITORÍA DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO

III.1 Mediciones de Parámetros de Confort Térmico por parte de Incosa (Mantenimiento Conductivo)

1ª MEDICIÓN TEMPERATURA/HUMEDAD

	HOSPITAL	PLANTA	ZONA	ESTANCIA	TEMPERATURA (°C)	HUMEDAD (%)	Fecha mediciones	HORA
1	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Sala de reuniones	22,3	25,4	23/11/2017	10:00
2	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Despacho	22,6	25,5	23/11/2017	10:03
3	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Sala de reuniones	23,2	24,2	23/11/2017	10:06
4	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Mantenimiento	Pasillo	19,3	28,9	23/11/2017	10:09
5	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Lencería	Almacén Ropa Sucia	20,4	25,7	23/11/2017	10:12
6	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Mantenimiento	Taller Climatización	21	25,1	23/11/2017	10:15
7	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Suministros	Almacén Compras	21	26,6	23/11/2017	10:18
8	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cuidados Intensivos	Box Aislamiento	23,1	22,7	23/11/2017	10:21
9	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cuidados Intensivos	Box	23,1	21,8	23/11/2017	10:24
10	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cuidados Intensivos	Sala de espera familiares	23,5	23,8	23/11/2017	10:27
11	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	23,5	26,8	23/11/2017	10:30
12	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Puesto Control Enfermería	23,6	25,1	23/11/2017	10:33
13	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	23,5	23,8	23/11/2017	10:36
14	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Personal	23,5	26,6	23/11/2017	10:39
15	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	21,8	24,9	23/11/2017	10:42
16	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Puesto Control Enfermería	23,3	24,6	23/11/2017	10:45
17	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Limpia	23,7	24,2	24/11/2017	8:30
18	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de espera familiares	22,7	24,2	24/11/2017	8:33
19	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	22,8	24	24/11/2017	8:36
20	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Sala Técnica Polivalente	23,4	22,8	24/11/2017	8:39
21	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Sucia	22,8	22,8	24/11/2017	8:42
22	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	22,7	24,5	24/11/2017	8:45
23	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	22,9	23,8	24/11/2017	8:48
24	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	21	25	23/11/2017	10:52
25	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de Reuniones	20,6	25,2	23/11/2017	10:55
26	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	20	26	23/11/2017	10:58
27	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	20,6	26,8	23/11/2017	11:01
28	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	19,5	26,9	24/11/2017	8:51
29	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Administrativo	18	30,8	24/11/2017	8:54
30	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	19,7	30	24/11/2017	8:57
31	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	19,8	31,8	23/11/2017	11:04
32	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	21,2	26,7	23/11/2017	11:07
33	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	21,6	25,8	23/11/2017	11:10
34	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	21,7	25,1	23/11/2017	11:13
35	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Sucia	21,9	25,1	23/11/2017	11:16
36	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Personal	22,5	24,7	23/11/2017	11:19
37	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala Técnica Polivalente	22,4	24,8	23/11/2017	11:22
38	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	22,6	24,4	23/11/2017	11:25
39	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	22,9	24,1	23/11/2017	11:28
40	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	22,1	24,6	23/11/2017	11:31
41	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	21,9	25,3	23/11/2017	11:34
42	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	21,8	25,1	23/11/2017	11:37
43	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	21,9	25,3	23/11/2017	11:40
44	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de espera familiares	22,8	24,4	23/11/2017	11:43
45	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Despacho información	23,2	23,9	23/11/2017	11:46
46	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	23,5	24,7	23/11/2017	11:49
47	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Puesto Control Enfermería	23,5	25,9	23/11/2017	11:52
48	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala Técnica Polivalente	23,2	26,7	23/11/2017	11:55
49	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Limpia	23,4	27,9	23/11/2017	11:58
50	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Personal	22,4	27,5	23/11/2017	12:01

	HOSPITAL	PLANTA	ZONA	ESTANCIA	TEMPERATURA (°C)	HUMEDAD (%)	Fecha mediciones	HORA
51	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	22,7	27,8	23/11/2017	12:04
52	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Vestuario	22,9	22,9	23/11/2017	12:07
53	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	21	25,4	23/11/2017	12:10
54	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Dilatación	23,4	22,1	23/11/2017	12:13
55	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Equipo Obstérico	Consultorio	24,3	23	23/11/2017	12:16
56	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Monitorización	23,7	22,8	23/11/2017	12:19
57	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de espera familiares	23	22,4	23/11/2017	12:22
58	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Traumatología	Sala de espera traumatología	23,4	28,1	23/11/2017	12:25
59	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Pasillo	23	25,6	23/11/2017	12:28
60	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Sala Traumatología	22,7	25,5	23/11/2017	12:31
61	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Traumatología	Sala Traumatología 2	22,9	28	24/11/2017	10:50
62	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Sala de Yesos 1	23,1	25,8	24/11/2017	10:53
63	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Sala de Yesos 2	23	27,6	24/11/2017	10:56
64	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Campimetría	23	26,7	24/11/2017	10:59
65	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Sala de espera oftalmología	22,6	27,6	24/11/2017	11:02
66	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Recepción Consultas	22,4	28,1	24/11/2017	11:05
67	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Exploraciones Funcionales 1	23,3	26,2	24/11/2017	11:08
68	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Audiometría	22,8	24,8	24/11/2017	11:11
69	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Exploraciones Funcionales 2	23	25,7	24/11/2017	11:14
70	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Consulta 1	23,7	25,8	24/11/2017	11:17
71	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Consulta 3	23,3	25,8	24/11/2017	11:20
72	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Zona Polivalente Personal	23,4	25,8	24/11/2017	11:23
73	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Pasillo	23,7	23,8	24/11/2017	11:26
74	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala de Curas	23,8	24,2	24/11/2017	11:29
75	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala Anestesia	23,3	23,3	24/11/2017	11:32
76	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala Consulta Cirugía	24	25,2	24/11/2017	11:35
77	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala Consulta Enfermería	24,1	24,1	24/11/2017	11:38
78	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Recepción consultas	23,5	24,9	24/11/2017	11:41
79	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Recepción consultas 2	23,1	25,2	24/11/2017	11:44
80	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Obstetricia	23,5	26,8	24/11/2017	11:47
81	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Ecografías	25,8	30	24/11/2017	11:50
82	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Consulta Ginecología	23,4	24	24/11/2017	11:53
83	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Consulta Ginecología 2	23,6	23,8	24/11/2017	11:56
84	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Sala de Curas	23,8	24,4	24/11/2017	11:59
85	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Pasillo	23,8	24,1	24/11/2017	12:02
86	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Sala de Reuniones	22,6	23,9	24/11/2017	12:05
87	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Pasillo	22,7	25	24/11/2017	12:08
88	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Consulta Endoscopia	23,1	25,5	24/11/2017	12:11
89	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Consulta Recuperación	23	24,6	24/11/2017	12:14
90	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Urodinamia	23,2	24,2	24/11/2017	12:17
91	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Consulta Endoscopia 2	23,8	24	24/11/2017	12:20
92	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Consulta Enfermería Endoscopia	23,6	24,5	24/11/2017	12:23
93	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Recepción consultas endoscopias	23,3	24,5	24/11/2017	12:26
94	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Psiquiatría Neurol.	Consulta Psiquiatría	24,3	24	24/11/2017	12:29
95	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Psiquiatría Neurol.	Consulta Neurología	24	25,3	24/11/2017	12:32
96	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Onco	Consulta Oncología	24,1	25,6	24/11/2017	12:35
97	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	23,5	24,5	24/11/2017	9:00
98	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	22,9	24,8	24/11/2017	9:03
99	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Sala Reuniones	23,4	24,1	24/11/2017	9:06
100	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Jefe Servicio	23,8	28	24/11/2017	9:09
101	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	22,8	23,9	24/11/2017	9:12
102	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	22,8	23,9	24/11/2017	9:15
103	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Sistemas E Inform.	Medicina Preventiva	22,3	24,9	24/11/2017	9:18
104	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Pasillo	22,1	26,7	24/11/2017	9:21
105	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Sistemas E Inform.	Dirección Administrativa	22,6	25,3	24/11/2017	9:24
106	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	22,1	25	24/11/2017	9:27
107	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Pasillo	22,6	25,4	24/11/2017	9:30
108	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Sala Reuniones	22,5	25,7	24/11/2017	9:33

	HOSPITAL	PLANTA	ZONA	ESTANCIA	TEMPERATURA (°C)	HUMEDAD (%)	Fecha mediciones	HORA
109	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Registros	23,3	25	24/11/2017	9:36
110	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Jefe Gestión Económica	23	24,7	24/11/2017	9:39
111	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir.Sistemas E Infor.	Secretaria	22,9	26,3	24/11/2017	9:42
112	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	RRHH	Zona Trabajo Administrativo	23	26,6	24/11/2017	9:45
113	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	RRHH	Jefe Recursos Humanos	22,8	25,1	24/11/2017	9:48
114	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Director Sistemas e Información	23,1	25	24/11/2017	9:51
115	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Gerencia y dir. Gestión	Despacho	23,6	24,6	24/11/2017	9:54
116	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Sala de Reuniones	23,3	24,4	24/11/2017	9:57
117	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Gerencia y dir. Gestión	Despacho	23,6	24,5	24/11/2017	10:00
118	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Gerencia y dir. Gestión	Zona Trabajo Administrativo	23,2	25	24/11/2017	10:03
119	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Despacho	23,1	25	24/11/2017	10:06
120	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Sala de reuniones	22,7	25,6	24/11/2017	10:09
121	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Despacho	22,7	26	24/11/2017	10:12
122	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Hosp. Pediátrica	Pasillo	24,1	24,3	24/11/2017	12:45
123	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Neonatologia	Habitación	23,9	23,9	24/11/2017	12:48
124	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Neonatologia	Habitación	23,9	36,3	24/11/2017	12:51
125	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Hosp. Obstérica	Pasillo	22,8	34,1	24/11/2017	12:54
126	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Pasillo	23,8	23,3	24/11/2017	12:57
127	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Pasillo	23,5	24,7	23/11/2017	13:00
128	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Box Agitados	23,5	24,5	23/11/2017	13:03
129	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Sala de Curas	25,1	22,5	23/11/2017	13:06
130	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Pasillo	24,1	24,1	23/11/2017	13:09
131	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Despacho Médico	23,6	25,2	23/11/2017	13:12
132	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Almacén	23,3	25,3	23/11/2017	13:15
133	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diálisis	Zona Diálisis Crónicos	23,5	26	23/11/2017	13:18
134	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diálisis	Zona Trabajo Administrativo	23,5	25	23/11/2017	13:21
135	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diálisis	Zona Diálisis Agudo	23,6	24	23/11/2017	13:24
136	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Admisión	Zona Acceso Personal	23,7	25,6	23/11/2017	13:27
137	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Admisión	Zona Atención al Paciente	23,7	25,6	23/11/2017	13:30
138	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Admisión	Zona Á rea Adiministrativa	23,5	31,4	23/11/2017	13:33
139	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Cafeterías	Cafetería	22,5	27,1	23/11/2017	13:36
140	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Hosp. Psiquiátrica	Sala Espera Familiares	23,5	25	23/11/2017	13:39
141	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	21,3	22,1	24/11/2017	7:15
142	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	20,8	22,8	24/11/2017	7:17
143	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	20,6	23,3	24/11/2017	7:19
144	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	20,6	23,9	24/11/2017	7:21
145	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	20,2	26,1	24/11/2017	7:23
146	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	20,5	23	24/11/2017	7:25
147	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	20,1	26	24/11/2017	7:27
148	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	19,8	24,3	24/11/2017	7:29
149	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	19,8	23,6	24/11/2017	7:31
150	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	20,8	24,5	24/11/2017	7:33
151	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	21,3	24	24/11/2017	7:35
152	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	20,9	22,4	24/11/2017	7:37
153	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	20,6	24	24/11/2017	7:39
154	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	20,3	24,4	24/11/2017	7:41
155	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	20,1	24,1	24/11/2017	7:43
156	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	18	27	24/11/2017	7:45
157	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	21	23,2	24/11/2017	7:47
158	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	21,6	23	24/11/2017	7:49
159	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	19,5	25,6	24/11/2017	7:51
160	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	18,6	26,8	24/11/2017	7:53
161	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	18	28	24/11/2017	7:55
162	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	18,7	27,9	24/11/2017	7:57
163	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	19,4	26,3	24/11/2017	7:59
164	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	19,7	26	24/11/2017	8:01
165	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	21,2	25,8	24/11/2017	8:03

2ª MEDICIÓN TEMPERATURA/HUMEDAD

	HOSPITAL	PLANTA	ZONA	ESTANCIA	TEMPERATURA (ºC)	HUMEDAD (%)	Fecha mediciones	HORA
1	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Sala de reuniones	20,4	24,2	18/12/2017	9:30
2	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Despacho	21,5	31,8	18/12/2017	9:33
3	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Sala de reuniones	21,7	32,2	18/12/2017	9:36
4	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Mantenimiento	Pasillo	19,5	25,2	18/12/2017	9:18
5	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Lencería	Almacén Ropa Sucia	19,7	25,5	18/12/2017	9:21
6	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Mantenimiento	Taller Climatización	20,3	26,2	18/12/2017	9:24
7	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Suministros	Almacén Compras	21,1	25	18/12/2017	9:27
8	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cuidados Intensivos	Box Aislamiento	20,6	27,7	18/12/2017	12:40
9	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cuidados Intensivos	Box	21,6	24,1	18/12/2017	12:43
10	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cuidados Intensivos	Sala de espera familiares	22,8	32	18/12/2017	12:46
11	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	23	25,7	18/12/2017	12:49
12	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Puesto Control Enfermería	23,4	24,8	18/12/2017	12:52
13	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	23,5	29,7	18/12/2017	12:55
14	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Personal	23,9	26,7	18/12/2017	12:58
15	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	23,2	21,4	18/12/2017	13:01
16	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Puesto Control Enfermería	22,6	26,2	18/12/2017	13:04
17	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Limpia	22,9	26,4	18/12/2017	13:07
18	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de espera familiares	22,3	25,2	18/12/2017	13:10
19	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	21,7	25	18/12/2017	13:13
20	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Sala Técnica Polivalente	20,9	24,9	18/12/2017	13:16
21	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Sucia	20,5	25,6	18/12/2017	13:19
22	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	20,3	27	18/12/2017	13:22
23	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	20	28	18/12/2017	13:25
24	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	20	24,8	18/12/2017	13:28
25	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de Reuniones	21,2	26,8	18/12/2017	13:31
26	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	20,6	24,2	18/12/2017	13:34
27	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	20,5	27,3	18/12/2017	9:39
28	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	20	25,5	18/12/2017	9:42
29	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Administrativo	17	28,1	18/12/2017	9:45
30	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	17,8	31	18/12/2017	9:48
31	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	19,8	38,5	18/12/2017	9:51
32	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	21,4	28,4	18/12/2017	9:54
33	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	21,6	27,6	18/12/2017	9:57
34	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	22,1	27	18/12/2017	10:00
35	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Sucia	22,4	24,1	18/12/2017	10:03
36	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Personal	23,2	24,4	18/12/2017	10:06
37	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala Técnica Polivalente	22,9	24,8	18/12/2017	10:09
38	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	23,2	24,5	18/12/2017	10:12
39	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	23,6	23,7	18/12/2017	10:15
40	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	23,1	22,3	18/12/2017	10:18
41	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	22,7	23,9	18/12/2017	10:21
42	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	21,4	26,1	18/12/2017	10:24
43	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	21,5	25,1	18/12/2017	10:27
44	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de espera familiares	22,3	26,5	18/12/2017	10:30
45	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Despacho información	22,8	22,5	18/12/2017	10:33
46	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	23,5	26,1	18/12/2017	10:36
47	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Puesto Control Enfermería	23,8	24,8	18/12/2017	10:39
48	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala Técnica Polivalente	23,5	22,9	18/12/2017	10:42
49	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Limpia	23,5	29,3	18/12/2017	10:45
50	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Personal	23,8	33,4	18/12/2017	10:48
51	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	24	26	18/12/2017	10:51
52	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Vestuario	23,9	27,4	18/12/2017	10:54
53	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	21,4	23	18/12/2017	10:57
54	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Dilatación	22,3	21,1	18/12/2017	11:00
55	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Equipo Obstérico	Consultorio	23	21,1	18/12/2017	11:03

	HOSPITAL	PLANTA	ZONA	ESTANCIA	TEMPERATURA (°C)	HUMEDAD (%)	Fecha mediciones	HORA
56	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Monitorización	23,3	23	18/12/2017	11:06
57	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de espera familiares	23,8	22,4	18/12/2017	11:09
58	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Traumatología	Sala de espera traumatología	23,4	24,8	18/12/2017	15:00
59	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Pasillo	23	21,9	18/12/2017	15:03
60	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Sala Traumatología	23,1	23,9	18/12/2017	15:06
61	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Traumatología	Sala Traumatología 2	23,1	23,5	18/12/2017	15:09
62	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Sala de Yesos 1	22,9	23	18/12/2017	15:12
63	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Sala de Yesos 2	22,8	23,7	18/12/2017	15:15
64	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Campimetría	22,5	26,8	18/12/2017	15:18
65	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Sala de espera oftalmología	22,8	27,8	18/12/2017	15:21
66	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Recepción Consultas	22,9	26,4	18/12/2017	15:24
67	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Exploraciones Funcionales 1	22,6	25	18/12/2017	15:27
68	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Audiometría	22,8	26,4	18/12/2017	15:30
69	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Exploraciones Funcionales 2	22,6	25,7	18/12/2017	15:33
70	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Consulta 1	22,4	25,4	18/12/2017	15:36
71	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Consulta 3	22,3	24,8	18/12/2017	15:39
72	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Zona Polivalente Personal	22,2	24,1	18/12/2017	15:42
73	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Pasillo	22,7	24,5	18/12/2017	15:45
74	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala de Curas	22,8	27,4	18/12/2017	15:48
75	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala Anestesia	23	27,6	18/12/2017	15:51
76	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala Consulta Cirugía	22,9	27,5	18/12/2017	15:54
77	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala Consulta Enfermería	23,1	24,1	18/12/2017	15:57
78	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Recepción consultas	22,5	24,1	18/12/2017	16:00
79	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Recepción consultas 2	22,4	26,4	18/12/2017	16:03
80	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Obstetricia	23	26,1	18/12/2017	16:06
81	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Ecografías	23,9	26,3	18/12/2017	16:09
82	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Consulta Ginecología	23,7	29,4	18/12/2017	16:12
83	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Consulta Ginecología 2	22,9	25,7	18/12/2017	16:15
84	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Sala de Curas	22,9	25,2	18/12/2017	16:18
85	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Pasillo	23	24	18/12/2017	16:21
86	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Sala de Reuniones	21,7	25,6	18/12/2017	16:24
87	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Pasillo	22	27,3	18/12/2017	16:27
88	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Consulta Endoscopia	22,2	29,6	18/12/2017	16:30
89	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Consulta Recuperación	22,6	25,3	18/12/2017	16:33
90	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Urodinamia	22,7	26,3	18/12/2017	16:36
91	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Consulta Endoscopia 2	22,8	25,3	18/12/2017	16:39
92	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Consulta Enfermería Endoscopia	22,8	27,3	18/12/2017	16:42
93	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Recepción consultas endoscopias	23,8	26,4	18/12/2017	16:45
94	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Psiquiatría Neurol.	Consulta Psiquiatría	24,1	24	18/12/2017	16:48
95	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Psiquiatría Neurol.	Consulta Neurología	24,3	22,3	18/12/2017	16:51
96	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Onco	Consulta Oncología	23,7	25	18/12/2017	16:54
97	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	23,8	25,1	18/12/2017	11:12
98	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	23,2	26,4	18/12/2017	11:15
99	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Sala Reuniones	23,1	23,8	18/12/2017	11:18
100	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Jefe Servicio	23,1	27,1	18/12/2017	11:21
101	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	23,1	25,7	18/12/2017	11:24
102	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	23	27	18/12/2017	11:27
103	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Sistemas E Inform.	Medicina Preventiva	24,5	25,5	18/12/2017	11:30
104	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Pasillo	21,5	26,9	18/12/2017	11:33
105	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Sistemas E Inform.	Dirección Administrativa	21,8	25	18/12/2017	11:36
106	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	22,7	23	18/12/2017	11:39
107	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Pasillo	21,2	25,3	18/12/2017	11:42
108	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Sala Reuniones	22,2	24,8	18/12/2017	11:45
109	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Registros	22,6	29,2	18/12/2017	11:48
110	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Jefe Gestión Económica	22,3	25,5	18/12/2017	11:51

	HOSPITAL	PLANTA	ZONA	ESTANCIA	TEMPERATURA (°C)	HUMEDAD (%)	Fecha mediciones	HORA
111	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir.Sistemas E Infor.	Secretaria	22,7	30	18/12/2017	11:54
112	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	RRHH	Zona Trabajo Administrativo	22,6	28,2	18/12/2017	11:57
113	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	RRHH	Jefe Recursos Humanos	22,7	26,6	18/12/2017	12:00
114	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Director Sistemas e Información	22,5	24,7	18/12/2017	12:03
115	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Gerencia y dir. Gestión	Despacho	22,7	26,3	18/12/2017	12:06
116	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Sala de Reuniones	22,9	24,9	18/12/2017	12:09
117	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Gerencia y dir. Gestión	Despacho	23,1	24	18/12/2017	12:12
118	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Gerencia y dir. Gestión	Zona Trabajo Administrativo	23,1	26,8	18/12/2017	12:15
119	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Despacho	22,8	26	18/12/2017	12:18
120	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Sala de reuniones	23,2	24	18/12/2017	12:21
121	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Despacho	23	27	18/12/2017	12:24
122	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Hosp. Pediátrica	Pasillo	22,2	25,5	18/12/2017	17:05
123	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Neonatologia	Habitación	23,2	24,4	18/12/2017	17:08
124	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Neonatologia	Habitación	23	25,8	18/12/2017	17:11
125	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Hosp. Obstérica	Pasillo	23,1	24,2	18/12/2017	17:14
126	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Pasillo	20,4	26,2	18/12/2017	17:17
127	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Pasillo	21,3	28,1	18/12/2017	17:20
128	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Box Agitados	22,3	24,4	18/12/2017	17:23
129	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Sala de Curas	23	24	18/12/2017	17:26
130	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Pasillo	23	24,6	18/12/2017	17:29
131	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Despacho Médico	22,5	25,6	18/12/2017	17:32
132	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Almacén	23,2	27,9	18/12/2017	17:35
133	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diálisis	Zona Diálisis Crónicos	24	22,6	18/12/2017	17:38
134	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diálisis	Zona Trabajo Administrativo	23,9	26,2	18/12/2017	17:41
135	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diálisis	Zona Diálisis Agudo	23,5	22,3	18/12/2017	17:44
136	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Admisión	Zona Acceso Personal	22	25,9	18/12/2017	17:47
137	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Admisión	Zona Atención al Paciente	23,2	27,9	18/12/2017	17:50
138	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Admisión	Zona Á rea Adiministrativa	23,7	24,3	18/12/2017	17:53
139	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Cafeterías	Cafetería	19,6	26,3	18/12/2017	17:56
140	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Hosp. Psiquiátrica	Sala Espera Familiares	22,9	24,2	18/12/2017	17:59
141	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	22,5	26,5	18/12/2017	7:15
142	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	22,7	25,1	18/12/2017	7:17
143	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	22,9	24,2	18/12/2017	7:19
144	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	22,9	27	18/12/2017	7:21
145	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	22,6	26,2	18/12/2017	7:23
146	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	23	24,2	18/12/2017	7:25
147	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	22,8	27,2	18/12/2017	7:27
148	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	22	25,7	18/12/2017	7:29
149	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	23	24,6	18/12/2017	7:31
150	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	22,8	26	18/12/2017	7:33
151	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	22,9	24,4	18/12/2017	7:35
152	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	20,2	26,4	18/12/2017	7:37
153	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	21,1	28,3	18/12/2017	7:39
154	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	22,1	24,6	18/12/2017	7:41
155	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	22,8	24,2	18/12/2017	7:43
156	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	22,8	24,8	18/12/2017	7:45
157	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	22,3	25,8	18/12/2017	7:47
158	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	23	28,1	18/12/2017	7:49
159	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	23,8	22,8	18/12/2017	7:51
160	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	23,7	26,4	18/12/2017	7:53
161	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	23,3	22,5	18/12/2017	7:55
162	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	21,8	26,1	18/12/2017	7:57
163	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	23	28,1	18/12/2017	7:59
164	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	23,5	24,5	18/12/2017	8:01
165	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	19,4	26,5	18/12/2017	8:03

3ª MEDICIÓN TEMPERATURA/HUMEDAD

	HOSPITAL	PLANTA	ZONA	ESTANCIA	TEMPERATURA (°C)	HUMEDAD (%)	Fecha mediciones	HORA
1	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Sala de reuniones	22,7	30,1	01/03/2018	9:00
2	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Despacho	22,6	31,6	01/03/2018	9:02
3	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Sala de reuniones	22,6	32,7	01/03/2018	9:04
4	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Mantenimiento	Pasillo	23	34,5	01/03/2018	9:06
5	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Lencería	Almacén Ropa Sucia	23,1	32,5	01/03/2018	9:08
6	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Mantenimiento	Taller Climatización	22,5	30,9	01/03/2018	9:10
7	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Suministros	Almacén Compras	22,1	30,7	01/03/2018	9:12
8	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cuidados Intensivos	Box Aislamiento	21,8	31,8	01/03/2018	9:14
9	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cuidados Intensivos	Box	21,7	32,9	01/03/2018	9:16
10	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cuidados Intensivos	Sala de espera familiares	22,6	33,8	01/03/2018	9:18
11	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	23	34,5	01/03/2018	9:20
12	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Puesto Control Enfermería	23,4	34,7	01/03/2018	9:22
13	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	23,4	35,1	01/03/2018	9:24
14	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Personal	23,7	35,3	01/03/2018	9:26
15	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	22,6	33,7	01/03/2018	9:28
16	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Puesto Control Enfermería	22,5	33,9	01/03/2018	9:30
17	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Limpia	22,3	32,1	01/03/2018	9:32
18	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de espera familiares	22,5	32	01/03/2018	9:34
19	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	23,1	33,2	01/03/2018	9:36
20	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Sala Técnica Polivalente	23,4	34,3	01/03/2018	9:38
21	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Sucia	21,9	35,8	01/03/2018	9:40
22	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	22,4	35,9	01/03/2018	9:42
23	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	23	36,1	01/03/2018	9:44
24	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	23,1	37,2	01/03/2018	9:46
25	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de Reuniones	23,2	31,7	01/03/2018	9:48
26	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	23,7	33,2	01/03/2018	9:50
27	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	23,1	33	01/03/2018	9:52
28	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	23	29,7	01/03/2018	9:54
29	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Administrativo	22,8	31,8	01/03/2018	9:56
30	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	22,6	32,2	01/03/2018	9:58
31	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	22,1	32,7	01/03/2018	10:00
32	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	22,2	33,1	01/03/2018	10:02
33	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	22,8	33,9	01/03/2018	10:04
34	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	22,9	34,2	01/03/2018	10:06
35	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Sucia	23,1	34,4	01/03/2018	10:08
36	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Personal	23,4	35,3	01/03/2018	10:10
37	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala Técnica Polivalente	23,5	36,2	01/03/2018	10:12
38	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	23,4	37,1	01/03/2018	10:14
39	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	23,4	36,9	01/03/2018	10:16
40	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	23,6	35,8	01/03/2018	10:18
41	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	22,8	31,2	01/03/2018	10:20
42	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	23,7	33,4	01/03/2018	10:22
43	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	21,2	36,2	01/03/2018	10:24
44	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de espera familiares	22,4	36,1	01/03/2018	10:26
45	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Despacho información	22,6	36,1	01/03/2018	10:28
46	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	22,6	34,3	01/03/2018	10:30
47	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Puesto Control Enfermería	22,5	33,5	01/03/2018	10:32
48	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala Técnica Polivalente	23	29,4	01/03/2018	10:34
49	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Limpia	22,9	30,1	01/03/2018	10:36
50	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Personal	23,2	30,3	01/03/2018	10:38
51	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	23,2	30,7	01/03/2018	10:40
52	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Vestuario	23,1	30,7	01/03/2018	10:42
53	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	23	31	01/03/2018	10:44
54	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Dilatación	23,3	31,8	01/03/2018	10:46
55	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Equipo Obstérico	Consultorio	23,4	33,9	01/03/2018	10:48

	HOSPITAL	PLANTA	ZONA	ESTANCIA	TEMPERATURA (°C)	HUMEDAD (%)	Fecha mediciones	HORA
56	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Monitorización	23,5	34,8	01/03/2018	10:50
57	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de espera familiares	23,4	33,7	01/03/2018	10:52
58	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Traumatología	Sala de espera traumatología	23,1	34,1	01/03/2018	10:54
59	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Pasillo	23,7	34,2	01/03/2018	10:56
60	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Sala Traumatología	23,9	33,8	01/03/2018	10:58
61	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Traumatología	Sala Traumatología 2	23,9	33,9	01/03/2018	11:00
62	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Sala de Yesos 1	22,2	36,2	01/03/2018	11:02
63	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Sala de Yesos 2	22,4	36	01/03/2018	11:04
64	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Campimetría	22,5	35,7	01/03/2018	11:06
65	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Sala de espera oftalmología	22,7	35,4	01/03/2018	11:08
66	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Recepción Consultas	24,1	34,6	01/03/2018	11:10
67	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Exploraciones Funcionales 1	24	34,8	01/03/2018	11:12
68	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Audiometría	24,1	34,6	01/03/2018	11:14
69	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Exploraciones Funcionales 2	23,7	34,9	01/03/2018	11:16
70	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Consulta 1	23,8	32,6	01/03/2018	11:18
71	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Consulta 3	23,7	30,9	01/03/2018	11:20
72	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Zona Polivalente Personal	23,4	33,5	01/03/2018	11:22
73	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Pasillo	24	32,4	01/03/2018	11:24
74	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala de Curas	24,1	37,2	01/03/2018	11:26
75	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala Anestesia	24,1	36,2	01/03/2018	11:28
76	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala Consulta Cirugía	23,7	35,6	01/03/2018	11:30
77	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala Consulta Enfermería	23,7	34,8	01/03/2018	11:32
78	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Recepción consultas	236	37,4	01/03/2018	11:34
79	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Recepción consultas 2	22,8	38,1	01/03/2018	11:36
80	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Obstetricia	22,1	32,3	01/03/2018	11:38
81	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Ecografías	23,6	31,2	01/03/2018	11:40
82	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Consulta Ginecología	23,6	34,7	01/03/2018	11:42
83	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Consulta Ginecología 2	23,7	30,8	01/03/2018	11:44
84	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Sala de Curas	24	29,6	01/03/2018	11:46
85	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Pasillo	24,1	28,7	01/03/2018	11:48
86	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Sala de Reuniones	24,1	30,3	01/03/2018	11:50
87	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Pasillo	23,8	31,3	01/03/2018	11:52
88	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Consulta Endoscopia	23,6	31,5	01/03/2018	11:54
89	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Consulta Recuperación	23,9	31,5	01/03/2018	11:56
90	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Urodinamia	22,6	31,6	01/03/2018	11:58
91	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Consulta Endoscopia 2	22,4	32,7	01/03/2018	12:00
92	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Consulta Enfermería Endoscopia	21,9	32,7	01/03/2018	12:02
93	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Recepción consultas endoscopias	22	32,8	01/03/2018	12:04
94	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Psiquiatría Neurol.	Consulta Psiquiatría	22,4	33	01/03/2018	12:06
95	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Psiquiatría Neurol.	Consulta Neurología	22,7	33,1	01/03/2018	12:08
96	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Onco	Consulta Oncología	22,9	31,9	01/03/2018	12:10
97	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	23,1	31,3	01/03/2018	12:12
98	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	23,2	34,5	01/03/2018	12:14
99	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Sala Reuniones	23,7	33,3	01/03/2018	12:16
100	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Jefe Servicio	22,8	37,4	01/03/2018	12:18
101	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	22,9	36,5	01/03/2018	12:20
102	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	23,4	29,8	01/03/2018	12:22
103	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Sistemas E Inform.	Medicina Preventiva	23,1	30,1	01/03/2018	12:24
104	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Pasillo	22,7	30,6	01/03/2018	12:26
105	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Sistemas E Inform.	Dirección Administrativa	22,1	30,9	01/03/2018	12:28
106	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	22	31,2	01/03/2018	12:30
107	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Pasillo	22,4	31,4	01/03/2018	12:32
108	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Sala Reuniones	22,8	31,4	01/03/2018	12:34
109	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Registros	23,7	31	01/03/2018	12:36
110	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Jefe Gestión Económica	23,5	29,8	01/03/2018	12:38

	HOSPITAL	PLANTA	ZONA	ESTANCIA	TEMPERATURA (°C)	HUMEDAD (%)	Fecha mediciones	HORA
111	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir.Sistemas E Infor.	Secretaria	23,5	32,3	01/03/2018	12:40
112	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	RRHH	Zona Trabajo Administrativo	23,6	32,5	01/03/2018	12:42
113	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	RRHH	Jefe Recursos Humanos	23,7	33,3	01/03/2018	12:44
114	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Director Sistemas e Información	22,8	36,1	01/03/2018	12:46
115	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Gerencia y dir. Gestión	Despacho	22,7	37,8	01/03/2018	12:48
116	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Sala de Reuniones	22,8	33,1	01/03/2018	12:50
117	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Gerencia y dir. Gestión	Despacho	22,1	34	01/03/2018	12:52
118	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Gerencia y dir. Gestión	Zona Trabajo Administrativo	22	33,5	01/03/2018	12:54
119	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Despacho	21,9	34,9	01/03/2018	12:56
120	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Sala de reuniones	21,8	32,3	01/03/2018	12:58
121	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Despacho	23,8	30,9	01/03/2018	13:00
122	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Hosp. Pediátrica	Pasillo	22,9	33,1	01/03/2018	13:02
123	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Neonatologia	Habitación	23	32,9	01/03/2018	13:04
124	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Neonatologia	Habitación	23,1	32,9	01/03/2018	13:06
125	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Hosp. Obstérica	Pasillo	23,3	30,9	01/03/2018	13:08
126	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Pasillo	23,8	31,3	01/03/2018	13:10
127	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Pasillo	24,5	32,2	01/03/2018	13:12
128	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Box Agitados	24,3	33,8	01/03/2018	13:14
129	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Sala de Curas	24,7	34,5	01/03/2018	13:16
130	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Pasillo	22,7	33,2	01/03/2018	13:18
131	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Despacho Médico	21,9	31,9	01/03/2018	13:20
132	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Almacén	22,3	33	01/03/2018	13:22
133	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diálisis	Zona Diálisis Crónicos	22,7	32,8	01/03/2018	13:24
134	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diálisis	Zona Trabajo Administrativo	22,7	33,7	01/03/2018	13:26
135	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diálisis	Zona Diálisis Agudo	22,9	34,5	01/03/2018	13:28
136	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Admisión	Zona Acceso Personal	23	33,2	01/03/2018	13:30
137	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Admisión	Zona Atención al Paciente	23,1	31,9	01/03/2018	13:32
138	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Admisión	Zona Á rea Adiministrativa	23,3	33,4	01/03/2018	13:34
139	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Cafeterías	Cafetería	23,1	33	01/03/2018	13:36
140	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Hosp. Psiquiátrica	Sala Espera Familiares	23,8	34,6	01/03/2018	13:38
141	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 1	22,8	34,3	01/03/2018	15:00
142	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 1	22,8	34,4	01/03/2018	15:02
143	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 1	23,1	34	01/03/2018	15:04
144	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 2	23,2	35,1	01/03/2018	15:06
145	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 2	22,5	35,2	01/03/2018	15:08
146	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 2	22,7	34,6	01/03/2018	15:10
147	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 3	22	34,8	01/03/2018	15:12
148	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 3	21,9	34,1	01/03/2018	15:14
149	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 3	21,9	34,7	01/03/2018	15:16
150	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 4	21,9	33,5	01/03/2018	15:18
151	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 4	21,8	32,8	01/03/2018	15:20
152	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 4	22	33,7	01/03/2018	15:22
153	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 5	22,2	30,8	01/03/2018	15:24
154	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 5	22,3	30,4	01/03/2018	15:26
155	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 5	22,1	32,3	01/03/2018	15:28
156	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 6	23,3	32,4	01/03/2018	15:30
157	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 6	23	32,5	01/03/2018	15:32
158	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 6	23,3	33,3	01/03/2018	15:34
159	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 7	23,2	34,1	01/03/2018	15:36
160	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 7	23,3	35	01/03/2018	15:38
161	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 7	21,4	40,7	01/03/2018	15:40
162	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 8	20,5	35,5	01/03/2018	15:42
163	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 8	20,2	35,4	01/03/2018	15:44
164	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 9	20,8	39,5	01/03/2018	15:46
165	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 9	20,3	40,7	01/03/2018	15:48

RESUMEN TEMPERATURA/HUMEDAD

Medición	Parámetro de confort	Zona	Nº Mediciones	RITE		Zona	Nº Mediciones	UNE 100713	
				Adecuadas	No Adecuadas			Adecuadas	No Adecuadas
1ª	Temperatura	Centro Sanitario	165	63 (38,2%)	102 (61,8%)	Centro Sanitario	140	10 (7,1%)	130 (92,9%)
						Bloque Quirúrgico	25	0 (0%)	25 (100%)
	Humedad	Centro Sanitario	165	0 (0%)	165 (100%)	Centro Sanitario	140	0 (0%)	140 (100%)
						Bloque Quirúrgico	25	0 (0%)	25 (100%)
2ª	Temperatura	Centro Sanitario	165	97 (58,8%)	68 (41,2%)	Centro Sanitario	140	5 (3,6%)	135 (96,4%)
						Bloque Quirúrgico	25	21 (84%)	4 (16%)
	Humedad	Centro Sanitario	165	0 (0%)	165 (100%)	Centro Sanitario	140	0 (0%)	140 (100%)
						Bloque Quirúrgico	25	0 (0%)	25 (100%)
3ª	Temperatura	Centro Sanitario	165	84 (50,9%)	81 (49,1%)	Centro Sanitario	140	13 (9,3%)	127 (90,7%)
						Bloque Quirúrgico	25	16 (64%)	9 (36%)
	Humedad	Centro Sanitario	165	2 (1,2%)	163 (98,8%)	Centro Sanitario	140	0 (0%)	140 (100%)
						Bloque Quirúrgico	25	0 (0%)	25 (100%)
TOTAL	Temperatura	Centro Sanitario	495	244 (49,3%)	251 (50,7%)	Centro Sanitario	420	28 (6,7%)	392 (93,3%)
						Bloque Quirúrgico	75	37 (49,3%)	38 (50,7%)
	Humedad	Centro Sanitario	495	2 (0,4%)	493 (99,6%)	Centro Sanitario	420	0 (0%)	420 (100%)
						Bloque Quirúrgico	75	0 (0%)	75 (100%)

1ª MEDICIÓN LUXOMETRÍA/VELOCIDAD RESIDUAL

	HOSPITAL	PLANTA	ZONA	ESTANCIA	Nivel de iluminación (lux)	Velocidad residual (m/s)	Fecha mediciones	HORA
1	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Sala de reuniones	1195		23/11/2017	10:00
2	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Despacho	1080		23/11/2017	10:03
3	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Sala de reuniones	606		23/11/2017	10:06
4	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Mantenimiento	Pasillo	414	0,01	23/11/2017	10:09
5	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Lencería	Almacén Ropa Sucia	296		23/11/2017	10:12
6	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Mantenimiento	Taller Climatización	620		23/11/2017	10:15
7	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Suministros	Almacén Compras	743		23/11/2017	10:18
8	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cuidados Intensivos	Box Aislamiento	750		23/11/2017	10:21
9	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cuidados Intensivos	Box	956		23/11/2017	10:24
10	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cuidados Intensivos	Sala de espera familiares	330	0,01	23/11/2017	10:27
11	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	376	0,01	23/11/2017	10:30
12	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Puesto Control Enfermería	495	0,02	23/11/2017	10:33
13	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	588		23/11/2017	10:36
14	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Personal	290		23/11/2017	10:39
15	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	465	0,01	23/11/2017	10:42
16	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Puesto Control Enfermería	541	0	23/11/2017	10:45
17	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Limpia	566		24/11/2017	8:30
18	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de espera familiares	126,7	0	24/11/2017	8:33
19	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	1142		24/11/2017	8:36
20	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Sala Técnica Polivalente	530		24/11/2017	8:39
21	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Sucia	527		24/11/2017	8:42
22	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	1360		24/11/2017	8:45
23	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	201		24/11/2017	8:48
24	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	243	0,01	23/11/2017	10:52
25	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de Reuniones	370		23/11/2017	10:55
26	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	419	0,01	23/11/2017	10:58
27	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	340	0,01	23/11/2017	11:01
28	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	341	0,02	24/11/2017	8:51
29	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Administrativo	225		24/11/2017	8:54
30	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	260	0,02	24/11/2017	8:57
31	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	271	0,01	23/11/2017	11:04
32	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	1787		23/11/2017	11:07
33	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	1056		23/11/2017	11:10
34	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	193		23/11/2017	11:13
35	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Sucia	663		23/11/2017	11:16
36	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Personal	3380		23/11/2017	11:19
37	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala Técnica Polivalente	1450		23/11/2017	11:22
38	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	486	0,01	23/11/2017	11:25
39	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	691		23/11/2017	11:28
40	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	388	0,01	23/11/2017	11:31
41	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	1404		23/11/2017	11:34
42	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	347		23/11/2017	11:37
43	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	849		23/11/2017	11:40
44	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de espera familiares	137,5	0,01	23/11/2017	11:43
45	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Despacho información	284	0,02	23/11/2017	11:46
46	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	612	0	23/11/2017	11:49
47	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Puesto Control Enfermería	664	0,02	23/11/2017	11:52
48	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala Técnica Polivalente	368		23/11/2017	11:55
49	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Limpia	703		23/11/2017	11:58
50	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Personal	937		23/11/2017	12:01
51	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	736	0,02	23/11/2017	12:04
52	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Vestuario	670		23/11/2017	12:07
53	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	703	0,01	23/11/2017	12:10
54	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Dilatación	251		23/11/2017	12:13
55	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Equipo Obstérico	Consultorio	1087		23/11/2017	12:16

	HOSPITAL	PLANTA	ZONA	ESTANCIA	Nivel de iluminación (lux)	Velocidad residual (m/s)	Fecha mediciones	HORA
56	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Monitorización	1120		23/11/2017	12:19
57	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de espera familiares	1410	0,01	23/11/2017	12:22
58	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Traumatología	Sala de espera traumatología	599	0,01	23/11/2017	12:25
59	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Pasillo	538		23/11/2017	12:28
60	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Sala Traumatología	683		23/11/2017	12:31
61	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Traumatología	Sala Traumatología 2	690		24/11/2017	10:50
62	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Sala de Yesos 1	999		24/11/2017	10:53
63	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Sala de Yesos 2	687		24/11/2017	10:56
64	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Campimetría	553		24/11/2017	10:59
65	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Sala de espera oftalmología	63,3	0,01	24/11/2017	11:02
66	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Recepción Consultas	13,32	0,01	24/11/2017	11:05
67	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Exploraciones Funcionales 1	469		24/11/2017	11:08
68	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Audiometría	1462		24/11/2017	11:11
69	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Exploraciones Funcionales 2	650		24/11/2017	11:14
70	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Consulta 1	448		24/11/2017	11:17
71	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Consulta 3	1104		24/11/2017	11:20
72	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Zona Polivalente Personal	260		24/11/2017	11:23
73	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Pasillo	522	0,02	24/11/2017	11:26
74	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala de Curas	700		24/11/2017	11:29
75	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala Anestesia	717		24/11/2017	11:32
76	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala Consulta Cirugía	917		24/11/2017	11:35
77	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala Consulta Enfermería	565		24/11/2017	11:38
78	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Recepción consultas	478	0,01	24/11/2017	11:41
79	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Recepción consultas 2	594	0,01	24/11/2017	11:44
80	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Obstetricia	658		24/11/2017	11:47
81	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Ecografías	743		24/11/2017	11:50
82	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Consulta Ginecología	582		24/11/2017	11:53
83	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Consulta Ginecología 2	880		24/11/2017	11:56
84	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Sala de Curas	135		24/11/2017	11:59
85	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Pasillo	501	0,01	24/11/2017	12:02
86	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Sala de Reuniones	635		24/11/2017	12:05
87	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Pasillo	205		24/11/2017	12:08
88	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Consulta Endoscopia	949		24/11/2017	12:11
89	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Consulta Recuperación	463		24/11/2017	12:14
90	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Urodinamia	774		24/11/2017	12:17
91	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Consulta Endoscopia 2	872		24/11/2017	12:20
92	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Consulta Enfermería Endoscopia	1390		24/11/2017	12:23
93	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Recepción consultas endoscopias	182		24/11/2017	12:26
94	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Psiquiatría Neurol.	Consulta Psiquiatría	1060		24/11/2017	12:29
95	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Psiquiatría Neurol.	Consulta Neurología	460		24/11/2017	12:32
96	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Onco	Consulta Oncología	1421		24/11/2017	12:35
97	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	741		24/11/2017	9:00
98	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	125		24/11/2017	9:03
99	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Sala Reuniones	545		24/11/2017	9:06
100	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Jefe Servicio	662		24/11/2017	9:09
101	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	192		24/11/2017	9:12
102	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	3960		24/11/2017	9:15
103	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Sistemas E Inform.	Medicina Preventiva	526		24/11/2017	9:18
104	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Pasillo	642	0,01	24/11/2017	9:21
105	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Sistemas E Inform.	Dirección Administrativa	630		24/11/2017	9:24
106	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	8200		24/11/2017	9:27
107	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Pasillo	2310		24/11/2017	9:30
108	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Sala Reuniones	552		24/11/2017	9:33
109	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Registros	1025		24/11/2017	9:36
110	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Jefe Gestión Económica	545		24/11/2017	9:39

	HOSPITAL	PLANTA	ZONA	ESTANCIA	Nivel de iluminación (lux)	Velocidad residual (m/s)	Fecha mediciones	HORA
111	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir.Sistemas E Infor.	Secretaria	1045		24/11/2017	9:42
112	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	RRHH	Zona Trabajo Administrativo	884		24/11/2017	9:45
113	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	RRHH	Jefe Recursos Humanos	267		24/11/2017	9:48
114	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Director Sistemas e Información	1953		24/11/2017	9:51
115	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Gerencia y dir. Gestión	Despacho	855		24/11/2017	9:54
116	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Sala de Reuniones	1167		24/11/2017	9:57
117	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Gerencia y dir. Gestión	Despacho	368		24/11/2017	10:00
118	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Gerencia y dir. Gestión	Zona Trabajo Administrativo	945		24/11/2017	10:03
119	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Despacho	1314		24/11/2017	10:06
120	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Sala de reuniones	800		24/11/2017	10:09
121	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Despacho	522		24/11/2017	10:12
122	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Hosp. Pediátrica	Pasillo	395,5	0,01	24/11/2017	12:45
123	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Neonatologia	Habitación	391,5		24/11/2017	12:48
124	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Neonatologia	Habitación	228		24/11/2017	12:51
125	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Hosp. Obstérica	Pasillo	299	0,02	24/11/2017	12:54
126	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Pasillo	434	0,01	24/11/2017	12:57
127	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Pasillo	443	0,02	23/11/2017	13:00
128	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Box Agitados	309		23/11/2017	13:03
129	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Sala de Curas	334		23/11/2017	13:06
130	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Pasillo	315,5	0	23/11/2017	13:09
131	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Despacho Médico	276		23/11/2017	13:12
132	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Almacén	223		23/11/2017	13:15
133	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diálisis	Zona Diálisis Crónicos	284	0,01	23/11/2017	13:18
134	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diálisis	Zona Trabajo Administrativo	295		23/11/2017	13:21
135	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diálisis	Zona Diálisis Agudo	249		23/11/2017	13:24
136	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Admisión	Zona Acceso Personal	345	0,03	23/11/2017	13:27
137	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Admisión	Zona Atención al Paciente	232		23/11/2017	13:30
138	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Admisión	Zona Á rea Adiministrativa	165		23/11/2017	13:33
139	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Cafeterías	Cafetería	292	0,03	23/11/2017	13:36
140	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Hosp. Psiquiátrica	Sala Espera Familiares	204	0,01	23/11/2017	13:39
141	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 1	264		23/11/2017	7:15
142	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 1	350		23/11/2017	7:17
143	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 1	366		23/11/2017	7:19
144	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 2	243		23/11/2017	7:21
145	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 2	309		23/11/2017	7:23
146	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 2	258		23/11/2017	7:25
147	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 3	255		23/11/2017	7:27
148	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 3	333		23/11/2017	7:29
149	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 3	270		23/11/2017	7:31
150	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 4	344		23/11/2017	7:33
151	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 4	332		23/11/2017	7:35
152	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 4	150		23/11/2017	7:37
153	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 5	258		23/11/2017	7:39
154	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 5	375		23/11/2017	7:41
155	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 5	437		23/11/2017	7:43
156	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 6	436		23/11/2017	7:45
157	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 6	416		23/11/2017	7:47
158	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 6	492		23/11/2017	7:49
159	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 7	453		23/11/2017	7:51
160	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 7	442		23/11/2017	7:53
161	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 7	552		23/11/2017	7:55
162	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 8	522		23/11/2017	7:57
163	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 8	515		23/11/2017	7:59
164	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 9	634		23/11/2017	8:01
165	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófano 9	600		23/11/2017	8:03

2ª MEDICIÓN LUXOMETRÍA/VELOCIDAD RESIDUAL/SONOMETRÍA

	HOSPITAL	PLANTA	ZONA	ESTANCIA	Nivel de iluminación (lux)	Sonometría (dB)	Velocidad residual (m/s)	Fecha mediciones	HORA
1	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Sala de reuniones	1087	34,7	0	01/03/2018	9:00
2	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Despacho	955	29,2		01/03/2018	9:02
3	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Sala de reuniones	562	31,8		01/03/2018	9:04
4	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Mantenimiento	Pasillo	394	25,4	0,01	01/03/2018	9:06
5	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Lencería	Almacén Ropa Sucia	284	31,8		01/03/2018	9:08
6	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Mantenimiento	Taller Climatización	343	32,3		01/03/2018	9:10
7	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Suministros	Almacén Compras	327	33,3		01/03/2018	9:12
8	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cuidados Intensivos	Box Aislamiento	411	34,1	0	01/03/2018	9:14
9	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cuidados Intensivos	Box	562	34,2		01/03/2018	9:16
10	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cuidados Intensivos	Sala de espera familiares	241	36,3		01/03/2018	9:18
11	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	255	30,9		01/03/2018	9:20
12	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Puesto Control Enfermería	169	32,8	0,01	01/03/2018	9:22
13	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	348	29,1		01/03/2018	9:24
14	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Personal	377	32,8	0,01	01/03/2018	9:26
15	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	199	33,1		01/03/2018	9:28
16	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Puesto Control Enfermería	232	34,2		01/03/2018	9:30
17	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Limpia	354	35,7		01/03/2018	9:32
18	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de espera familiares	371	36,9		01/03/2018	9:34
19	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	470	33,1	0,01	01/03/2018	9:36
20	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Sala Técnica Polivalente	502	29,8		01/03/2018	9:38
21	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Sucia	291	27,6		01/03/2018	9:40
22	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	388	24,3		01/03/2018	9:42
23	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	404	22,1		01/03/2018	9:44
24	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	370	23	0,02	01/03/2018	9:46
25	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de Reuniones	221	24,2		01/03/2018	9:48
26	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	509	24,7		01/03/2018	9:50
27	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	288	29,9	0,01	01/03/2018	9:52
28	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	181	37,3	0,02	01/03/2018	9:54
29	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Administrativo	290	34,5		01/03/2018	9:56
30	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	382	40,2		01/03/2018	9:58
31	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	493	34,6		01/03/2018	10:00
32	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	417	46,4	0	01/03/2018	10:02
33	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	522	51	0	01/03/2018	10:04
34	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	365	48,7	0	01/03/2018	10:06
35	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Sucia	478	53,1		01/03/2018	10:08
36	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Personal	344	42,4		01/03/2018	10:10
37	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala Técnica Polivalente	243	44,7		01/03/2018	10:12
38	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	182	38,5		01/03/2018	10:14
39	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	245	33,6		01/03/2018	10:16
40	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	367	37,3		01/03/2018	10:18
41	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	241	34,7		01/03/2018	10:20
42	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	1372	38,1	0	01/03/2018	10:22
43	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	345	39,2		01/03/2018	10:24
44	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de espera familiares	598	39,8	0,01	01/03/2018	10:26
45	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Despacho información	121	38,4	0,01	01/03/2018	10:28
46	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	242	37	0,01	01/03/2018	10:30
47	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Puesto Control Enfermería	364	42,2	0,02	01/03/2018	10:32
48	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala Técnica Polivalente	403	42,3		01/03/2018	10:34
49	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Limpia	337	42,2		01/03/2018	10:36
50	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Personal	251	45,5	0	01/03/2018	10:38
51	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	299	45,8	0	01/03/2018	10:40
52	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Vestuario	287	45,6		01/03/2018	10:42
53	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	353	45		01/03/2018	10:44
54	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Dilatación	250	42,3		01/03/2018	10:46
55	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Equipo Obstérico	Consultorio	148	43,1		01/03/2018	10:48

	HOSPITAL	PLANTA	ZONA	ESTANCIA	Nivel de iluminación (lux)	Sonometría (dB)	Velocidad residual (m/s)	Fecha mediciones	HORA
56	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Monitorización	160	43,3		01/03/2018	10:50
57	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de espera familiares	222	43,3	0	01/03/2018	10:52
58	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Traumatología	Sala de espera traumatología	374	44	0,01	01/03/2018	10:54
59	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Pasillo	141	43,1		01/03/2018	10:56
60	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Sala Traumatología	292	44,2		01/03/2018	10:58
61	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Traumatología	Sala Traumatología 2	345	46,2		01/03/2018	11:00
62	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Sala de Yesos 1	254	42,1		01/03/2018	11:02
63	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Sala de Yesos 2	331	43,8		01/03/2018	11:04
64	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Campimetría	114	42,7		01/03/2018	11:06
65	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Sala de espera oftalmología	233	38,9		01/03/2018	11:08
66	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Recepción Consultas	310	36,2		01/03/2018	11:10
67	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Exploraciones Funcionales 1	460	38,1		01/03/2018	11:12
68	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Audiometría	374	43,8		01/03/2018	11:14
69	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Exploraciones Funcionales 2	249	42,1		01/03/2018	11:16
70	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Consulta 1	163	43,8		01/03/2018	11:18
71	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Consulta 3	211	44,5		01/03/2018	11:20
72	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Zona Polivalente Personal	348	43,3	0	01/03/2018	11:22
73	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Pasillo	321	46,1	0	01/03/2018	11:24
74	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala de Curas	366	47,8		01/03/2018	11:26
75	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala Anestesia	445	49		01/03/2018	11:28
76	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala Consulta Cirugía	414	43,3		01/03/2018	11:30
77	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala Consulta Enfermería	318	38,1	0	01/03/2018	11:32
78	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Recepción consultas	501	37,6		01/03/2018	11:34
79	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Recepción consultas 2	445	36		01/03/2018	11:36
80	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Obstetricia	322	33,6		01/03/2018	11:38
81	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Ecografías	442	36,1		01/03/2018	11:40
82	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Consulta Ginecología	387	35,8	0	01/03/2018	11:42
83	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Consulta Ginecología 2	251	33,2		01/03/2018	11:44
84	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Sala de Curas	256	33,4		01/03/2018	11:46
85	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Pasillo	396	41,6	0,01	01/03/2018	11:48
86	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Sala de Reuniones	353	43,4		01/03/2018	11:50
87	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Pasillo	458	37,5		01/03/2018	11:52
88	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Consulta Endoscopia	489	36,9		01/03/2018	11:54
89	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Consulta Recuperación	416	36,7		01/03/2018	11:56
90	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Urodinamia	367	39,9		01/03/2018	11:58
91	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Consulta Endoscopia 2	372	43,1		01/03/2018	12:00
92	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Consulta Enfermería Endoscopia	411	43,3		01/03/2018	12:02
93	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Recepción consultas endoscopias	312	43,7		01/03/2018	12:04
94	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Psiquiatría Neurol.	Consulta Psiquiatría	297	44,8		01/03/2018	12:06
95	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Psiquiatría Neurol.	Consulta Neurología	308	46,1		01/03/2018	12:08
96	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Onco	Consulta Oncología	301	43,6		01/03/2018	12:10
97	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	291	42,5		01/03/2018	12:12
98	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	445	44,7		01/03/2018	12:14
99	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Sala Reuniones	562	29,9		01/03/2018	12:16
100	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Jefe Servicio	344	34,3		01/03/2018	12:18
101	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	466	34,3		01/03/2018	12:20
102	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	556	33,1		01/03/2018	12:22
103	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Sistemas E Inform.	Medicina Preventiva	391	41,8		01/03/2018	12:24
104	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Pasillo	443	39,2	0,01	01/03/2018	12:26
105	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Sistemas E Inform.	Dirección Administrativa	291	38,1		01/03/2018	12:28
106	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	197	39,7		01/03/2018	12:30
107	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Pasillo	285	42,5	0,02	01/03/2018	12:32
108	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Sala Reuniones	310	31,8		01/03/2018	12:34
109	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Registros	284	33,2		01/03/2018	12:36
110	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Jefe Gestión Económica	340	41,4		01/03/2018	12:38

	HOSPITAL	PLANTA	ZONA	ESTANCIA	Nivel de iluminación (lux)	Sonometría (dB)	Velocidad residual (m/s)	Fecha mediciones	HORA
111	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir.Sistemas E Infor.	Secretaria	234	32,8		01/03/2018	12:40
112	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	RRHH	Zona Trabajo Administrativo	435	34,9		01/03/2018	12:42
113	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	RRHH	Jefe Recursos Humanos	543	37,5		01/03/2018	12:44
114	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Director Sistemas e Información	267	34,4		01/03/2018	12:46
115	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Gerencia y dir. Gestión	Despacho	368	36,2		01/03/2018	12:48
116	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Sala de Reuniones	445	35,1		01/03/2018	12:50
117	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Gerencia y dir. Gestión	Despacho	314	47		01/03/2018	12:52
118	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Gerencia y dir. Gestión	Zona Trabajo Administrativo	601	36,4		01/03/2018	12:54
119	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Despacho	342	28,3		01/03/2018	12:56
120	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Sala de reuniones	402	34,2		01/03/2018	12:58
121	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Despacho	335	33,4	0,01	01/03/2018	13:00
122	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Hosp. Pediátrica	Pasillo	401	37,3		01/03/2018	13:02
123	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Neonatologia	Habitación	382	38,1		01/03/2018	13:04
124	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Neonatologia	Habitación	235	38,3		01/03/2018	13:06
125	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Hosp. Obstérica	Pasillo	249	44,2	0,02	01/03/2018	13:08
126	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Pasillo	363	47,1	0,01	01/03/2018	13:10
127	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Pasillo	464	47	0,02	01/03/2018	13:12
128	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Box Agitados	371	38,6		01/03/2018	13:14
129	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Sala de Curas	472	40,4		01/03/2018	13:16
130	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Pasillo	360	36,8		01/03/2018	13:18
131	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Despacho Médico	292	41,9		01/03/2018	13:20
132	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Almacén	131	42,3	0	01/03/2018	13:22
133	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diálisis	Zona Diálisis Crónicos	238	36,7		01/03/2018	13:24
134	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diálisis	Zona Trabajo Administrativo	322	43,4		01/03/2018	13:26
135	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diálisis	Zona Diálisis Agudo	267	45,4		01/03/2018	13:28
136	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Admisión	Zona Acceso Personal	445	43,2	0,02	01/03/2018	13:30
137	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Admisión	Zona Atención al Paciente	284	41,9		01/03/2018	13:32
138	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Admisión	Zona Á rea Adiministrativa	152	48		01/03/2018	13:34
139	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Cafeterías	Cafetería	310	46,5	0,01	01/03/2018	13:36
140	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Hosp. Psiquiátrica	Sala Espera Familiares	187	39,9	0,01	01/03/2018	13:38
141	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	303	36,6		01/03/2018	15:00
142	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	370	34,3		01/03/2018	15:02
143	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	479	33,8	0	01/03/2018	15:04
144	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	217	36,7		01/03/2018	15:06
145	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	265	44,1		01/03/2018	15:08
146	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	248	44,3		01/03/2018	15:10
147	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	374	44		01/03/2018	15:12
148	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	470	47,3	0	01/03/2018	15:14
149	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	299	49,5	0	01/03/2018	15:16
150	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	360	41,3		01/03/2018	15:18
151	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	421	39,8		01/03/2018	15:20
152	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	125	38,7		01/03/2018	15:22
153	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	244	38,7		01/03/2018	15:24
154	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	293	37,1		01/03/2018	15:26
155	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	462	40,2		01/03/2018	15:28
156	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	397	41,1		01/03/2018	15:30
157	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	505	43,5		01/03/2018	15:32
158	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	512	43,3		01/03/2018	15:34
159	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	416	47,8		01/03/2018	15:36
160	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	388	49		01/03/2018	15:38
161	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	503	29,3		01/03/2018	15:40
162	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	526	33		01/03/2018	15:42
163	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	491	30,2		01/03/2018	15:44
164	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	638	28,7		01/03/2018	15:46
165	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	594	33,1		01/03/2018	15:48

3ª MEDICIÓN LUXOMETRÍA/VELOCIDAD RESIDUAL/SONOMETRÍA

	HOSPITAL	PLANTA	ZONA	ESTANCIA	Nivel de iluminación (lux)	Sonometría (dB)	Velocidad residual (m/s)	Fecha mediciones	HORA
1	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Sala de reuniones	956	31,6	0	01/03/2018	18:00
2	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Despacho	971	33,2		01/03/2018	18:02
3	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Sala de reuniones	543	30,9		01/03/2018	18:04
4	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Mantenimiento	Pasillo	388	31,7	0,01	01/03/2018	18:06
5	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Lencería	Almacén Ropa Sucia	289	31,4		01/03/2018	18:08
6	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Mantenimiento	Taller Climatización	371	29,8		01/03/2018	18:10
7	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	SÓTANO -1	Suministros	Almacén Compras	303	34,5		01/03/2018	18:12
8	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cuidados Intensivos	Box Aislamiento	405	29,9	0	01/03/2018	18:14
9	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cuidados Intensivos	Box	601	32,3		01/03/2018	18:16
10	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cuidados Intensivos	Sala de espera familiares	248	34,6		01/03/2018	18:18
11	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	301	33,3	0,01	01/03/2018	18:20
12	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Puesto Control Enfermería	271	31,4	0,01	01/03/2018	18:22
13	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	273	36		01/03/2018	18:24
14	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Personal	199	32,5		01/03/2018	18:26
15	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	242	30,1		01/03/2018	18:28
16	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Puesto Control Enfermería	308	30,9	0,01	01/03/2018	18:30
17	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Limpia	343	32,8		01/03/2018	18:32
18	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de espera familiares	450	32,7	0,02	01/03/2018	18:34
19	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	358	34,5		01/03/2018	18:36
20	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Sala Técnica Polivalente	374	33,4		01/03/2018	18:38
21	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Sucia	255	30,6		01/03/2018	18:40
22	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	453	30,1		01/03/2018	18:42
23	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	310	29,8		01/03/2018	18:44
24	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	482	29,9	0,02	01/03/2018	18:46
25	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de Reuniones	237	32,6	0,01	01/03/2018	18:48
26	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	259	33,8		01/03/2018	18:50
27	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	397	32,7		01/03/2018	18:52
28	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	136	34,1	0,02	01/03/2018	18:54
29	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Administrativo	444	34,9		01/03/2018	18:56
30	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	391	36	0	01/03/2018	18:58
31	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	452	33,1		01/03/2018	19:00
32	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	377	28,6		01/03/2018	19:02
33	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	369	29,3		01/03/2018	19:04
34	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	411	32,4		01/03/2018	19:06
35	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Sucia	287	34,7		01/03/2018	19:08
36	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Personal	400	37,1		01/03/2018	19:10
37	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala Técnica Polivalente	246	33,9		01/03/2018	19:12
38	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	251	35,2		01/03/2018	19:14
39	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	354	36,4		01/03/2018	19:16
40	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	468	35,9		01/03/2018	19:18
41	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	237	29,9		01/03/2018	19:20
42	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	1281	29,3	0	01/03/2018	19:22
43	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Habitación	281	30,7		01/03/2018	19:24
44	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de espera familiares	411	38,8	0,02	01/03/2018	19:26
45	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Despacho información	108	32,4	0,01	01/03/2018	19:28
46	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	241	32,6	0,01	01/03/2018	19:30
47	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Puesto Control Enfermería	360	32,6	0,03	01/03/2018	19:32
48	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala Técnica Polivalente	433	33,7		01/03/2018	19:34
49	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Limpia	337	35,9		01/03/2018	19:36
50	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Trabajo Personal	354	35,6	0	01/03/2018	19:38
51	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	255	40,1	0	01/03/2018	19:40
52	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Vestuario	448	36,7		01/03/2018	19:42
53	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Pasillo	526	40,4		01/03/2018	19:44
54	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Zona Dilatación	387	33,5		01/03/2018	19:46
55	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Equipo Obstérico	Consultorio	249	35,1		01/03/2018	19:48

	HOSPITAL	PLANTA	ZONA	ESTANCIA	Nivel de iluminación (lux)	Sonometría (dB)	Velocidad residual (m/s)	Fecha mediciones	HORA
56	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Monitorización	346	34,8		01/03/2018	19:50
57	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	UD Hospitalización Convencional	Sala de espera familiares	231	32,6	0	01/03/2018	19:52
58	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Traumatología	Sala de espera traumatología	238	37,3	0,01	01/03/2018	19:54
59	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Pasillo	301	39,8		01/03/2018	19:56
60	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Sala Traumatología	456	33,2		01/03/2018	19:58
61	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Traumatología	Sala Traumatología 2	347	34,5		01/03/2018	20:00
62	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Sala de Yesos 1	382	32,1		01/03/2018	20:02
63	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Pediatría	Sala de Yesos 2	294	29,7		01/03/2018	20:04
64	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Campimetría	263	30,3		01/03/2018	20:06
65	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Sala de espera oftalmología	227	34,5		01/03/2018	20:08
66	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Recepción Consultas	356	36,3		01/03/2018	20:10
67	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Exploraciones Funcionales 1	388	39,7		01/03/2018	20:12
68	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Audiometría	225	40		01/03/2018	20:14
69	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Exploraciones Funcionales 2	197	41,6		01/03/2018	20:16
70	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Consulta 1	185	36,5		01/03/2018	20:18
71	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Consulta 3	242	34,5		01/03/2018	20:20
72	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Oftalmología	Zona Polivalente Personal	238	36,3	0	01/03/2018	20:22
73	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Pasillo	414	33,3	0	01/03/2018	20:24
74	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala de Curas	385	34,6		01/03/2018	20:26
75	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala Anestesia	397	30,1		01/03/2018	20:28
76	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala Consulta Cirugía	412	28,7		01/03/2018	20:30
77	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Sala Consulta Enfermería	288	28,4	0	01/03/2018	20:32
78	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Recepción consultas	274	30,1		01/03/2018	20:34
79	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Recepción consultas 2	223	32,8		01/03/2018	20:36
80	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Obstetricia	319	31,6		01/03/2018	20:38
81	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Ecografías	338	30,7		01/03/2018	20:40
82	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Consulta Ginecología	401	31,2	0	01/03/2018	20:42
83	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Cirugía CX	Consulta Ginecología 2	367	31,3		01/03/2018	20:44
84	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Sala de Curas	453	30,4		01/03/2018	20:46
85	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Pasillo	245	31,9	0,01	01/03/2018	20:48
86	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Sala de Reuniones	247	32,3		01/03/2018	20:50
87	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Pasillo	268	33,5		01/03/2018	20:52
88	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Consulta Endoscopia	236	34		01/03/2018	20:54
89	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Consulta Recuperación	198	32,7		01/03/2018	20:56
90	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Urodinamia	167	29,9		01/03/2018	20:58
91	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Gine y Obste	Consulta Endoscopia 2	289	28,1		01/03/2018	21:00
92	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Consulta Enfermería Endoscopia	325	39,4		01/03/2018	21:02
93	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Endosc. Urológicas	Recepción consultas endoscopias	280	39,1		01/03/2018	21:04
94	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Psiquiatría Neurol.	Consulta Psiquiatría	341	42,7		01/03/2018	21:06
95	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Psiquiatría Neurol.	Consulta Neurología	470	43,9		01/03/2018	21:08
96	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	1ª	Onco	Consulta Oncología	286	40,1		01/03/2018	21:10
97	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	391	36,3		01/03/2018	21:12
98	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	236	41,2		01/03/2018	21:14
99	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Sala Reuniones	149	33,9		01/03/2018	21:16
100	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Jefe Servicio	185	38,2		01/03/2018	21:18
101	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	247	34,6		01/03/2018	21:20
102	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	404	34,9		01/03/2018	21:22
103	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Sistemas E Inform.	Medicina Preventiva	300	34,8		01/03/2018	21:24
104	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Pasillo	249	37,7	0,01	01/03/2018	21:26
105	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Sistemas E Inform.	Dirección Administrativa	341	38,2		01/03/2018	21:28
106	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Despacho	294	41,4		01/03/2018	21:30
107	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Pasillo	182	36,3	0,02	01/03/2018	21:32
108	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Soporte Médico	Sala Reuniones	380	34,7		01/03/2018	21:34
109	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Registros	449	33,3		01/03/2018	21:36
110	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Jefe Gestión Económica	274	29,1		01/03/2018	21:38

	HOSPITAL	PLANTA	ZONA	ESTANCIA	Nivel de iluminación (lux)	Sonometría (dB)	Velocidad residual (m/s)	Fecha mediciones	HORA
111	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir.Sistemas E Infor.	Secretaria	363	32,4		01/03/2018	21:40
112	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	RRHH	Zona Trabajo Administrativo	345	32,9		01/03/2018	21:42
113	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	RRHH	Jefe Recursos Humanos	253	31,4		01/03/2018	21:44
114	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Director Sistemas e Información	184	38,7		01/03/2018	21:46
115	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Gerencia y dir. Gestión	Despacho	255	29,8		01/03/2018	21:48
116	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Dir. Médica y dir.enfermería	Sala de Reuniones	314	32,5		01/03/2018	21:50
117	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Gerencia y dir. Gestión	Despacho	401	33,7		01/03/2018	21:52
118	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Gerencia y dir. Gestión	Zona Trabajo Administrativo	322	29,8		01/03/2018	21:54
119	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Despacho	284	34,2		01/03/2018	21:56
120	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Sala de reuniones	345	33,5		01/03/2018	21:58
121	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Investigación	Despacho	227	30,1	0,01	01/03/2018	22:00
122	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Hosp. Pediátrica	Pasillo	390	32,4		01/03/2018	22:02
123	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Neonatologia	Habitación	401	33,9		01/03/2018	22:04
124	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Neonatologia	Habitación	221	30,8		01/03/2018	22:06
125	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Hosp. Obstérica	Pasillo	349	31,4	0,02	01/03/2018	22:08
126	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Pasillo	505	31,5	0,01	01/03/2018	22:10
127	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Pasillo	422	32,7	0,02	01/03/2018	22:12
128	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Box Agitados	248	32,8		01/03/2018	22:14
129	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Sala de Curas	195	33,9		01/03/2018	22:16
130	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Pasillo	271	31		01/03/2018	22:18
131	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Despacho Médico	260	31,8		01/03/2018	22:20
132	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diagnóstico por la imagen	Almacén	314	32,7	0	01/03/2018	22:22
133	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diálisis	Zona Diálisis Crónicos	330	30		01/03/2018	22:24
134	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diálisis	Zona Trabajo Administrativo	267	29,3		01/03/2018	22:26
135	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Diálisis	Zona Diálisis Agudo	231	36,6		01/03/2018	22:28
136	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Admisión	Zona Acceso Personal	245	37,9	0,02	01/03/2018	22:30
137	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Admisión	Zona Atención al Paciente	179	30,3		01/03/2018	22:32
138	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Admisión	Zona Á rea Adiministrativa	178	29,8		01/03/2018	22:34
139	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Cafeterías	Cafetería	274	32,5	0,01	01/03/2018	22:36
140	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	BAJA	Hosp. Psiquiátrica	Sala Espera Familiares	221	34,1	0,01	01/03/2018	22:38
141	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	225	33,8		01/03/2018	22:40
142	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	330	32,3		01/03/2018	22:42
143	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	252	31,4	0	01/03/2018	22:44
144	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	270	31,7		01/03/2018	22:46
145	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	354	34,4		01/03/2018	22:48
146	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	268	35,6		01/03/2018	22:50
147	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	136	35,3		01/03/2018	22:52
148	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	196	38,9	0	01/03/2018	22:54
149	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	241	34,1	0	01/03/2018	22:56
150	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	327	35,5		01/03/2018	22:58
151	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	244	34,9		01/03/2018	23:00
152	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	175	34,1		01/03/2018	23:02
153	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	273	32,4		01/03/2018	23:04
154	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	458	31,7		01/03/2018	23:06
155	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	412	28,5		01/03/2018	23:08
156	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	476	30,8		01/03/2018	23:10
157	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	328	32,5		01/03/2018	23:12
158	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	472	30,2		01/03/2018	23:14
159	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	491	29,1		01/03/2018	23:16
160	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	495	29		01/03/2018	23:18
161	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	601	28,7		01/03/2018	23:20
162	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	517	27,1		01/03/2018	23:22
163	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	538	27,3		01/03/2018	23:24
164	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	629	29,8		01/03/2018	23:26
165	HOSPITAL INFANTA CRISTINA	2ª	Bloque Quirúrjico	Quirófanos	606	30,2		01/03/2018	23:28

RESUMEN LUXOMETRÍA

Medición	Parámetro de confort	Zona	Nº Mediciones	UNE	
				Adecuadas	No Adecuadas
1ª	Luxometría	Oficinas de personal, zonas de examen… etc	116	61 (52,6%)	55 (47,4%)
		Salas de espera, puestos de control, pasillos… etc	49	45 (91,8%)	4 (8,2%)
2ª	Luxometría	Oficinas de personal, zonas de examen… etc	116	17 (14,7%)	99 (85,3%)
		Salas de espera, puestos de control, pasillos… etc	49	7 (14,29%)	42 (85,71%)
3ª	Luxometría	Oficinas de personal, zonas de examen… etc	116	10 (8,62%)	106 (91,38%)
		Salas de espera, puestos de control, pasillos… etc	49	45 (91,84%)	4 (8,16%)
TOTAL	Luxometría	Hospital	495	185 (37,4%)	310 (62,6%)

RESUMEN VELOCIDAD RESIDUAL

Medición	Parámetro de confort	Zona	Nº Mediciones	RITE	
				Adecuadas	No adecuadas
1ª	Velocidad residual	Salas de espera, puestos de control, pasillos… etc.	39	39 (100%)	0
2ª	Velocidad residual	Salas de espera, puestos de control, pasillos… etc.	38	38 (100%)	0
3ª	Velocidad residual	Salas de espera, puestos de control, pasillos… etc.	38	38 (100%)	0
TOTAL	Velocidad residual	Hospital	115	115 (100%)	0

SONOMETRÍA

Medición	Parámetro de confort	Zona	Nº Mediciones	RITE	
				Adecuadas	No adecuadas
1ª	Sonometría	Salas de espera, puestos de control, pasillos… etc.	-	-	-
		Oficinas de personal, zonas de examen	-	-	-
2ª	Sonometría	Salas de espera, puestos de control, pasillos… etc.	116	69 (59,5%)	47 (40,5%)
		Oficinas de personal, zonas de examen	49	39 (79,6%)	10 (20,4%)
3ª	Sonometría	Salas de espera, puestos de control, pasillos… etc.	116	109 (94,0%)	7 (6,0%)
		Oficinas de personal, zonas de examen	49	49 (100%)	0
TOTAL	Sonometría	Hospital	330	266 (80,6%)	310 (19,4%)

III.2 PPI DE INSPECCIÓN DOCUMENTAL (MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL)

III.2 ANEXOS AL PLAN DE REPOSICIONES (ANÁLISIS DE VIDA ÚTIL)

En este anexo se puede observar una tabla en la que se combinan las dos tablas creadas para el análisis de la vida útil en una sola. Esto se ha hecho debido a que, en la tabla proporcionada por la concesionaria, los años de vida útil de cada instalación vienen dados en tanto porciento y de esta manera no queda claro

Al final del mismo documento se adjunta a este mismo anexo la explicación del criterio utilizado por la concesionaria para el cálculo de la vida útil de las instalaciones.

ESPACIO	UNIDADI	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	VIDA ÚTIL	VIDA ÚTIL INCOSA	AÑOS RESTANTES
I0S105	1	SISTEMA DE AGUA	GRUPO DE BOMBEO Y AGUA TRATADA	GRUPOS DE BOMBEO FONTANERIA MODELO EPVAE 4VLX804T ITUR	ACTIVO	100,00%	6	-4
I0S105	1	SISTEMA DE AGUA	GRUPO DE BOMBEO Y AGUA TRATADA	GRUPOS DE BOMBEO FLUXORES MODELO EPVAE 3VLX6503 ITUR	ACTIVO	100,00%	6	-4
I0S105	1	SISTEMA DE AGUA	GRUPO DE BOMBEO Y AGUA TRATADA	GRUPOS DE BOMBEO RIEGO EPVAE 2VLX3205 ITUR	ACTIVO	100,00%	6	-4
I00027	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	ENFRIADORA PRINCIPAL DE AGUA CON COMPRESOR DE TORNILLO	ACTIVO	80,00%	15	5
I00027	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	ENFRIADORA PRINCIPAL DE AGUA CON COMPRESOR DE TORNILLO	ACTIVO	80,00%	15	5
I00027	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	ENFRIADORA PRINCIPAL DE AGUA CON COMPRESOR DE TORNILLO	ACTIVO	80,00%	15	5
I00027	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	ENFRIADORA PRINCIPAL DE AGUA CON COMPRESOR DE TORNILLO	ACTIVO	80,00%	15	5
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENTRIFUGA MONO EN BANCADA VELOCIDAD CONSTANTE (192 M3/H	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENTRIFUGA MONO EN BANCADA VELOCIDAD CONSTANTE (192 M3/H	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENTRIFUGA MONO EN BANCADA VELOCIDAD CONSTANTE (192 M3/H	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENTRIFUGA MONO EN BANCADA VELOCIDAD CONSTANTE (192 M3/H	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENTRIFUGA MONO EN BANCADA VELOCIDAD CONSTANTE (192 M3/H	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENTRIFUGA MONO EN BANCADA VELOCIDAD CONSTANTE (192 M3/H	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENTRIFUGA MONO EN BANCADA VELOCIDAD CONSTANTE (192 M3/H	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE FANCOIL(150 m3/h	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE FANCOIL(150 m3/h	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE FANCOIL(150 m3/h	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE FANCOIL(150 m3/h	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE UTA`S (95 m3/h	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE UTA`S (95 m3/h	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE UTA`S (95 m3/h	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE UTA`S (95 m3/h	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE UTA`S (95 m3/h	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	BOMBA DE ROTOR ENCAPSULADA. RECIRCULACION FRIO (7 m3/h)	ACTIVO	160,00%	7	-3
HCOO1	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 1, HOSPITALIZACIÓN	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO3	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 2, HOSPITALIZACIÓN	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO6	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 3, HOSPITALIZACIÓN	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO9	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 4, DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN BAJA D	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO8	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA5 UCI PRIMERA D	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO8	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA6 BLOQUE OBSTÉTRICO SEGUNDA D	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO11	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 7 RADIOLOGÍA	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO12	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 8, COMUNES HOSPITAL DE DÍA RADIOLOGÍA	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO4	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 9, NEONATOLOGÍA	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO12	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 10, SUMINISTROS Y MORTUORIO	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO11	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 11, PASILLO LIMPIO Y SUCIO SEGUNDA E	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO11	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 12, QUIROFANOS CMI 1	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO11	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 13, QUIROFANOS CMI 2	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO11	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 14, QUIROFANOS CMI 3	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO11	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 15, QUIROFANOS CMI 4	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO11	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 16, QUIROFANOS CMI 5	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO13	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 17, URGENCIAS, PASILLO PREVIO A PASILLOS SEGUNDA F	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO14	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 18, OBSERVACIÓN DE URGENCIAS BAJA F	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO14	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 19, NEUROLOGÍA, ENDOSCOPIAS… TODA PRIMERA F	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO13	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 20, ADAPTACIÓN AL MEDIO SEGUNDA F	ACTIVO	80,00%	15	5

ESPACIO	UNIDADES	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	VIDA ÚTIL	VIDA ÚTIL INCOSA	AÑOS RESTANTES
HCOO14	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 21, PASILLO LIMPIO Y SUCIO SEGUNDA F	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO13	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 22, QUIROFANOS CMA 1	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO13	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 23, QUIROFANOS CMA 2	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO13	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 24, QUIROFANOS CMA 3	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO13	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 25, QUIROFANOS CMA 4	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO23	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 26, ENTRADA URGENCIAS Y ESPERA DE FAMILIARES BAJA N	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO23	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 27, PRIMERA Y SEGUNDA N	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO22	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 28, CONSULTAS PRIMERA Y VESTUARIOS	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO21	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 29, CONSULTAS Y DESPACHOS	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO20	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 30, SOPORTE MÉDICO SEGUNDA M, SOPORTE MÉDICO SEGUNDA M	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO19	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 31, CONSULTAS PRIMERA K, SOPORTE MÉDICO SEGUNDA L, VESTUARIO	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO18	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 32, EXTRACCIONES BAJA K, CONSULTAS PRIMERA K, DIRECCIÓN ECON	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO17	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 33, CONSULTAS DIRECCIÓN ECONOMICA Y EXTRACCIONES	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO15	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 34, AULAS	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO16	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 35, CONSULTAS Y GERENCIA	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO1	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 36 AULAS, BIBLIOTECA, GURD PLANTA BAJA	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO15	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 37,CAFETERÍAS BAJA G	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO1	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 38, SALÓN DE ACTOS, SALA DE CULTO..., PRIMERA G	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO8	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 39, SALAS DE ESPERA DE UCI PRIMERA D, GALERÍA COMERCIAL BAJA	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO4	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 40, VESTUARIOS BAJA, PRIMERA Y SEGUNDA C, PASILLO A-42 PAST	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO9	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 41, PASILLOS	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO12	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 42, VESTUARIOS	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO9	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 43, REANIMACIÓN SEGUNDA E	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO6	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 44, GALERÍA COMERCIAL BAJA, PRIMERA Y SEGUNDA H e	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO9	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 45, SUMINISTROS Y MORTUORIO	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO19	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 46, DIÁLISIS BAJA L	ACTIVO	80,00%	15	5
HN2207	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 47, LABORATORIO	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO22	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 48, REHABILITACIÓN, GIMNASIO Y ASEOS DE BAJA M	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO4	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 49, COCINA	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO24	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 50, MANTENIMIENTO Y LENCERÍA	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO24	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 51, FARMACIA SÓTANO	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO12	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTA 52, ESTERILIZACIÓN SEGUNDA E, GALERÍA LIMPIA SEGUNDA E	ACTIVO	80,00%	15	5
CONSUL/DES	119	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	FAN-COILS FCX-P-50	ACTIVO	80,00%	6	-4
CONSUL/DES	473	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	FAN-COILS FCX-PO-50	ACTIVO	80,00%	6	-4
HOSPITALIZ	191	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	FAN-COIL FCX-42	ACTIVO	80,00%	6	-4
SALAS REUNI	6	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	FAN-COIL FCX-32-PO	ACTIVO	80,00%	6	-4
BOX / DESP	73	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	FAN-COIL FCX-42-PO	ACTIVO	80,00%	6	-4
SALAS DE ESP	48	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	FAN-COIL FCX-62-PO	ACTIVO	80,00%	6	-4
PASILLOS	12	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	FAN-COIL FCX-82-PO	ACTIVO	80,00%	6	-4
DIÁLISIS	6	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTB TROX TIPO 1	ACTIVO	80,00%	15	5
PARIT/ Z	23	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTB TROX TIPO 2	ACTIVO	80,00%	15	5
AULAS	6	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTB TROX TIPO 3	ACTIVO	80,00%	15	5
REHABILITACI	9	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTB TROX TIPO 4	ACTIVO	80,00%	15	5
RAYOS	5	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTB TROX TIPO 5	ACTIVO	80,00%	15	5
NEONATOS	2	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTB TROX TIPO 6	ACTIVO	80,00%	15	5
NEONATOS	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTB TROX TIPO 7	ACTIVO	80,00%	15	5
NEONATOS	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTB TROX TIPO 8	ACTIVO	80,00%	15	5
OBSERV URG	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTB TROX TIPO 9	ACTIVO	80,00%	15	5
OBSERV URG	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTB TROX TIPO 10	ACTIVO	80,00%	15	5
OBSERV URG	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	UTB TROX TIPO 11	ACTIVO	80,00%	15	5
HCOO8	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	RECUPERADOR UTA 5	ACTIVO	-80,00%	15	5

ESPACIO	UNIDADES	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	VIDA ÚTIL	VIDA ÚTIL INCOSA	AÑOS RESTANTES
HCOO8	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	RECUPERADOR UTA 6	ACTIVO	-80,00%	15	5
HCOO11	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	RECUPERADOR UTA 7	ACTIVO	-80,00%	15	5
HCOO4	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	RECUPERADOR UTA 9	ACTIVO	-80,00%	15	5
HCOO11	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	RECUPERADOR UTA 11	ACTIVO	-80,00%	15	5
HCOO14	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	RECUPERADOR UTA 18	ACTIVO	-80,00%	15	5
HCOO13	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	RECUPERADOR UTA 20	ACTIVO	-80,00%	15	5
HCOO14	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	RECUPERADOR UTA 21	ACTIVO	-80,00%	15	5
HCOO15	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	RECUPERADOR UTA 37	ACTIVO	-80,00%	15	5
HCOO9	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	RECUPERADOR UTA 43	ACTIVO	-80,00%	15	5
HCOO9	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	RECUPERADOR UTA 45	ACTIVO	-80,00%	15	5
HCOO24	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO/CALOR	RECUPERADOR UTA 50	ACTIVO	-80,00%	15	5
I01107	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Daikin RXS25E21B. Despachos E. industrial.	ACTIVO	80,00%	12	2
I01105	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Daikin RXS25E21B. Despachos E. industrial.	ACTIVO	80,00%	12	2
I01106	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Daikin RXS25E21B. Despachos E. industrial.	ACTIVO	80,00%	12	2
I01109	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Daikin RXS25E21B. Despachos E. industrial.	ACTIVO	80,00%	12	2
I01108	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Daikin RXS25E21B. Despachos E. industrial.	ACTIVO	80,00%	12	2
HG2204	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Daikin RKS35E2V1B. Satelite 1.	ACTIVO	80,00%	12	2
HH2208	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Daikin RKS35E2V1B. Satelite 2.	ACTIVO	80,00%	12	2
HH2203	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Daikin RKS35E2V1B. Satelite 3.	ACTIVO	80,00%	12	2
HI2216	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Daikin RKS35E2V1B. Satelite 4.	ACTIVO	80,00%	12	2
HI2209	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Daikin RKS35E2V1B. Satelite 5.	ACTIVO	80,00%	12	2
HI2202	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Daikin RKS35E2V1B. Satelite 6.	ACTIVO	80,00%	12	2
HI2209	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Daikin RKS35E2V1B. Satelite 4.	ACTIVO	80,00%	12	2
HQS009	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Daikin RKS35E2V1B. Satelita 7.	ACTIVO	80,00%	12	2
HC1199	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Daikin RKS35E2V1B. Control 1C.	ACTIVO	80,00%	12	2
HB1164	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Daikin RKS35E2V1B. Control 1B.	ACTIVO	80,00%	12	2
HC2298	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Daikin RKS35E2V1B.Control 2C.	ACTIVO	80,00%	12	2
HRS073	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Daikin RKS35E2V1B. Farmacia.	ACTIVO	80,00%	12	2
HOS001	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Daikin RKS35E2V1B. RITI.	ACTIVO	80,00%	12	2
HE0019	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Mitsubishi PUHZ-RPS0VHA4. Sala reso techo.	ACTIVO	80,00%	12	2
HE0023	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Hitachi. Rayos.	ACTIVO	80,00%	12	2
HC0013	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Haier HUM24HA03/R2 (DB).Casetón 13.	ACTIVO	80,00%	12	2
HC0011	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Haier HUM24HA03/R2 (DB). Casetón 11,	ACTIVO	80,00%	12	2
HF1149	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Daikin RZQ71C7V1B. Sala PUVA.	ACTIVO	80,00%	12	2
HN001	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Panasonic CU-RE1SPKE. SEGURIDAD.	ACTIVO	80,00%	12	2
HD2216	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Haier 1V09DN1ERA. Sai rea.	ACTIVO	80,00%	12	2
HL0023	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Haier 1V18FS1ERASAI diálisis..	ACTIVO	80,00%	12	2
hi1109	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Haier 1V09DN1ERA. SAI uci.	ACTIVO	80,00%	12	2
HE0019	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	MDV MDVS071VSEXT.Sala reso split.	ACTIVO	80,00%	12	2
I00025	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	KAYSUN KUE-10SDVN7. Sala baja tensión industrial.	ACTIVO	80,00%	12	2
HC018	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	LENOX KVHK 100 D. Casetón 18.	ACTIVO	80,00%	12	2
HG2213	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	AIR DATA. CPD.	ACTIVO	80,00%	12	2
HB2262	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	SISTEMA DE FRIO	Panasonic CU-RE1SPKE. Control 2B.	ACTIVO	80,00%	12	2
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	CALDERA AGUA CALIENTE 1400 kW	ACTIVO	80,00%	14	4
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	CALDERA AGUA CALIENTE 1400 kW	ACTIVO	80,00%	14	4
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	CALDERA AGUA CALIENTE 1400 kW	ACTIVO	80,00%	14	4
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	CALDERA AGUA CALIENTE 400 kW	ACTIVO	80,00%	14	4
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	CALDERA DE VAPOR DE ALTA PRESION PRODUCCION DE VAPOR 2,14 T/H	ACTIVO	-80,00%	14	4
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	CALDERA DE VAPOR DE ALTA PRESION PRODUCCION DE VAPOR 2,14 T/H	ACTIVO	-80,00%	14	4
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	BOMBA CENTRI. MONO EN BANCADA V. CONSTANTE (69 m3/h). PRIMARIO	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	BOMBA CENTRI. MONO EN BANCADA V. CONSTANTE (69 m3/h). PRIMARIO	ACTIVO	160,00%	7	-3

ESPACIO	UNIDADES	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	VIDA ÚTIL	VIDA ÚTIL INCOSA	AÑOS RESTANTES
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	BOMBA CENTRI. MONO EN BANCADA V. CONSTANTE (69 m3/h). PRIMARIO	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	BOMBA CENTRI. MONO EN BANCADA V. CONSTANTE (69 m3/h). PRIMARIO	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	BOMBA CENTRI. MONO EN BANCADA V. CONSTANTE (69 m3/h). PRIMARIO	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	BOMBA CENTRI. MONO EN BANCADA V. CONSTANTE (15 m3/h). PRIMARIO	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	BOMBA CENTRI. MONO EN BANCADA V. CONSTANTE (15 m3/h). PRIMARIO	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE. FANCOIL(72 m3/h	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE. FANCOIL(72 m3/h	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE. FANCOIL(72 m3/h	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE. UTA`S (45 m3/h	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE. UTA`S (45 m3/h	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	BOMBA CENT. MONOC. EN BANCADA Y DE V. VARIABLE. UTA`S (45 m3/h	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	BOMBA DE ROTOR ENCAPSULADA. RECIRCULACION FRIO (30 m3/h)	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	BOMBA DE ROTOR ENCAPSULADA. RECIRCULACION FRIO (30 m3/h)	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	BOMBA DE ROTOR ENCAPSULADA. RECIRCULACION FRIO (30 m3/h)	ACTIVO	160,00%	7	-3
I00010	1	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	CALEFACCIÓN	DEPOSITO DE EXPANSION DE 1900 L	ACTIVO	80,00%	18	8
HG0009	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	ASCENSOR ORONA 630 KGS -8 PERSONAS- 2 PARADAS- 3M RECORRIDO	ACTIVO	80,00%	12	2
HG0009	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	ASCENSOR ORONA 630 KGS -8 PERSONAS- 2 PARADAS- 3M RECORRIDO	ACTIVO	80,00%	12	2
HI0007	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	ASCENSOR ORONA 630 KGS -8 PERSONAS- 2 PARADAS- 3M RECORRIDO	ACTIVO	80,00%	12	2
HI0007	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	ASCENSOR ORONA 630 KGS -8 PERSONAS- 2 PARADAS- 3M RECORRIDO	ACTIVO	80,00%	12	2
HB0063	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	ASCENSOR ORONA 1000 KGS -13 PERSONAS- 4 PARADAS- 9M RECORRIDO	ACTIVO	80,00%	12	2
HBOO62	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	ASCENSOR ORONA 1000 KGS -13 PERSONAS- 4 PARADAS- 9M RECORRIDO	ACTIVO	80,00%	12	2
IO0014	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	ASCENSOR ORONA 1000 KGS -13 PERSONAS- 3 PARADAS- 6M RECORRIDO	ACTIVO	80,00%	12	2
HK0034	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	ASCENSOR ORONA 1000 KGS -13 PERSONAS- 2 PARADAS- 3M	ACTIVO	80,00%	12	2
HJ0015	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	ASCENSOR ORONA 630 KGS -8 PERSONAS- 3 PARADAS-6M **ASCENSOR Nº 1**	ACTIVO	80,00%	12	2
HL0015	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	ASCENSOR ORONA 630 KGS -8 PERSONAS- 3 PARADAS-6M **ASCENSOR Nº 2**	ACTIVO	80,00%	12	2
HN0002	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	ASCENSOR ORONA 630 KGS -8 PERSONAS- 3 PARADAS-6M **ASCENSOR Nº 3**	ACTIVO	80,00%	12	2
HG0026	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	ASCENSOR ORONA 1000 KGS -13 PERSONAS- 3 PARADAS-8M	ACTIVO	80,00%	12	2
HG0026	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	ASCENSOR ORONA 1000 KGS -13 PERSONAS- 3 PARADAS-8M	ACTIVO	80,00%	12	2
HI0029	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	ASCENSOR ORONA 1000 KGS -13 PERSONAS- 3 PARADAS-8M	ACTIVO	80,00%	12	2
HI0029	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	ASCENSOR ORONA 1000 KGS -13 PERSONAS- 3 PARADAS-8M	ACTIVO	80,00%	12	2
HI0007	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	ASCENSOR ORONA 1000 KGS -13 PERSONAS- 3 PARADAS-8M	ACTIVO	80,00%	12	2
HI0007	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	ASCENSOR ORONA 1000 KGS -13 PERSONAS- 3 PARADAS-8M	ACTIVO	80,00%	12	2
HA0041	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	MONTACAMAS ORONA 1600 KGS -21 PERSONAS- 4 PARADAS **ASCENSOR Nº15**	ACTIVO	80,00%	12	2
HA0041	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	MONTACAMAS ORONA 1600 KGS -21 PERSONAS- 4 PARADAS **ASCENSOR Nº16**	ACTIVO	80,00%	12	2
HB0061	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	MONTACAMAS ORONA 1600 KGS -21 PERSONAS- 4 PARADAS **ASCENSOR Nº21**	ACTIVO	80,00%	12	2
HB0061	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	MONTACAMAS ORONA 1600 KGS -21 PERSONAS- 4 PARADAS **ASCENSOR Nº22**	ACTIVO	80,00%	12	2
HE0040	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	MONTACAMAS ORONA 1600 KGS -21 PERSONAS- 4 PARADAS **ASCENSOR Nº23**	ACTIVO	80,00%	12	2
HE0040	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	MONTACAMAS ORONA 1600 KGS -21 PERSONAS- 4 PARADAS **ASCENSOR Nº24**	ACTIVO	80,00%	12	2
HF0025	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	MONTACAMAS ORONA 1600 KGS -21 PERSONAS- 4 PARADAS **ASCENSOR Nº25**	ACTIVO	80,00%	12	2
HF0025	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	MONTACAMAS ORONA 1600 KGS -21 PERSONAS- 4 PARADAS **ASCENSOR Nº26**	ACTIVO	80,00%	12	2
HD0021	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	MONTACAMAS ORONA 1600 KGS -21 PERSONAS- 5 PARADAS**ASCENSOR Nº19**	ACTIVO	80,00%	12	2
HD0021	1	SISTEMA DE TRANSPORTE	ASCENSORES	MONTACAMAS ORONA 1600 KGS -21 PERSONAS- 5 PARADAS**ASCENSOR Nº20**	ACTIVO	80,00%	12	2
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10

ESPACIO	UNIDADES	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	VIDA ÚTIL	VIDA ÚTIL INCOSA	AÑOS RESTANTES
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10

ESPACIO	UNIDADES	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	VIDA ÚTIL	VIDA ÚTIL INCOSA	AÑOS RESTANTES
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I01111	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	COLECTOR SOLAR PLANO	ACTIVO	100,00%	20	10
I0S105	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	DEPOSITO ACUMULADOR VERTICAL DE 5.000 LITROS	ACTIVO	100,00%	15	5
I0S105	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	DEPOSITO ACUMULADOR VERTICAL DE 5.000 LITROS	ACTIVO	100,00%	15	5
I0S105	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	DEPOSITO ACUMULADOR VERTICAL DE 5.000 LITROS	ACTIVO	100,00%	15	5
I0S105	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PLACAS SOLARES	DEPOSITO ACUMULADOR VERTICAL DE 5.000 LITROS	ACTIVO	100,00%	15	5
HOS011	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	GRUPO ELECTROGENO / 1000 kVA / 400 V/ 50Hz	ACTIVO	50,00%	20	10
HOS019	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	GRUPO ELECTROGENO / 1000 kVA / 400 V/ 50Hz	ACTIVO	50,00%	20	10
IO0001	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	GRUPO ELECTROGENO /700 KVA / 400 V/ 50Hz	ACTIVO	50,00%	20	10
HF2243	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PANELES DE AISLAMIENTO	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 7,5 KVA	ACTIVO	50,00%	20	10
HF2244	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PANELES DE AISLAMIENTO	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 7,5 KVA	ACTIVO	50,00%	20	10
HF2245	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PANELES DE AISLAMIENTO	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 7,5 KVA	ACTIVO	50,00%	20	10
HF2246	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PANELES DE AISLAMIENTO	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 7,5 KVA	ACTIVO	50,00%	20	10
HE2231	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PANELES DE AISLAMIENTO	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 7,5 KVA	ACTIVO	50,00%	20	10
HE2232	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PANELES DE AISLAMIENTO	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 7,5 KVA	ACTIVO	50,00%	20	10
HE2233	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PANELES DE AISLAMIENTO	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 7,5 KVA	ACTIVO	50,00%	20	10
HE2234	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PANELES DE AISLAMIENTO	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 7,5 KVA	ACTIVO	50,00%	20	10
HE2235	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PANELES DE AISLAMIENTO	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 7,5 KVA	ACTIVO	50,00%	20	10
HD2213	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PANELES DE AISLAMIENTO	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 7,5 KVA	ACTIVO	50,00%	20	10
HD1168	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PANELES DE AISLAMIENTO	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 7,5 KVA	ACTIVO	50,00%	20	10
HD1168	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PANELES DE AISLAMIENTO	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 7,5 KVA	ACTIVO	50,00%	20	10
HD1168	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PANELES DE AISLAMIENTO	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 7,5 KVA	ACTIVO	50,00%	20	10
HF1157	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PANELES DE AISLAMIENTO	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 7,5 KVA	ACTIVO	50,00%	20	10
HL1126	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PANELES DE AISLAMIENTO	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 7,5 KVA	ACTIVO	50,00%	20	10
HL0026	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PANELES DE AISLAMIENTO	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 7,5 KVA	ACTIVO	50,00%	20	10
HL0026	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PANELES DE AISLAMIENTO	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 7,5 KVA	ACTIVO	50,00%	20	10
HD0060	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PANELES DE AISLAMIENTO	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 7,5 KVA	ACTIVO	50,00%	20	10
HF0001	1	SISTEMA DE ENERGÍA	PANELES DE AISLAMIENTO	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 7,5 KVA	ACTIVO	50,00%	20	10
HC011	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 8 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HC011	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 8 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HC011	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 8 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HC011	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 8 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HC013	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 8 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HC013	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 8 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HC013	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 8 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3

ESPACIO	UNIDADES	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	VIDA ÚTIL	VIDA ÚTIL INCOSA	AÑOS RESTANTES
HC013	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 8 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HC013	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 8 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HI2216	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 8 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HI2209	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 8 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HI2202	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 8 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HI1109	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 60 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HL0023	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 60 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HG2213	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 40 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HD2216	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 30kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HA0060	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 30kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HI1101	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 20 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HG2204	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 4 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HH2208	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 4 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HH2203	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 4 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HH1104	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 4 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HOS011	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 4 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
IO0024	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 4 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HQS009	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 3 kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
IOS101	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA S.A.I. 2kVA	ACTIVO	400,00%	7	-3
HOS002	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	DEPÓSITO DE GASÓLEO 10000 L	ACTIVO	50,00%	23	13
IO0001	1	SISTEMA DE ENERGÍA	SISTEMAS ALTERNATIVOS	DEPÓSITO DE GASÓLEO 3000 L	ACTIVO	50,00%	23	13
IO0002	1	SISTEMA DE ENERGÍA	MEDIA TENSIÓN	TRANSFORMADOR SECO MT/BT 1600 kVA 20/0,42 kV	ACTIVO	50,00%	20	10
IO0004	1	SISTEMA DE ENERGÍA	MEDIA TENSIÓN	TRANSFORMADOR SECO MT/BT 1600 kVA 20/0,42 kV	ACTIVO	50,00%	20	10
HOS014	1	SISTEMA DE ENERGÍA	MEDIA TENSIÓN	TRANSFORMADOR SECO MT/BT 1000 kVA 20/0,42 kV	ACTIVO	50,00%	20	10
HOS015	1	SISTEMA DE ENERGÍA	MEDIA TENSIÓN	TRANSFORMADOR SECO MT/BT 1000 kVA 20/0,42 kV	ACTIVO	50,00%	20	10
HOS016	1	SISTEMA DE ENERGÍA	MEDIA TENSIÓN	TRANSFORMADOR SECO MT/BT 1000 kVA 20/0,42 kV	ACTIVO	50,00%	20	10
HOS017	1	SISTEMA DE ENERGÍA	MEDIA TENSIÓN	TRANSFORMADOR SECO MT/BT 1000 kVA 20/0,42 kV	ACTIVO	50,00%	20	10
HF0064	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	SEGURIDAD ELECTRONICA	CENTRAL DE DECCIÓN ANALÓGICA / AGUILERA. Modelo: AE/SA-C8	ACTIVO	100,00%	15	5
HL0026	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	SEGURIDAD ELECTRONICA	CENTRAL DE DECCIÓN ANALÓGICA / AGUILERA. Modelo: AE/SA-C8	ACTIVO	100,00%	15	5
HJ0006	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	SEGURIDAD ELECTRONICA	CENTRAL DE DECCIÓN ANALÓGICA / AGUILERA. Modelo: AE/SA-C8	ACTIVO	100,00%	15	5
HC0087	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	SEGURIDAD ELECTRONICA	CENTRAL DE DECCIÓN ANALÓGICA / AGUILERA. Modelo: AE/SA-C8	ACTIVO	100,00%	15	5
HB0052	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	SEGURIDAD ELECTRONICA	CENTRAL DE DECCIÓN ANALÓGICA / AGUILERA. Modelo: AE/SA-C8	ACTIVO	100,00%	15	5
HRS109	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	SEGURIDAD ELECTRONICA	CENTRAL DE DECCIÓN ANALÓGICA / AGUILERA. Modelo: AE/SA-C8	ACTIVO	100,00%	15	5
HOS057	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	SEGURIDAD ELECTRONICA	CENTRAL DE DECCIÓN DE CO / AGUILERA.Modelo: AE/CO-Z4M	ACTIVO	100,00%	15	5
HK0003	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	SEGURIDAD ELECTRONICA	CENTRAL SIST.EXTINCIÓN AUTOMÁTICA / AGUILERA. Modelo: AE/SA-PX2	ACTIVO	100,00%	15	5
HK0025	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	SEGURIDAD ELECTRONICA	CENTRAL SIST.EXTINCIÓN AUTOMÁTICA / AGUILERA. Modelo: AE/SA-PX2	ACTIVO	100,00%	15	5
HN2010	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	SEGURIDAD ELECTRONICA	CENTRAL SIST.EXTINCIÓN AUTOMÁTICA / AGUILERA. Modelo: AE/SA-PX2	ACTIVO	100,00%	15	5
HN2010	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	SEGURIDAD ELECTRONICA	CENTRAL SIST.EXTINCIÓN AUTOMÁTICA / AGUILERA. Modelo: AE/SA-PX2	ACTIVO	100,00%	15	5
HF2213	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	SEGURIDAD ELECTRONICA	CENTRAL SIST.EXTINCIÓN AUTOMÁTICA / AGUILERA. Modelo: AE/SA-PX2	ACTIVO	100,00%	15	5
HG2212	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	SEGURIDAD ELECTRONICA	CENTRAL SIST.EXTINCIÓN AUTOMÁTICA / AGUILERA. Modelo: AE/SA-PX2	ACTIVO	100,00%	15	5
IO008	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	SEGURIDAD ELECTRONICA	CENTRAL SIST.EXTINCIÓN AUTOMÁTICA / AGUILERA. Modelo: AE/SA-PX2	ACTIVO	100,00%	15	5
HOSPITAL	192	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	PCI	B.I.E. 25 MM x 20 MTS MANGUERA ARM. VERTICAL	ACTIVO	100,00%	20	10
HOSPITAL	7	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	PCI	B.I.E. 45 MM x 20 MTS MANGUERA ARM. VERTICAL	ACTIVO	100,00%	20	10
HOSPITAL	402	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	PCI	EXTINTOR DE POLVO ABC 6 KG.	ACTIVO	100,00%	20	10
HOSPITAL	64	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	PCI	EXTINTOR CO2 5 KG	ACTIVO	100,00%	20	10
IO0022	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	PCI	SISTEMA DE EXTINCIÓN ROCIADORES AUTOMATICOS	ACTIVO	100,00%	30	20
HRS045	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	PCI	SISTEMA DE EXTINCIÓN ROCIADORES AUTOMATICOS	ACTIVO	100,00%	30	20
HRS074	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	PCI	SISTEMA DE EXTINCIÓN ROCIADORES AUTOMATICOS	ACTIVO	100,00%	30	20
HRS076	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	PCI	SISTEMA DE EXTINCIÓN ROCIADORES AUTOMATICOS	ACTIVO	100,00%	30	20
HRS046	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	PCI	SISTEMA DE EXTINCIÓN ROCIADORES AUTOMATICOS	ACTIVO	100,00%	30	20

ESPACIO	UNIDADES	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	VIDA ÚTIL	VIDA ÚTIL INCOSA	AÑOS RESTANTES
HOSPITAL	2851	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	PCI	DETECTOR ÓPTICO-TERMICO SIST.ALGORÍTMICO, MOD.AE/SA-OPT	ACTIVO	100,00%	15	5
HOSPITAL	2896	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	PCI	ZOCALO DETECTORES ALGORÍTMICO, MOD.AE/SA-ZB2	ACTIVO	100,00%	15	5
I0S105	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	EQUIPOS DE PRESIÓN Y DE BOMBEO PCI	BOMBA PRINCIPAL 180 M3/H	ACTIVO	100,00%	5	-5
I0S105	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	EQUIPOS DE PRESIÓN Y DE BOMBEO PCI	BOMBA RESERVA 180 M3/H	ACTIVO	0,00%	5	-5
I0S105	1	SISTEMA DE PCI Y CONTROL	EQUIPOS DE PRESIÓN Y DE BOMBEO PCI	BOMBA JOCKEY 7 M3/H	ACTIVO	100,00%	5	-5
HG1118	1	MEGAFONÍA Y COMUNICACIÓN	TELEFONÍA WI-FI Y MEGAFONÍA	RACK BASCULANTE 9 UNIDADES	ACTIVO	90,00%	30	20
HHN001	1	MEGAFONÍA Y COMUNICACIÓN	TELEFONÍA WI-FI Y MEGAFONÍA	RACK 19" - 24 UNIDADES	ACTIVO	90,00%	30	20
COCIN/CAFET	1	COCINA Y CAFETERÍAS	COCINA, CAFETERÍA PÚBLICO Y CAFETERÍA	SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS TRIPLE	ACTIVO	130,00%	12	2
COCIN/CAFET	1	COCINA Y CAFETERÍAS	COCINA, CAFETERÍA PÚBLICO Y CAFETERÍA	SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS SIMPLE	ACTIVO	130,00%	12	2
COCIN/CAFET	1	COCINA Y CAFETERÍAS	COCINA, CAFETERÍA PÚBLICO Y CAFETERÍA	ARMARIO FRIGORIFICO POTENCIA 378 W	ACTIVO	130,00%	10	0
COCIN/CAFET	1	COCINA Y CAFETERÍAS	COCINA, CAFETERÍA PÚBLICO Y CAFETERÍA	ARMARIO FRIGORIFICO POTENCIA 780 W	ACTIVO	130,00%	10	0

Hospital de Parla

REGISTRO DE ENTRADA
Ref:07/171572.9/17 Fecha:06/02/2017 14:33
Registro del Servicio Madrileño de Salud
Registro Servicio Madrileño de Salud
Destino: Hospital Universitario Infanta Cristina

En Parla, a 6 de febrero de 2017

Estimado Director Gerente D. Carlos Mingo Rodríguez,

Por la presente se responde a su carta de fecha **20 de enero de 2017,** (Reg. Salida ref: 07/091924.9/17). En concreto en lo referente a las dudas generadas por los datos sobre la vida útil de los activos y/o equipos de los Inventarios entregados en fecha 30 de diciembre de 2016.

En los archivos aportados de inventario, el dato de vida de útil de los activos y/o equipos adquiridos es un dato que ha sido consultado al propio fabricante, y son estimaciones según un tipo de uso y mantenimiento determinado, y según la propia experiencia de empresas del Grupo Sacyr en conservación de infraestructuras similares.

Esta estimación, que ha sido calculada para todo el periodo de la concesión, es una aproximación teórica y cualitativa, ya que viene determinada por muchos factores externos, (mantenimientos preventivos, correctivos, uso prolongado, malos hábitos de uso), y en alguna ocasión por factores internos, (errores de fabricación). Un mal uso de un equipo puede reducir la vida útil del mismo, en cambio un buen mantenimiento preventivo o correctivo puede alargarla. Por tanto, este dato es una mera estimación inicial teórica que sirve como referencia para los Planes de Mantenimiento y Reposición a lo largo de todo el periodo de la concesión.

Por todo ello, la información aportada en cuanto a la vida útil de los elementos del inventario se refiere, sirve para estimar que porcentaje de equipos en el baremo de años indicado (duración de la concesión), fallarán y no tendrán reparación posible o bien la reparación será más costosa que la adquisición de un equipo nuevo. Todo esto, sin dejar de ser estimaciones que posteriormente se ajustan a la realidad de uso en el Hospital.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.

Sin otro particular,

Reciba un cordial saludo.

Violeta Paniagua Gil

HOSPITAL DE PARLA S.A.

Avenida Nueve de Junio,2
28981 Parla (Madrid)-Tel.:(+34) 91 191 33 83

HOSPITAL DE PARLA, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 21232, folio 133, sección 8, hoja M-12914. C.I.F.: A-84943020. Domicilio social y Fiscal: Paseo de la Castellana nº 83-85, 4ª Planta. 28046 MADRID

III.3 PPI DE INSPECCIÓN DOCUMENTAL (MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL)

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN DOCUMENTAL
INSPECCIONES TECNICO-LEGALES (1)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Porta S.A.	**COD. PARTE:**	-ID-ITL-01.01
INSPECTOR:	Pedro Alastrué	**FECHA:**	14-2-18
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	Florencio	**HORA:**	10:00

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
ELECTRICIDAD GENERAL	1	INFORME TECNICO LEGAL DEL CENTRO DE TRANSFORMACION DE TENSION. SUBSANACION DE ANOMALIAS. PERIOCIDAD ANUAL.	X		X		
	2	INSPECCION REGLAMENTARIA DE ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO CON PERIOCIDAD TRIANUAL.	X		X		
	3	INFORME TECNICO LEGAL DE REVISION E INSPECCION ANUAL DE LA INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION ELECTRICA, INCLUYENDO INSTALACION INTERIOR, INSTALACION DE ENLACE, CUADROS GENERALES Y PARCIALES, SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES, GRUPOS ELECTROGENOS, RED DE PUESTA A TIERRA, ETC. SEGÚN orden 7955/2006 de la comunidad de Madrid.	X		X		X 1
QUIROFANOS	4	EXISTE REGISTROS DEL CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIPOSITIVOS DE VIGILANCIA DE AISLAMIENTO. PERIOCIDAD SEMANAL.	X			X	X 2
	5	EXISTE REGISTRO DEL CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIPOSITIVOS DE PROTECCION. PERIOCIDAD SEMANAL.	X			X	X 3
	6	EXISTE REGISTRO DE MEDIDA DE CONTINUIDAD Y DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE LOS DIVERSOS CIRCUITOS INTERIORES DE CADA QUIROFANO. PERIOCIDAD MENSUAL.	X			X	X 4 5
	7	EXISTE REGISTRO DE REVISIONES ANUALES A REALIZAR POR INSTALADOR AUTORIZADO, SEGÚN ITC-BT-05 Y VERIFICACION DE LOS PUNTOS 5-6-7 DE ESTE PARTE.	X		X		
ASCENSORES	8	INSPECCION PERIODICA DE EQUIPOS DE ELEVACION DE EDIFICIOS DE PUBLICA CONCURRENCIA. PERIOCIDAD BIANUAL.	X		X		
INSTALACIONES DE PCI	9	REGISTRO DE LA COMPROBACION TRIMESTRAL DEL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS A REALIZAR POR EL TITULAR DE LA INSTALACION O SISTEMA.	X		X		
	10	REGISTRO DE LA COMPROBACION TRIMESTRAL DEL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIOS A REALIZAR POR EL TITULAR DE LA INSTALACION O SISTEMA.	X		X		
	11	REGISTRO DE LA COMPROBACION TRIMESTRAL DE EXTINTORES, HIDRANTES Y BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS A REALIZAR POR EL TITULAR DE LA INSTALACION O SISTEMA.	X		X		
	12	REGISTRO DE LA COMPROBACION TRIMESTRAL DE SISTEMAS FIJOS DE EXTINCION (ROCIADORES, AGUA NEBULIZADA, POLVO, ESPUMA, GAS) A REALIZAR POR EL TITULAR DE LA INSTALACION O SISTEMA.	X		X		
	13	REGISTRO DE LA COMPROBACION ANUAL DEL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS A REALIZAR POR PERSONAL ESPECIALIZADO.	X		X		
	14	REGISTRO DE LA COMPROBACION ANUAL DEL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIOS A REALIZAR POR PERSONAL ESPECIALIZADO.	X		X		
	15	REGISTRO DE LA COMPROBACION ANUAL DE EXTINTORES, HIDRANTES Y BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS A REALIZAR POR PERSONAL ESPECIALIZADO.	X		X		
	16	REGISTRO DE LA COMPROBACION ANUAL DE SISTEMAS FIJOS DE EXTINCION (ROCIADORES, AGUA NEBULIZADA, POLVO, ESPUMA, GAS) A REALIZAR POR PERSONAL ESPECIALIZADO.	X		X		

OBSERVACIONES

*1, Se hace mensual y queda reflejado en el preventivo

*2,3 y 4 Lo dicen mensual no ~~semal~~ semanal

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN DOCUMENTAL
INSPECCIONES TECNICO-LEGALES (2)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-ID-ITL-02.01
INSPECTOR:	Alvaro	**FECHA:**	15-12-2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	FLORENCIO	**HORA:**	10:45

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
REVISIONES ACS	1	EXISTE REGISTRO DE LA REVISION TRIMESTRAL DEL ESTADO Y CONSERVACION DE TODOS LOS DEPOSITOS DE ACS.	X		X		
	2	EXISTE REGISTRO DE LA REVISION MENSUAL DEL ESTADO Y CONSERVACION DE UN NUMERO REPRESENTATIVO DE PUNTOS TERMINALES DE LA RED. TOTALIDAD POR ANUALIDAD COMPLETA.	X		X		
	3	EXISTE REGISTRO DE PURGAS Y OPERACIONES EN ZONAS NO HABITADAS. MENSUALMENTE PURGA DE TUBERIAS. SEMANALMENTE PURGA DE FONDO DE ACUMULADORES. SEMANALMENTE APERTURA DE GRIFOS Y DUCHAS NO UTILIZADOS.	X			X	*2
	4	SE DOCUMENTA LAS OPERACIONES DE CONTROL DE TEMPERATURA. DEPOSITOS FINALES DE ACS > 60ºC DIARIAMENTE. MUESTREO ROTATORIO EN GRIFOS Y DUCHAS >50ºC MENSUALMENTE (SE COMPLETARA EL 100% ANUALMENTE).	X		X		
	5	EXISTE ANALITICA DETERMINACION DE LEGIONELLA EN PUNTOS REPRESENTATIVOS DE LA INSTALACION	X		X		
REVISIONES AFS	6	EXISTE REGISTRO DE LA REVISION TRIMESTRAL DEL ESTADO Y CONSERVACION DE TODOS LOS DEPOSITOS DE AFS.	X		X		
	7	EXISTE REGISTRO DE LA REVISION MENSUAL DEL ESTADO Y CONSERVACION DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE PUNTOS TERMINALES DE LA RED. TOTALIDAD POR ANUALIDAD COMPLETA.	X		X		
	8	SE DOCUMENTA LAS OPERACIONES DE CONTROL DE TEMPERATURAS EN LOS DEPOSITOS DE AFS, MANTENIENDOLA POR DEBAJO DE LOS 20ºC, SIEMPRE QUE LAS CONDICIONES CLIMATICAS LO PERMITAN.	X		X		
	9	SE REGISTRAN LAS MEDICIONES DE NIVELES DE CLORO LIBRE O COMBINADO EN UN NUMERO REPRESENTATIVO DE PUNTOS TERMINALES, CON MAGNITUDES <0,2MG/L	X		X		*1
LIMPIEZA Y DESINFECCION ACS Y AFS	10	SE REGISTRA LAS LABORES DE DESINFECCION QUIMICA O TERMICA REALIZADAS EN LA TOTALIDAD DE LA INSTALACIÓN DE ACS ANUALMENTE. S/ PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN RD.865/2003	X		X		
	11	SI EXISTE PARTES DE LA INSTALACIÓN DE ACS CON FUNCIONAMIENTO ESTACIONAL (PARADAS >1MES), SE REGISTRA LAS LABORES DE DESINFECCION Y LIMPIEZA. S/ PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN RD.865/2003		X			*3
	12	SE REGISTRA LAS ACTUACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN DEPOSITOS DE LA INSTALACIÓN DE AFS POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO QUIMICO S/ RD.865/2003	X		X		
	13	SE REGISTRA LAS ACTUACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN ELEMENTOS DESMONTABLES S/ PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN RD.865/2003	X		X		
	14	EN CASO DE DETECCION DE BROTE DE LEGIONELOSIS, SE PROCEDE Y REGISTRA SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO RD.865/2003		X			*4
REVISION TORRES DE REFRIGERACION NO HAY *5	15	SE REVISA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE CONSERVACION Y LIMPIEZA DEL SEPARADOR DE GOTAS ANUALMENTE					
	16	SE REVISA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE CONSERVACION Y LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y EL RELLENO SEMESTRALMENTE.					
	17	SE REVISA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LA BANDEJA MENSUALMENTE					
	18	SE REVISA LA CALIDAD FISICO-QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA: MENSUALMENTE: (Tª – PH – CONDUCTIVIDAD – TURBIDEZ – HIERRO TOTAL) DIARIAMENTE: (NIVEL DE CLORO O BIOCIDA UTILIZADO) MENSUALMENTE: TOTAL DE AEROBIOS EN EL AGUA DE LA BALSA. TRIMESTRALMENTE: DETERMINACION DE LEGIONELLA 15 DIAS TRAS DESINFECCION Y LIMPIEZA: DETERMINACION DE LEGIONELLA					
	19	SI EXISTE CAMBIOS EN LOS PARAMETROS FISICO-QUIMICOS, SE PROCEDE A MODIFICA EL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUA					
	20	SI EXISTE CAMBIOS EN EL RECUENTO DE AEROBIOS Y NIVEL DE DESINFECTANTE, SE REALIZA UNA DETERMINACION DE LEGIONELLA					

OBSERVACIONES

*1 = Foto adjunta con cloro libre 0'67 mg/L

*2 No existe registro

*3 No hay paradas

*4 No ha habido nunca

*5 Usan sistemas de agua-aire, no agua-agua

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Álvaro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN DOCUMENTAL
INSPECCIONES TECNICO-LEGALES (3)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-ID-ITL-02.01
INSPECTOR:	Alvaro	**FECHA:**	15-12-2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	FLORENCIO	**HORA:**	11:00

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TORRES DE REFRIGERACION NO HAY	1	SE REGISTRA LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION REALIZADAS DOS VECES AL AÑO (EN PRIMAVERA Y EN OTOÑO).					
	2	CUANDO SE TRATE DE EQUIPOS DE FUNCIONAMIENTO ESTACIONAL SE REGISTRA ACTUACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA PARADAS SUPERIORES A 1MES					
	3	SE HA TENIDO LUGAR UNA PARADA DE LA INSTALACIÓN, SUPERIOR A LA VIDA MEDIA DEL BIOCIDA, SE VERIFICA Y REGISTRA EL NIVEL DE BIOCIDA Y LOS VALORES DE AEROBIOS TOTALES					
	4	SE REGISTRA EL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS PIEZAS DESMONTABLES SEGÚN RD.865/2003					
	5	EN CASO DE DETECCION DE BROTE DE LEGIONELOSIS, SE PROCEDE Y REGISTRA SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO RD.865/2003					
INSTALACIONES TERMICAS (CONTINUA EN XXXX-ID-ITL-04.01)	6	QUEDA REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA DE EVAPORADORES Y CONDENSADORES REALIZADAS COMO MINIMO ANUALMENTE	X		X		
	7	QUEDA REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE COMPROBACION DE ESTANQUIDAD Y NIVELES DE ACEITE Y REFRIGERANTE. PERIORICIDAD: MENSUAL	X		X		
	8	SE REGISTRA LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CIRCUITO DE HUMOS Y CHIMENEAS, REALIZADAS AL INICIO DE TEMPORADA Y A MITAD DE TEMPORADA (SIEMPRE QUE LA TEMPORADA DE USO SEA >4MESES)	X		X		
	9	SE REGISTRA LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA DE QUEMADORES DE CALDERAS, RALIZADO MENSUALMENTE	X			X	*1
	10	QUEDA CONSTANCIA DOCUMENTAL DE LAS INSPECCIONES DE VASOS DE EXPANSION REALIZADAS MENSUAMENTE.	X		X		
	11	EL PROTOCOLO SEGUIDO PARA LA REVISION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA QUEDA REGISTRADO CON CARÁCTER MENSUAL	X		X		
	12	EL MATERIAL REFRACTARIO ES COMPROBADO, AL MENOS, DOS VECES POR TEMPORADA, REALIZADAS AL INICIO DE TEMPORADA Y A MITAD DE TEMPORADA (SIEMPRE QUE LA TEMPORADA DE USO SEA >4MESES).	X		X		
	13	SE VERIFICA LA ESTANQUEIDAD DEL CIERRE ENTRE CALDERA Y QUEMADOR MENSUALMENTE.	X		X		
	14	SE REGISTRA LAS OPERACIONES DE REVISION EFECTUADAS EN CALDERAS DE GAS O GASOLEO UNA VEZ POR TEMPORADA	X		X		
	15	SE VERIFICA NIVELES DE AGUA EN CIRCUITOS MENSUALMENTE	X		X		
	16	SE VERIFICA ESTANQUIDAD EN CIRCUITOS UNA VEZ POR TEMPORADA	X		X		
	17	SE VERIFICA LA ESTANQUIDAD DE VALVULAS DE INTERCEPTACION DOS VECES POR TEMPORADA, REALIZADAS AL INICIO DE TEMPORADA Y A MITAD DE TEMPORADA (SIEMPRE QUE LA TEMPORADA DE USO SEA >4MESES)	X		X		
	18	SE VERIFICA EL TARADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD MENSUALMENTE	X		X		
	19	SE REGISTRA LAS OPERACIONES DE LIMPIEZADE FILTROS DE AGUA, REALIZADAS AL MENOS 2 VECES POR TEMPORADA, REALIZADAS AL INICIO DE TEMPORADA Y A MITAD DE TEMPORADA (SIEMPRE QUE LA TEMPORADA DE USO SEA >4MESES)	X		X		
	20	SE REGISTRA LAS OPERACIONES DE REVISION Y LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE, REALIZADAS MENSUALMENTE	X		X		

OBSERVACIONES

*1 = Se realiza una vez al año, no mensualmente.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Álvaro.	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN DOCUMENTAL
INSPECCIONES TECNICO-LEGALES (4)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla SA.	**COD. PARTE:**	-ID-ITL-04.01
INSPECTOR:	Alvaro	**FECHA:**	15-12-2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	FLORENCIO	**HORA:**	11:15

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	NO	SI	NO	
INSTALACIONES TERMICAS (CONTINUA DE XXXX-ID-ITL-03.01)	1	SE REGISTRA LAS OPERACIONES DE REVISION DE TUBERIAS DE INTERCAMBIO TERMICO UNA VEZ POR TEMPORADA	X		X		
	2	REGISTRO DE OPERACIONES DE REVISION DE APARATOS DE HUMECTACION Y ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO REALIZADAS MENSUALMENTE	X		X		
	3	QUEDA REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE REVISION Y LIMPIEZA DE RECUPERADORES DE CALOR, AL MENOS DOS VECES POR TEMPORADA, REALIZADAS AL INICIO DE TEMPORADA Y A MITAD DE TEMPORADA (SIEMPRE QUE LA TEMPORADA DE USO SEA >4MESES)	X		X		
	4	SE REGISTRA LAS ACCIONES DE REVISION DE UNIDADES TERMINALES AGUA-AIRE Y UNIDADES DE DISTRIBUCION DE AIRE DOS VECES POR TEMPORADA, REALIZADAS AL INICIO DE TEMPORADA Y A MITAD DE TEMPORADA (SIEMPRE QUE LA TEMPORADA DE USO SEA >4MESES)	X		X		
	5	REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE REVISION Y LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DE IMPULSION Y RETORNO DE AIRE UNA VEZ POR TEMPORADA	X		X		
	6	REGISTRO DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA REVISION DE EQUIPOS AUTONOMOS DOS VECES POR TEMPORADA, REALIZADAS AL INICIO DE TEMPORADA Y A MITAD DE TEMPORADA (SIEMPRE QUE LA TEMPORADA DE USO SEA >4MESES)	X		X		
	7	REGISTRO DE LAS ACCIONES DE REVISION DE BOMBAS Y VENTILADORES REALIZADAS MENSUALMENTE	X		X		
	8	REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE REVISION DEL SISTEMA DE PREPARACION DE ACS REALIZADO MENSUALMENTE	X		X		
	9	REGISTRO DE LA REVISION DEL ESTADO DEL AISLAMIENTO TERMICO UNA VEZ POR TEMPORADA	X		X		
	10	REGISTRO DE LA REVISION REALIZADA SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO REALIZADO DOS VECES POR TEMPORADA, REALIZADAS AL INICIO DE TEMPORADA Y A MITAD DE TEMPORADA (SIEMPRE QUE LA TEMPORADA DE USO SEA >4MESES)	X		X		
PROGRAMA DE GESTION ENERGETICA EN GENERADORES DE CALOR	11	REGISTRO DE TEMPERATURA O PRESION A LA ENTRADA Y SALIDA DEL GENERADOR CON PERIORICIDAD: BIANUAL: 20 kW < P ≤ 70 kW TRIMESTRAL: 70 kW < P ≤ 1000 kW MENSUAL: P > 1000 kW	X		X		
	12	REGISTRO DE TEMPERATURA AMBIENTE DEL LOCAL O SALA DE MAQUINAS CON PERIORICIDAD: BIANUAL: 20 kW < P ≤ 70 kW TRIMESTRAL: 70 kW < P ≤ 1000 kW MENSUAL: P > 1000 kW	X		X		
	13	REGISTRO DE LA TEMPERATURADE LOS GASES DE COMBUSTION BIANUAL: 20 kW < P ≤ 70 kW TRIMESTRAL: 70 kW < P ≤ 1000 kW MENSUAL: P > 1000 kW	X		X		
	14	REGISTRO DE LAS MEDICIONES DE CONTENIDO DE CO Y CO2 EN LOS PRODUCTOS DE CONBUSTION BIANUAL: 20 kW < P ≤ 70 kW TRIMESTRAL: 70 kW < P ≤ 1000 kW MENSUAL: P > 1000 kW	X		X		
	15	REGISTRO DE LAS MEDICIONES DEL INDICE DE OPACIDAD DE LOS HUMOS DE CONBUSTION DE GASOLEO BIANUAL: 20 kW < P ≤ 70 kW TRIMESTRAL: 70 kW < P ≤ 1000 kW MENSUAL: P > 1000 kW	X		X		
	16	REGISTRO DE LA REVISION DEL TIRO DE LA CAJA DE HUMOS DE LA CALDERA BIANUAL: 20 kW < P ≤ 70 kW TRIMESTRAL: 70 kW < P ≤ 1000 kW MENSUAL: P > 1000 kW	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Alvaro T.	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN DOCUMENTAL
INSPECCIONES TECNICO-LEGALES (5)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-ID-ITL-05.01
INSPECTOR:	Alvaro	**FECHA:**	15-12-2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	FLORENCIO	**HORA:**	11:30

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
PROGRAMA DE GESTION ENERGETICA EN GENERADORES DE FRIO	1	REGISTRO DE TEMPERATURA DEL FLUIDO A LA ENTRADA Y SALIDA DEL EVAPORADOR CON PERIORICIDAD: TRIMESTRAL: 70 kW < P ≤ 1000 kW MENSUAL: P > 1000 kW	X		X		
	2	REGISTRO DE TEMPERATURA DEL FLUIDO A LA ENTRADA Y SALIDA DEL CONDENSADOR CON PERIORICIDAD: TRIMESTRAL: 70 kW < P ≤ 1000 kW MENSUAL: P > 1000 kW	X		X		
	3	REGISTRO DE PERDIDAS DE PRESION EN EVAPORADOR Y EN CONDENSADOR EN PLANTAS ENFRIADORAS POR AGUA, CON PERIORICIDAD: TRIMESTRAL: 70 kW < P ≤ 1000 kW MENSUAL: P > 1000 kW	X		X		
	4	REGISTRO DE TEMPERATURA Y PRESION DE EVAPORACION CON PERIORICIDAD: TRIMESTRAL: 70 kW < P ≤ 1000 kW MENSUAL: P > 1000 kW	X		X		
	5	REGISTRO DE TEMPERATURA Y PRESION DE CONDENSACION CON PERIORICIDAD: TRIMESTRAL: 70 kW < P ≤ 1000 kW MENSUAL: P > 1000 kW	X		X		
	6	REGISTRO DE POTENCIA ELECTRICA ABSORBIDA CON PERIORICIDAD: TRIMESTRAL: 70 kW < P ≤ 1000 kW MENSUAL: P > 1000 kW	X		X		
	7	REGISTRO DE MEDIDA DE LA POTENCIA TERMICA INSTANTANEA DEL GENERADOR CON PERIORICIDAD: TRIMESTRAL: 70 kW < P ≤ 1000 kW MENSUAL: P > 1000 kW	X		X		
	8	REGISTRO DE LOS VALORES DE CEE Ó COP INSTANTANEO CON PERIORICIDAD: TRIMESTRAL: 70 kW < P ≤ 1000 kW MENSUAL: P > 1000 kW	X		X		
	9	REGISTRO DE LAS MEDICIONES DE CAUDAL DE AGUA EN EL EVAPORADOR CON PERIORICIDAD: TRIMESTRAL: 70 kW < P ≤ 1000 kW MENSUAL: P > 1000 kW	X		X		
	10	REGISTRO DE LAS MEDICIONES DE CAUDAL DE AGUA EN EL CONDENSADOR CON PERIORICIDAD: TRIMESTRAL: 70 kW < P ≤ 1000 kW MENSUAL: P > 1000 kW	X		X		
INSTALACIONES TERMICAS ADECUACION AL RITE2013	11	REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE REVISION DE LA RED DE CONDUCTOS TRIMESTRALES, SEGÚN CRITERIO DE LA NORMA UNE 100012	X		X		
	12	REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE REVISION DE LA CALIDAD AMBIENTAL TRIMESTRALES, SEGÚN CRITERIO DE LA NORMA UNE 171330	X		X		
LIMITACION DE LAS TEMPERATURAS	14	REGISTRO DE MEDICION DE TEMPERATURAS DE CONFORT CONSIGNADAS Y REALES EN TEMPORADA DE VERANO (1 MEDICION POR CADA 100M2)	X		X		
	16	REGISTRO DE MEDICION DE TEMPERATURAS DE CONFORT CONSIGNADAS Y REALES EN TEMPORADA DE INVIERNO (1 MEDICION POR CADA 100M2)	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Alvaro T	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN DOCUMENTAL
INSPECCIONES TECNICO-LEGALES (6)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-ID-ITL-06.01
INSPECTOR:	Alvaro	**FECHA:**	15-12-2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	FLORENCIO	**HORA:**	11:45

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
PLAN DE VIGILANCIA SISTEMA DE PRODUCCION SOLAR PARA ACS	1	REGISTRO DE PERIORICIDAD DE LIMPIEZA DE CRISTALES. EN FUNCION DE LAS CARACTERISTIAS Y UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN SE ESTABLECERÁ LA PERIORICIDAD EN EL PLAN DE VIGILANCIA.	X		X		
	2	REGISTRO DE INSPECCIONES VISUALES EN CAPTADORES CON PERIORICIDAD TRIMESTRAL (CRISTALES, JUNTAS, ABSORBDOR, CONEXIONES, ESTRUCTURA)	X		X		
	3	REGISTRO DE INSPECCIONES VISUALES EN TUBERIAS, AISLAMIENTOS Y SISTEMA DE LLENADO DEL CIRCUITO PRIMARIO, CON PERIORICIDAD SEMESTRAL.	X		X		
	4	REGISTRO DE INSPECCIONES EN PURGADORES MANUALES, ACTUANDO PARA VACIAR EL AIRE DEL BOTELLIN. FRECUENCIA TRIMESTRAL	X		X		
	5	REGISTRO DE INSPECCIONES DIARIAS PARA MEDICION DE TEMPERATURAS EN EL CIRCUITO SECUNDARIO.	X		X		
	6	REGISTRO DE VERIFICACION VISUAL DEL ESTADO DE TUBERIAS Y AISLAMIENTO, FRECUENCIA SEMESTRAL	X		X		
	7	REGISTRO DE INSPECCION DE ACUMULADORES Y PURGA DE LODOS ACUMULADOS EN LA PARTE INFERIOR DEL MISMO TRIMESTRALMENTE.	X		X		
PLAN DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAPTACION (?) $*_1$	8	REGISTRO DE INSPECCION DE DIFERENCIAS SOBRE EL CAPTADOR ORIGINAL, REALIZADA CADA 6 MESES					
	9	REGISTRO DE INSPECCION DE DIFERENCIAS ENTRE CRISTALES DE LOS CAPTADORES INSTALADOS, REALIZADA CADA 6 MESES					
	10	REGISTRO DE INSPECCION DE JUNTAS, LOCALIZANDO CONDENSACIONES Y SUCIEDAD CADA 6 MESES					
	11	REGISTRO DE LOCALIZACION DE AGRIETAMIENTOS Y DEFORMACIONES EN ABSORBEDORES CADA 6 MESES					
	12	REGISTRO DE INSPECCIONES SOBRE LA CARCASA DETECTANDO CORROSION Y DEFORMACIONES, CON FRECUENCIA SEMESTRAL					
	13	REGISTRO DE INSPECCIONES A REALIZAR SOBRE LAS CONEXIONES SEMESTRALMENTE, DETECTANDO DEFORMACIONES, OSCILACIONES VENTANAS DE RESPIRACION.					
	14	REGISTRO DE INSPECCIONES EN ESTRUCTURA SEMESTRALMENTE, LOCALIZANDO LA APARICION DE FUGAS					
	15	EN CASO DE INSTALACIONES CON PARTES ESTACIONALES, ANUALMENTE SE REALIZARAN LAS OPERACIONES DE ARRANQUE Y PARADA DE LA PARTE DE INSTALACIÓN PERTINENTE.					
PLAN DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE ACUMULACION (?)	16	REGISTRO DE LAS INSPECCIONES PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE LODOS REALIZADAS ANUALMENTE	X		X		
	17	REGISTRO DE LAS INSPECCIONES PARA VERIFICAR EL DESGASTE DE LOS ANODOS DE SACRIFICIO, REALIZADAS ANUALMENTE		X			$*_2$
	18	REGISTRO DE LAS INSPECCIONES DE ANODOS DE CORRIENTE IMPRESA ANUAES, CON VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO		X			$*_3$
	19	REGISTRO DE LAS INSPECCIONES DE AISLAMIENTO PARA VERIFICACION DE AUSENCIA DE HUMEDADES, REALIZADAS ANUALMENTE.	X		X		

OBSERVACIONES

$*_1$ = No utiliza sistemas de captación.

$*_2$ y 3 = El hospital no utiliza ánodos en el sistema de acumulación.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Alvaro	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN DOCUMENTAL
INSPECCIONES TECNICO-LEGALES (7)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla SA.	**COD. PARTE:**	-ID-ITL-07.01
INSPECTOR:	Álvaro	**FECHA:**	15-12-2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	FLORENCIO	**HORA:**	12:00

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
PLAN DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE INTERCAMBIO	1	REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE CONTROL DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN INTERCAMBIADORES DE PLACAS, VERIFICANDO EFICIENCIA Y PRESTACIONES. ANUALMENTE	X		X		
	2	REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA EFECTUADAS SOBRE LOS INTERCAMBIADORES DE PLACAS. PERIORICIDAD ANUAL	X		X		
	3	REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE CONTROL DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN INTERCAMBIADOR DE SERPENTIN, VERIFICANDO EFICIENCIA Y PRESTACIONES. ANUALMENTE	X		X		
	4	REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA EFECTUADAS SOBRE LOS INTERCAMBIADORES DE SERPENTIN. PERIORICIDAD ANUAL	X		X		
PLAN DE MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE LA INSTALACION	5	REGISTRO DE VERIFICACIONES DE DENSIDAD Y PH DEL FLUIDO REFRIGERANTE REALIZADAS ANUALMENTE	X		X		
	6	REGISTRO DE PRUEBAS DE PRESION REALIZADAS PARA CERTIFICAR LA ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN. BIANUAL	X		X		
	7	REGISTRO DE INSPECCIONES DE AISLAMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, ANOTANDO AUSENCIA DE HUMEDAD Y DEGRADACION DE PROTECCION DE UNIONES. ANUAL	X		X		
	8	REGISTRO DE ACCIONES DE COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE PURGADOR AUTOMATICO. ANUAL	X		X		
	9	REGISTRO DE OPERACIONES DE VACIADO DE BOTELLIN DE PURGADOR MANUAL REALIZADAS CADA 6 MESES	X		X		
	10	REGISTRO DE VERIFICACIONES DE ESTANQUEIDAD DE LA BOMBA CIRCULADORA CON PERIORICIDAD SEMESTRAL	X		X		
	11	REGISTRO DE COMPROBACIONES DE PRESION EN VASO DE EXPANSION CERRADO SEMESTRALMENTE	X		X		
	12	REGISTRO DE COMPROBACIONES DE NIVELES EN VASO DE EXPANSION ABIERTO REALIZADAS SEMESTRALMENTE	X		X		
	13	REGISTRO DEL CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LLENADO SEMESTRALMENTE	X		X		
	14	REGISTRO DE ACCIONES DE MANIPULACION DE VALVULAS PARA EVITAR EL AGARROTAMIENTO REALIZADAS ANUALMENTE	X		X		
	15	REGISTRO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE SEGURIDAD REALIZADO CADA AÑO.	X		X		
PLAN DE MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL	16	REGISTRO DE VERIFICACIONES DE ESTANQUEIDAD Y SISTEMA DE CIERRE DE CUADRO ELECTRICO CADA 12 MESES	X		X		
	17	REGISTRO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DIFERENCIAL ANUALMENTE	X		X		
	18	REGISTRO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATOS REALIZADO ANUALMENTE	X		X		
	19	REGISTRO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE VERIFICACION DEL SISTEMA DE MEDIDA ANUALMENTE	X		X		
PLAN DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE ENERGIA AUXILIAR	20	REGISTRO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE ACTUACION DE ENERGIA AUXILIAR REALIZADO ANUALMENTE	X		X		
	21	REGISTRO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE SONDAS DE TEMPERATURA REALIZADO ANUALMENTE	X		X		

OBSERVACIONES

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Álvaro.I	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN DOCUMENTAL
INSPECCIONES TECNICO-LEGALES (8)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-ID-ITL-08.01
INSPECTOR:	Alvaro	**FECHA:**	15-12-2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	FLORENCIO	**HORA:**	12:15

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA	1	REGISTRO DE COMPROBACIONES ELECTRICAS REALIZADAS ANUALMENTE SEGÚN HE5-CTE	X		X		
	2	REGISTRO DE COMPROBACION DEL ESTADO DE MODULOS, SIGUACION Y CONEXIONES RESPECTO A LA INSTALACIÓN INICIAL. ANUAL	X		X		
	3	REGISTRO DE COMPROBACION DEL ESTADO EL INVERSOR, FUNCIONAMIENTO, LAMPARAS DE SEÑALIZACION, ALARMAS, ETC.. ANUAL	X		X		
	4	REGISTRO DE COMPROBACION DEL ESTADO MECANICO DE CABLES Y TERMINALES, PLETINAS, TRAFOS, VENTILADORES/EXTRACTORES, UNIONES, APRIETES, LIMPIEZA. ANUALMENTE	X		X		
	5	REGISTRO DE COMPROBACION DE LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION DE LA RESISTENCIA DE TIERRA. ANUALMENTE	X		X		
	6	REGISTRO DE COMPROBACION DE LA ESTRUCTURA VERIFICANDO ANCLAJE Y REAPRIETE DE SUJECIONES. ANUAL	X		X		
INSTALACIÓN DE GASOLEO NO HAY *1	7	REVISIONES Y PRUEBAS REGLAMENTARIAS PARA INSTALACIONES DE SUPERFICIE SEGÚN MI-IP03 A REALIZAR CADA 5 AÑOS EN INSTALACIONES QUE REQUIERAN PROYECTO Y CADA 10 AÑOS EN EL RESTO. (EXCEPTO PARA DOBLE PARED CON DETECCION DE FUGAS, NO SE INSPECCIONA LA ESTANQUEIDAD)					
	8	COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA PROTECCION CATODICA EN DEPOSITOS ENTERRADOS TRIMESTRALMENTE					
	9	EN DEPOSITOS ENTERRADOS, SE CERTIFICARA EL SISTEMA DE DE PROTECCION ACTIVA CON PERIORICIDAD: TANQUES V<10M3 CADA 5 AÑOS, CON LA PRUEBA PERIODICA TANQUES V≤60M3 CADA 2 AÑOS TANQUES V>60M3 CADA AÑO					
	10	INSPECCIONES DE INSTALACIONES QUE REQUIEREN PROYECTO A REALIZAR POR UN OCA CADA DIEZ AÑOS.					
INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS	11	PARA INSTALACIONES ALIMENTADAS DESDE RED DE ABASTECIMIENTO, INSPECCION REALIZADA POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CADA 5 AÑOS	X	X	X		*2
	12	PARA INSTALACIONES NO ALIMENTADAS DESDE RED, REVISION DE LA INSTALACIÓN CADA CINCO AÑOS, REALIZADA POR INSTALADORA DE GAS AUTORIZADA SEGÚN ITC-ICG 09	X	X	X		*3

OBSERVACIONES

*1 = El hospital utiliza gas, no gasóleo.

*2 y *3 = Se encargan la empresa distribuidora e instaladora de gas. Ellos llevan las inspecciones.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Álvaro T.	

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN DOCUMENTAL
INSPECCIONES TECNICO-LEGALES (9)

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:	HIC		
EXPLOTADOR:	Hospital de Parla S.A.	**COD. PARTE:**	-ID-ITL-09.01
INSPECTOR:	Alvaro	**FECHA:**	15-12-2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	FLORENCIO	**HORA:**	12:30

ZONA REVISADA:

			INSPECCIONADO		CONFORME		OBS.
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
INSTALACIONES DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES	1	REGISTRO DE LIMPIEZA DE SUMIDEROS DE LOCALES HUMEDOS Y CUBIERTAS TRANSITABLES SEMESTRALMENTE	X		X		
	2	REGISTRO DE LIMPIEZA DE BOTES SIFONICOS SEMESTRALMENTE		X			*1
	3	REGISTRO DE LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y CALDERETAS CUBIERTAS NO TRANSITABLES REALIZADOS AL MENOS ANUALMENTE	X		X		
	4	REGISTRO DE REVISIONES DE COLECTORES SUSPENDIDOS, LIMPIEZA DE ARQUETAS SUMIDERO, POZOS DE REGISTRO, BOMBAS DE ELEVACION, ANUALES	X		X		
	5	REGISTRO DE LIMPIEZA DE ARQUETAS DE PIE DE BAJANTE, DE PASO Y SIFONICAS CADA 10 AÑOS.		X			*2
	6	REGISTRO DE LIMPIEZA DE SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS CADA 6 MESES		X			*3
INSTALACIÓN DE GASES MEDICIONALES	7	REGISTRO DE VERIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y SUS COMPONENTES SEGÚN PLAN DE MANTENIMIENTO ESPECIFICO	X		X		
	8	REGISTRO DE INSPECCIONES DE CANALIZACIONES Y DETECCION DE FUGAS PERIODICAMENTE SEGÚN PLAN DE MANTENIMIENTO ESPECIFICO	X		X		
	9	REGISTRO DE INSPECCIONES DE DESGASTE Y DETERIORO DE LA INSTALACIÓN SEGÚN PLAN DE MANTENIMIENTO ESPECIFICO	X		X		
	10	REGISTRO DE INSPECCIONES DE LA CALIDAD DEL AIRE SUMINISTRADO SEGÚN PLAN DE MANTENIMIENTO ESPECIFICO	X		X		
	11	REGISTRO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS EN CENTRALES DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y SEGÚN PLAN DE MANTENIMIENTO ESPECIFICO	X		X		
	12	INSPECCION PERIODICA DE INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES A PRESION SEGÚN REAL DECRETO 2060/2008	X		X		
	13	INSPECCION PERIODICA DE INSTALACIONES FIJAS DE DEPOSITOS CRIOGENICOS A PRESION SEGÚN REAL DECRETO 2060/2008	X		X		

OBSERVACIONES

*1: Se encarga el personal de limpieza. No existen órdenes de trabajo.

*2 y 3: Se encarga el personal de limpieza.

AUDITOR:	RESP. DE LA INSTALACIÓN:
Alvaro	

ANEXO IV: PPI DE INSPECCIÓN MOBILIARIO

SÓTANO

HIT

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	~~Alejandro Farfán~~	FECHA: ~~28-11-19~~ 01-12-2020	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA: 12:45h	

LABORATORIO

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción de mercancías (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Silla fija	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	2	1	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	X	X		
	Papelera	1	1	✓		
Almacén general (1)	Modulos compactos de farmacia completos	8	13	✓		
	Escalera con cinco peldaños y pies aislantes	1	✓			
	Depósito de alcohol	1	X	✓		
	Papelera	1	X 1	✓		
	Carro de transporte de ropa sucia	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	1	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	✓		
Almacén de gran volumen (1)	Almacenable en pales	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES

La zona de recepción y almacenamiento junto con la de dispensación intrahospitalaria ~~están~~ forman parte del mismo espacio ~~Adjunto fotos~~ He realizado el recuento por separado según indicaciones de la secretaria del área.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

SÓTANO

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	01-12-2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	13:15

ÁREA DE DISPENSACIÓN INTRAHOSPITALARIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Área de preparación (1)	Estación de picking	1	1	✓		
	Carros nodriza	3	X	X		
	Reloj de pared con fecha	1	X			
	Carro de historias clínicas		X	X		
Área de almacenamiento de carros de medicación (1)	Equipamiento médico específico	2	X	X		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

ELABORACIÓN DE MEDICAMENTOS Y REENVASADO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Reenvasado (1)	Taburete giratorio alto con respaldo	2	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 50L	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	✓		
Laboratorio (1)	Taburete giratorio alto con respaldo	2	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 50L	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	✓		
Zona pre-estéril (1)	Equipamiento médico específico	1	1	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	✓		
Zona estéril (2 cámaras + esclusa) (1)	Equipamiento médico específico		1	✓		
	Colgador mural múltiple (módulo)	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X	X		
	OBSERVACIONES					

El área de reenvasado y de laboratorio forman parte de la misma sala pero separadas. He realizado el recuento por separado

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

SÓTANO 2ª PLANTA HJE

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:** 01-12-2017	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:** 13:45	

DISPENSACIÓN AMBULATORIA ? CIRUGÍA AMBULATORIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Dispensación ambulatoria (1) *1	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1	X			
	Cajonera de mostrador	2	X			
	Taburete giratorio alto con respaldo	2	X			
	Papelera	1	X			
	Reloj de pared con fecha	1	X			
Sala de espera	Sillas modulares	10	6	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	2	1	✓		
	Cuadro decoración pared	3	X			
	Jardinera	1	X			
	Soporte para posters de campañas	1	X			
	Expositor de folletos	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
Aseos públicos (2)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
Aseos públicos (2)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				

*1 Dispensación ambulatoria →

OBSERVACIONES

- 1 Mesa de trabajo
- 1 Silla fija
- 1 Silla giratoria alto con respaldo
- 1 Plafón de corcho

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Aseos públicos no hay en la planta-1.

Para poner Cirugía Ex

~~PLANTA BAJA~~

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

DESPACHOS Y ÁREAS DE TRABAJO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho responsable servicio (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	2	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		
Sala Trabajo Adjuntos (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	4	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	~~3~~	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	3	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	3	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Plafón de corcho	1	1	✓		
	Papelera	1	3	✓		
	Fotocopiadora	1	X			
Secretaría (1)	Mostrador de información de 200-240 cm.	1	X			
	Cajonera de mostrador	2	1	✓		
	Silla giratoria con ruedas alta	2	1	✓		
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	2	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	X			
~~Archivo~~ (1)	Estantería metálica 5/6 niveles ML	7				
	Escalera con tres peldaños y pies aislantes	1				

OBSERVACIONES

* Cajonera de tres cajones (Secretaría)
* 8 Estanterías metálica 5/6 niveles ML repartidas por todas las áreas de trabajo

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

~~Archivo con falta~~ No existe archivo.

SÓTANO

MJC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	~~Alejandro Lacaso~~	FECHA: ~~28-11-17~~ 01-12-2017	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA: 10:45h	

LENCERÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Zona de recepción ropa sucia (1)	Báscula de suelo	1	✓	✓		
Almacenes de ropa limpia (1)	Estantería metálica 5/6 niveles ML	25	27	✓		
	Escalera con tres peldaños y pies aislantes	1	✓			
Zona de distribución de ropa limpia (1)	Carro de lencería	20	18	✓		
Zona lavado de carros (1)	Sin mobiliario clínico	✓				
Área de Trabajo Administrativo (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	✓	✓		
	Silla fija	1	2	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	✓	✓		
	Papelera	1	✓	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	✓	✓		
Aseos Personal (1)	Dispensador de jabón	2	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	2	✓			
	Cubo de basura con pedal 5L	2	✓			
	Reloj de pared con fecha	2	✓			
	Carro de historias clínicas	2	✓			
	Colgador mural individual	2	1	✓		

OBSERVACIONES

* Las básculas de suelo se encuentran situadas en el almacén de ropa limpia y de ropa sucia. En total son dos básculas
* Zona de Trabajo administrativo no existe como tal en este área. Tienen un pequeño espacio destinado ~~a gestionar~~ de gestiones dentro del almacén de ropa limpia

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

* Zona de lavado de carros se encuentra en el área de limpieza

SÓTANO

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso	**FECHA:**	01/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	12:00 h

LIMPIEZA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Almacén de productos (1)	Estantería metálica 5/6 niveles ML	10	18	✓		
	Escalera con tres peldaños y pies aislantes	1	X 1	✓		
Útiles y maquinaria (1)	Equipamiento técnico específico	✓	✓	✓		
corresponde con el área de lavado de carros. **Despacho Administrativo (1)**	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X	X		
	Silla fija	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X	X		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			

OBSERVACIONES

- En el despacho administrativo tienen dos sillas giratorias con brazos y ruedas ~~[illegible]~~ (son compradas por ellos)
- La mesa de trabajo ~~tampoco es de la concesión~~ (es comprada por ellos)
- La escalera con tres peldaños la tienen en el almacén de lavado de carros.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

~~PLANTA~~ SÓTANO

MSC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Fonfría	FECHA:	~~28-11-17~~ 01-12-2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	11:30

ZONA DE AUTOPSIAS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Puestos sala de autopsias (~~3~~) (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	✓			
	Balanza de 10 kilos	1		✓		
	Litera para transporte de cadáveres	1	✓	✓		
	Palangana con soporte y ruedas	1	✓	✓		
	Mesa de autopsias	1	✓	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		✓	✓		
Puestos sala de autopsias (3) (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	✓			
	Balanza de 10 kilos	1	✓			
	Litera para transporte de cadáveres	1	✓			
	Palangana con soporte y ruedas	1	✓			
	Mesa de autopsias	1	✓			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		✓			
Puestos sala de autopsias (3)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Balanza de 10 kilos	1				
	Litera para transporte de cadáveres	1				
	Palangana con soporte y ruedas	1				
	Mesa de autopsias	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					
Puestos cámaras frigoríficas (6)	Cámara de cadáveres de 6 cuerpos	1	✓	✓		
Puestos cámaras frigoríficas (6)	Cámara de cadáveres de 6 cuerpos	1	✓	✓		
Puestos cámaras frigoríficas (6)	Cámara de cadáveres de 6 cuerpos	1	✓	✓		
Puestos cámaras frigoríficas (6)	Cámara de cadáveres de 6 cuerpos	1	✓	✓		
Puestos cámaras frigoríficas (6)	Cámara de cadáveres de 6 cuerpos	1	✓	✓		
Puestos cámaras frigoríficas (6)	Cámara de cadáveres de 6 cuerpos	1	✓	✓		
Zona sucia (1)	Dispensador de jabón	1		✓		
	Dispensador de toallas de papel	1		✓		
	Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1		✓		
Vestuario personal (1)	Carro de transporte de ropa sucia	1	x			
	Banco de vestidor	1		✓		
	Armario ropero modular	4	x			
	Colgador para ropero	16	✓	✓		
	Papelera con tapa basculante de 50L	1	x			
	Colgador mural múltiple (módulo)	1		✓		
Aseos personal (1) (2)	Dispensador de jabón	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	2	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	x			
	Dispensador de papel higiénico o rollo 200/300 m.	1	2	✓		
	Colgador mural individual	1	x			

OBSERVACIONES

Sólo hay una sala de autopsias en el ~~hos~~ HJS. Existe otra sala para la preparación de cadáveres. (Adjunto FOTO)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

GUARDERÍA

ZONA DE DUELO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
NO EXISTE NADA Recepción (1)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	2				
	Silla giratoria con brazos y ruedas alta	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Túmulo (3)	Equipamiento específico					
Túmulo (3)	Equipamiento específico					
Túmulo (3)	Equipamiento específico					
Sala de familiares (3)	Sillas modulares	8				
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	1				
	Cuadro decoración pared	2				
	Jardinera	1				
	Soporte para posters de campañas	1				
	Expositor de folletos	1				
	Papelera	1				
Sala de familiares (3)	Sillas modulares	8				
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	1				
	Cuadro decoración pared	2				
	Jardinera	1				
	Soporte para posters de campañas	1				
	Expositor de folletos	1				
	Papelera	1				
Sala de familiares (3)	Sillas modulares	8				
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	1				
	Cuadro decoración pared	2				
	Jardinera	1				
	Soporte para posters de campañas	1				
	Expositor de folletos	1				
	Papelera	1				

OBSERVACIONES

~~No existe nada de esto, es una guardería ahora~~
~~El Velatorio o Zona de Duelo~~ El HJC no tiene zona de Duelo o Velatorio. En el momento de su construcción se proyectó un espacio para ello pero por cuestiones legales se desestimó. Actualmente ese espacio es dedicado a una guardería.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

SÓTANO HJC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso	**FECHA:**	28-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho funeraria (3)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija	2				
	Papelera	1				
Despacho funeraria (3)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija	2				
	Papelera	1				
Despacho funeraria (3)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija	2				
	Papelera	1				
Aseos públicos (2)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	8	1	✓		
	Colgador mural individual	1	x			
Aseos públicos (2)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	8	1	✓		
	Colgador mural individual	1	x			

OBSERVACIONES

Despachos de funeraria no hay
No hay aseos públicos en la planta -1 ó ~~sótano~~ sótano.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

RESIDUOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Residuos de Riesgo (1)	Sin mobiliario clínico					
Residuos Generales (1)	Sin mobiliario clínico					
Residuos Domesticos (1)	Sin mobiliario clínico					
Lavado de carros (1)	Sin mobiliario clínico					
Residuos Especiales (1)	Sin mobiliario clínico					
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN		

PLANTA BAJA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR: A	Gis CORDOBA	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

REHABILITACIÓN PLANTA BAJA

RECEPCIÓN

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción / Información / Secretaría (1) Compartido con Diálisis *	Mostrador de información de 200-240 cm.	1	1	✓		
	Cajonera de mostrador	2	1	✓		
	Silla giratoria con ruedas alta	2	1	✓		
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	2	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	1	✓		
Sala de espera familiares (1)	Sillas modulares	15	12	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x ~~50~~ cm. 65x65	3	1	✓		
	Cuadro decoración pared	3	2	✓		
	Jardinera	1	X			
	Soporte para posters de campañas	1	1	✓		✓
	Expositor de folletos	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
Aseos públicos adaptados (1) (2) *	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	✓		
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X	X		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Barra soporte lateral pared	1	1	✓		

OBSERVACIONES

* 2 Aseos adapta en la sala de espera
* la recepción está compartida con Diálisis

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Aseo Público (2)

No hay Cubo de 12 l., ni colgador ni repisa.

Cristina 630036215

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:			
INSPECTOR:		**COD. PARTE:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**FECHA:**	
		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos públicos (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
Aseos públicos (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
Aseos públicos (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
Aseos públicos (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

Realizados dentro de la Zona de Apoyo de esta área

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

REHABILITACIÓN

ZONA DE TERAPIAS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho consultas (3)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	2	1	✓		
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1			
	Gavetas para material fungible	1	10	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			
Box cinesiterapia (3)	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	6	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	3	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	4	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	6	✓		

Gimnasio

OBSERVACIONES

Box cinesiterapia, es el Gym. (Gimnasio)

3 camillas

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA DE TERAPIAS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho consultas (3)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	2	1	✓		
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	10	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			
Box cinesiterapia (3)	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Gavetas para material fungible	1				

Actual GIMNASIO

OBSERVACIONES

Cinesiterapia ubicación actual
Drenaje linfático, con tabla pedal en Gimnasio

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA DE TERAPIAS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho consultas (3)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	2	1	✓		
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	ID	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			
Box cinesiterapia (3) GIMNASIO	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Gavetas para material fungible	1				

OBSERVACIONES

En la ubicación de cinesiterapia hay hidroterapia con
- 3 sillas - jabón
- 1 vitrina - papel
- 1 camilla - cajonera ruedas

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control del Consumo S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box electroterapia (5)	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	2	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	✓		
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		
Box polivalente / individual (4)	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	2	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		

OBSERVACIONES

+ Hay otro Box de electroterapia (6)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

electroterapia (6)

- Jabón
- Papel
- 4 sillas madera
- Camilla, con dispensador papel de camilla
- Vitrina
- Papelera
- Gavetas xa material fungible

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
B06 **Box electroterapia (5)**	Foco de exploración de pie	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	x	x		
	Taburete giratorio con ruedas	1	✓	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	✓	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	✓	✓		
	Escabel	1	x			
	Cortinaje de exploración	1	x			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1	x			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	x			
	Papelera	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	x			
	Gavetas para material fungible	1	x			
B01, B02 B11 **Box polivalente / individual (4)**	Foco de exploración de pie	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	x			
	Dispensador de toallas de papel	1	x			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	x			
	Taburete giratorio con ruedas	1	x			
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	✓	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	x			
	Escabel	1	x			
	Cortinaje de exploración	1	x			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1	x			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	x			
	Papelera	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	x			
	Gavetas para material fungible	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA DE APOYO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (2)	Dispensador de jabón	1	1	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	—		
	Colgador mural individual	1	1	—		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	—		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	—		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Aseos Personal (2)	Dispensador de jabón	1	1	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	[illegible]			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	—		
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	—		
	Colgador mural individual	1	1	—		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	—		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	—		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
♂ Vestuarios Personal (2)	Carro de transporte de ropa sucia	1	X			
	Banco de vestidor	~~2~~	1	—		
	Armario ropero modular	~~10~~	18	/		
	Colgador para ropero	~~30~~	6	/		
	Papelera con tapa basculante de 50L	1	/	—		
	Colgador mural múltiple (módulo)	2	X	X		
♂ Vestuarios Personal (2)	Carro de transporte de ropa sucia	1	X			
	Banco de vestidor	2	1	—		
	Armario ropero modular	10	6			
	Colgador para ropero	~~30~~	2			
	Papelera con tapa basculante de 50L	1	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	2	X		✓	
Almacén de lencería (1)	Carro de lencería	1	1	✓		
Zona de utensilios de limpieza (1)	Carro de limpieza	1	1	✓		
	Estantería de pared de 3 estantes	1	1	✓		

OBSERVACIONES

Aseo personal: secador dañado x2

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA DE APOYO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (2)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
Aseos Personal (2)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
Vestuarios Personal (2)	Carro de transporte de ropa sucia	1				
	Banco de vestidor	2				
	Armario ropero modular	10				
	Colgador para ropero	30				
	Papelera con tapa basculante de 50L	1				
	Colgador mural múltiple (módulo)	2				
Vestuarios Personal (2)	Carro de transporte de ropa sucia	1				
	Banco de vestidor	2				
	Armario ropero modular	10				
	Colgador para ropero	30				
	Papelera con tapa basculante de 50L	1				
	Colgador mural múltiple (módulo)	2				
Almacén de lencería (1)	Carro de lencería	1				
Zona de utensilios de limpieza (1)	Carro de limpieza	1				
	Estantería de pared de 3 estantes	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box electroterapia (5) B09	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	/		
	Escabel	1	1	/		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1			/
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	/		
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	X			
Box polivalente / individual (4)	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Gavetas para material fungible	1				

En Box electroterapia (05)

OBSERVACIONES

- B09 → litera de 2 cuerpos
- Cubo de 50L con tapa

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box electroterapia (5) B07	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	/		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1	X	X		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	X	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	X			
Box polivalente / individual (4) B.01 Despacho	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	/		
	Papelera	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box electroterapia (5) B05	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	X			
Box polivalente / individual (4) Box 02	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	1	/		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X	X		
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
* Sala rehabilitación cardiorespiratoria (1) 1º Planta	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2	✓		
	Silla fija con brazos	8	2	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	(no 3 cuerpos)		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	2			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	X			
Sala pruebas funcionales (1) 1º Planta	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
	Carro de historias clínicas	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Gavetas para material fungible	1				
Gimnasio	Equipamiento médico específico	1	BOX CINESITERAPIA			
Baño Galvánico	Equipamiento médico específico	1	✓			
Tanque Hubbard	Equipamiento médico específico	1				

SALA ESTAR.

perpiso mecánic

No existe → Actualmente 7 sillas y 2 escabel en 2 salas de rehabilitación cervical

OBSERVACIONES

* la sala de rehabilitación está en la 1º Planta

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala actividades vida diaria (1)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	3				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	3				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Gavetas para material fungible	1				
	Conjunto encastrado de codina y fregadero (equipamiento fijo)	1				
Sala terapia ocupacional (1)	Reloj de pared con fecha	1				
	Carro de historias clínicas	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	~~12~~				
	Mesas trapezoidales	~~10~~				
	Taburete giratorio con ruedas	~~1~~				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	3				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	3				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Gavetas para material fungible	1				
	Conjunto encastrado de codina y fregadero (obra)	~~1~~				

OBSERVACIONES

- Cubo tapa oscilante.
- Perchero pie.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA DE TRABAJO PERSONAL

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho de supervisión (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm. Con estantería y archivador	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	2	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		
Sala de trabajo fisioterapeutas (1)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Silla fija con brazos	2				
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1				
	Papelera	1				
NO EXISTE,	Perchero de pie	1				
→ GIMNASIO INFANTIL	Pizarra para rotulador de pared	1				
Sala de trabajo adjuntos (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	8	5	✓		
	Papelera	1	2	✓		
	Planning para tarjetas	2	X			
	Plafón de avisos	1	X			
	"Tablilla" de Historia Clínica	1	X			
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	X			
Zona polivalente de personal (1)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	8	7	✓		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	✓	✓		
	Papelera	1	1			
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	X			
	Nevera de 150 L.	1	1	✓		
	Cafetera eléctrica	1	1	✓		
	Horno microondas empotrado	1	1	✓		
Zona Sucia (1)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1	X			
	Carro de transporte de ropa sucia	2	1	✓		
	Taburete fijo de 60 cm. Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		

→ Gimnasio Infantil

OBSERVACIONES

- papelera
- litera 3 cuerpos
- taburete
- linterna exploración de pie
- dispensador toallas papel
- litera de 3 cuerpos

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

REHABILITACIÓN

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (v / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Vestuarios pacientes (2) ♂	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	2	✓		
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	2	✓		
	Banco para ducha	1	X			
	Banco de vestidor	~~2~~	1	✓		
	Armario ropero modular	~~20~~	10	✓		
	Colgador para ropero	60	3	✓✓		
	Papelera con tapa basculante de 50L	1	1	✓		
	Colgador mural múltiple (módulo)	2	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	2	✓		
Vestuarios pacientes (2)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Banco para ducha	1				
	Banco de vestidor	2	1	✓		
	Armario ropero modular	20	10	Taquilla		
	Colgador para ropero	60				
	Papelera con tapa basculante de 50L	1	1		✓	
	Colgador mural múltiple (módulo)	2	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA BAJA (entrada)

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	JUAN CARLOS GARCÍA	**FECHA:**	27/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

PLANTA BAJA

SEGURIDAD

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Central de seguridad (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	2	1	✓		
	Equipamiento técnico específico		X			
Garita seguridad (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
Almacén general (1)	Estantería metálica 5/6 niveles ML	4	√ (S)			
	Escalera con tres peldaños y pies aislantes	1	X			
Aseos personal (2)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
Aseos personal (2)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			

OBSERVACIONES

~~SALA~~ ÁREA de SEGURIDAD ANTIGUA

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

RESULTADO x 2ºVEZ / GUIA QUIRÓGA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Pascual	FECHA: 28-11-17	30.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	14.15

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

PLANTA BAJA

RECEPCIÓN

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción / Información / Secretaría (1)	Mostrador de información de 200-240 cm.	1	3	✓		
	Cajonera de mostrador	2	4	✓		
	Silla giratoria con ruedas alta	2	2	✓		
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	2	X	✓		
	Papelera	1	12	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	1	✓	Sin Pila	
Sala de espera encamados (1)	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	✓		
Aseos públicos (2)	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Aseos públicos adaptados (1)	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Barra soporte lateral pared	1	1	✓		

OBSERVACIONES

4

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Inspección y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

RECEPCIÓN

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción / Información / Secretaría (1)	Mostrador de información de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	2				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	2				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Sala de espera encamados (1)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					
Aseos públicos (2)	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	x	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	x			
Aseos públicos adaptados (1)	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Secamanos eléctrico	1	x			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	x			
	Colgador mural individual	1	x			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	x			
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	x			
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	x			
	Barra soporte lateral pared	1	x			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de espera ambulatoria (6)	Sillas modulares	15	18	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm. 65x65	3	15	✓		
	Cuadro decoración pared	3	1 ✗ 3	✓		
	Jardinera	1	X X			
	Soporte para posters de campañas	1	X X			
	Expositor de folletos	1	X X			
	Reloj de pared con fecha	1	X X			
	Carro de historias clínicas		X X			
Sala de espera ambulatoria (6) FOTO NO EN USO	Sillas modulares	15	1 X	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm. 65x65	3	1 X	✓		
	Cuadro decoración pared	3	1 1	✓		
	Jardinera	1	X X			
	Soporte para posters de campañas	1	X X			
	Expositor de folletos	1	1 X			
	Reloj de pared con fecha	1	X X			
	Carro de historias clínicas		X X			
Sala de espera ambulatoria (6)	Sillas modulares	15	12	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm. 65x65	3	1 1	✓		
	Cuadro decoración pared	3	1 3	✓		
	Jardinera	1	X X			
	Soporte para posters de campañas	1	X X			
	Expositor de folletos	1	X X			
	Reloj de pared con fecha	1	X X			
	Carro de historias clínicas		X X			
Sala de espera ambulatoria (6)	Sillas modulares	15	12	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm. 65x65	3	X 6	✓		
	Cuadro decoración pared	3	X 3	✓		
	Jardinera	1	X X			
	Soporte para posters de campañas	1	X X			
	Expositor de folletos	1	X X			
	Reloj de pared con fecha	1	X X			
	Carro de historias clínicas		X X			
Sala de espera ambulatoria (6)	Sillas modulares	15	14	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm. 65x65	3	12	✓		
	Cuadro decoración pared	3	1 3	✓		
	Jardinera	1	X X			
	Soporte para posters de campañas	1	X 0 X	✓		
	Expositor de folletos	1	X 1	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	X X			
	Carro de historias clínicas		X X			
Sala de espera ambulatoria (6)	Sillas modulares	15	13	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm. 65x65	3	16	✓		
	Cuadro decoración pared	3	X 1	✓		
	Jardinera	1	X X			
	Soporte para posters de campañas	1	X X			
	Expositor de folletos	1	X X			
	Reloj de pared con fecha	1	X X			
	Carro de historias clínicas		X X			

OBSERVACIONES

Hay 2 salas de espera + q no están habilitadas

FOTO

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

PLANTA BAJA

ZONA DE EXÁMENES

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Radiología simple (6) Actualmente en Radiología Urgencias	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
Radiología simple (6) Radiología 4	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
Radiología simple (6) Radiología 3	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
Radiología simple (6) Radiología 2	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
Radiología simple (6) Radiología 1	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
Radiología simple (6) telemando	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	Equipamiento médico específico	1	✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (v / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Radiología Telecomandada (1)	Equipamiento médico específico					
Zona de mandos (14)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Resonancia Magnética (1)	Equipamiento médico específico		1			
Tomografía computerizada (2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Mamógrafo(2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	OBSERVACIONES					

Solo tienen un mamógrafo en el módulo.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA BAJA

Solo hay 5 zonas de mandos, como tal.

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Radiología Telecomandada (1)	Equipamiento médico específico					
Zona de mandos (14)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Resonancia Magnética (1)	Equipamiento médico específico					
Tomografía computerizada (2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Mamógrafo(2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Radiología Telecomandada (1)	Equipamiento médico específico					
Zona de mandos (14)	Equipamiento médico específico	1				
	Equipamiento médico específico	1				
	Equipamiento médico específico	1				
	Equipamiento médico específico	1				
	Equipamiento médico específico	1				
	Equipamiento médico específico	1				
	Equipamiento médico específico	1				
	Equipamiento médico específico	1				
	Equipamiento médico específico	1				
	Equipamiento médico específico	1				
	Equipamiento médico específico	1				
	Equipamiento médico específico	1				
	Equipamiento médico específico	1				
Resonancia Magnética (1)	Equipamiento médico específico					
Tomografía computerizada (2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Mamógrafo(2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN		

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Radiología Telecomandada (1)	Equipamiento médico específico					
Zona de mandos (14)	Equipamiento médico específico	1	/			
	Equipamiento médico específico	1	/			
	Equipamiento médico específico	1	/			
	Equipamiento médico específico	1	/			
	Equipamiento médico específico	1	/			
	Equipamiento médico específico	1	/			
	Equipamiento médico específico	1	/			
	Equipamiento médico específico	1	/			
	Equipamiento médico específico	1	/			
	Equipamiento médico específico	1	/			
	Equipamiento médico específico	1	/			
	Equipamiento médico específico	1	/			
	Equipamiento médico específico	1	/			
	Equipamiento médico específico	1	/			
Resonancia Magnética (1)	Equipamiento médico específico					
Tomografía computerizada (2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Mamógrafo(2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Radiología Telecomandada (1)	Equipamiento médico específico					
Zona de mandos (14)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Resonancia Magnética (1)	Equipamiento médico específico					
Tomografía computerizada (2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Mamógrafo(2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN		

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Radiología Telecomandada (1)	Equipamiento médico específico					
Zona de mandos (14)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Resonancia Magnética (1)	Equipamiento médico específico					
Tomografía computerizada (2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Mamógrafo(2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Radiología Telecomandada (1)	Equipamiento médico específico					
Zona de mandos (14)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Resonancia Magnética (1)	Equipamiento médico específico					
Tomografía computerizada (2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Mamógrafo(2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN		

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Radiología Telecomandada (1)	Equipamiento médico específico					
Zona de mandos (14)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Resonancia Magnética (1)	Equipamiento médico específico					
Tomografía computerizada (2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Mamógrafo(2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Radiología Telecomandada (1)	Equipamiento médico específico					
Zona de mandos (14)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Resonancia Magnética (1)	Equipamiento médico específico					
Tomografía computerizada (2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Mamógrafo(2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN		

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Radiología Telecomandada (1)	Equipamiento médico específico					
Zona de mandos (14)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Resonancia Magnética (1)	Equipamiento médico específico					
Tomografía computerizada (2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Mamógrafo(2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Radiología Telecomandada (1)	Equipamiento médico específico					
Zona de mandos (14)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Resonancia Magnética (1)	Equipamiento médico específico					
Tomografía computerizada (2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Mamógrafo(2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR		RESPONSABLE INSTALACIÓN	

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (v / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Radiología Telecomandada (1)	Equipamiento médico específico					
Zona de mandos (14)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Resonancia Magnética (1)	Equipamiento médico específico					
Tomografía computerizada (2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Mamógrafo(2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Radiología Telecomandada (1)	Equipamiento médico específico					
Zona de mandos (14)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Resonancia Magnética (1)	Equipamiento médico específico					
Tomografía computerizada (2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Mamógrafo(2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN		

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Consultoría de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Radiología Telecomandada (1)	Equipamiento médico específico					
Zona de mandos (14)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Resonancia Magnética (1)	Equipamiento médico específico					
Tomografía computerizada (2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
Mamógrafo(2)	Equipamiento médico específico					
	Equipamiento médico específico					
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Ecografías (3) 1	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X	✓		
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	2			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1			
	Taburete giratorio con ruedas	1	2	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	X	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
Ecografías (3) 2	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X	✓		
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	2			
	Dispensador de toallas de papel	1	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1			
	Taburete giratorio con ruedas	1	2	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
Ecografías (3) Se ubica en un despacho médico	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	2 X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1			
	Taburete giratorio con ruedas	1	1			
	Litera de exploración	1	1			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

Ecografías 3 está en obra foto

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA BAJA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Eco-doppler (1) Eco (4)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X	—		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X	—		
	Foco de exploración de pie	1	X 1	✓		
	Dispensador de jabón	1	X 2	—		
	Dispensador de toallas de papel	1	X 1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1 2	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1 2	✓		
	Litera de exploración	1	1 1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1 1	✓		
	Escabel	1	X X	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1 X	—		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1 X	—		
	Papelera	1	1 2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X 1	✓		
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

Son 4 ecografías y todas hacen doppler

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA DE TRABAJO PERSONAL

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Revelado luz de día (1)	Equipamiento médico específico	1	2	√		
Cámaras oscuras y revelado radiología (1)	Equipamiento médico específico	1	1	—		
Zona revelado RM (1)	Reloj de pared con fecha		—			
	Carro de historias clínicas		1	—		
Salas de lecturas radiología (1)	Negatoscopio de cuatro cuerpos	5	X 4	√		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	5	1 1	—		
	Papelera	5	1 3	—		
	Poyata construída en madera de alto 74 cm. y 65-70 cm. de ancho, perimetral a tres lados de la sala (Equipamiento fijo)		XX			
Despacho de supervisión (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1 2	√		
	Silla fija	2	1 4	√		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1 2	√		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm. Con estantería y archivador	1	1 2	√		
	Papelera	1	1 1	√		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1 X	—		
	Perchero de pie	1	X 1	√		
Zona polivalente de personal (1)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	1	—		
	Silla fija con brazos	8	X 8			
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	—		
	Papelera	1	1	—		
	Perchero de pie	1	1	—		
	Pizarra para rotulador de pared	1	X			
	Nevera de 150 L.	1	1	—		
	Cafetera eléctrica	1	X			
	Horno microondas empotrado	1	1	—		
Sala de reuniones (1)	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	X			6
	Silla fija con brazos	8	24	√		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	√		
	Papelera	1	2	√		
	Perchero de pie	1	1	—		
	Pizarra para rotulador de pared	1	X 1	√		
Despacho jefe servicio (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1 2	—		
	Silla fija	2	1 4	—		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1 2	—		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	1 2	—		
	Papelera	1	1 2	—		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	X	—		
	Perchero de pie	1	2	—		
Secretaría (1)	Mostrador de información de 200-240 cm.	1	1	—		
	Cajonera de mostrador	2	1	—		
	Silla giratoria con ruedas alta	2	1	—		
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	2	1	—		
	Papelera	1	1	—		
	Reloj de pared con fecha	1	1	—		

PLANTA BAJA

OBSERVACIONES

En total hay 4 salas de lecturas de radiología

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Zona trabajo administrativo (5)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Silla fija	2				
	Plafón de corcho	1				
	Papelera	1				
	Fotocopiadora	1	X			
Zona trabajo administrativo (5)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	X			
	Silla fija	2				
	Plafón de corcho	1	X			
	Papelera	1				
	Fotocopiadora	1	X			
Zona trabajo administrativo (5)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	X			
	Silla fija	2				
	Plafón de corcho	1				
	Papelera	1				
	Fotocopiadora	1	X			
Zona trabajo administrativo (5)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	X			
	Silla fija	2				
	Plafón de corcho	1				
	Papelera	1				
	Fotocopiadora	1	X			
Zona trabajo administrativo (5)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Silla fija	2				
	Plafón de corcho	1				
	Papelera	1				
	Fotocopiadora	1	X			

OBSERVACIONES

No hay. No existe mutua en zona de trabajo administrativo

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA DE APOYO

PLANTA BAJA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (v / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Taller reparaciones (1)	Equipamiento médico específico		1 X	✓		
Local criogénico (RM) (1)	Equipamiento médico específico		1	✓		
Informática (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1 2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1 2	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	1 1	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1 X	✓		
	Silla fija	1	1 X	✓		
	Plafón de corcho	1	X X			
	Papelera	1	1 1	✓		
Almacén material general (1)	Estantería metálica 5/6 niveles ML	10	1	✓		
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	20	1	✓		
	Escalera con cinco peldaños y pies aislantes	1	X			
Aseos Personal (1)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Zona de utensilios de limpieza (1)	Carro de limpieza	1	1	✓		
	Estantería de pared de 3 estantes	1	1	✓		
Almacén de equipamientos (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	4	1	✓		

PLANTA BAJA

OBSERVACIONES

Sala manipulación de imagen

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

BAJA

PLANTA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	[illegible]	**FECHA:**	27/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

DIÁLISIS PLANTA BAJA

RECEPCIÓN

Rehabilitación FOTO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción / Información / Secretaría (1) Comparte con Rehabilitación	Mostrador de información de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	2				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	2				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Sala de espera familiares (1)	Sillas modulares	15	1	—		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm. Cuadrados 65x65	~~1~~	2	—		—
	Cuadro decoración pared	~~2~~	1			
	Jardinera	1	X			
	Soporte para posters de campañas	1	1	—		
	Expositor de folletos	1	X			
	Papelera	~~1~~	2	—		
Aseos públicos adaptados (1) Están en Rehabilitación	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
	Barra soporte lateral pared	1				

OBSERVACIONES

- Actualmente Comparten recepción / Secretaria Diálisis y Rehabilitación

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos públicos (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
Aseos públicos (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
Aseos públicos (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
Aseos públicos (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

DIALISIS

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA DE TRATAMIENTO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala diálisis crónicos (1)	Mueble clínico con pila	14	X			
	Dispensador de jabón	14	3	✓		
	Dispensador de toallas de papel	14	3	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	14	12	Sin pedal	pedal	
	Sillón reclinable completo	14	14	✓		
	Carro de curas con cajones	2	2	✓		
	TV de 25"	14	14	✓		
Sala diálisis agudos (1)	Mueble clínico con pila	4	3	✓		
	Dispensador de jabón	4	3	✓		
	Dispensador de toallas de papel	4	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	4		Sin	en el	
	Cama clínica eléctrica	4	3	✓		
	Mesita de noche clínica	4	3	✓		
	Carro de curas con cajones	1	3	✓		
Sala pacientes aislados (1)	Mueble clínico con pila	2				
	Dispensador de jabón	2				
	Dispensador de toallas de papel	2				
	Cubo de basura con pedal 12L	2				
	Sillón reclinable completo	2				
	Carro de curas con cajones	1				
	TV 25"	2				
Sala diálisis peritoneal (1)	Mueble clínico con pila	6	X			
	Dispensador de jabón	6	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	6	X			
	Carro de historias clínicas	6	X			
	Cama clínica eléctrica	6	X			
	Mesita de noche clínica	6	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Mesa telescopada	1	X			
	Báscula	1	1	✓		

NO existe, en plano es sólo peritoneal

OBSERVACIONES

SOLO HAY UNA SALA PERITONEAL, QUE ES UNA DE LAS SALAS DE PACIENTES AISLADOS EN PLANO.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Puesto control enfermería (1)	Reloj de pared con fecha	1	1	√		
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	2	1	√		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	2	√		
	Papelera	1	1	√		
	Planning para tarjetas	1	X			
	Plafón de avisos	1	1	√		
	"Tablilla" de Historia Clínica	30	X			
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	5	Mal		
	Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	1	1	√		
Zona limpia (1)	Dispensador de jabón	1	1	√		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	√		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	√		
	Taburete fijo de 60 cm.	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Papelera con tapa basculante de 25L	1	2	√		
	Frigorífico 300L	1	1			
	Carro de curas con cajones Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	√		
Zona Intermedia (1)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Taburete fijo de 60 cm.	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Papelera con tapa basculante de 25L Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Zona Sucia (1)	Dispensador de jabón	1	1	√		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	√		
	Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1	X			
	Carro de transporte de ropa sucia	2	2	√		
	Taburete fijo de 60 cm. Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
Sala Técnica Polivalente (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	√		
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	√		
	Reloj de pared con fecha	1	X			
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Silla fija con brazos	2	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración con cabecero abatible y ruedas	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	√		
	Papelera	1	1	√		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Aspirador y contenedor	1	X			
	Gavetas para fungible	1	X			
	Carro de curas de 3 estantes con buzón de deshechos Poyatas (Equipamiento fijo) Mueble clínico encastrado con pilta dos cuerpos (elemento fijo)	1	X			

Escala de los 4 asientos

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso	**FECHA:**	28-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Vestuario Zona de trabajo personal (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	8				
	Papelera	1				
	Planning para tarjetas	2				
	Plafón de avisos	1				
	"Tablilla" de Historia Clínica	1				
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1				
Despacho de supervisión (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm. Con estantería y archivador	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	✓		
	Perchero de pie	1	X			
Zona polivalente de personal (1) OFICIO	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	8	X			
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1			
	Papelera	1	1	✓		
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	✓		
	Nevera de 150 L.	1	1	✓		
	Cafetera eléctrica	1	1	✓		
	Horno microondas empotrado	1	1	✓		
Zona trabajo administrativo (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	1	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	X			
	Silla fija	2	1	✓		
	Plafón de corcho	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Fotocopiadora	1	X			
Almacén de material general (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	1	X	✓		
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	5	1	✓		
Almacén de equipamientos (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	1	1	✓		
Zona de utensilios de limpieza (1)	Carro de limpieza	1	X	✓		
	Estantería de pared de 3 estantes	1	1	✓		

OBSERVACIONES

La zona de trabajo personal es un vestuario

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (4)	Dispensador de jabón	1	1	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	—		
	Colgador mural individual	1	1	—		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	—		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	—		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Aseos Personal (4)	Dispensador de jabón	1	1	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	—		
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	—		
	Colgador mural individual	1	1	—		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	—		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	—		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Aseos Personal (4)	Dispensador de jabón	1	1	—	—	
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	—	—	
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	—	—	
	Colgador mural individual	1	1	—	—	
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	—	—	
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	—	—	
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Aseos Personal (4)	Dispensador de jabón	1	1	—	—	
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X		—	
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X		—	
	Dispensador de toallas de papel	1	1	—	—	
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	—	—	
	Colgador mural individual	1	1	—	—	
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	—	—	
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	—	—	
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			

VESTUARIO PERSONAL

OBSERVACIONES

- 1 banco vestuario
- Taquillas 18
- Sillas fijas 3
- Cortina división 1

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA RD/A

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Fuentes	**FECHA:**	29-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción de muestras anat. Patológica (1)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1	✓	✓		
	Cajonera de mostrador	1	✓	—		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	2	✓	—		
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1	X			
	Papelera	1	✓	—		
	Reloj de pared con fecha Poyatas (Equipamiento		X			
Zona de Boxes (1)	Foco de exploración de pie	8	X			
	Juego de bandejas	8	X			
	Taburete giratorio con ruedas	8	✓	—		
	Butaca de extracciones con sujeta brazos	8	✓	—		
	Carro auxiliar pequeño 60 x 40 x 85	8	✓	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	8	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	8	✓	—		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	4	X			
Preparación muestras y etiquetado (1)	Silla giratoria con ruedas alta	2	✓	—		
	Cubo de basura con pedal 50L Poyatas (Equipamiento fijo)	2	✓	✓		
Despacho de supervisión (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija	2				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm. Con estantería y ar	1				
	Papelera	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Perchero de pie	1				

OBSERVACIONES

No tienen despacho de supervisión, utilizan uno de la 1ª planta

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Juan Carlos García	FECHA:	27/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

GESTIÓN DE PACIENTES

ADMISIÓN HOSPITALIZACIÓN

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de espera (1)	Sillas modulares	8	✓	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	1	X			
	Cuadro decoración pared	2	X			
	Jardinera	1	X			
	Soporte para posters de campañas	1	✓	✓		
	Expositor de folletos	1	✓	✓		
	Papelera	1	✓	✓		
Zona de atención al paciente (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	4	✓ (1)	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	4	✓ (1)	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	4	✓ (1)	✓		
	Silla fija	8	✓ (2)	✓		
	Armario altura 125 X 80 x 40 cm.	4	✓ (3)	✓		
	Papelera	4	✓ (1)	✓		
	Mamparas separadoras	3	X			
Despacho asistente social (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	✓	✓		
	Silla fija	2	✓ (3)	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	✓	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	X			
	Papelera	1	✓	✓		
Área de trabajo administrativo (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	3	✓ (6)	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	3	✓	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	3	✓ (6)	✓		
	Silla fija	3	✓ (4)	✓		
	Armario altura 125 X 80 x 40 cm.	3	✓	✓		
	Papelera	3	✓	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	JUAN CARLOS GARCÍA	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CAJA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Caja Fuerte (1)	Equipamiento técnico específico		X			
Área de trabajo (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija	1				
	Armario altura 125 X 80 x 40 cm.	1				
	Papelera	1				
	OBSERVACIONES: La Sala de Caja no existe					
			AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN		

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	JUAN CARLOS GARCIA	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

OTROS ESPACIOS ADMISIONES

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos públicos adaptados (1)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓			
	Secamanos eléctrico	1	✓			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓			
	Colgador mural individual	1	✓			
	Barra soporte lateral pared	1	✓	✓		
Sala de trabajo voluntarios (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓ (3)			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	✓ (7)			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	✓			
	Silla fija	1	✓ (4)			
	Armario altura 125 X 80 x 40 cm.	1	✓			
	Papelera	1	✓	✓		
Central telefónica (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	✓ (3)			
	Silla fija	1	✓			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓			
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	✓ (5)			
	Papelera	1	✓ (3)			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	✓	✓		
Almacén general (1)	Estantería metálica 5/6 niveles ML	5	✓			
	Escalera con tres peldaños y pies aislantes	1	x	✓		

OBSERVACIONES

Solo de Trabajo es la sala de jefe de admisión (modificada)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho (4)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	✓ (3)	✓		
	Silla fija	1	x			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓ (7)	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	✓	✓		
	Papelera	1	✓	✓		
Despacho (4)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	✓	✓		
	Papelera	1	✓	✓		
Despacho (4)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓ (7)	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	✓	✓		
	Papelera	1	✓	✓		
Despacho (4)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓ (3)	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	✓	✓		
	Papelera	1	✓	✓		
Aseos públicos (2)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x	✓		
	Secamanos eléctrico	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
Aseos Personal (2)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	x			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	x			

OBSERVACIONES

Los dospachos (2) son utilizados como despachos de asistencia social

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	JUAN CARLOS GARCÍA	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

VESTÍBULO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (✓ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Punto de información (1)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1	✓	✓		
	Cajonera de mostrador	1	✓	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas alta	1	✓	✓		
	Armario altura 125 X 80 x 40 cm.	1	✓	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	✓	✓		
	Papelera	1	✓	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	✓	✓		
Cajero automático (1)	Equipamiento técnico específico		✓	✓		
Telefones públicos (1)	Equipamiento técnico específico		✓	✓		
Hombres Aseos públicos (4)	El descrito para este elemento	4	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	8	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	4	X			
	Secamanos eléctrico	4	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	3	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
Mujeres Aseos públicos (4)	El descrito para este elemento	4	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L ES	8	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	4	X			
	Secamanos eléctrico	4	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	3	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
Minusválidos Aseos públicos (4)	El descrito para este elemento	4	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	8	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	4	X			
	Secamanos eléctrico	4	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	3	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
Minusválidos Aseos públicos (4)	El descrito para este elemento	4	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	8	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	4	X			
	Secamanos eléctrico	4	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	3	1	✓		
	Colgador mural individual	1	1	✓		
Aseos públicos adaptados (1)	Cubo de basura con pedal 12L	1	X	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓	✓		
	Secamanos eléctrico	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X	✓		
	Barra soporte lateral pared	1	✓	✓		
Kiosko (1)	Equipamiento técnico específico	✓	✓	✓		
Floristeria (1)	Equipamiento técnico específico	✓	✓	✓		
Lotería (1)	Equipamiento técnico específico	✓	✓	✓		

ESTÁN HECHOS

OBSERVACIONES

Los módulos Kiosco, floristeria y loteria sestán pero no son utilizados para tal fin. (1

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:	ELIA		**COD. PARTE:**
INSPECTOR:			**FECHA:** 24/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:			**HORA:**

HOSPITALIZACIÓN NEONATOLÓGICA

PLANTA BAJA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala Hospitalización (1)	Caudalímetro de oxígeno	6	8			
	Regulador de vacío	6	8			
	Esfigmomanómetro de pared	6	X			
	Soporte de termómetro	6	X			
	Mesa de exploración de bebés	1	1	✓		
	Carro de curas	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	6	X			
	Colgador para ropero	24	8-12	✓		
	Papelera metálica	6	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	6	X			
	Equipamiento técnico específico		1	✓		
Puesto de control enfermería (1)	Reloj de pared con fecha	1	1	✓		
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	2	4	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Planning para tarjetas	1	X			
	Plafón de avisos	1	1	✓		
	"Tablilla" de Historia Clínica	30	X			
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	1	✓		
	Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	1	1	✓		
Zona Limpia (1)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Taburete fijo de 60 cm.	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Papelera con tapa basculante de 25L	1	X			
	Frigorífico 300L	1	1	✓		
	Carro de curas con cajones Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		
Zona Sucia (1)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1	X			
	Carro de transporte de ropa sucia	2	1	✓		
	Taburete fijo de 60 cm. Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala técnica polivalente (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Silla fija con brazos	2	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Mesa de exploración de bebés	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
Zona de lavado de manos (1)	Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		
Zona de lavado (incubadoras, cunas, etc) (1)	Equipamiento específico	1	1	✓		
Habitación lactancia materna (1)	Silla fija	6				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Soporte para posters de campañas	1				
	Expositor de folletos	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Almacén de medicamentos (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	1	8	✓		
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	5	20	✓		
Zona de trabajo personal (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	8	1	✓		
	Papelera	1	3	✓		
	Planning para tarjetas	2	X			
	Plafón de avisos	1	1	✓		
	"Tablilla" de Historia Clínica	1	X	✓		
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	X	✓		
Sala de espera familiares (1)	Sillas modulares	20	7			
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	4	1	✓		
	Cuadro decoración pared	6	-5			
	Jardinera	1	X			
	Soporte para posters de campañas	1	X			
	Expositor de folletos	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1	X			
Aseos públicos (2)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	✓		
	Secamanos eléctrico	1	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Despacho de información (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X	(VACÍA)		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Silla fija con brazos	2	X			
	Papelera	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (v / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Almacén de medicamentos (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	1				
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	5				
Zona de trabajo personal (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	8				
	Papelera	1				
	Planning para tarjetas	2				
	Plafón de avisos	1				
	"Tablilla" de Historia Clínica	1				
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1				
Sala de espera familiares (1)	Sillas modulares	20				
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	4				
	Cuadro decoración pared	6				
	Jardinera	1				
	Soporte para posters de campañas	1				
	Expositor de folletos	1				
	Papelera	1				
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1				
Aseos públicos (2)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Despacho de información (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija con brazos	2				
	Papelera	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA BAJA HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	24/11/12
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B025

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	✓	✓		
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

- En ninguna habitación hay esfigmomanómetro de pared ni soporte para termómetro, ni silla ergonómica para acompañante, ni colgador para ropa ni basura.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HCT

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B-026

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	/		
	Regulador de vacío	1	1	/		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	/		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	/		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	/		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	/		
	Silla fija	1	1	/		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

Falta en Pantalla

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Elia QUIROGA	FECHA:	24/4/2012
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B Q 24

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1	1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X 1	✓		
	Silla fija	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	1	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	1	✓		
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HCL

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	23.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B028

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	✓	✓		
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

- Cuna movil
- Cuna bañera

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Elia QUIROGA	**FECHA:**	24.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

B029

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	/	/		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	/	/		
	Colchón de látex para cama clínica	1	/	/		
	Almohada para cama clínica	1	/	/		
	Portasueros rodado	1	/	/		
	Porta-sueros para cama clínica	1	/	/		
	Caudalímetro de oxígeno	1	/	/		
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	/	/		
	Mesa cigüeña para comer	1	/	/		
	Sofá-cama 2 m.	1	/	/		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	/	/		
	Silla fija	1	/	/		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	/	/		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	/	/		
	Sujeta toallas de ducha	1	/	/		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	/	/		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	/	/		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	/	/		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	/	/		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	/	/		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HCT

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B_030

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	I	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	I	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	I	✓		
	Almohada para cama clínica	1	I	✓		
	Portasueros rodado	1	I	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	I	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	I	✓		
	Regulador de vacío	1	I	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	I	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	I	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	I	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	I	✓		
	Silla fija	1	I	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	I	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	I	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	I	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	I	✓		
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	I	✓		
	Escobilla WC	1	I	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	I	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	I	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	X			
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	I	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

Habitación doble / uso individual (27)

Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
			Bueno	Roto	Deteriorado
Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
Juego de barandillas para cama clínica	1				
Colchón de látex para cama clínica	1				
Almohada para cama clínica	1				
Portasueros rodado	1				
Porta-sueros para cama clínica	1				
Caudalímetro de oxígeno	1				
Regulador de vacío	1				
Esfigmomanómetro de pared	1				
Soporte de termómetro	1				
Mesita de noche clínica	1				
Mesa cigüeña para comer	1				
Sofá-cama 2 m.	1				
Butaca paciente/acompañante	1				
Sillón ergonómico para pacientes	1				
Silla fija	1				
Cuadro decoración pared	1				
Colgador para ropero	4				
Papelera metálica	1				
Cubo de basura con pedal 5L	1				
Aseos de la habitación					
Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
Sujeta toallas de ducha	1				
Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
Palangana de aseo metálica	1				
Botella	1				
Escobilla WC	1				
Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Eli Quiroga	FECHA:	24.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B 031

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1		✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1		✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1		✓		
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1		✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1		✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1		✓		
	Regulador de vacío	1		✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1		✓		
	Mesa cigüeña para comer	1		✓		
	Sofá-cama 2 m.	1		✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1		✓		
	Silla fija	1		✓		
	Cuadro decoración pared	1		✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1		✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1		✓		
	Sujeta toallas de ducha	1		✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1		✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1		✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1		✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1		✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1		✓		

OBSERVACIONES

Cama bañera en estado deteriorado foto

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	[illegible]	FECHA:	24/11/17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B 032

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	I	V		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	I	V		
	Colchón de látex para cama clínica	1	I	V		
	Almohada para cama clínica	1	I	V		
	Portasueros rodado	1	I	V		
	Porta-sueros para cama clínica	1	I	V		
	Caudalímetro de oxígeno	1	I	V		
	Regulador de vacío	1	I	V		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	I	V		
	Mesa cigüeña para comer	1	I	V		
	Sofá-cama 2 m.	1	I	V		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	I	V		
	Silla fija	1	I	V		
	Cuadro decoración pared	1	I	V		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	I	V		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	I	V		
	Sujeta toallas de ducha	1	I	V		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	I	V		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	I	V		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	I	V		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	I	V		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	I	V		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HCS

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B.033

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1	1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	✓		
	Silla fija	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	1	✓		
	Palangana de aseo metálica	1	1	✓		
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR: A	Elia QUIROGA	FECHA: 24.11.17	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B.034

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1		✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1		✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1		✓		
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1		✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1		✓		
	Regulador de vacío	1		✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1		✓		
	Mesa cigüeña para comer	1		✓		
	Sofá-cama 2 m.	1		✓		
	Butaca paciente/acompañante	1		✓		
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1		✓		
	Cuadro decoración pared	1		✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1		✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1		✓		
	Sujeta toallas de ducha	1		✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1		✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1		✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1		✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1		✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1		✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HCT

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	EVA GOI206A	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B036

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	I	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	I	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	I	✓		
	Almohada para cama clínica	1	I	✓		
	Portasueros rodado	1	I	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	I	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	I	✓		
	Regulador de vacío	1	I	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	I	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	I	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	I	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	I	✓		
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	I			
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	I	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	I	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	I	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	I	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	I	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	I	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	I	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	I	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

B025

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HCT

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR: A	ELIA QUIROGA	FECHA:	29.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B037

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1	1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X 1	✓		
	Silla fija	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X	✓		
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

HCJ

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	DULCE A MARTÍN	FECHA:	24/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

B040

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				1
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HCL

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

BO41

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

BO42

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

HCI

B043

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	DANUSKA MARTÍN	FECHA:	24/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	√	√		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	√			
	Colchón de látex para cama clínica	1	√			
	Almohada para cama clínica	1	√			
	Portasueros rodado	1	√			
	Porta-sueros para cama clínica	1	√			
	Caudalímetro de oxígeno	1	√	√		
	Regulador de vacío	1	√			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	√	√		
	Mesa cigüeña para comer	1	√			
	Sofá-cama 2 m.	1	√			
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	√	√		
	Silla fija	1	√			
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X	√		
	Papelera metálica	1	√			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	√	√		
	Sujeta toallas de ducha	1	√			
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X	√		
	Escobilla WC	1	√			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	√			
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	√	√		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	√			
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	√			
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

B044

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	12				
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

HCJ

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

8045

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	DANIOSKA MARIN	FECHA:	24/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1		V		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1		V		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1		V		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1		V		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	BOUSKA MARTIN	FECHA:	24/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

BOU

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X	✓		
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓	✓		✓
FOTO	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	X	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

Barrera bebe

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

B048

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	DULSKA MARTÍN	FECHA:	24/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	✓	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
Foto	Silla fija	1	✓		✓	
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

Bañera bebe móvil

Cubo 12L tapa oscilante rota

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

MCI

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

B049

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

encimera roto

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

B051

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	DANUSKA MARTIN	FECHA:	24/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (27)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	✓			
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	✓			
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	✓			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	✓	✓		
	Papelera metálica	1	✓			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
X	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

- Vacía recien descargada
- Cuna móvil
- Bañera, Roto bebé

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

B050

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTORA	DANUSKA MARIN	FECHA:	24/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (v / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	✓			
	Mesa cigüeña para comer	1	✓			
FOTO	Sofá-cama 2 m.	1	✓			✓
	Butaca paciente/acompañante	1	X	✓		
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
Habitación doble / uso individual (27)	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

- Cuna
- Bañera bebe movil

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

196

PLANTA BAJA (solo 1 control)

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	[illegible] MARTIN	FECHA:	23/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN OBSTÉTRICA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Puesto control enfermería (5)	Reloj de pared con fecha	1				
	Carro de historias clínicas	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	2				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Papelera	1				
	Planning para tarjetas	1				
	Plafón de avisos	3				
	"Tablilla" de Historia Clínica	30				
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1				
	Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	1				
Zona limpia (5)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Taburete fijo de 60 cm.	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Papelera con tapa basculante de 25L	1				
	Frigorífico 300L	1				
	Carro de curas con cajones Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Zona Intermedia (5)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Taburete fijo de 60 cm.	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Papelera con tapa basculante de 25L Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Zona Sucia (5)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1				
	Carro de transporte de ropa sucia	2				
	Taburete fijo de 60 cm. Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Sala Técnica Polivalente (5)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
	Carro de historias clínicas	1				
	Silla fija con brazos	2				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración con cabecero abatible y ruedas	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Aspirador y contenedor	1				
	Gavetas para fungible	1				
	Carro de curas de 3 estantes con buzón de deshechos Poyatas (Equipamiento fijo) Mueble clínico encastrado con pilta dos cuerpos (elemento fijo)	1				

Sin identificar

OBSERVACIONES

El personal sanitario tampoco localiza la sala intermedia

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

HCL

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ANUSKA MARTIN	FECHA:	27/11/2012
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Almacén de medicamentos (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	1				
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	5				
Zona de trabajo personal (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	8				
	Papelera 1	1				
	Planning para tarjetas 1	2				
	Plafón de avisos 1	1				
	"Tablilla" de Historia Clínica 30	1				
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos 1	1				
Aseos Personal (2)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Sala de estar pacientes / comedor (1)	Mesa comedor de 120 X 80 X 74 cm.	6				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completa	2				
	Silla fija con brazos	20				
	Papelera	2				
	Jardinera	2				
	Cuadro decoración pared	4				
	Perchero de pie	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

HCI

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ANUSKA MADRIN	FECHA:	27-11-2012
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Almacén de medicamentos (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	1	6	✓		
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	5	21	✓		
Zona de trabajo personal (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	3	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	8	X			
	Papelera 1	1	1	✓		
	Planning para tarjetas 1	2	X			
	Plafón de avisos 1	1	X			
	"Tablilla" de Historia Clínica 30	1	X			
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos 1	1	X			
Aseos Personal (2)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X		✓	
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Sala de estar pacientes / comedor (1)	Mesa comedor de 120 X 80 X 74 cm.	6				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completa	2				
	Silla fija con brazos	20				
	Papelera	2				
	Jardinera	2				
	Cuadro decoración pared	4				
	Perchero de pie	1				

OBSERVACIONES

No existe sala pacientes en la Unidad Obstétrica

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

HCI

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ANUSKA MARTIN	FECHA:	22/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

HOSPITALIZACIÓN OBSTÉTRICA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Nido (1) SACA TÉCNICA	Cunas neonato	18	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Mesa desnudabebés	1	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	1	✓		
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Sacaleches	1 2	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm. Poyatas (Equipamiento fijo)	2	X			
Zona preparación biberones (1) SALA TÉCNICA	Taburete giratorio alto con respaldo	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Calentador de biberones	2	1			1 (foto)
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm. Poyatas (Equipamiento fijo)	2	1	/		
Lactario (1)	Silla fija	2	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Soporte para posters de campañas	1	X			
	Expositor de folletos	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

La sala técnica del hospital corresponde al Nido y a la zona de preparación de biberones del anexo 6.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

LOCALES SINDICALES

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

OTROS ESPACIOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despachos sindicatos (7)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Silla fija	1	2	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Armario altura 200 x 80 x 40 cm.	1	1	/		
	Papelera	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
Despachos sindicatos (7)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Silla fija	1	3	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Armario altura 200 x 80 x 40 cm.	1	1	/		
	Papelera	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	/		
Despachos sindicatos (7)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Silla fija	1	3	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Armario altura 200 x 80 x 40 cm.	1	1	/		
	Papelera	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	/		
Despachos sindicatos (7)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Silla fija	1	3	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Armario altura 200 x 80 x 40 cm.	1	1	/		
	Papelera	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	/		
Despachos sindicatos (7)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Silla fija	1	2	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Armario altura 200 x 80 x 40 cm.	1	1	/		
	Papelera	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	/		
Despachos sindicatos (7)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Silla fija	1	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Armario altura 200 x 80 x 40 cm.	1	1	/		
	Papelera	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	/		
Despachos sindicatos (7)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Silla fija	1	2	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Armario altura 200 x 80 x 40 cm.	1	1	/		
	Papelera	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	/		
Sala de Reuniones (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Silla fija	1	4	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Armario altura 200 x 80 x 40 cm.	1	X			
	Papelera	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA BAJA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Pascual	**FECHA:**	23-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de Reuniones (1)	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	8	X			
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	X			
	Reloj de pared con fecha	1	X			
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	✓	/		
Aseos (2)	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	/		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	/		
	Colgador mural individual	1	X			
Aseos (2)	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	/		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
Espacio polivalente (1)	Sin mobiliario clínico					

OBSERVACIONES

ESPACIO POLIVALENTE:
- 2 armarios
- 2 sillas giratorias
- 4 ~~fijos~~ sillas fijas
- 2 mesas de trabajo

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

REHABILITACIÓN

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
Vestuarios pacientes (2)	Dispensador de jabón	1	1	V		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	2	V		
	Secamanos eléctrico	1	1	V		
	Sujeta toallas de ducha	1	2	V		
	Banco para ducha	1	X			
	Banco de vestidor	~~2~~	1	V		
	Armario ropero modular	~~20~~	10	V		
	Colgador para ropero	60	3	V		
	Papelera con tapa basculante de 50L	1	1	V		
	Colgador mural múltiple (módulo)	2	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	2	V		
Vestuarios pacientes (2)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Banco para ducha	1				
	Banco de vestidor	2	1	V		
	Armario ropero modular	20	10	Taquillas		
	Colgador para ropero	60				
	Papelera con tapa basculante de 50L	1	1	V	V	
	Colgador mural múltiple (módulo)	2	1	V		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala actividades vida diaria (1)	Dispensador de jabón	1	0 X	X		
	Dispensador de toallas de papel	1	X	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X /	/		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	3	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	3	X			
	Papelera	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	X			
	Conjunto encastrado de codina y fregadero (equipamiento fijo)	1	X 1	/		
Sala terapia ocupacional (1)	Reloj de pared con fecha	1	1	/		
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	~~12~~	1	/		
	Mesas trapezoidales	~~10~~	2	/		
	Taburete giratorio con ruedas	~~1~~	4	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	/		
	Cortinaje de exploración	1	1	/		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1	2 X	X		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	3	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	3	1	/		
	Papelera	1	3			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X	~~/~~		
	Gavetas para material fungible	1	1	/		
	Conjunto encastrado de codina y fregadero (obra)	~~1~~	20			

OBSERVACIONES

- Cubo tapa oscilante.
- Perchero pie.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box electroterapia (5) BOS	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	X			
Box polivalente / individual (4) Box 02	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	1	/		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X	X		
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA DE APOYO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (2)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	✓			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	✗			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓			
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	✗			
Aseos Personal (2)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	✗			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✗			
	Dispensador de toallas de papel	1	✗			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	✗			
Vestuarios Personal (2)	Carro de transporte de ropa sucia	1				
	Banco de vestidor	2				
	Armario ropero modular	10				
	Colgador para ropero	30				
	Papelera con tapa basculante de 50L	1				
	Colgador mural múltiple (módulo)	2				
Vestuarios Personal (2)	Carro de transporte de ropa sucia	1				
	Banco de vestidor	2				
	Armario ropero modular	10				
	Colgador para ropero	30				
	Papelera con tapa basculante de 50L	1				
	Colgador mural múltiple (módulo)	2				
Almacén de lencería (1)	Carro de lencería	1				
Zona de utensilios de limpieza (1)	Carro de limpieza	1				
	Estantería de pared de 3 estantes	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box electroterapia (5) B06	Foco de exploración de pie	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X	X		
	Taburete giratorio con ruedas	1	✓	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	✓	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	✓	✓		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	X			
Box polivalente / individual (4) ~~B02~~, B02 B11	Foco de exploración de pie	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	✓	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA DE TERAPIAS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho consultas (3)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	2	1	✓		
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	10	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			
Box cinesiterapia (3)	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Gavetas para material fungible	1				

Actual GIMNASIO

OBSERVACIONES

Cinesia obsecsin actual
Drenaje linfático, contabilizado en Gimnasio

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Inspección y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos públicos (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
Aseos públicos (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
Aseos públicos (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
Aseos públicos (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

Realizados dentro de la Zona de Apoyo de esta área

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA BAJA (Edificio de Actividad Física)

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Inspección y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	01-12-2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	15:00 h

ZONAS de APOYO / EXTRACCIONES

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos pacientes (2)	Dispensador de jabón	2	1	√		
	Cubo de basura con pedal 12L	2	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	2	X			
	Secamanos eléctrico	2	1	√		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	2	2	√		
	Colgador mural individual	2	X			
Zona polivalente de personal (2)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	1	√		
	Silla fija con brazos	8	5	√		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	√		
	Papelera	1	2	√		
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	√		
Almacén de material general (2)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	3 *	3	√		
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 m	15	18	√		
Almacén de lencería (2)	Carro de lencería	2	X			
Zona de utensilios de limpieza (2)	Estantería de pared de 3 estantes	1				
Aseos Personal (2)	Dispensador de jabón	1	1	√		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	√		
	Colgador mural individual	1	1	√		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	√		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Vestuarios personal (4)	Carro de transporte de ropa sucia	2	X			
	Banco de vestidor	2	1	√		
	Armario ropero modular	18	13	√		
	Colgador para ropero	54	X			
	Papelera con tapa basculante de 50L	2	1	√		
	Colgador mural múltiple (módulo)	4	X			

OBSERVACIONES

* Los 8 estanterías del almacén general son de tres diferentes estantes (medidas)

* El almacén de lencería es un plano ficticio como almacén (medidas)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

- Esta zona de apoyo corresponde en el plano a las estancias situadas en el área de EXTRACCIONES y ARCHIVOS.
- Los aseos personales son los que se encontraban en el interior de los vestuarios.
- Vestuarios personales había 2.
- 1 de las zonas polivalente de personal corresponde con una consulta de podología.

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos pacientes (2) ♀	Dispensador de jabón	2	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	2	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	2	2	✓		
	Secamanos eléctrico	2	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	2	2	✓		
	Colgador mural individual	2	1	✓		
Zona polivalente de personal (2)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	1	✓		
	Silla fija con brazos	8	2	✓		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		
	Pizarra para rotulador de pared	1	X			
Almacén de material general (2)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	3	10	✓		
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 m	15	X			
Almacén de lencería (2)	Carro de lencería	2				
Zona de utensilios de limpieza (2)	Estantería de pared de 3 estantes	1				
Aseos Personal (2) ♀	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	2	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	2	✓		
	Colgador mural individual	1	2	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Vestuarios personal (4) ♀	Carro de transporte de ropa sucia	2	X			
	Banco de vestidor	2	2	✓		
	Armario ropero modular	18	26	✓		
	Colgador para ropero	54	X			
	Papelera con tapa basculante de 50L	2	1	✓		
	Colgador mural múltiple (módulo)	4	X			

OBSERVACIONES

* Las estanterías del Almacén Gral 2 son de diferentes estantes también.
* Zona Polivalente de Personal en plano, es actualmente una consulta del área de neonatología.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Las Estanterías de los almacenes son de diferentes estantes (no sólo de 8 estantes)

VESTUARIOS GENERALES. PLANTA BAJA.

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal ~~(10)~~ 7 vestuarios gral.	Dispensador de jabón	1	13	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	15	12		3
	~~Dispensador de toallas de papel~~ SECAMANOS ELECTRICO	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	12	✓		
	Colgador mural individual	1	14	11	1	2
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	27	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	11	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	✓			

OBSERVACIONES

- Es la suma total de los aseos de los (7) vestuarios generales.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

18-48 21 57

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	~~Alejandro Ramos~~ ANOSKA M.	FECHA:	29-11-18
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

VESTUARIO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
(*)2 11 Aseos completos (con ducha) (*) 5 en todos los vestuarios de planta	Dispensador de jabón	80	1	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	40	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	40	X			
	Secamanos eléctrico	40	1	—		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	40	X			
	Colgador mural individual	40	X			
	Cortinaje de ducha	2	X			
	Sujeta toallas de ducha	2	X			
	Colgador mural individual	2	X			
VESTUARIOS (*)1 1 Taquillas (20)	Carro de transporte de ropa sucia	20	X			
	Banco de vestidor	~~20~~	8	—		
	Armario ropero modular	400	108	—		—
	Colgador para ropero	800	4?	—		
	Papelera con tapa basculante de 50L	~~20~~	1			
	Colgador mural múltiple (módulo)	~~20~~	4	—		
2 Taquillas (20)	Carro de transporte de ropa sucia	20	X			
	Banco de vestidor	~~20~~	7	—		
	Armario ropero modular	400	48	—		9
	Colgador para ropero	~~800~~	X 40	—		7
	Papelera con tapa basculante de 50L	~~20~~	4	X	///	
	Colgador mural múltiple (módulo)	~~20~~	4	—		
3 Taquillas (20)	Carro de transporte de ropa sucia	20	X			
	Banco de vestidor	20	7	—		
	Armario ropero modular	400	28	—		3
	Colgador para ropero	800	175	—		
	Papelera con tapa basculante de 50L	20	2	—	—	
	Colgador mural múltiple (módulo)	20	4	—		
4 Taquillas (20)	Carro de transporte de ropa sucia	20	X			
	Banco de vestidor	20	6	—		
	Armario ropero modular	400	X	—		
	Colgador para ropero	800	59	~~54~~		5
	Papelera con tapa basculante de 50L	20	2			//
	Colgador mural múltiple (módulo)	20	~~20~~ 1	—		
5 Taquillas (20)	Carro de transporte de ropa sucia	20	X			
	Banco de vestidor	20	6	—		
	Armario ropero modular	400	X	—		
	Colgador para ropero	800	89	87		2
	Papelera con tapa basculante de 50L	20	1			—
	Colgador mural múltiple (módulo)	20	3	—		

PLANTA BAJA

OBSERVACIONES

(*) Papeleras de 50L sin tapa ++ 3

(*) En todos los vestuarios de planta baja hay aseos y duchas individuales con puerta.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Taquillas (20) 6 ♂	Carro de transporte de ropa sucia	20	X			
	Banco de vestidor	20	X	—		
	Armario ropero modular	400	X	—		
	Colgador para ropero	800	X	—		
	Papelera con tapa basculante de 50L	20	X	—		
	Colgador mural múltiple (módulo)	20	1	—		
7 ♂ OK Taquillas (20)	Carro de transporte de ropa sucia	20	X	X		
	Banco de vestidor	20	1	—		
	Armario ropero modular	400	X	—		
	Colgador para ropero	800	6	—		
	Papelera con tapa basculante de 50L	20	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	20	2	—		
Taquillas (20)	Carro de transporte de ropa sucia	20	X			
	Banco de vestidor	20	1	—		
	Armario ropero modular	400	1	—		
	Colgador para ropero	800	1	—		
	Papelera con tapa basculante de 50L	20	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	20	1	—		
Taquillas (20)	Carro de transporte de ropa sucia	20	X			
	Banco de vestidor	20	1	—		
	Armario ropero modular	400	1	—		
	Colgador para ropero	800	1	—		
	Papelera con tapa basculante de 50L	20	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	20	1	—		
Taquillas (20)	Carro de transporte de ropa sucia	20	X			
	Banco de vestidor	20	1	—		
	Armario ropero modular	400	1	—		
	Colgador para ropero	800	1	—		
	Papelera con tapa basculante de 50L	20	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	20	1	—		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Baños personal restaurante (6 y 7)

· Papel	2	2
· ~~Cubo 12L~~	X	X
· Cubo 5L	2	X
· Secamanos elec.	1	1
· Jabón	1	1
· Colgador indi	2(d1)	✓

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	~~Alejandro Paredes~~ ANUSKA M	**FECHA:**	29-11-19
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

VESTUARIO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
En total 2 aseos con ducha Aseos completos (con ducha) (1) (2)	Dispensador de jabón	80	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	40	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	40	X			
	Secamanos eléctrico	40	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	40	✓	✓		
	Colgador mural individual	40	✓	✓		
	Cortinaje de ducha	2	X			
	Sujeta toallas de ducha	2	X			
	Colgador mural individual	2	X			
Taquillas (20)	Carro de transporte de ropa sucia	20	X			
	Banco de vestidor	20	✓	✓		
	Armario ropero modular	400	✓	✓		
	Colgador para ropero	800	✓	✓		
	Papelera con tapa basculante de 50L	20	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	20	✓	✓		
Taquillas (20)	Carro de transporte de ropa sucia	20	X			
	Banco de vestidor	20	✓	✓		
	Armario ropero modular	400	✓	✓		
	Colgador para ropero	800	✓	✓		
	Papelera con tapa basculante de 50L	20	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	20	✓	✓		
Taquillas (20)	Carro de transporte de ropa sucia	20	X			
	Banco de vestidor	20	✓	✓		
	Armario ropero modular	400	✓	✓		
	Colgador para ropero	800	✓	✓		
	Papelera con tapa basculante de 50L	20	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	20	✓	✓		
Taquillas (20)	Carro de transporte de ropa sucia	20	X			
	Banco de vestidor	20	✓	✓		
	Armario ropero modular	400	✓	✓		
	Colgador para ropero	800	✓	✓		
	Papelera con tapa basculante de 50L	20	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	20	✓	✓		
Taquillas (20)	Carro de transporte de ropa sucia	20	X			
	Banco de vestidor	20	✓	✓		
	Armario ropero modular	400	✓	✓		
	Colgador para ropero	800	✓	✓		
	Papelera con tapa basculante de 50L	20	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	20	✓	✓		

PLANTA BAJA

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Taquillas (20)	Carro de transporte de ropa sucia	20	X			
	Banco de vestidor	20	1	/		
	Armario ropero modular	400	1	/		
	Colgador para ropero	800	1	/		
	Papelera con tapa basculante de 50L	20	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	20	1	/		
Taquillas (20)	Carro de transporte de ropa sucia	20	X			
	Banco de vestidor	20	1	/		
	Armario ropero modular	400	1	/		
	Colgador para ropero	800	1	/		
	Papelera con tapa basculante de 50L	20	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	20	1	/		
Taquillas (20)	Carro de transporte de ropa sucia	20	X			
	Banco de vestidor	20	1	/		
	Armario ropero modular	400	1	/		
	Colgador para ropero	800	1	/		
	Papelera con tapa basculante de 50L	20	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	20	1	/		
Taquillas (20)	Carro de transporte de ropa sucia	20	X			
	Banco de vestidor	20	1	/		
	Armario ropero modular	400	1	/		
	Colgador para ropero	800	1	/		
	Papelera con tapa basculante de 50L	20	X	1/0		
	Colgador mural múltiple (módulo)	20	1	/		
Taquillas (20)	Carro de transporte de ropa sucia	20	X			
	Banco de vestidor	20	1	/		
	Armario ropero modular	400	1	/		
	Colgador para ropero	800	1	/		
	Papelera con tapa basculante de 50L	20	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	20	1	/		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Baños vestuarios 1 a 5

- Dispensador jabón | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
- Cubo de 12 l pedal | X | 1 | X | X | X
- Cubo de 5 l pedal | 5(3d) | X | 4 | 4 | X
- Secamanos | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
- Papel | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
- Colgador mural ind | 1 | X | 4 | 4 | 1
- Cortinaje | X | X | X | X | X

- Sop. toallas ducha : X X X X

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	~~Alejandro Paraíso~~ ANUSKA MARZI	FECHA: 30-11-17	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

SOCIAL

CAFETERÍA

PLANTA BAJA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Barra (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X	X		
Espacio mesas personal (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
Espacio mesas público (1)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	X	✓		
Almacén general (1)	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	X			
Zona de utensilios de limpieza (1)	Carro de limpieza	1	X	X		
	Estantería de pared de 3 estantes	1	1	✓		
Aseos públicos (2)	Dispensador de jabón	1	1		✓	
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	8	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
Aseos públicos (2)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	8	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandra Parraga	FECHA:	24-11-18
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA

PLANTA BAJA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Puesto control enfermería (1)	Reloj de pared con fecha	1	✓	✓		
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	2	✓	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	✓	✓		
	Papelera	1	✓	✓		
	Planning para tarjetas	1	X			
	Plafón de avisos	1	✓	✓		
	"Tablilla" de Historia Clínica	30	X			
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	X			
	Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	1	✓	✓		
Zona limpia (1)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	✓	✓		
	Taburete fijo de 60 cm.	1	✓			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Papelera con tapa basculante de 25L	1	✓	✓		
	Frigorífico 300L	1	X			
	Carro de curas con cajones Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
Zona Intermedia (1)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Taburete fijo de 60 cm.	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Papelera con tapa basculante de 25L Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Zona Sucia (1)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	✓		
	Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1	✓	✓		
	Carro de transporte de ropa sucia	2	✓	✓		
	Taburete fijo de 60 cm. Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
Sala Técnica Polivalente (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	X			
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Silla fija con brazos	2	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	✓	✓		
	Litera de exploración con cabecero abatible y ruedas	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	✓	✓		
	Papelera	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Aspirador y contenedor	1	X			
	Gavetas para fungible	1	X			
	Carro de curas de 3 estantes con buzón de deshechos Poyatas (Equipamiento fijo) Mueble clínico encastrado con pilta dos cuerpos (elemento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parra	FECHA:	24-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A001

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (13)	Cama clínica eléctrica	4	1	✓		
	Cama infantil con barandilla	8	1	✓		
	Cuna alta	11	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	8	1	✓		
	Colchón de espuma para cama clínica	4	1	✓		
	Almohada para cama clínica	4	1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	4	X			
	Reloj de pared con fecha	13	X			
	Carro de historias clínicas	13	X			
	Sofá-cama 2 m.	13	X			
	Butaca paciente/acompañante	13	2	✓		
	Silla fija	13	1	✓		
	TV de 25"	13	1	✓		
	Cuadro decoración pared	13	1	✓		
	Colgador para ropero	52	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	13	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	13	X			
	Sujeta toallas de ducha	13	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable	13	X			
	Botella	13	X			
	Escobilla WC	13	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A 807

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (13)	Cama clínica eléctrica	4	✓	✓		
	Cama infantil con barandilla	8	✓ X			
	Cuna alta	11	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	8	✓	✓		
	Colchón de espuma para cama clínica	4	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	4	✓	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	4	✓	✓		
	Reloj de pared con fecha	13	X			
	Carro de historias clínicas	13	X			
	Sofá-cama 2 m.	13	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	13	✓			
	Silla fija	13	X			
	TV de 25"	13	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	13	X			
	Colgador para ropero	52	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	13	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	13	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	13	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable	13	X			
	Botella	13	X			
	Escobilla WC	13	✓	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso	**FECHA:**	25/8-11-19
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

A003

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (13)	Cama clínica eléctrica	4	✓	✓		
	Cama infantil con barandilla	8	X			
	Cuna alta	11	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	8	✓	✓		
	Colchón de espuma para cama clínica	4	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	4	✓	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	4	✓	✓		
	Reloj de pared con fecha	13	X			
	Carro de historias clínicas	13	X			
	Sofá-cama 2 m.	13	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	13	X			
	Silla fija	13	X			
	TV de 25"	13	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	13	X			
	Colgador para ropero	52	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	13	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	13	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	13	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable	13	X			
	Botella	13	X			
	Escobilla WC	13	✓	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

A004

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (13)	Cama clínica eléctrica	4	X			
	Cama infantil con barandilla	8	X			
	Cuna alta	11	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	8	X			
	Colchón de espuma para cama clínica	4	X			
	Almohada para cama clínica	4	X			
	Porta-sueros para cama clínica	4	X			
	Reloj de pared con fecha	13	X			
	Carro de historias clínicas	13	X			
	Sofá-cama 2 m.	13	1			
	Butaca paciente/acompañante	13	X			
	Silla fija	13	1	✓		
	TV de 25"	13	1	✓		
	Cuadro decoración pared	13	X			
	Colgador para ropero	52	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	13	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	13	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	13	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable	13	X			
	Botella	13	X			
	Escobilla WC	13	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandra Paraíso	**FECHA:**	24-11-19
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

A005

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (13)	Cama clínica eléctrica	4	1	✓		
	Cama infantil con barandilla	8	X			
	Cuna alta	11	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	8	1	✓		
	Colchón de espuma para cama clínica	4	1	✓		
	Almohada para cama clínica	4	1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	4	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	13	X			
	Carro de historias clínicas	13	X			
	Sofá-cama 2 m.	13	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	13	X			
	Silla fija	13	1	✓		
	TV de 25"	13	1	✓		
	Cuadro decoración pared	13	X			
	Colgador para ropero	52	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	13	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	13	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	13	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable	13	X			
	Botella	13	X			
	Escobilla WC	13	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

Aseo

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (13)	Cama clínica eléctrica	4	1	✓		
	Cama infantil con barandilla	8	X			
	Cuna alta	11	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	8	1	✓		
	Colchón de espuma para cama clínica	4	1	✓		
	Almohada para cama clínica	4	1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	4	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	13	1	✓		
	Carro de historias clínicas	13	X			
	Sofá-cama 2 m.	13	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	13	X			
	Silla fija	13	1	✓		
	TV de 25"	13	1	✓		
	Cuadro decoración pared	13	X			
	Colgador para ropero	52	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	13	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	13	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	13	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable	13	X			
	Botella	13	X			
	Escobilla WC	13	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso	**FECHA:**	26-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

A007

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (13)	Cama clínica eléctrica	4	X			
	Cama infantil con barandilla	8	X			
	Cuna alta	11	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	8	X			
	Colchón de espuma para cama clínica	4	X			
	Almohada para cama clínica	4	X			
	Porta-sueros para cama clínica	4	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	13	X			
	Carro de historias clínicas	13	X			
	Sofá-cama 2 m.	13	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	13	X			
	Silla fija	13	X			
	TV de 25"	13	1	✓		
	Cuadro decoración pared	13	X			
	Colgador para ropero	52	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	13	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	13	X			
	Sujeta toallas de ducha	13	X			
	Cuña de acero inoxidable	13	X			
	Botella	13	X			
	Escobilla WC	13	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

A008

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (13)	Cama clínica eléctrica	4	X			
	Cama infantil con barandilla	8	X			
	Cuna alta	11	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	8	X			
	Colchón de espuma para cama clínica	4	X			
	Almohada para cama clínica	4	X			
	Porta-sueros para cama clínica	4	X			
	Reloj de pared con fecha	13	X			
	Carro de historias clínicas	13	X			
	Sofá-cama 2 m.	13	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	13	X			
	Silla fija	13	X			
	TV de 25"	13	1	✓		
	Cuadro decoración pared	13	1	✓		
	Colgador para ropero	52	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	13	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	13	X			
	Sujeta toallas de ducha	13	X			
	Cuña de acero inoxidable	13	X			
	Botella	13	X			
	Escobilla WC	13	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandra Paraíso	**FECHA:**	24-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

A009

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (13)	Cama clínica eléctrica	4	X			
	Cama infantil con barandilla	8	X			
	Cuna alta	11	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	8	X			
	Colchón de espuma para cama clínica	4	X			
	Almohada para cama clínica	4	X			
	Porta-sueros para cama clínica	4	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	13	X			
	Carro de historias clínicas	13	X			
	Sofá-cama 2 m.	13	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	13	X			
	Silla fija	13	1	✓		
	TV de 25"	13	1	✓		
	Cuadro decoración pared	13	1	✓		
	Colgador para ropero	52	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	13	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	13	X			
	Sujeta toallas de ducha	13	X			
	Cuña de acero inoxidable	13	X			
	Botella	13	X			
	Escobilla WC	13	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

A010

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (13)	Cama clínica eléctrica	4	1	✓		
	Cama infantil con barandilla	8	X			
	Cuna alta	11	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	8	1	✓		
	Colchón de espuma para cama clínica	4	1	✓		
	Almohada para cama clínica	4	X			
	Porta-sueros para cama clínica	4	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	13	X			
	Carro de historias clínicas	13	X			
	Sofá-cama 2 m.	13	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	13	X			
	Silla fija	13	1	✓		
	TV de 25"	13	1	✓		
	Cuadro decoración pared	13	1	✓		
	Colgador para ropero	52	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	13	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	13	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	13	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable	13	X			
	Botella	13	X			
	Escobilla WC	13	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parasón	FECHA:	24-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

X011

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (13)	Cama clínica eléctrica	4	1	✓		
	Cama infantil con barandilla	8	X			
	Cuna alta	11	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	8	1	✓		
	Colchón de espuma para cama clínica	4	1	✓		
	Almohada para cama clínica	4	1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	4	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	13	X			
	Carro de historias clínicas	13	X			
	Sofá-cama 2 m.	13	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	13	X			
	Silla fija	13	1	✓		
	TV de 25"	13	1	✓		
	Cuadro decoración pared	13	X			
	Colgador para ropero	52	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	13	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	13	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	13	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable	13	X			
	Botella	13	X			
	Escobilla WC	13	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A012

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (13)	Cama clínica eléctrica	4	✓	✓		
	Cama infantil con barandilla	8	X			
	Cuna alta	11	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	8	✓	✓		
	Colchón de espuma para cama clínica	4	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	4	✓	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	4	✓	✓		
	Reloj de pared con fecha	13	X			
	Carro de historias clínicas	13	X			
	Sofá-cama 2 m.	13	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	13	X			
	Silla fija	13	✓	✓		
	TV de 25"	13	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	13	✓	✓		
	Colgador para ropero	52	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	13	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	13	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	13	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable	13	X			
	Botella	13	X			
	Escobilla WC	13	✓	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso	**FECHA:**	24-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

A013

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (13)	Cama clínica eléctrica	4	X			
	Cama infantil con barandilla	8	X			
	Cuna alta	11	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	8	X			
	Colchón de espuma para cama clínica	4	X			
	Almohada para cama clínica	4	X			
	Porta-sueros para cama clínica	4	X			
	Reloj de pared con fecha	13	X			
	Carro de historias clínicas	13	X			
	Sofá-cama 2 m.	13	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	13	X			
	Silla fija	13	X			
	TV de 25"	13	1	✓		
	Cuadro decoración pared	13	1	✓		
	Colgador para ropero	52	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	13	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	13	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	13	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable	13	X			
	Botella	13	X			
	Escobilla WC	13	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

A014

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (13)	Cama clínica eléctrica	4	X			
	Cama infantil con barandilla	8	X			
	Cuna alta	11	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	8	X			
	Colchón de espuma para cama clínica	4	X			
	Almohada para cama clínica	4	X			
	Porta-sueros para cama clínica	4	X			
	Reloj de pared con fecha	13	X			
	Carro de historias clínicas	13	1	✓		
	Sofá-cama 2 m.	13	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	13	X			
	Silla fija	13	1	✓		
	TV de 25"	13	1	✓		
	Cuadro decoración pared	13	1	✓		
	Colgador para ropero	52	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	13	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	13	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	13	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable	13	X			
	Botella	13	X			
	Escobilla WC	13	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Zona preparación biberones (1)	Taburete giratorio alto con respaldo	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Calentador de biberones	2	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
Sala de juegos (1)	Mesa redonda, diámetro 120 y altura 40 cm.	2	1	✓		
	Mesa redonda, diámetro 120 y altura 47 cm.	2	1	✓		
	Mesa redonda, diámetro 120 y altura 54 cm.	2	1	✓		
	Módulo casillero guardería 90 x 75 x 40 cm.	1	1	✓		
	Módulo cubetero guardería 90 x 75 x 40 cm.	2	1	✓		
	Carro infantil con ruedas 90 x 55 x 59 cm.	1	1	✓		
	Módulo estantería guardería 90 x 75 x 40 cm.	2	1	✓		
	Silla infantil madera 33 x 30 cm.	8	1	✓		
	Silla infantil madera 31 x 54 cms	8	1	✓		
	Silla infantil madera 34 x 57 cms	8	1	✓		
Sala de enseñanza (1)	Mesa redonda, diámetro 120 y altura 47 cm.	2	X			
	Mesa rectangular 120 x 60 y altura 53 cm.	2	X			
	Mesa rectangular 120 x 60 y altura 59 cm.	2	X			
	Silla infantil madera 33 x 30 cm.	8	X			
	Silla infantil madera 31 x 54 cm.	8	X			
	Silla infantil madera 34 x 57 cm.	8	X			
	Módulo estantería guardería 90 x 75 x 40 cm.	4	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Almacén de medicamentos (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	1	1	✓		
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	5	1	✓		
Zona de trabajo personal (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Cajonera de tres cajones con ruedas	8	X			
	Papelera 1	1	1	✓		
	Planning para tarjetas 1	2	X			
	Plafón de avisos 1	1	1	✓		
	"Tablilla" de Historia Clínica 30	1	X			
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos 1	1	X			
Aseos Personal (2)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	X			
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Almacén de medicamentos (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	1				
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	5				
Zona de trabajo personal (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	8				
	Papelera 1	1				
	Planning para tarjetas 1	2				
	Plafón de avisos 1	1				
	"Tablilla" de Historia Clínica 30	1				
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos 1	1				
Aseos Personal (2)	Dispensador de jabón	1	√1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X	.		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	X			
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

UIC Pediatría

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandra Tarazona	**FECHA:**	24-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

A015

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	✓	✓		
	Colgador para ropero	4	X3			
	Papelera metálica	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A016

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HFC Pediatría

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso	**FECHA:**	24-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

A017

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual ~~(130)~~	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	1	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	✓		
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	1	✓		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

A018

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (v / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	X			
	Regulador de vacío	1	X	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	✓	✓		
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	X	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	X			
	Sujeta toallas de ducha	1	X			
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	X			
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	X	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	X			
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

Pediatría

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	DANIELA MARÍN	**FECHA:**	24/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

A019

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual ~~(130)~~	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Acreditación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A020

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HFC Pediatra

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	MONICA MARTIN	FECHA:	24/04/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A021

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (~~130~~)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	✓	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		✓
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	✓	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓	✓		
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A022

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA BAJA.

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ANA [illegible]	FECHA:	26.11.2014
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	11'30

MAD. 067 FOTOS

PLANTA BAJA

UNIDAD PSIQUIÁTRICA

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (16) (11)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓		✓	
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	X			
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Sofá-cama 2 m.	1	X			
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	X			
	Sujeta toallas de ducha	1	X			
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	X			
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	X			
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

- tienen armario
- habitaciones con 6 mínimo x seguridad

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

Hab: 066

UNIDAD PSIQUIÁTRICA

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (16)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	X			
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Sofá-cama 2 m.	1	X			
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	X			
	Sujeta toallas de ducha	1	X			
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓			✓
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓			✓
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	X			
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

Hab. 052

UNIDAD PSIQUIÁTRICA

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (16)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	x			
	Porta-sueros para cama clínica	1	x			
	Caudalímetro de oxígeno	1	x			
	Regulador de vacío	1	x			
	Esfigmomanómetro de pared	1	x			
	Soporte de termómetro	1	x			
	Mesita de noche clínica	1	x			
	Mesa cigüeña para comer	1	x			
	Sofá-cama 2 m.	1	x			
	Butaca paciente/acompañante	1	x			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	x			
	Silla fija	1	x			
	Cuadro decoración pared	1	x			
	Colgador para ropero	4	x			
	Papelera metálica	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1	x			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

No presentan toma del caudalimetro de O2 y el regulador de vacio

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

Hab: 053

UNIDAD PSIQUIÁTRICA

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (16)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

Hab. 054 B70

UNIDAD PSIQUIÁTRICA

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (16)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	V		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X	V		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	V		
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	X			
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Sofá-cama 2 m.	1	X			
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	X			
	Sujeta toallas de ducha	1	X			
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	V		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	V		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	X			
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

Hab: 055

UNIDAD PSIQUIÁTRICA

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (16)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

Hab: 056

UNIDAD PSIQUIÁTRICA

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (16)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

Hab. 057

UNIDAD PSIQUIÁTRICA

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (16)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

Hab. 058

UNIDAD PSIQUIÁTRICA

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (16)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

059

UNIDAD PSIQUIÁTRICA

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (16)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	V	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	X			
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	V			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

060

UNIDAD PSIQUIÁTRICA

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (16)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

061

UNIDAD PSIQUIÁTRICA

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (16)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	~~X~~ 1	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1			
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala Técnica Polivalente (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
	Carro de historias clínicas	1				
	Silla fija con brazos	2				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración con cabecero abatible y ruedas	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1	HECHO			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Aspirador y contenedor	1				
	Gavetas para fungible	1				
	Carro de curas de 3 estantes con buzón de deshechos Poyatas (Equipamiento fijo) Mueble clínico encastrado con pilta dos cuerpos (elemento fijo)	1				
Almacén de medicamentos (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	1				
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	5				
Zona de trabajo personal (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	8				
	Papelera	1				
	Planning para tarjetas	2				
	Plafón de avisos	1				
	"Tablilla" de Historia Clínica	1				
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1				
Aseos Personal (2)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

- Seca manos

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	PSIQUIATRÍA.	**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de espera familiares (1)	Sillas modulares	20	9	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm (65x65 ✱)	4	2	✓		
	Cuadro decoración pared	6	1	✓		
	Jardinera	1	X			
	Soporte para posters de campañas	1	1	✓		
	Expositor de folletos	1	X	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1	X			
Aseos públicos (2)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Despacho de información (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Silla fija con brazos	2	X			
	Papelera	1	X			

OBSERVACIONES

✱ Hay 2 mesas:
- una de 65x65 cm
- la otra 90x60 cm

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Oficio (1)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Armario oficio colgado 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Papelera con tapa basculante de 25L	1				
	Frigorífico 80L	1				
	Microondas de 20-25L Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Almacén de material general (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	4	6	✓		
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	20	40	✓		
Almacén de lencería (1)	Carro de lencería	1	1	✓		
Almacén de equipamientos (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	4	1	✓		
Zona de utensilios de limpieza (1)	Carro de limpieza	1	1	✓		
	Estantería de pared de 3 estantes	1	1	✓		
Vestuarios personal (1)	Carro de transporte de ropa sucia	2	X			
	Banco de vestidor	2	X			
	Armario ropero modular	18	X			
	Colgador para ropero	54	X			
	Papelera con tapa basculante de 50L	2	1			
	Colgador mural múltiple (módulo)	4	X			
Sala de estar pacientes / comedor (1)	Mesa comedor de 120 X 80 X 74 cm.	6	4	✓		
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	2	X			
	Silla fija con brazos	20	10	✓		
	Papelera	2	X			
	Jardinera	2	X			
	Cuadro decoración pared	4	X			
	Perchero de pie	1	X			

OBSERVACIONES

X 10 taquilla

SALA DE ESTAR

MESAS 2.
SILLAS 3
BUTACAS 10

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

UN SIO ALMACEN

Hoy 2 salas diferenciadas: el comedor y la sala de estar

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho de supervisión (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm. Con estantería y archivador	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	✓		
	Perchero de pie	1	X			
Zona polivalente de personal (1)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	1	✓		
	Silla fija con brazos	8	X		2 sillones	
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Perchero de pie	1	2	✓		
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	✓		
	Nevera de 150 L.	1	1	✓		
	Cafetera eléctrica	1	1	✓		
	Horno microondas empotrado	1	1	✓	(sin empotrar)	
Sala de reuniones (1)	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	1	✓		
	Silla fija con brazos	8	5	✓		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	✓		
	Papelera	1	2	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		
	Pizarra para rotulador de pared	1	X			
Zona trabajo administrativo (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	X			
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	✓		
	Silla fija	2	X			
	Plafón de corcho	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Fotocopiadora	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Puesto control enfermería (1)	Reloj de pared con fecha	1				
	Carro de historias clínicas	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	2				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Papelera	1				
	Planning para tarjetas	1				
	Plafón de avisos	1				
	"Tablilla" de Historia Clínica	30				
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1				
	Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	1				
Zona limpia (1)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Taburete fijo de 60 cm.	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Papelera con tapa basculante de 25L	1				
	Frigorífico 300L	1				
	Carro de curas con cajones Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Zona Intermedia (1)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Taburete fijo de 60 cm.	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Papelera con tapa basculante de 25L Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Zona Sucia (1)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1				
	Carro de transporte de ropa sucia	2				
	Taburete fijo de 60 cm. Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Sala Técnica Polivalente (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
	Carro de historias clínicas	1				
	Silla fija con brazos	2				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración con cabecero abatible y ruedas	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Aspirador y contenedor	1				
	Gavetas para fungible	1				
	Carro de curas de 3 estantes con buzón de deshechos Poyatas (Equipamiento fijo) Mueble clínico encastrado con pilta dos cuerpos (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

065 FOTO

UNIDAD PSIQUIÁTRICA

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (16)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

069

UNIDAD PSIQUIÁTRICA

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (16)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1		✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1		✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

063

Habitación personal hospital

UNIDAD PSIQUIÁTRICA

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (16)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	11	✓		
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	11	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

062

UNIDAD PSIQUIÁTRICA

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (16)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

URGENCIAS

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR/A	EVA QUIROGA	**FECHA:**	27.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	10:00

ZONA ASISTENCIAL

FOTO BOX02

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box de emergencias / paradas (2) BOX 02	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	X 1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	X			
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1		X	
	Camilla de urgencias con barandillas	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	X			
	Soporte brazo con pie	1	X 1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	2	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Carro de curas con cajones Poyatas (Equipamiento	1	1	✓		
Salas de triaje (2)	Negatoscopio de dos cuerpos	1	X 1			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Camilla de urgencias con barandillas	1	X			
	Mesa de trabajo	1	1			
	Silla giratoria	1	1			
	Silla fija con brazos	2	1			
	Taburete giratorio con ruedas	1	1			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
Sala de espera pacientes (1)	Sillas modulares	15	15	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	3	X			
	Cuadro decoración pared	4	2	✓		
	Jardinera	1	X			
	Papelera	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA ASISTENCIAL

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box de emergencias / paradas (2) BOX01	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1				
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Camilla de urgencias con barandillas	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	2	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	X			
	Colgador mural individual	1	X			
	Carro de curas con cajones Poyatas (Equipamiento	1	1	✓		
Salas de triaje (2)	Negatoscopio de dos cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Camilla de urgencias con barandillas	1	X			
	Mesa de trabajo	1	2	✓		
	Silla giratoria	1	1	✓		
	Silla fija con brazos	2	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
Sala de espera pacientes (1)	Sillas modulares	15				
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	3				
	Cuadro decoración pared	4				
	Jardinera	1				
	Papelera	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HCI

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR: A	Elis 09/2067	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despachos de atención al paciente (2)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija con brazos	2				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
Sala de espera familiares (3)	Sillas modulares	30	72	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	3	X			
	Cuadro decoración pared	3	2	✓		
	Jardinera	3	X			
	Soporte para posters de campañas	1	X			
	Expositor de folletos	1	X			
	Papelera	1	2	✓		
Aseos públicos (5) (1 ADAPTADO CON BARRA LATERAL) ♀	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	✓	sin	pedal
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	✓		
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			

Aseo adaptado ♂

OBSERVACIONES

- dispensador jabón y papel
- Secamanos
- Lavabo con repisa/espejo
- basura con pedal 5l.
- basura 12l. sin pedal.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	**FECHA:**	27.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	12:40

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado Bueno	Estado Roto	Estado Deteriorado
Aseos pacientes (4)	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	√	√		
	Sujeta toallas de ducha	1	X			
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	√	√		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	√	√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	√	√		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	X			
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	X			
Duchas pacientes (2) Pediatría	Dispensador de jabón	2	1	√		
	Cortinaje de ducha	2	X			
	Taburete fijo de 60 cm.	2	X			
	Sujeta toallas de ducha	2	1	√		
	Colgador mural individual	2	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	2	1	Cubo basura basculante		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Box OBSERVACIÓN PEDIATRÍA

6 sillas
7 batacas pacientes
3 cunas móviles
5 camas, con porta sueros, caudalímetros de O_2, papeleras plásticas 12l.
1 Esfigmanómetro movil
6 mesas clínicas con mesa cigüeñal

3 carros clínicos
1 medidor altura/peso
1 foco clínico
7 cortinas de separación fija

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos pacientes (4)	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	x			
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	x			
	Palangana de aseo metálica	1	x			
	Botella	1	x			
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	x			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	x			
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	x			
Duchas pacientes (2)	Dispensador de jabón	2	1	✓		
	Cortinaje de ducha	2	1	✓		
	Taburete fijo de 60 cm.	2	x	Escabel		
	Sujeta toallas de ducha	2	3			
	Colgador mural individual	2	x			
	Cubo de basura con pedal 12L	2	x			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	JUAN CARLOS	FECHA:	27.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	12:40

ZONA APOYO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho Trabajo (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	/	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	/	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	X			
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	/			
	Silla fija	2	/			
	Plafón de corcho	1	/			
	Papelera	1	/			
	Fotocopiadora	1	X			
Almacén General (1)	Estantería metálica 5/6 niveles ML	8	10	✓		
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	10	10	✓		
	Escalera con cinco peldaños y pies aislantes	1	X			
Secretaria en plano	OBSERVACIONES					
			AUDITOR		RESPONSABLE INSTALACIÓN	

URGENCIAS PEDIÁTRICAS

Box 4 Pediatría

- Caudalímetro de Oz
- taburete
- Camilla con barandilla
- Báscula de medida de altura
- Dispensador de medicamentos
- Dispensador de jabón
- Dispensador de papel
- Carro de curas
- Armario colgante sin vitrinas

Observación Pediátrica

Box

Zona Limpia

- 2 carrita de curas
- 1 taburete con ruedas giratorio
- 1 Esfingomanómetro
- 1 Aparato
- 1 Dispensador de papel
- 1 Dispensador de jabón
- 1 microondas
- 3 armarios colgantes sin vitrinas

Zona Sucia

- 2 carrita de zapas
- 1 Dispensador de papel
- Dispensador de jabón
- 3 Portasueros
- 1 Carro de curas
- 1 foco clínico
- 1 gabete fungible

3 Escaleras

1 Dispensador medicamentos

4 gabetas ~~fungible~~

PLANTA BAJA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

URGENCIAS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción de muestras de urgencias (1)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	2				
	Taburete giratorio alto con respaldo	2				
	Cubo de basura con pedal 50L	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Laboratorio Urgencias (1) 2ª Planta.	Taburete giratorio alto con respaldo	2				
	Cubo de basura con pedal 50L	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					
Zona polivalente de personal (1) Encargado del Serv. Adm	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	1	✓		
	Silla fija con brazos	8	2	✓		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	X			
	Papelera	1	X	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		
	Pizarra para rotulador de pared	1	X			
	Nevera de 150 L.	1	X			
	Cafetera eléctrica	1	X			
	Horno microondas empotrado	1	X			
Aseos Personal (1)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Zona polivalente personal. + Pediatría

- 1 fisiológico
- 4 sillas fijas
- 1 mesa de trabajo
- 1 cubo de basura con tapa 50L
- 2 sofas
- 1 plafón de amonio
- 1 microonda no especificada

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despachos de atención al paciente (2)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija con brazos	2				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
Sala de espera familiares (3)	Sillas modulares	30	20	√		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	3	0			
	Cuadro decoración pared	3	0			
	Jardinera	3	0			
	Soporte para posters de campañas	1	0			
	Expositor de folletos	1	0			
	Papelera	1	1	√		
Aseos públicos (4)	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1 2	2	//		
	Secamanos eléctrico	1	/	/		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1 2	/	//		
	Colgador mural individual	1 2	//	//		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1 2	/	//		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	/	/		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X	X		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Box 3 Pediatría

1 Camilla con vanavodilla
1 Foco clínico exploración
1 Báscula con medida de altura
2 Vitrina de pies
1 Dispensador de jabón
1 Dispensador de papel
Caudalímetro de 02
Camo duros
Camo de yesos
2 Camas auxiliares
Cuarto fungibles
Cubo con tapa 50 litros

HCI

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ALINDEA MARTIN	**FECHA:**	27/11/2019
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despachos de atención al paciente (2)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija con brazos	2				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
Sala de espera familiares (3)	Sillas modulares	30				
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	3				
	Cuadro decoración pared	3				
	Jardinera	3				
	Soporte para posters de campañas	1				
	Expositor de folletos	1				
	Papelera	1				
Aseos públicos (4)	Dispensador de jabón	1	/	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	/	X		
	Secamanos eléctrico	1	/	/		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	~~1~~ 2	/	//		
	Colgador mural individual	1	//		//	
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	//	//		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	/	/		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	/	/		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

SALAS DE EMERGENCIAS (2)

2 Salas emergencias
4 camilla bancadilla
4 caudalometro de O_2
4 Esfigmomanometro
4 Dispensador de jabón
4 Dispensador de toalla
4 Armario colgantes sin vitrinas
2 Escabel
4 Cubos de basura con tapa 50L
2 Carros de Cura

4 portasueros con ruedas
2 cortinas de quirófano fijo

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Inspección y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

BAJA

PLANTA

URGENCIAS-ZONA LLEGADA EMERGENCIAS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (v / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de estar conductores (1)	Sillas modulares	8	1	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Jardinera	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Expositor de folletos	1	X			
Aseos conductores (1)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso	**FECHA:**	28-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

URGENCIAS-ZONA INGRESO PACIENTES

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Control y estar celadores (1)	Mostrador de recepción de 120-140 cm.	1	X			
	Cajonera de mostrador	1	X			
	Silla giratoria con ruedas alta	1	X			
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
Recepción / admisión / registro (1)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1	1	✓		
	Cajonera de mostrador	3	1	✓		
	Silla giratoria con ruedas alta	3	1	✓		
	Armario 200 x 80 x 40 cm. con puertas completas	3	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	1	✓		
Despacho trámites policiales (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	✓		
	Perchero de pie	1	X			
Almacén camillas / sillas (1)	Reloj de pared con fecha	4	X			
	Carro de historias clínicas	8	X			
	Grúa para pacientes	1	X			
	Biombos de 2-3 cuerpos	6	X			
	Balas de oxígeno	6	X			
Despacho información familiares (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	2	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2	✓		
	Silla fija con brazos	2	2	✓		
	Papelera	1	1	✓		
Almacén camillas / sillas (1)	Reloj de pared con fecha	4				
	Carro de historias clínicas	8				
	Grúa para pacientes	1				
	Biombos de 2-3 cuerpos	6				
	Balas de oxígeno	6				

OBSERVACIONES

No existe el almacen de camillas.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Clasificación
silla giratoria
con ruedas
camilla
carro curas
papelera
foco exploración
Báscula y altímetro
Toma de tensión

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box exploración aislados (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Caudalímetro 02 con humidif icador	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓	Sin cristal	
	Camilla de urgencias con barandillas	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	X			
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	2	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
B16	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	X			
	Colgador mural individual	1	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
Boxes de observación (camas) (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Dispensador de jabón	1	2	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	2	✓		
	Escabel	1	X	✓		
	Carro de curas con cajones	1	5	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	12	3			
	Caudalímetro 02 con humidificador	12	18	✓		
	Cama clínica eléctrica	12	18	✓		
	Colchones de látex para cama clínica	12	18	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	12	19	✓		
	Mesita de noche clínica	12	18	✓		
	Mesa cigüeña para comer	12	18	✓		
	Cortina para box de urgencias	12	19	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	12	18	basura sin pedal		
Sillones de observación y espera (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Escabel	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	10				
	Caudalímetro 02 con humidificador	10				
	Sillón reclinable completo	10				
	Cortina para box de urgencias	10				
	Cubo de basura con pedal 12L	10				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	EVA QUIROGA	**FECHA:**	27.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	10:40

ZONA TRABAJO PERSONAL

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Puesto de control (1)	Mostrador de control de 250 cm	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Plafón de avisos	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	2	4	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	✓		
	Carro de historias clínicas	2	X			
	Carro de parada	1	X			
	Cubo de basura 50L	1	X			
Sala de curas (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	2	✓		
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Carro de transporte de ropa sucia	1	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Camilla de urgencias con barandillas	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Cubo de basura 100L	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	1	✓		
	Mesa auxiliar Mayo	1	1	✓		
	Palangana con soporte y ruedas	2	X			
	Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas Poyatas (Equipamiento fijo)	2	X			
Sala de curas ventilada (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	2		Sin cristal	
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Carro de transporte de ropa sucia	1	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Camilla de urgencias con barandillas	1	X			
	Portasuero adaptable a la litera	1	3	✓		
	Cubo de basura 100L	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	X			
	Mesa auxiliar Mayo	1	X			
	Palangana con soporte y ruedas	2	X			
	Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas Poyatas (Equipamiento fijo)	2	X			

OBSERVACIONES

6 butacas
2 taburetes rue 2.0.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

* hay 2 puestos de control: mostrador, dispensador de jabón, de toallas, 2 plafón de avisos, 5 sillas giratorias, 2 cajonera

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Oficio (1) (2) Recepción	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Armario oficio colgado 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Papelera con tapa basculante de 25L	1	X			
	Frigorífico 80L	1	1	✓		
	Microondas de 20-25L Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		
Local de exitus (1) Urgencias	Dispensador de jabón					
	Dispensador de toallas de papel					
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	4				
	Papelera con tapa basculante de 25L Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Zona de utensilios de limpieza (1)	Estantería de pared de 3 estantes	1				
Vestuarios personal (2)	Carro de transporte de ropa sucia	1				
	Banco de vestidor	2				
	Armario ropero modular	10				
	Colgador para ropero	30				
	Papelera con tapa basculante de 50L	1				
	Colgador mural múltiple (módulo)	4				
Aseos Personal (4)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	0			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	0			
	Dispensador de toallas de papel	1	0			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	0			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	0			
Almacén de medicamentos (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	3				
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	15				
Almacén de material general (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	3				
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	15				
Almacén de lencería (1)	Carro de lencería	2				
Almacén de equipamientos (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	3				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Oficio (1)	Dispensador de jabón	1	✓			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Armario oficio colgado 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Papelera con tapa basculante de 25L	1	1	✓		
	Frigorífico 80L	1	1	✓		
	Microondas de 20-25L Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		
Local de exitus (1) es un oficio tb	Dispensador de jabón	X				
	Dispensador de toallas de papel	1	✓			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1			
	Cubo de basura con pedal 12L	4	1	sin	pedal	
	Papelera con tapa basculante de 25L Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
Zona de utensilios de limpieza (1)	Estantería de pared de 3 estantes	1	1	✓		
Vestuarios personal (2)	Carro de transporte de ropa sucia	1				
	Banco de vestidor	2				
	Armario ropero modular	10				
	Colgador para ropero	30				
	Papelera con tapa basculante de 50L	1				
	Colgador mural múltiple (módulo)	4				
Aseos Personal (4)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	0			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	0			
	Dispensador de toallas de papel	1	0			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	0			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	0			
Almacén de medicamentos (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	3	3	✓		
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	15	15	✓		
Almacén de material general (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	3	3	✓		
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	15				
Almacén de lencería (1)	Carro de lencería	2	1	✓		
Almacén de equipamientos (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	3				

OBSERVACIONES

Almacén de lencería hay 2 estanterías, 2 butacas con brazos

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Oficio (1)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Armario oficio colgado 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Papelera con tapa basculante de 25L	1				
	Frigorífico 80L	1				
	Microondas de 20-25L Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Local de exitus (1)	Dispensador de jabón					
	Dispensador de toallas de papel					
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	4				
	Papelera con tapa basculante de 25L Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Zona de utensilios de limpieza (1)	Estantería de pared de 3 estantes	1				
Vestuarios personal (2)	Carro de transporte de ropa sucia	1	1	✓		
	Banco de vestidor	2	2	✓		
	Armario ropero modular	10	8	taquilla		
	Colgador para ropero	30	15			
	Papelera con tapa basculante de 50L	1	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	4	X			
Aseos Personal (4)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	0			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	0			
	Dispensador de toallas de papel	1	0			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	0			
Almacén de medicamentos (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	3				
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	15				
Almacén de material general (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	3				
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	15				
Almacén de lencería (1)	Carro de lencería	2				
Almacén de equipamientos (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	3				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	JUAN CARLOS CORONADO	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	11:00

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Oficio (1)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Armario oficio colgado 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Papelera con tapa basculante de 25L	1				
	Frigorífico 80L	1				
	Microondas de 20-25L Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Local de exitus (1)	Dispensador de jabón					
	Dispensador de toallas de papel					
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	4				
	Papelera con tapa basculante de 25L Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Zona de utensilios de limpieza (1)	Estantería de pared de 3 estantes	1				
Vestuarios personal (2)	Carro de transporte de ropa sucia	1	X			
	Banco de vestidor	2	2	✓		
	Armario ropero modular	10	X			
	Colgador para ropero	30	X			
	Papelera con tapa basculante de 50L	1	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	4	2	✓		
Aseos Personal (4) ♀	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Almacén de medicamentos (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	3				
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	15				
Almacén de material general (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	3				
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	15				
Almacén de lencería (1)	Carro de lencería	2				
Almacén de equipamientos (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	3	8 (8 estantes) 4 (3 estantes)	✓		

OBSERVACIONES

Zona sucio en control de enfermería Urgencias: Ya inventariado.
8 gabetas fungibles Dispensador de jabón
Equipo de medicamentos Dispensador de papel
Cubo de basura 50 L
Gabe

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR: A	Elia 001206 A	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado Bueno	Estado Roto	Estado Deteriorado
Despacho de supervisión (1) Recibir urgencias	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2	✓		
	Silla fija	2	1	✓	+ 1 taburete	
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	1	✓		
	Papelera	1	2	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		
Zona polivalente de personal (1)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	8	X			
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	X			
	Papelera	1	1			
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	X			
Sala trabajo Personal (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	8	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Planning para tarjetas	2	X			
	Plafón de avisos	1	2	✓		
	"Tablilla" de Historia Clínica	1	X			
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	1	✓	Recepción	
Recepción/Secretaría (1)	Reloj de pared con fecha	1	1	✓		
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	2	3	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	2	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Planning para tarjetas	1	X			
	Plafón de avisos	1	1	✓		
	"Tablilla" de Historia Clínica	30	X			
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	X			
	Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	1	1	✓		
Despacho de información (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	2	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija con brazos	2				
	Papelera	1				
Sala de reuniones (1) Despacho médico	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	1	✓		
	Silla fija con brazos	8	4	✓		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	✓		
	Papelera	1	2	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	✓		

↳ un sofa.

OBSERVACIONES

sofa, microondas, nevera 300l. } En la sala de trabajo personal, también hay

En la zona polivalente de personal hay { Gabetas fungibles, escabel, dispensador jabón, papel
3 soportes la brazos

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de yesos (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	0			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	1			
	Dispensador de jabón	1	1			
	Dispensador de toallas de papel	1	1			
	Taburete giratorio con ruedas	2	0			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	~~2~~ 4 (sin cristal)			
	Carro auxiliar de yesos	1	1			
	Carro de curas con cajones	1	1			
	Portasuero adaptable a la litera	1	0			
	Litera de exploración fija de madera	1	0			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1			
	Báscula de pie con altímetro	1	1			
	Carro de transporte de ropa sucia	1	0			
	Colgador mural múltiple (módulo)	2	1			
	Escabel	1	1			
	Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1	0			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	0			
	Cubo de basura 100L Poyatas (Equipamiento fijo)	1	0			
Zona limpia (1)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	2			
	Taburete fijo de 60 cm.	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Papelera con tapa basculante de 25L	1	1 contenedor			
	Frigorífico 300L	1	1	✓		
	Carro de curas con c ajones Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
Zona intermedia (1)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Taburete fijo de 60 cm.	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Papelera con tapa basculante de 25L Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Zona sucia	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1	0			
	Carro de transporte de ropa sucia	2	2	✓		
	Taburete fijo de 60 cm. Poyatas (Equipamiento fijo)	1	0			

OBSERVACIONES

2 apoya brazos en la zona sucia ~~en malo continuo~~ (feto

6 botellas
1 cuña
1 palangana

- Hay 2 zonas de limpio 2º:
  - Dispensador jabón / papel
  - 1 armario vitrina
  - Frigorífico
- Hay 2 zonas sucia 2º:
  - Dispensador jabón, papel. Cubo 50L con tapa
  - 2 cabezas fungibles

CONTROL ENFERMERIA URGENCIAS

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box exploración toco gine (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmo manómetro de mercurio de pared	1	X			
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	X			
	Litera ginecológica convertible	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	2	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Carro de curas con cajones	1	X 1	✓		
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		
Box exploración ORL (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Camilla de exploración de tres cuerpos	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	2	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		
Salas de espera resultados (2)	Sillones ergonómicos para paciente	4	3	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	2	X			
	Cuadro decoración pared	2	2	✓		
	Jardinera	1	X			
	Papelera	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

URGENCIA BOX Supervisora Cristina

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A. 63821091

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Eva QUIROGA	**FECHA:**	28-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box exploración toco gine (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmo manómetro de mercurio de pared	1	X			
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	X			
	Litera ginecológica convertible	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X	X		
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	2	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Escabel	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X	✓		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1	2	✓		
Box exploración ORL (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓	sin	cristal
	Camilla de exploración de tres cuerpos	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	2	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X	sin	pedal	
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
Salas de espera resultados (2)	Sillones ergonómicos para paciente	4	6	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	2	1	✓		
	Cuadro decoración pared	2	2	✓		
	Jardinera	1	X			
	Papelera	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box de atención resolutiva (7) B05	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	X		Sin toma	
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1		✓ (sin cristal)	
	Camilla de urgencias con barandillas	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	7	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1	3	✓		
Box exploración convencional (8) Box 20	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1			
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	1			
	Portasuero adaptable a la litera	1	1			
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
		1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1		✓ sin cristal	
	Camilla de urgencias con barandillas	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	2	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	X			
	Colgador mural individual	1	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		
	En boxes quirúrgicos:	1				
	Aspirador y contenedor Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADORA	Elia Quiroga	**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box de atención resolutiva (7) Box 04	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	X			
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1		✓	(sin cristal)
	Camilla de urgencias con barandillas	1	1			
	Portasuero adaptable a la litera	1	X			
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	7	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	X			
	Colgador mural individual	1	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
Box exploración convencional (8) BOX 21	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X	X		
	Mesa cigüeña para comer	1	X	X		
		1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1		X	sin cristal
	Camilla de urgencias con barandillas	1	1	X		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	X		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	2	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	~~X~~ 1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		
	En boxes quirúrgicos:	1				
	Aspirador y contenedor Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box de atención resolutiva (7)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	sin	cajón	
	Camilla de urgencias con barandillas	1	1	—		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	7	X			
Box 08 convencional	Cubo de basura con pedal 12L	1	X	✓		
	Dispensador de jabón	1	1			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	—		
	Escabel	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
Box exploración convencional (8) Box 02	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
		1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1		✓ (sin cristal)	
	Camilla de urgencias con barandillas	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	2	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		
	En boxes quirúrgicos:	1				
	Aspirador y contenedor Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Elia Quiroga	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box de atención resolutiva (7) Sala de curas	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	✓			
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Camilla de urgencias con barandillas	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	7	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	tapa		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	2	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		
Box exploración convencional (8) Box 01 11	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
		1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	sin cristal		
	Camilla de urgencias con barandillas	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	2	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		
	En boxes quirúrgicos:	1				
	Aspirador y contenedor Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

El Box 01 2 atención resolutiva es una Sala de curas

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Inspección y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box de atención resolutiva (7)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	√	√		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	√	√		
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	√	√		
	Portasuero adaptable a la litera	1	√	√		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Camilla de urgencias con barandillas	1				
	Portasuero adaptable a la litera	1				
	Soporte brazo con pie	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Taburete giratorio con ruedas	7				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Escabel	1				
	Colgador mural individual	1				
	Carro de curas con cajones	1				
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Box exploración convencional (8) Box 22	Negatoscopio de tres cuerpos	1	√ (1)			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	√ (1)			
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	1			
	Portasuero adaptable a la litera	1	1			
	Soporte brazo con pie	1	0			
	Mesa cigüeña para comer	1	0			
		1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1 (sin cajón)		✓	
	Camilla de urgencias con barandillas	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	0			
	Taburete giratorio con ruedas	2	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	0			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	0			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		
	En boxes quirúrgicos:	1				
	Aspirador y contenedor Poyatas (Equipamiento fijo)	1	0			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box de atención resolutiva (7) B09 Convencional	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	Lm	Cristal	
	Camilla de urgencias con barandillas	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	7	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
Box exploración convencional (8) Box 15	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	0			
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
		1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1 (sin cristal)	✓	✓	
	Camilla de urgencias con barandillas	1	0			
	Portasuero adaptable a la litera	1	0			
	Soporte brazo con pie	1	0			
	Mesa cigüeña para comer	1	0			
	Taburete giratorio con ruedas	2	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	0			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	0			
	Colgador mural individual	1	0			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		
	En boxes quirúrgicos:	1				
	Aspirador y contenedor Poyatas (Equipamiento fijo)	1	0			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box de atención resolutiva (7)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1		✓	Sin espejo
	Camilla de urgencias con barandillas	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	7	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X	X		
	Dispensador de jabón	1	X	X		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	X			
	Colgador mural individual	1	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		
Box exploración convencional (8)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	0			
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	0			
		1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Camilla de urgencias con barandillas	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	✓		
	Soporte brazo con pie	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	0			
	Taburete giratorio con ruedas	2	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	0			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	0			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		
	En boxes quirúrgicos:	1				
	Aspirador y contenedor Poyatas (Equipamiento fijo)	1	0			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	[illegible]	FECHA:	27/11/2019
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box de atención resolutiva (7) B03	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	/	/		
	Portasuero adaptable a la litera	1	/	/		
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	/		Vit.	/
	Camilla de urgencias con barandillas	1	/	/		
	Portasuero adaptable a la litera	1	/			
	Soporte brazo con pie	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1	/	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	/	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	/	/		
	Escabel	1	X			
	Colgador mural individual	1	X			
	Carro de curas con cajones	1	/	/		
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1	/	/		
Box exploración convencional (8) B10	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	0			
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	1	/		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	/		
	Soporte brazo con pie	1	1	/		
	Mesa cigüeña para comer	1	0			
		1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1 (sin [illegible])	/		
	Camilla de urgencias con barandillas	1	1	/		
	Portasuero adaptable a la litera	1	1	/		
	Soporte brazo con pie	1	1	/		
	Mesa cigüeña para comer	1	0			
	Taburete giratorio con ruedas	2	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	0			
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	/		
	Escabel	1	1	/		
	Colgador mural individual	1	0			
	Carro de curas con cajones	1	1	/		
	Gavetas para material fungible	1	1	/		
	En boxes quirúrgicos:	1				
	Aspirador y contenedor Poyatas (Equipamiento fijo)	1	0	/		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

Roto

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box exploración agitados (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	1	Solo 6 toma		
	Portasuero adaptable a la litera	1				
	Soporte brazo con pie	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Camilla de urgencias con barandillas	1	1	Sin Lencería		
	Portasuero adaptable a la litera	1				
	Soporte brazo con pie	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Taburete giratorio con ruedas	2				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Escabel	1				
	Colgador mural individual	1				
	Carro de curas con cajones	1				
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Box 15						
Box exploración pediátrica (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X	✓		
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	X			
	Portasuero adaptable a la litera	1	X			
	Soporte brazo con pie	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	X	—		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	X			
	Camilla de urgencias con barandillas	1	1	—		
	Portasuero adaptable a la litera	1	X			
	Soporte brazo con pie	1	1	—		
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	2	1	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	—		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	—		
	Escabel	1	1			
	Colgador mural individual	1	1X			
	Carro de curas con cajones	1	1	—		
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	—		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	[redacted]	**FECHA:**	28-11-19
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Box exploración agitados (2) Box 14 ahora un espacio	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Caudalímetro 02 con humidificador	1		Solo la toma		
	Portasuero adaptable a la litera	1				
	Soporte brazo con pie	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Camilla de urgencias con barandillas	1				
	Portasuero adaptable a la litera	1				
	Soporte brazo con pie	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Taburete giratorio con ruedas	2				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Escabel	1				
	Colgador mural individual	1				
	Carro de curas con cajones	1				
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Box exploración pediátrica (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Caudalímetro 02 con humidificador	1	x			
	Portasuero adaptable a la litera	1	x			
	Soporte brazo con pie	1	✓	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	x			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	x			
	Camilla de urgencias con barandillas	1	x			
	Portasuero adaptable a la litera	1	x			
	Soporte brazo con pie	1	x	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	x			
	Taburete giratorio con ruedas	2	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	x			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1	x			

OBSERVACIONES

* 2 sillas y un taburete con ruedas, papelera y mesa de trabajo

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HCL

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ANUSKA MARCIN	**FECHA:**	27/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despachos de atención al paciente (2)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2	√		
	Silla fija con brazos	2	2	√		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	1	√		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	2	√		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X	√		
	Papelera	1	2	√		
Sala de espera familiares (3) Pediatría	Sillas modulares	30	√	√		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	3	1	√		
	Cuadro decoración pared	3	X			
	Jardinera	3	X			
	Soporte para posters de campañas	1	1	/		
	Expositor de folletos	1	X			
	Papelera	1	2	√		
Aseos públicos (4) 6 Pediatría 1 fóra	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	/		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	2	/		
	Colgador mural individual	1 2	X /		/ /	
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	/	/		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	/			
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			

X 1

OBSERVACIONES

→ 1 cajonera ruedas

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despachos de atención al paciente (2)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Silla fija con brazos	2	X			
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	—		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	X			
Sala de espera familiares (3)	Sillas modulares	30				
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	3				
	Cuadro decoración pared	3				
	Jardinera	3				
	Soporte para posters de campañas	1				
	Expositor de folletos	1				
	Papelera	1				
Aseos públicos (4)	Dispensador de jabón	1	1	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	—	—		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	2	—	—	
	Colgador mural individual	1 2			—	—
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	—		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	—		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

URGENCIA · S. ESPERA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
♀ Aseos públicos (4)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	2	✓		
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	2	✓		
	Colgador mural individual	1	X	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	4	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
♂ Aseos públicos (4)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	2	✓		
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	2	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	4	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Aseos públicos (4) NIÑOS	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	X			
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Aseos públicos (4) personal	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
cuarto empleza	**OBSERVACIONES** Cubo ropa sucia carrito de limpieza					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (v / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (4)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Aseos Personal (4) ♀	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	X	Secador de manos		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	2	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Aseos Personal (4) ♀	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	X	secador de manos		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Aseos Personal (4)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COO. PARTE:**	
INSPECTOR:	ANUSKA MARTÍN	**FECHA:**	27/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA DE APOYO COMPARTIDA ENTRE UNIDADES PEDIÁTRICA, OBSTÉTRICA Y NEONATOLÓGICA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho de supervisión (1) (solo pediatría)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm. Con estantería y archivador	1	1	✓		
	Papelera	1	2	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		
Zona polivalente de personal (1) (Otra sala) (SALA ESTAR)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	1	✓		
	Silla fija con brazos	~~8~~	3	✓		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	✓		
	Nevera de 150 L.	1	1	✗		
	Cafetera eléctrica	1	1	✓		
	Horno microondas empotrado	1	1	✓		
Sala de reuniones (1)	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	1	✓		
	Silla fija con brazos	~~8~~	10	✓		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	✓		
Zona trabajo administrativo (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	3	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	2	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	4	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Plafón de corcho	1	1	✓		
	Papelera	1	3	✓		
	Fotocopiadora	1	1	✓		

OBSERVACIONES

ESTAR PERSONAL. → El microondas no está empotrado
- Hay una mesa para 4p.
- 1 mesa por escritorio.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA BAJA

(*) SERVICIOS DE TIGAS.

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Oficio (1)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	✓		
	Armario oficio colgado 80 x 90 x 35 cm.	1	X	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	✓	✓		
	Papelera con tapa basculante de 25L	1	✓	✓		
	Frigorífico 80L	1	✓	✓		
	Microondas de 20-25L Poyatas (Equipamiento fijo)	1	✓	✓		
Almacén de material general (1)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	4	VACIA			
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	20				
Almacén de lencería (1)	Carro de lencería	~~1~~	7			
Almacén de equipamientos (1) (X)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	4	~~VACIA~~			
Zona de utensilios de limpieza (1)	Carro de limpieza	1	✓	✓		
	Estantería de pared de 3 estantes	1	✓	✓		
Vestuarios personal (1) (2 ♂) (psiquiatría)	Carro de transporte de ropa sucia	~~2~~	X			
	Banco de vestidor	2	1	✓		
	Armario ropero modular	~~18~~	21	✓		
	Colgador para ropero	~~54~~	X			
	Papelera con tapa basculante de 50L	2	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	~~4~~	1	✓		

OBSERVACIONES

(X) NO EXISTE ESTÁ SACA

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Vest. pers 2 ♂

X	
1	✓
14	✓
1	✓
X	
1	✓

papelera pedal 5l.

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de espera familiares (1) Hall	Sillas modulares	~~20~~	9	/		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	~~4~~	1	/		
	Cuadro decoración pared	6	1			
	Jardinera	1	X			
	Soporte para posters de campañas	1	X			
	Expositor de folletos	1	X			
	Papelera	1	1	/		
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1	1	/		
Aseos públicos (4) 1	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	/		
	Secamanos eléctrico	1	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	/		
	Colgador mural individual	1	1	/		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	/		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	/		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo) 1	1	X	X		
Despacho de información (3) 1	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Silla fija con brazos	2	1	/		
	Papelera	1	1	/		

OBSERVACIONES

· Aseo público · (papelera 12 L) (Aseo público) 1
· Dispensador de papel.

Despacho de información sos-
tituido por

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

OBSTETRICA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de espera familiares (1)	Sillas modulares	20	6	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	4	2	✓		
	Cuadro decoración pared	6	1	✓		
	Jardinera	1	X			
	Soporte para posters de campañas	1	X			
	Expositor de folletos	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1	X			
Aseos públicos (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo) 1	1				
Despacho de información (3)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija con brazos	2				
	Papelera	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de espera familiares (1)	Sillas modulares	20				
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	4				
	Cuadro decoración pared	6				
	Jardinera	1				
	Soporte para posters de campañas	1				
	Expositor de folletos	1				
	Papelera	1				
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1				
Aseos públicos (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo) 1	1				
Despacho de información (3)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija con brazos	2				
	Papelera	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de espera familiares (1)	Sillas modulares	20				
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	4				
	Cuadro decoración pared	6				
	Jardinera	1				
	Soporte para posters de campañas	1				
	Expositor de folletos	1				
	Papelera	1				
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1				
Aseos públicos (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo) 1	1				
Despacho de información (3)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija con brazos	2				
	Papelera	1				
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR		**RESPONSABLE INSTALACIÓN**	

PLANTA 2. UNIDAD HOSPITALIZ. CONVENCIONAL B

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Farriso	FECHA: 23-11-17	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

3131

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (v / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

- Dispensador alcohol gel
- Sofa mide +2m.
- No hay colgador xq hay armario

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B132

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1	1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	✓		
	Silla fija	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	1	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	1	✓		
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	1	✓		
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

silla ducha
Dispensador
- Sofá 42m

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Segundo Pascual	FECHA:	23-11-(4
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B-33

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	√		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	√		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	√		
	Almohada para cama clínica	1	1	√		
	Portasueros rodado	1	1	√		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	√		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	√		
	Regulador de vacío	1	1	√		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	√		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	√		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	√		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X 1	√		
	Silla fija	1	1	√		
	Cuadro decoración pared	1	1	√		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	√		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	√		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	√		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	1	√		
	Escobilla WC	1	1	√		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	√		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X	X		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	√		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	√		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B34

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parrilla	FECHA: 23/11/17	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B 135

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	√		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	√		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	√		
	Almohada para cama clínica	1	1	√		
	Portasueros rodado	1	1	√		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	√		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	√		
	Regulador de vacío	1	1	√		
	Esfigmomanómetro de pared	1	√			
	Soporte de termómetro	1	√			
	Mesita de noche clínica	1	1	√		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	√		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	√		
	Butaca paciente/acompañante	1	√			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	√		
	Silla fija	1	1	√		
	Cuadro decoración pared	1	1	√		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	√		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	√		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	√		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	1	√		
	Escobilla WC	1	1	√		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	√		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X	X		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	√		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	√		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B136

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	✓	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	✓			
	Soporte de termómetro	1	✓			
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	✓			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	✓	✓		
	Colgador para ropero	4	✓			
	Papelera metálica	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	✓			
	Palangana de aseo metálica	1	✓			
	Botella	1	✓			
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parra Sa	FECHA:	23-1-2
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B137

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1	1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	✓		
	Silla fija	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	1	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	1	✓		
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X	X		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B.38

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	✓		
	Silla fija	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	1	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parra	FECHA:	23-11-22
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B139

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	✓	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	✓	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X	X		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

BLYO

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	√		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	√		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	√		
	Almohada para cama clínica	1	1	√		
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	√		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	√		
	Regulador de vacío	1	1	√		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	√		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	√		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	√		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	√		
	Silla fija	1	1	√		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	√		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	√		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	√		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	1	√		
	Palangana de aseo metálica	1	√			
	Botella	1	1	√		
	Escobilla WC	1	1	√		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	√		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X	√		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	√		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	√		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parra	FECHA:	23-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

8/47

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1		√		
	Juego de barandillas para cama clínica	1		√		
	Colchón de látex para cama clínica	1		√		
	Almohada para cama clínica	1		√		
	Portasueros rodado	1		√		
	Porta-sueros para cama clínica	1		√		
	Caudalímetro de oxígeno	1		√		
	Regulador de vacío	1		√		
	Esfigmomanómetro de pared	1	x			
	Soporte de termómetro	1	x			
	Mesita de noche clínica	1		√		
	Mesa cigüeña para comer	1		√		
	Sofá-cama 2 m.	1		√		
	Butaca paciente/acompañante	1	x			
	Sillón ergonómico para pacientes	1		√		
	Silla fija	1		√		
	Cuadro decoración pared	1	x			
	Colgador para ropero	4		√		
	Papelera metálica	1		√		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1		√		
	Sujeta toallas de ducha	1		√		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	x			
	Palangana de aseo metálica	1	x			
	Botella	1	x			
	Escobilla WC	1		√		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1		√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1		√		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	+	√		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1		√		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1		√		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B142

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	✓	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	✓	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	✓	✓		
	Botella	1	✓	✓		
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Pascual	FECHA:	23-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B143

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	√		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	√		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	√		
	Almohada para cama clínica	1	1	√		
	Portasueros rodado	1	1	√		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	√		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	√		
	Regulador de vacío	1	1	√		
	Esfigmomanómetro de pared	1	√			
	Soporte de termómetro	1	√			
	Mesita de noche clínica	1	1	√		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	√		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	√		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	√		
	Silla fija	1	1	√		
	Cuadro decoración pared	1	1	√		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	√		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	√			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	√		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	√		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	√		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	√		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X	X		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	√		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	√		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B44

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Pascual	FECHA:	23-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

3145

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	√		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	√		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	√		
	Almohada para cama clínica	1	1	√		
	Portasueros rodado	1	2	√		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	√		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	√		
	Regulador de vacío	1	1	√		
	Esfigmomanómetro de pared	1	x			
	Soporte de termómetro	1	x			
	Mesita de noche clínica	1	1	√		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	√		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	√		
	Butaca paciente/acompañante	1	x			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	√		
	Silla fija	1	1	√		
	Cuadro decoración pared	1	1	√		
	Colgador para ropero	4	x			
	Papelera metálica	1	1	√		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	√		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	√		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	1	√		
	Palangana de aseo metálica	1	1	√		
	Botella	1	1	√		
	Escobilla WC	1	1	√		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	√		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	x	x		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	√		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	√		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Eric QUIROGA	FECHA:	23.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B-146

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1	1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	✓		
	Silla fija	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	1	✓		
	Colgador para ropero	4	1	✓		
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	1	✓		
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X	✓		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:	ELIA QUIROGA	COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	23.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B-147

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	+			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	23.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B_148

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Elia Quiroga	FECHA:	23.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B-149

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	/		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	/		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	/		
	Almohada para cama clínica	1	1	/		
	Portasueros rodado	1	1	/		
	Porta-sueros para cama clínica	1	2			
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	/		
	Regulador de vacío	1	1	/		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	/		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	/		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	/		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	/		
	Silla fija	1	1	/		
	Cuadro decoración pared	1	1	/		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X	/		
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	/		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	/		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	1	/		
	Botella	1	1	/		
	Escobilla WC	1	1	/		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	/		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	/		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X	/		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	/		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	/		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	23.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B-150

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (v / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	✓	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	✓	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	✓	✓		
	Palangana de aseo metálica	1	✓	✓		
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X	OK		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR/A	ELVIA QUINOCA	FECHA:	23.11.07
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B151

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4	X	X		
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X	X		
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
X	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1				
X	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELVA RODRIGUEZ	FECHA:	23.11.07
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B-152

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELVA PEDROSA	FECHA:	23.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B153

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1	1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
X	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
X	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X	X		
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	✓		
	Silla fija	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	1	✓		
Habitación doble / uso individual (130)	Colgador para ropero	4	X	X		
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X	X		
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
X	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
X	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	2	✓		
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	+	✓		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:	ELIA QUIRÓN A	COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	23.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B.154

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1		✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1		✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1		✓		
	Almohada para cama clínica	1		✓		
	Portasueros rodado	1		✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1		✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1		✓		
	Regulador de vacío	1		✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X	X		
	Soporte de termómetro	1	✓	✓		
	Mesita de noche clínica	1		✓		
	Mesa cigüeña para comer	1		✓		
	Sofá-cama 2 m.	1		✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X	✓		
	Sillón ergonómico para pacientes	1		✓		
	Silla fija	1		✓		
	Cuadro decoración pared	1		✓		
	Colgador para ropero	4	X	✓		
	Papelera metálica	1		✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X	✓		
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1		✓		
	Sujeta toallas de ducha	1		✓		
X	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
X	Palangana de aseo metálica	1				
X	Botella	1				
	Escobilla WC	1		✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1		✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1		✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	+	✓		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1		✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1		✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA GUZMÁN	FECHA:	23.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B-155

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	✓	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X	X		
	Soporte de termómetro	1	X	X		
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X	X		
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	✓	✓		
	Colgador para ropero	4	X	X		
	Papelera metálica	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X	X		
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X	X		
	Palangana de aseo metálica	1	X	X		
	Botella	1	X	X		
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X	X		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	EVA . MORCOA	FECHA:	23 . 10 . 14
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	CECILIA	HORA:	

Hora: 8:56

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1		✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1		✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1		✓		
	Almohada para cama clínica	1		✓		
	Portasueros rodado	1		✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1		✓		
	Regulador de vacío	1		✓		
X	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
✓	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1		✓		
	Mesa cigüeña para comer	1		✓		
	Sofá-cama 2 m.	1		✓		
	Butaca paciente/acompañante	1		✓		
	Sillón ergonómico para pacientes	1		✓		
	Silla fija	1		✓		
	Cuadro decoración pared	1		✓		
	Colgador para ropero	4		✓		
	Papelera metálica	1		✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1		✓		
	Sujeta toallas de ducha	1		✓		
X	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
X	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1		✓		
	Escobilla WC	1		✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1		✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1		✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X	✓		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1		✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1		✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	23.10.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	CECILIA	HORA:	33

Mpri: B157

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1		✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1		✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1		✓		
	Almohada para cama clínica	1		✓		
	Portasueros rodado	1		✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1		✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1		✓		
	Regulador de vacío	1		✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1		✓		
	Mesa cigüeña para comer	1		✓		
	Sofá-cama 2 m.	1		✓		
	Butaca paciente/acompañante	1		✓		
	Sillón ergonómico para pacientes	1		✓		
	Silla fija	1		✓		
	Cuadro decoración pared	1		✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1		✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1		✓		
	Sujeta toallas de ducha	1		✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1		✓		
	Palangana de aseo metálica	1		✓		
	Botella	1		✓		
	Escobilla WC	1		✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1		✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1		✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X	✓		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1		✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1		✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	23.10.13
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	CECILIA	HORA:	

HAB.: B [redacted] 158

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
X	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
X	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
Habitación doble / uso individual (130)	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

- Orinal
- dispensador

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	EVA CORROA	FECHA:	23.12.14
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	CECILIA	HORA:	

MAS: B 150

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	/	V		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	/	V		
	Colchón de látex para cama clínica	1	/	V		
	Almohada para cama clínica	1	/	V		
	Portasueros rodado	1	/	V		
	Porta-sueros para cama clínica	1	/	V		
	Caudalímetro de oxígeno	1	/	V		
	Regulador de vacío	1	/	V		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	/	V		
	Mesa cigüeña para comer	1	/	V		
	Sofá-cama 2 m.	1	/	V		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	/	V		
	Silla fija	1	/	V		
	Cuadro decoración pared	1	/	V		
Habitación doble / uso individual (130)	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	/	V		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	/	V		
	Sujeta toallas de ducha	1	/	V		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	/	V		
	Palangana de aseo metálica	1	/	V		
	Botella	1	/	V		
	Escobilla WC	1	/	V		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	/	V		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	/	V		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X	V		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	/	V		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	/	V		

OBSERVACIONES

- Dispensador
- cortinas
- sofa + 2m.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	EVA QUIROGA	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Puesto control enfermería (5)	Reloj de pared con fecha	1	1	√		
	Carro de historias clínicas	1	1	√		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	2	1	√		4 sin ruedas
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	~~0~~ 2	√		
	Papelera	1	1	√		
	Planning para tarjetas	1	1	√		
	Plafón de avisos	1	1	√		
	"Tablilla" de Historia Clínica	30	X			
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	X			
	Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	1	1	√		
Zona limpia (5)	Dispensador de jabón	1	1	√		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	√		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	√		
	Taburete fijo de 60 cm.	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X	- basura con tapa		
	Papelera con tapa basculante de 25L	1	2	√		
	Frigorífico 300L	1	X			
	Carro de curas con cajones Poyatas (Equipamiento fijo)	1	3			
Zona Intermedia (5)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Taburete fijo de 60 cm.	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Papelera con tapa basculante de 25L Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Zona Sucia (5)	Dispensador de jabón	1	1	√		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	√		
	Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1	1	√		
	Carro de transporte de ropa sucia	2	3	√		
	Taburete fijo de 60 cm. Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

1º PLANTA . BLOQUE B

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
Sala Técnica Polivalente (5)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X 2 puesto de control. 2 cuerpos			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	2	✓		
	Foco de exploración de pie	1	2	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	X			
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Silla fija con brazos	2	2	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración con cabecero abatible y ruedas	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2		+ grande		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1 3 cajones	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Aspirador y contenedor	1	X			
	Gavetas para fungible	1	2	✓		
	Carro de curas de 3 estantes con buzón de deshechos	1	X	✓		
Almacén de medicamentos (5)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	1	1			
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	5	6	✓		
Zona de trabajo personal (5)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	3	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	8	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Planning para tarjetas	2	1	✓		
	Plafón de avisos	1	1	✓		
	"Tablilla" de Historia Clínica	1	1	✓		
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	16 huecos	✓		

OBSERVACIONES

- Dispensador de toallas papel
- " jabón
- 3 sillas
- 7 batas
- nevera - micro - horno - ordenador
- mesa redonda.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

* la sala técnica polivalente, es el despacho de la persona encargada

En la fase de trabajo personal hay 7 butacas, 3 sillas, ventana, mesa, lámpara, ordenador, mesa redonda.

PLANTA 1. UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL. MÓDULO C

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Fariña	FECHA:	23-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C1&1

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	✓	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	✓	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	✓	✓		
	Palangana de aseo metálica	1	✓	✓		
	Botella	1	✓	✓		
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X	✓		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C162

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	√		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	√		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	√		
	Almohada para cama clínica	1	1	√		
	Portasueros rodado	1	1	√		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	√		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	√		
	Regulador de vacío	1	1	√		
	Esfigmomanómetro de pared	1	x			
	Soporte de termómetro	1	x			
	Mesita de noche clínica	1	1	√		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	√		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	√		
	Butaca paciente/acompañante	1	x			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	√		
	Silla fija	1	1	√		
	Cuadro decoración pared	1	1	√		
	Colgador para ropero	4	x			
	Papelera metálica	1	1	√		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	√		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	√		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	x			
	Palangana de aseo metálica	1	x			
	Botella	1	1	√		
	Escobilla WC	1	1	√		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	√		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	x	√		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	√		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	√		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parejo	FECHA: 23-11-17	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA: 8	

C163

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C164

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓			
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓			
	Almohada para cama clínica	1	✓			
	Portasueros rodado	1	✓			
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓			
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓			
	Regulador de vacío	1	✓			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	✓			
	Mesa cigüeña para comer	1	✓			
	Sofá-cama 2 m.	1	✓			
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓			
	Silla fija	1	✓			
	Cuadro decoración pared	1	✓			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	✓			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓			
	Sujeta toallas de ducha	1	✓			
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	✓			
	Escobilla WC	1	✓			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓			
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓			
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	✓			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓			
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓			
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parreño	FECHA:	23-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C165

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	V		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	V		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	V		
	Almohada para cama clínica	1	1	V		
	Portasueros rodado	1	1	V		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	V		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	V		
	Regulador de vacío	1	1	V		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	V		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	V		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	V		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	V		
	Silla fija	1	1	V		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	V		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	V		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	V		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	1	V		
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	V		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	V		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	V		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X	XV		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	V		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	V		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C166

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Pascual	FECHA:	23-11-04
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C167

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	√		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	√		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	√		
	Almohada para cama clínica	1	1	√		
	Portasueros rodado	1	1	√		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	√		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	√		
	Regulador de vacío	1	1	√		
	Esfigmomanómetro de pared	1	x			
	Soporte de termómetro	1	x			
	Mesita de noche clínica	1	1	√		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	√		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	√		
	Butaca paciente/acompañante	1	x			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	√		
	Silla fija	1	1	√		
	Cuadro decoración pared	1	1	√		
	Colgador para ropero	4	x			
	Papelera metálica	1	1	√		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	√		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	√		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	1	√		
	Palangana de aseo metálica	1	x			
	Botella	1	1	√		
	Escobilla WC	1	1	√		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	√		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	x			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	√		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	√		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C158

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1	1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	✓		
	Silla fija	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	1	✓		
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parraiso	FECHA:	23-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C 169

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1	1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	✓		
	Silla fija	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	1	✓		
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	1	✓		
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	1			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C170

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Garrido	FECHA:	23-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C17

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (v / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1	1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	✓			
	Mesita de noche clínica	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	✓		
	Silla fija	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C172

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1	1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	✓		
	Silla fija	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	1	✓		
	Botella	1	1	✓		
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	+			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parejo	FECHA:	23-01-19
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C173

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1	1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	✓		
	Silla fija	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	1	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	1	✓		
	Palangana de aseo metálica	1	1	✓		
	Botella	1	1	✓		
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C174

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	V		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	V		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	V		
	Almohada para cama clínica	1	1	V		
	Portasueros rodado	1	1	V		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	V		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	V		
	Regulador de vacío	1	1	V		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	V		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	V		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	V		
	Butaca paciente/acompañante	1	X	~~DX~~		
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	V		
	Silla fija	1	1	V		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	V		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	V		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	V		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	1	V		
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	V		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	V		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	V		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	+			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	V		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	V		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Pastrigo	FECHA:	23-11-2
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C175

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	✓		
	Almohada para cama clínica	1	1	✓		
	Portasueros rodado	1	1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	✓		
	Silla fija	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	1	✓		
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parreño	FECHA:	23-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CH 76

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	√		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	√		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	√		
	Almohada para cama clínica	1	1	√		
	Portasueros rodado	1	1	√		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	√		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	√		
	Regulador de vacío	1	1	√		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	√		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	√		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	√		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	√		
	Silla fija	1	1	√		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	√		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	√		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	√		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	1	√		
	Escobilla WC	1	1	√		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	√		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	√		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	√		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parra	FECHA:	23-11-12
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C177

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C178

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELVA QUIROGA	FECHA:	22.10.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	CECILIA	HORA:	

Habit. [redacted] E. 179

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	✓	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	✓	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELVA QUIROGA	FECHA:	22.10.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	CECILIA	HORA:	

Hab: C_180
Planta 1

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1		✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1		✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1		✓		
	Almohada para cama clínica	1		✓		
	Portasueros rodado	1		✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1		✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1		✓		
	Regulador de vacío	1		✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1		✓		
	Mesa cigüeña para comer	1		✓		
	Sofá-cama 2 m.	1		✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1		✓		
	Silla fija	1		✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1		✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1		✓		
	Sujeta toallas de ducha	1		✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1		✓		
	Escobilla WC	1		✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1		✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1		✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1		✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1		✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Eva Quiroga	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C-181

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	I	V		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	I	V		
	Colchón de látex para cama clínica	1	I	V		
	Almohada para cama clínica	1	I	V		
	Portasueros rodado	1	I	V		
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	I	V		
	Regulador de vacío	1	I	V		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	I	V		
	Mesa cigüeña para comer	1	I	V		
	Sofá-cama 2 m.	1	I	V		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	I	V		
	Silla fija	1	I	V		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	I	V		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	I	V		
	Sujeta toallas de ducha	1	I	V		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	I	V		
	Escobilla WC	1	I	V		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	I	V		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	I	V		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	I	V		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	I	V		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELVA QUIROGA	FECHA:	23.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C.182

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	EVA CÓRDOBA	FECHA:	23.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

€.183

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	✓	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

1 - Luz rota

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELM QUIROGA	FECHA:	23.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C-1R4

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	V	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	V	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	V	✓		
	Almohada para cama clínica	1	V	✓		
	Portasueros rodado	1	V	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	V	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	V	✓		
	Regulador de vacío	1	V	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	V	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	V	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	V	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	V	✓		
	Silla fija	1	V	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	V	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	V	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	V	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	V	✓		
	Botella	1	V	✓		
	Escobilla WC	1	V	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	V	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	V	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	V	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	V	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	23.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C-185

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1	V		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1	V		
	Colchón de látex para cama clínica	1	1	V		
	Almohada para cama clínica	1	1	V		
	Portasueros rodado	1	1	V		
	Porta-sueros para cama clínica	1	1	V		
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	V		
	Regulador de vacío	1	X	V		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	V		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	V		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	V		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	V		
	Silla fija	1	1	V		
	Cuadro decoración pared	1	1	V		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	V		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	V		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	V		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	V		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	V		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	V		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	V		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	V		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

D-160
-152

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Elm 001200 A	FECHA:	23.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

C-186

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso	**FECHA:**	24-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

C186

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	✓	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	✓	✓		
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso	**FECHA:**	24-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

C188

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	✓	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X ✓	✓		
	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	✓	✓		
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

6177

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	✓	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X	X		
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	✓	✓		
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	✓	✓		
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA DOLROBA	FECHA:	22.10.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	CECILIA	HORA:	

HABSI: C-188

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	22.10.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	CECILIA	HORA:	

HAB: C_187

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓	✓		
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	✓	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA . QUIROGA	FECHA:	22.10.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	CEGASA	HORA:	

UDS: C-189

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1		✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1		✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1		✓		
	Almohada para cama clínica	1		✓		
	Portasueros rodado	1		✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1		✓		
	Regulador de vacío	1		✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1		✓		
	Mesa cigüeña para comer	1		✓		
	Sofá-cama 2 m.	1		✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1		✓		
	Silla fija	1		✓		
	Cuadro decoración pared	1		✓		
	Colgador para ropero	4		✓		
	Papelera metálica	1		✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1		✓		
	Sujeta toallas de ducha	1		✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1		✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1		✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1		✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1		✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1		✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Planta 1 C

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	23.10.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	CECILIA	HORA:	

MSB: C_190

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1		✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1		✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1		✓		
	Almohada para cama clínica	1		✓		
	Portasueros rodado	1		✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1		✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1		✓		
	Regulador de vacío	1		✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1		✓		
	Mesa cigüeña para comer	1		✓		
	Sofá-cama 2 m.	1		✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1		✓		
	Silla fija	1		✓		
	Cuadro decoración pared	1		✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1		✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1		✓		
	Sujeta toallas de ducha	1		✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1		✓		
	Palangana de aseo metálica	1		✓		
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1		✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1		✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1		✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1		✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1		✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

CONTROL

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Paracca	FECHA:	24-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

Planta 1 C

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala Técnica Polivalente (5)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	x			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	x			
	Foco de exploración de pie	1	1	/		
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Reloj de pared con fecha	1	x			
	Carro de historias clínicas	1	1	/		
	Silla fija con brazos	2	x			
	Taburete giratorio con ruedas	1	x			
	Litera de exploración con cabecero abatible y ruedas	1	x			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	/		
	Escabel	1	x			
	Cortinaje de exploración	1	x			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	/		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	x			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	/		
	Papelera	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	/		
	Aspirador y contenedor	1	x			
	Gavetas para fungible	1	x			
	Carro de curas de 3 estantes con buzón de deshechos	1	x			
Almacén de medicamentos (5)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	1	1	/		
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	5	1	/		
Zona de trabajo personal (5)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	x			
	Cajonera de tres cajones con ruedas	8	1	/		
	Papelera	1	1	/		
	Planning para tarjetas	2	x			
	Plafón de avisos	1	1	/		
	"Tablilla" de Historia Clínica	1	x			
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	x			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Puesto control enfermería (5)	Reloj de pared con fecha	1				
	Carro de historias clínicas	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	2				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Papelera	1				
	Planning para tarjetas	1				
	Plafón de avisos	1				
	"Tablilla" de Historia Clínica	30				
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1				
	Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	1				
Zona limpia (5)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Taburete fijo de 60 cm.	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Papelera con tapa basculante de 25L	1				
	Frigorífico 300L	1				
	Carro de curas con cajones Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Zona Intermedia (5)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Taburete fijo de 60 cm.	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Papelera con tapa basculante de 25L Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Zona Sucia (5)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1				
	Carro de transporte de ropa sucia	2				
	Taburete fijo de 60 cm. Poyatas (Equipamiento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HTC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA / JUAN C. GARCIA	**FECHA:**	29/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

UROLOGÍA (2)

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala endoscopia urológica + biopsia (2) Consulta 6	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración urológica	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Armario endoscopia	1	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			
Sala urodinámica (1) Consulta 3	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración urológica	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1		sin cristal	
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	2	1	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)					

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

UROLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala endoscopia urológica + biopsia (2) Citoscopia en plano	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración urológica	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	2	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1		✓(sin cristal)	
	Armario endoscopia	1	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)					
Sala urodinámica (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración urológica	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Gavetas para material fungible	2				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELVIRA QUIROGA / JUAN C. GARCÍA	FECHA:	29/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

UROLOGÍA

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1		✓	1
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		

05 en plantas

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

UROLOGÍA CONSULTAS 2

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
02 **Salas de consulta con exploración (65)**	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ALIUSKA ELIAQUIROS / JUANC	FECHA:	29/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

UROLOGIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
07 Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	3	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Elia Quinga	FECHA:	1. R. A
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	16:00

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	✓		
	Báscula de pie con altímetro	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X	con tapa		oscilante
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

consulta 03

Medicina interna

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HFC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	BLANCA MARÍN	FECHA:	30/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

DERMATOLOGÍA (8)

Consulta (8)	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
Puva (1)	Equipamiento técnico específico	?	1	X		
Biopsia y cirugía menor (2) Consulta - (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	11	//		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	11	//		
	Dispensador de jabón para zona quirúrgica	1	X	X		
	Dispensador de jabón	1	11	//		
	Dispensador de toallas de papel	1	11	//		
	Taburete giratorio con ruedas	1	11	//		
	Escabel	1	X 1	/		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	11	//		
	Papelera	1	2 1	///		
	Cubo alto con soporte giratorio	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	11	//		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		11	//		

Biopsia / Consulta (2) Curas

OBSERVACIONES

las dos consultas en esta misma hoja. (No hay copia doble para consulta)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Derma.

Consulta 1 y 2. Enfermería (Curas y Biopsia derma)

NOTAS:

- PUVA, SE ENCUENTRA EN LA CONSULTA 8.
- BIOPSIA Y CIRUGÍA MENOR (2), NORMALMENTE CORRESPONDE A LA CONSULTA 1 Y A LA CONSULTA 2 QUE ES LA SALA DE CURAS DE DERMO

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	[illegible] MARTÍN	**FECHA:** 30/11/2017	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Consulta 8 **Salas de consulta con exploración (65)** dermatol.	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	~~X~~	·		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	~~X~~			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	~~4~~	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	~~2~~	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

· Cubo basura sol. Tapa escalente rota.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Consulta 9 **Salas de consulta con exploración (65)** dermat.	Negatoscopio de tres cuerpos	1	x			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	/		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	/		
	Báscula de pie con altímetro	1	1	/		
	Foco de exploración de pie	1	1	/		
	Juego estándar de curas	3	x	x		
	Juego de bandejas	1	1	/		
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	/		
	Silla fija	2	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	x	x		
	Litera de exploración	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	/		
	Escabel	1	1	/		
	Cortinaje de exploración	1	1	/		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	/		
	Carro de curas con cajones	1	1	/		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	/	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	x			
	Papelera	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	/		

OBSERVACIONES

- Cubo basura 50L. tapa oscilante (Bueno)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	LUISSA MARTIN	FECHA:	30/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 11 derma.	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Oscilometro con brazal de pierna	1				
	Báscula de pie con altímetro	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Juego estándar de curas	0				
	Juego de bandejas	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla fija	2				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Carro de curas con cajones	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1				

OBSERVACIONES

- Cubo basura 50L. Tapa oscilante rota

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 21 dermal.	Negatoscopio de tres cuerpos	1	x			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	x			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	x			
	Báscula de pie con altímetro	1	x			
	Foco de exploración de pie	1	1	/		
	Juego estándar de curas	~~x~~	1	/		
	Juego de bandejas	1	x			
	Dispensador de jabón	1	x			
	Dispensador de toallas de papel	1	x			
	Silla fija	2	1	//		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	/		
	Litera de exploración	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	/		
	Escabel	1	x			
	Cortinaje de exploración	1	x			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	x			
	Carro de curas con cajones	1	x			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	x			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	x			
	Papelera	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	x			

OBSERVACIONES

→ Cambio en planos (en plano Almacén)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ANIUSKA MARTÍN	FECHA:	30/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
(19bis) Consulta derma Salas de consulta con exploración (65) (Almacén en plano)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

Antiguo almacen en plano

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (8) Hema y Onco	Negatoscopio de tres cuerpos 2 cuerp.	1	1			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1			
	Báscula de pie con altímetro	1	1			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	~~8~~	1			
	Juego de bandejas	~~10~~	~~X~~			
	Dispensador de jabón	1	1			
	Dispensador de toallas de papel	1	1			
	Silla fija	2	1			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1			
	Taburete giratorio con ruedas	1	1			
	Litera de exploración	1	1			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1			
	Escabel	1	1			
	Cortinaje de exploración	1	1			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	~~6~~	1			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	~~0~~	1			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1			
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ALICIA MARTIN	FECHA:	30/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 10 Derma	Negatoscopio de tres cuerpos	1	x			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	✓	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	x			
	Báscula de pie con altímetro	1	✓	✓		
	Foco de exploración de pie	1	✓	✓		
	Juego estándar de curas	8				
	Juego de bandejas	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	✓		
	Silla fija	2	✓	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	✓	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	✓	✓		
	Litera de exploración	1	✓	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	✓	✓		
	Escabel	1	✓	✓		
	Cortinaje de exploración	1	✓	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	✓	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	x			
	Papelera	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

- Cubo basura 50L. tapa osc. (Roto)
-

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	DANIELA MARTÍN	FECHA:	1/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Medicina Interna	Negatoscopio de tres cuerpos 2 cuerp.	1	1			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1			
	Báscula de pie con altímetro	1	1			
	Foco de exploración de pie	1	1			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1			
	Dispensador de toallas de papel	1	1			
	Silla fija	2	1			
Salas de consulta con exploración (65)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1			
	Taburete giratorio con ruedas	1	1			
	Litera de exploración	1	1			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1			
Consulta	Escabel	1	1			
	Cortinaje de exploración	1	1			
7	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	2	1			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1			
~~Hema~~	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	BELÉN MARTÍN	**FECHA:**	30/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

(13) **GASTROENTEROLOGIA** 1ª PLANTA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Endoscopias y pruebas funcionales (2) 23-[illegible] Consultas	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guía para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		✓
	Armario endoscopia	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X	✓		
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		

OBSERVACIONES

* Cama completa

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

GASTROENTEROLOGIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Endoscopias y pruebas funcionales (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
Consulta 24	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1			✓
	Armario endoscopia	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		

OBSERVACIONES

Cama completa eléctrica

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	JUAN CARLOS	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
Ecografias (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	✓		✓
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
22 Consultas	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			
Biopsia Hepática (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	3	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
25 Consultas Foto	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	3	1 (sin cristal)			✓
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	3	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HLC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	BLANCA MARTÍN	FECHA:	30/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Consulta 3 Salas de consulta con exploración (65) Digestivo	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	/		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	/		
	Báscula de pie con altímetro	1	1	/		
	Foco de exploración de pie	1	1	/		
	Juego estándar de curas	~~2~~	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	/		
	Silla fija	2	1	//		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	/		
	Escabel	1	1	/		
	Cortinaje de exploración	1	1	/		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	~~0~~	1	/		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	/		

OBSERVACIONES

- Cubos basura 20L. Tapa oscilante (Bueno)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Consulta 6 Salas de consulta con exploración (65) Digestivo	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	/		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	/		
	Báscula de pie con altímetro	1	1	/		
	Foco de exploración de pie	1	1	/		
	Juego estándar de curas	~~2~~	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	/		
	Silla fija	2	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	/		
	Escabel	1	1	/		
	Cortinaje de exploración	1	1	/		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	~~4~~	1	/		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	~~2~~	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	1		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	11	//		

OBSERVACIONES

- Cubo basura Tapa os. Sol. Bueno

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	DALIUSKA MARTÍN	FECHA:	30/11/2014
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Consulta 7 Salas de consulta con exploración (65) Digestivo	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	/		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	/		
	Báscula de pie con altímetro	1	1	/		
	Foco de exploración de pie	1	1	/		
	Juego estándar de curas	~~3~~	X			
	Juego de bandejas	~~1~~	X			
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	/		
	Silla fija	2	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	/		
	Litera de exploración	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	/		
	Escabel	1	1	/		
	Cortinaje de exploración	1	1	/		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	~~1~~	1	/		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	~~2~~	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	/		

OBSERVACIONES

Cubo basura 50 L. Tapa oscilante (Bueno)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	DULCE MARIA	**FECHA:**	1/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (9) Ellenat. y Onco	Negatoscopio de tres cuerpos Zuerp.	1	1			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1			
	Báscula de pie con altímetro	1	1			
	Foco de exploración de pie	1	1			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1			
	Dispensador de toallas de papel	1	1			
	Silla fija	2	1			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1			
	Taburete giratorio con ruedas	1	1			
	Litera de exploración	1	1			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1			
	Escabel	1	1			
	Cortinaje de exploración	~~17~~	1			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	~~A~~	1			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	②	1			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1 1			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HJC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	BLANCA MUÑOZ	**FECHA:**	30/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ALERGOLOGÍA (9)

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Pruebas de provocación (2) Consulta 17	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	2	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		✓			
Comparte con 17 y 20 Tests cutáneos (2) ~~Consulta 17~~	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Gavetas para material fungible	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

- la sala de tests cutáneos no existe como tal. Las pruebas las realizan en la Consulta 17 y en la 20.

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ALERGOLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Pruebas de provocación (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guía para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Gavetas para material fungible	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					
Tests cutáneos (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guía para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Gavetas para material fungible	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

- Solo existe una sala de pruebas y 1 camilla.

(HIC) 8 a 11 → Dermat Tec (10)

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	DULCE MARIA	FECHA:	20/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Alergia Salas de consulta con exploración (65) Consulta 18	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	/		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	/		
	Báscula de pie con altímetro	1	1	/		
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	1	/		
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	/		
	Silla fija	2	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	/		
	Escabel	1	1	/		
	Cortinaje de exploración	1	1	/		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	/		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	/	/		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

M 2 Enf. · Digest. 6-7-8-3

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	DANIELA MARTIN	FECHA:	1/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Cons. 6 Hema y Onco	Negatoscopio de tres cuerpos 2 uvop	1	1	1		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1			
	Báscula de pie con altímetro	1	1			
	Foco de exploración de pie	1	1			
	Juego estándar de curas	~~2~~	1			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1			
	Dispensador de toallas de papel	1	1			
	Silla fija	2	1			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1			
	Taburete giratorio con ruedas	1	1			
	Litera de exploración	1	1			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1			
	Escabel	1	1			
	Cortinaje de exploración	1	1			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	~~4~~	1			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	~~0~~	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1			
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

12-13-14 y 15 (Endocri) 21 → Dermat.

HFC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	JUAN CARLOS	**FECHA:**	01-12-2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	17:00 h

PLANTA BAJA

PSIQUIATRÍA (11)

? PREGUNTAR A CONSULTA → HOSPITAL.

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Tests Psicológicos (2)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija	2				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					
Sala terapias de grupo y educación (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija	10				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

CONSULTA PSIQUIATRÍA

- 2 SILLAS GIRATORIAS
- 1 SILLA FIJA
- 1 MESA de TRABAJO
- 1 PAPELERA
- 1 TABURETE con RUEDAS
- 1 CUADRO COLGANTE

La consulta de psiquiatría se encuentra situada a la entrada del bloque de hospitalización psiquiátrica. Corresponde al despacho de información en el plano del anexo.

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

PSIQUIATRÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Tests Psicológicos (2)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija	2				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					
Sala terapias de grupo y educación (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija	10				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR		**RESPONSABLE INSTALACIÓN**	

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Elis QUIROGA	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	16:20

ONCO

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	✓		
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

Cama 12

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 04 Medicina interna	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpo		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	—		
	Báscula de pie con altímetro	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1			
	Taburete giratorio con ruedas	1	1			
	Litera de exploración	1	1			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1			
	Escabel	1	1			
	Cortinaje de exploración	1	1			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1			
	Cubo de basura con pedal 12L	1		con tapa basculante		
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ENRIQUE MARTÍN	**FECHA:**	30/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

TRAUMATOLOGÍA

10

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de yesos (3) Consulta 5 trauma.	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	2	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		✓
	Carro auxiliar de yesos	1	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Portasuero adaptable a la litera	1	X			
	Litera de exploración fija de madera	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Carro de transporte de ropa sucia	1	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	2	1	✓		
	Escabel	1	X 1	✓		
	Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1	X	X		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura 100L	1	X	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Gavetas para material fungible	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

Actualmente No Sale de Yesos.

Yesos 2 → es Consulta 5

Yesos 3 → es Consulta 2

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

- Litera metal ruedas 1. (Bueno)

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

TRAUMATOLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (v / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de yesos (3) Consulta 2	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	2	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1			✓
	Carro auxiliar de yesos	1	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Portasuero adaptable a la litera	1	X			
	Litera de exploración fija de madera	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Carro de transporte de ropa sucia	1	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	~~2~~	1	✓		
	Escabel	1	X			
	Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura 100L	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Gavetas para material fungible	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	✓		

OBSERVACIONES

- Litera metal 1 (Bueno)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Inspección y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	BELÉN MARTÍN	**FECHA:**	30/11/2012
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

TRAUMATOLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de yesos (3) Consulta (7)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	2	//		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración quirúrgica de pie 35.000 Lux	1	X			
	Dispensador de jabón	~~1~~	2	//		
	Dispensador de toallas de papel	~~1~~	2	//		
	Taburete giratorio con ruedas	2	1	//		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	~~1~~	2	X		//
	Carro auxiliar de yesos	1	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	/		
	Portasuero adaptable a la litera	1	X			
	Litera de exploración fija de madera	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	2	//		
	Báscula de pie con altímetro	1	1	/		
	Carro de transporte de ropa sucia	1	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	2	1	//		
	Escabel	1	/	/		
	Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1	1	1		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura 100L	1	1	/		
	Cortinaje de exploración	~~1~~	2	//		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	~~4~~	2	//		
	Gavetas para material fungible	1	2	//		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		2	//		

OBSERVACIONES

- litera metalica (2) Bueno

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HSC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	[illegible] MUÑOZ	FECHA:	30/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (1) Trauma	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	✓✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	Poyatas	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Cons. trauma 3	Negatoscopio de tres cuerpos	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	2	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4 ✓	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2 ✓	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	✓✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	✓		
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1 X	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ANUSKA MARÍN	FECHA:	20/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (4) trauma	Negatoscopio de tres cuerpos	1	/	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	1	/		
	Foco de exploración de pie	1	1	/		
	Juego estándar de curas	3	1	/		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	/		
	Silla fija	2	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	/		
	Litera de exploración	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	/		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	/		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4 /	1	/		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	11	11		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (6) trauma	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	✓	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

MIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	LUISA MARÍN	FECHA:	20/11/2012
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (8) trauma	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	/		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	/		
	Báscula de pie con altímetro	1	1	/		
	Foco de exploración de pie	1	1	/		
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla fija	2	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	/		
	Litera de exploración	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	/		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	//		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	/		
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (9) trauma	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1			
	Báscula de pie con altímetro	1	1			
	Foco de exploración de pie	1	1			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1			
	Dispensador de toallas de papel	1	1			
	Silla fija	2	1			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1			
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	~~4~~	1			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	~~2~~	1			/
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

MIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ANIUSKA MARZIN	FECHA:	30/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (10) Trauma	Negatoscopio de tres cuerpos (2)	1	1	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	/		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	/		
	Báscula de pie con altímetro	1	1	/		
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	~~3~~	1	/		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	/		
	Silla fija	2	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	/		
	Escabel	1	1	/		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	/		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	~~0~~	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	~~1~~	2	/ /		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1 1	/ /		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (11)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	1		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	~~4~~	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	~~0~~	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	~~1~~	2	✓		✓
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1 1	✓ ✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR: A	ELIA QUIROGA / J.C. CAR	**FECHA:**	29/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

(2)

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
02 Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	✓		
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	3	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓	✓	
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	3	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

GINE

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
01 Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	√		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	√		
	Juego estándar de curas	3	3	√		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	√		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	√		
	Silla fija	2	3	√		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	√		
	Taburete giratorio con ruedas	1	3	√		
	Litera de exploración	1	1	√		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	√		
	Escabel	1	1	√		
	Cortinaje de exploración	1	1	√		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	√		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	√		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	√		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	√		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	√		
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	√		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA / J. C. GARCÍA	**FECHA:**	29/11/2012
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

GINECOLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 04	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	✓		
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	3	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	3	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	3	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

GINE

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	2	movil → Aprod		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	X	✓		
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	2	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		

Consulta 3 Sdo Planta

2 Modulo

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA / J. CARLOS. GARCÍA	**FECHA:**	29/11/2021
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

GINECOLOGÍA (2)

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Ecografía ginecológica + Histerosalpingografia (3) Consulta 6	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración ginecológica	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)					

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

GINECOLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Ecografía ginecológica + Histerosalpingografia (3) Consulta 8	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración ginecológica	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	CLA QUIROGA / J.C. GMEZ	**FECHA:**	29/11/2012
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

OBSTETRICIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Ecografía obstétrica (2) Consulta 5	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración obstétrica	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

OBSTETRICIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Ecografía obstétrica (2) Consulta 7	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	√		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	√		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	√		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	√		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	√		
	Litera de exploración obstétrica	1	1	√		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	√		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	√		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	√		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	√		
	Papelera	1	1	√		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	√		
	Gavetas para material fungible	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

4IC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	DANUSKA MARZÍN	**FECHA:**	29/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

NEUMOLOGÍA (6)

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Pruebas funcionales respiratorias (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1		/	
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	/		
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
Sala broncoscopia + biopsia pleural (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	/	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	~~1~~	2	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	/		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	/	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	2	/		
	Cortinaje de exploración	1	/	/		
	ML de guia para cortinas de zonas clínic as	~~4~~	1	/		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	~~2~~	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	2	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	3	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	/		
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	~~1~~	2	/		

Consulta 19

(26)

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

NEUMOLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Pruebas funcionales respiratorias (2) Consulta 20	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	/		
	Foco de exploración de pie	1	1	/		
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	/		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	1	/		
	Cortinaje de exploración	1	1	/		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	/		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	~~2~~	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X	/		
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	/	/		
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1	/	/		
Sala broncoscopia + biopsia pleural (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínic as	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR		**RESPONSABLE INSTALACIÓN**	

HSC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ALICIA MARÍN	FECHA:	29/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

NEUMO

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 4	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	/		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	/		
	Báscula de pie con altímetro	1	1	/		
	Foco de exploración de pie	1	1	/		
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X	/		
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	/		
	Silla fija	2	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	/		
	Escabel	1	1	/		
	Cortinaje de exploración	1	1	/		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	/		
	Carro de curas con cajones	1	1	/		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	/		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS NEUMO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (5)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	/		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	/		
	Báscula de pie con altímetro	1	1	/		
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	/		
	Silla fija	2	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	/		
	Litera de exploración	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	/		
	Escabel	1	1	/		
	Cortinaje de exploración	1	1	/		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	~~4~~	1	/		
	Carro de curas con cajones	1	1	/		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	~~2~~	1			/
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	/		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HJC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	DULCSKA MARTÍN	**FECHA:**	29/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

NEUROLOGÍA (5)

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Consultas (12)	Negatoscopio de tres cuerpos	2	/			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	2	1	/		
	Foco de exploración de pie	2	1	/		
	Dispensador de jabón	2	X			
	Dispensador de toallas de papel	2	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	2	✓	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	2	1	/		
	Litera de exploración de tres cuerpos	2	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	2	X			
Sala electroencefalograma (2) (1) Solo 1 sala	Escabel	2	X			
	Cortinaje de exploración	2	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	8	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	2	/ 1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	2	X			
	Papelera	2	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	2	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	2	1	/		
	Gavetas para material fungible	2	/	/		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		/			
Consulta (13)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
Sala electromiograma (1)	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 c m.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

- Cama eléctica completa en consulta 12

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

NEUROLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala electroencefalograma (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	2				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	2				
	Foco de exploración de pie	2				
	Dispensador de jabón	2				
	Dispensador de toallas de papel	2				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	2				
	Taburete giratorio con ruedas	2				
	Litera de exploración de tres cuerpos	2				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	2				
	Escabel	2				
	Cortinaje de exploración	2				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	8				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	2				
	Cajonera colgante de dos cajones	2				
	Papelera	2				
	Cubo de basura con pedal 12L	2				
	Perchero mural múltiple (módulo)	2				
	Gavetas para material fungible	2				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					
Sala electromiograma (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 c m.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Gavetas para material fungible Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HJC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	DANIELA MARTÍN	FECHA:	29/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

NEURO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (7)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	✓		
	Báscula de pie con altímetro	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	x			
	Juego de bandejas	1	x			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	x			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	x			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

ALERGOLÓGICO

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 16	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	✓		
	Báscula de pie con altímetro	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	DANIUSKA MARTIN	FECHA:	29/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

NEURO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) consulta 9	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	✓		
	Báscula de pie con altímetro	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 8	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	/		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	/		
	Báscula de pie con altímetro	1	1	/		
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	/		
	Silla fija	2	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	/		
	Litera de exploración	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	/		
	Escabel	1	1	/		
	Cortinaje de exploración	1	1	/		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	/		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	/		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	BLANCA MARTÍN	**FECHA:**	28/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA DE RESIDENCIA Y DORMITORIOS DE GUARDIA

1ª PLANTA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
Médico guardia (1) Dormitorios individuales con baño (18)	Cama individual	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Silla fija con brazos	1	3	✓		
	Mesita de noche	1	✓	✓		
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm. (180mt)	1	✓	✓		
	Luz para mesita de noche	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X	X		
	Cortinaje de ducha	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
Médico de guardia (2) Dormitorios individuales con baño (18)	Cama individual	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Silla fija con brazos	~~1~~	2	✓		
	Mesita de noche	1	✓	✓		
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm. (180ml)	1	✓	✓		
	Luz para mesita de noche	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cortinaje de ducha	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
(1) Dormitorios individuales con baño (18) Medicina interna	Cama individual	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X	✓		
	Silla fija con brazos	1	✓	✓		
	Mesita de noche	1	✓	✓		
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm. empotrado	1	✓	✓		
	Luz para mesita de noche	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X	✓		
	Cortinaje de ducha	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		

- compartem con UCI -

OBSERVACIONES

- Papelera. SI.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HHC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	BELÉN MARTÍN	FECHA:	28/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA DE RESIDENCIA Y DORMITORIOS DE GUARDIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
9 Dormitorios individuales con baño (18) Urgencias.	Cama individual	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	x			
	Silla fija con brazos	1	✓	✓		
	Mesita de noche	1	✓	✓		
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm. empotrado	1	✓	✓		
	Luz para mesita de noche	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal ~~12L~~ 5L	1	x			
	Cortinaje de ducha	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
3 Dormitorios individuales con baño (18) Urgencias	Cama individual	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	x			
	Silla fija con brazos	1	✓	✓		
	Mesita de noche	1	✓	✓		
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm. empotrado	1	✓	✓		
	Luz para mesita de noche	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	✓	✓		
	Cortinaje de ducha	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
4 Dormitorios individuales con baño (18) Médicos de guardia (4)	Cama individual	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Silla fija con brazos	1	✓	✓		
	Mesita de noche	1	✓	✓		
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm. empotrado	1	✓	✓		
	Luz para mesita de noche	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cortinaje de ducha	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Cubo basura pedal 5L. en todas
todos los armarios son empotrado.

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA DE RESIDENCIA Y DORMITORIOS DE GUARDIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Pediatría **Dormitorios individuales con baño (18)** 5	Cama individual	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	1	✓	✓		
	Mesita de noche	1	✓	✓		
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm. empotrado	1	✓	✓		
	Luz para mesita de noche	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X	X		
	Cortinaje de ducha	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
6 **Dormitorios individuales con baño (18)** Psiquiatría	Cama individual	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	1	✓	✓		
	Mesita de noche	1	✓	✓		
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm. empotrado	1	✓	✓		
	Luz para mesita de noche	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X	X		
	Cortinaje de ducha	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
7 **Dormitorios individuales con baño (18)** Radiología	Cama individual	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	1	✓	✓		
	Mesita de noche	1	✓	✓		
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm.	1	✓	✓		
	Luz para mesita de noche	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	-		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cortinaje de ducha	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA PRIMERA

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	MARISA MARTIN	FECHA:	28-11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA DE RESIDENCIA Y DORMITORIOS DE GUARDIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
(8) Dormitorios individuales con baño (18) Supervisor	Cama individual	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Silla fija con brazos	1	✓	✓		
	Mesita de noche	1	✓	✓		
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm. empotrado	1	✓	✓		
	Luz para mesita de noche	1	✓	✓		✓
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cortinaje de ducha	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
(9) Dormitorios individuales con baño (18) Jefe de guardia	Cama individual	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	1	✓	✓		
	Mesita de noche	1	✓	✓		
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm. empotrado	1	✓	✓		
	Luz para mesita de noche	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cortinaje de ducha	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
(10) Dormitorios individuales con baño (18) Guardia localizado	Cama individual	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Silla fija con brazos	1	✓	✓		
	Mesita de noche	1	✓			✓
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm. empotrado	1	✓	✓		
	Luz para mesita de noche	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cortinaje de ducha	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA DE RESIDENCIA Y DORMITORIOS DE GUARDIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Guardia localizada Dormitorios individuales con baño (18) 11	Cama individual	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	1	✓	✓		
	Mesita de noche	1	✓	✓		
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm.	1	✓	✓		
	Luz para mesita de noche	1	✓			✓
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cortinaje de ducha	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
12 Dormitorios individuales con baño (18) Anestesiología	Cama individual	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	1	✓	✓		
	Mesita de noche	1	✓	✓		
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm.	1	✓	✓		
	Luz para mesita de noche	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cortinaje de ducha	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
13 Dormitorios individuales con baño (18) Obstétrica y Ginecología	Cama individual	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	1	✓	✓		
	Mesita de noche	1	✓	✓		
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm.	1	✓	✓		
	Luz para mesita de noche	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cortinaje de ducha	1	✓			✓
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	BLANCA MARTÍN	FECHA:	28/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA DE RESIDENCIA Y DORMITORIOS DE GUARDIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
trauma Dormitorios individuales con baño (18) 14	Cama individual	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Silla fija con brazos	1	✓	✓		
	Mesita de noche	1	✓	✓		
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm. empotrado	1	✓	✓		
	Luz para mesita de noche	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cortinaje de ducha	1	✓	✓		✓
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓	✓	
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
15 Dormitorios individuales con baño (18) Cirugía gral.	Cama individual	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Silla fija con brazos	1	✓	✓		
	Mesita de noche	1	✓			✓
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm. empotrado	1	✓	✓		
	Luz para mesita de noche	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cortinaje de ducha	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
16 Dormitorios individuales con baño (18)	Cama individual	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Silla fija con brazos	1	✓			✓
	Mesita de noche	1	✓	✓		
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm.	1	✓	✓		
	Luz para mesita de noche	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cortinaje de ducha	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓	✓	
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

(d) 14. SILLÓN

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	LUISCA MARTIN	**FECHA:**	28/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de estar (1)	Asiento modular confortable	6	2	/		
	Mesa rectangular baja 120 x 60	1	X			
	Silla fija con brazos	4	13	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	TV de 25"	1	X			
	Soporte elevado para TV	1	X			
	Paragüero	1	X			
	Perchero de pie	1	X			
	Cafetera expres de una salida	1	X			
	Frigorífico 80L	1	X			
Almacén de lencería (1)	Carro de lencería	1	/	/		
Zona de utensilios de limpieza (1)	Carro de limpieza	1	2	/		
	Estantería de pared de 3 estantes	1	/	/		

OBSERVACIONES

- papelera 5L. (sala Estar 1)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA PRIMERA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ASISTENCIA RELIGIOSA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho (1)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	✓			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	✓			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	✓			
	Silla fija	2	✓ (2)			
	Papelera	1	✓			
Sala de preparación del culto (1)	Armario modular 200x40x100 cms	3	✓ (2)			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	2	✓ (1)			
	Armario ropero modular	2	✓ (2)			
Sala de culto (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓			
	Altar	1	✓			
	Sillas fijas apilables sin brazos	70	✓ (65)			
Dormitorio y aseo capellán (1)	Cama individual	3	✓ (2)	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Silla fija con brazos	4	✓ (2)	✓		
	Mesita de noche	8	✓ (4)	✓		
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm.	4	X	✓		
	Luz para mesita de noche	4	✓	✓		
	Dispensador de jabón	3	✓ (1)	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cortinaje de ducha	4	✓ (2)	✓		
	Sujeta toallas de ducha	8	✓ (2)	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	4	✓ (2)	✓		
	Colgador mural individual	4	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PRIMERA PLANTA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

BIBLIOTECA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Zona de préstamo e información (1)	Mostrador de recepción de 120-140 cm.	1	1	✓		
	Cajonera de mostrador	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas alta	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
Fondo bibliográfico y sala de lectura (1)	Armario de biblioteca de 200 x 80 x 40 cm de ancho	12	1	✓		
	Silla fija con brazos	24	1	✓		
	Mesa de biblioteca 160 x 120 x 74 cm. (4 personas)	6	1	✓		
	Papelera	2	1	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		
Aula informática compartida (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Mesa de trabajo de 160 x 80 x 74 cm.	6	1	✓		
	Silla fija	15	1	✓		
	Pizarra para rotulador de pared	2	X			
	Papelera	1	1	✓		
Almacén fondo bibliográfico (1)	Estantería metálica 5/6 niveles ML	5	1	✓		
	Escalera con tres peldaños y pies aislantes	1	X			
Reprografía (1)	Mostrador de recepción de 120-140 cm.	1	1	✓		
	Cajonera de mostrador	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas alta	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
Secretaría (1) No hay	Silla giratoria con brazos y ruedas					
	Silla fija					
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.					
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.					
	Papelera					
	Cajonera colgante de dos cajones					

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HJC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	JUAN CARLOS GARCÍA y ALEJANDRO PARAÍSO	**FECHA:**	27/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

PRIMERA PLANTA

CONSULTAS EXTERNAS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción / Programación de Consultas (1)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1	√ 1			
	Cajonera de mostrador	2	√ 2			
	Silla giratoria con ruedas alta	2	√ 2			
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	2	√ 2			
	Papelera	1	√ 1			
	Reloj de pared con fecha	1	√ 1			
Almacén de sillas de ruedas (1)	Sillas de ruedas plegables	6	√ 6			
	Camilla de transporte de pacientes	2		√		
Sala de espera (1)	Conjunto lineal de asientos y mesitas	24	√ 24			
	Papelera para sala de espera	2	X			
	Jardinera	2	X			
	TV de 25"	2	√ 2	√		
	Cuadro decoración pared	3	X			
	Soporte para posters de campañas	1	√ 1	√		
	Expositor de folletos	1	√ 1	√		

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN - ADMISIÓN

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	(8) Medicina Interna
INSPECTOR:		**FECHA:**	Noviembre
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	Noviembre

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1	√ 1	√		
	Cajonera de mostrador	1	X			
	Silla giratoria con ruedas alta	2	√ 1	√		
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1	X			
	Papelera	1	√ 1	√		
	Reloj de pared con fecha	1	√ 1	√		
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	CARDIOLOGÍA (5)
INSPECTOR:	ALEJANDRO PARAISO y JUAN CARLOS GARCÍA	**FECHA:**	27/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ESPACIOS GENERALES DE CADA MÓDULO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1	1			
	Cajonera de mostrador	1	1			
	Silla giratoria con ruedas alta	2	(1)			
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1	1			
	Papelera	1	1			
	Reloj de pared con fecha	1	1			
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	UROLOGIA y ~~CARDIOLOGIA~~ (6)
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1	✓ 1	✓		
	Cajonera de mostrador	1	✓ 1	✓		
	Silla giratoria con ruedas alta	2	✓ (1)	✓		
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1	✓ 1	✓		
	Papelera	1	✓ 1	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	✓ 1	✓		
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	GINECOLOGIA y OBSTETRICIA (S)
INSPECTOR:	ALEJANDRO PARDISO y JUAN CARLOS GARCIA	FECHA:	27/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ESPACIOS GENERALES DE CADA MÓDULO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1	✓ 1	✓		
	Cajonera de mostrador	1	X			
	Silla giratoria con ruedas alta	2	X			
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1	X			
	Papelera	1	X			
	Reloj de pared con fecha	1	✓ 1	✓		
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:** CIRUGÍA GENERAL (4)	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1	✓1	✓		
	Cajonera de mostrador	1	X			
	Silla giratoria con ruedas alta	2	X			
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1	X			
	Papelera	1	X			
	Reloj de pared con fecha	1	✓1	✓		
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			OTORRINO (3)
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	~~OFTALMOLOGÍA~~
INSPECTOR:	ALEJANDRO PARAISO y JUAN CARLOS GARCÍA	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ESPACIOS GENERALES DE CADA MÓDULO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1	√ 1	√		
	Cajonera de mostrador	1	√ 1	√		
	Silla giratoria con ruedas alta	2	√ (1)	√		
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1	√ 1	√		
	Papelera	1	√ 1	√		
	Reloj de pared con fecha	1	√ 1	√		
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	OFTALMOLOGÍA (7)
INSPECTOR:	JUAN CARLOS GARCÍA, ALEJANDRO PARAÍSO	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1	✓ 1	✓		
	Cajonera de mostrador	1	✓ 1	✓		
	Silla giratoria con ruedas alta	2	✓ (1)	✓		
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1	✓ 1	✓		
	Papelera	1	✓ 1	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	✓ 1	✓		
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	TRAUMATOLOGÍA (1)
INSPECTOR:	JUAN CARLOS GARCÍA y ALEJANDRO PARADA	FECHA:	27/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ESPACIOS GENERALES DE CADA MÓDULO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1	✓ 1	✓		
	Cajonera de mostrador	1	✓ 1	✓		
	Silla giratoria con ruedas alta	2	✓ (1)	✓		
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1	✓ 1	✓		
	Papelera	1	✓ 1	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	✓ 1	✓		
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	(10) DERMATOLOGÍA DIGESTIVO
INSPECTOR:	ALEJANDRO PARAISO y JUAN CARLOS GARCIA	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1	✓ 1	✓		
	Cajonera de mostrador	1	X 1			
	Silla giratoria con ruedas alta	2	✓ (1)	✓		
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1	X			
	Papelera	1	✓ 1	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	✓ 1	✓		
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	(9)
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ALERGIA, CONDUCTAS

ESPACIOS GENERALES DE CADA MÓDULO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1	✓ 1	✓		
	Cajonera de mostrador	1	✗ ✓ 1	✓		
	Silla giratoria con ruedas alta	2	✗ ✓ 2	✓		
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1	✗ ✓ 1	✓		
	Papelera	1	✗ ✓ 1	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	✓	✗		
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
Recepción del módulo (10)	Mostrador de recepción de 200-240 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	1				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ALEJANDRO PARAÍSO y JUAN CARLOS CARRO	**FECHA:**	27/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de espera pacientes / familiares (1)	Conjunto lineal de asientos / mesitas	10	✓ 10	✓		
	Papelera para sala de espera	1	✓ 1	✓		
	Jardinera	2	X			
	Cuadro decoración pared	2	✓ 2	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	✓ 1	✓		
	Carro de historias clínicas	1	X			

OBSERVACIONES

10 Módulos de Recepción + 10 Sala de esperas pacientes y familiares con el siguiente equipamiento (cifras Totales)

- Conjunto de sillas modulares 273
- Mesas cuadradas 65x65 16
- Cuadro decoración pared 30
- Papeleras 9
- Soportes para póster de campaña 7

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

(1)

~~24 sillas~~

~~1 papelera~~

~~2 cuadros~~

~~1 expositor~~

~~2 mesas cuadradas 65x65~~

(2)

~~28 sillas~~

~~4 cuadros~~

~~1 expositor~~

~~1 mesa cuadrada 65x65~~

~~1 papelera~~

(3)

~~30 sillas~~

~~5 cuadros~~

~~1 papelera~~

~~1 expositor~~

(4)

~~27 sillas~~

~~5 cuadros~~

~~1 expositor~~

~~2 mesas cuadradas 65x65~~

~~1 expositor~~

~~1 papelera~~

(5)

~~27 sillas~~

~~3 mesas cuadradas 65x65~~

~~4 cuadros decoración~~

~~1 papelera~~

~~1 expositor~~

(6)

~~28 sillas~~

3 mesas cuadradas 65x65

~~6 cuadros~~

~~1 papelera~~

~~1 expositor~~

(7)

~~28 sillas~~

~~5 cuadros~~

~~2 mesas cuadradas 65x65~~

~~1 papelera~~

~~1 expositor~~

(8)

~~24 sillas~~

~~2 mesas 65x65~~

~~2 cuadros~~

~~1 papelera~~

(9)

~~36 sillas~~

~~1 mesa cuadrada 65x65~~

~~2 cuadros decoración~~

~~1 papelera~~

(10)

~~33 sillas~~

~~1 papelera~~

~~1 cuadro decoración~~

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTORA:	ELIA QUIROGA	FECHA:	1-12-12
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	13'00

~~[illegible]~~ CIRUGIA CX

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Consulta	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2	Cuerpos	
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	3	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
Salas de consulta con exploración (65) 04	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1		Sin	pedal	tapa
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

OFTALMOLOGÍA

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Consulta 07 Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	2	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2			
	Taburete giratorio con ruedas	1	2	✓		
	Litera de exploración	1	0	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

CIRUGÍA CX

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consult. 08.	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CX

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	3	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	Sin	pedal	
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
	OBSERVACIONES					

Consulta 02

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Elia Quiroga	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 07	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR: A	Elia QUIROGA	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ALBACETE

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 06	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ANUSKA	**FECHA:**	5.12.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 01 CX	Negatoscopio de tres cuerpos 2c	1	1	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	/		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	/		
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	/		
	Juego estándar de curas	2	1	/		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	/		
	Silla fija	2	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	/		
	Litera de exploración	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	/		
	Escabel	1	1	/		
	Cortinaje de exploración	1	1	/		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	/		
	Carro de curas con cajones	1	1	/		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	/		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Consultas CX.

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 3 CX	Negatoscopio de tres cuerpos 2.C	1	1	1		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	✓		
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	~~1~~	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	~~0~~	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	~~0~~	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1 ✓			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ANUSKA	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla fija	2	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (5) CX	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	3 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CIRUGÍA VASCULAR

NO existe

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala dopler vascular periférico (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Armario endoscopia	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
	Gavetas para material fungible	1				

OBSERVACIONES

~~Ahor~~ En la actualidad corresponde con la consulta 9 del área de Traumatología

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

- CIRUGÍA VASCULAR NO EXISTE EN ESTE HOSPITAL.

HFC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA GUIRADO A	**FECHA:**	1.12.2021
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

OFTALMOLOGÍA (7)

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala campimetría (1) Corresponde con la consulta 8 1	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 (cuerpos)		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1		sin cristal	
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	✓		
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	2	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	✓		
Sala láser oftalmológico (1) 2 Corresponde con consulta 1	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	3			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	1		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			
Sala angiografía (1)	Equipamiento técnico específico					
Sala refractometría (2)	Equipamiento técnico específico					
Sala refractometría (2)	Equipamiento técnico específico					

OBSERVACIONES

No hay sala 2 refractometría, esta en consulta 8

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

OFTALMOLOGÍA

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 02	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	✓			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	✓			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

OFTALMOLOGÍA

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) 03	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 (1 op)		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X		1	
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	2	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

OFTALMOLOGIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Consulta 04	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1			
	Dispensador de toallas de papel	1	1			
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
Salas de consulta con exploración (65)						

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

OPTALMOLOGIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 05	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1			
	Dispensador de toallas de papel	1	1			
	Silla fija	2	2			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X 1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	**FECHA:**	5.12.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	12:00

ANATOMÍA PATOLÓGICA

2ª ~~PLANTA~~ (~~laboratorio banco sangre~~)

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
PAAF (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1		✓	FOTO
	Escabel	1	1			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Papelera	1	1			
	Cubo de basura con pedal 12L SOL	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		

Punción aspiración con aguja fina.

OBSERVACIONES

→ Se encuentra en Hospital de día y se realiza en la Sala técnica

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HJC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	BRUSKA MARTÍN	**FECHA:**	1/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

OTORRINOLARINGOLOGÍA (12)

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (v / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas audiometría (3) Consulta (3) 070	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	—		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	—		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	—		
	Gavetas para material fungible	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			

OBSERVACIONES

- Dispensador alcohol-gel
- Sala con maquinaria especifica para pruebas audimetria.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

- SOLO HAY UNA SALA ESPECÍFICA DE AUDIOMETRÍA.
- EN VARIAS CONSULTAS HAY FICHAS ESPECÍFICAS DE EXPLORACIÓN

H 5C

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	BLUSKA MARTIN	**FECHA:** 1/12/2017	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

OTORRINOLARINGOLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas audiometría (3) Consulta 5	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Gavetas para material fungible	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

OTORRINOLARINGOLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
OTO Sala pruebas nasales. Consulta (9)	Negatoscopio de tres cuerpos 2 uds	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	2	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	~~Salas audiometría (3)~~ Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	✓		

OBSERVACIONES

- Silla de exploración eléctrica

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HJC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	DULUSKA MARTÍN	FECHA:	1/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de Exploraciones funcionales (2) Consulta 1 OTO	Negatoscopio de tres cuerpos Zoveno	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	✓		

OBSERVACIONES

- Silla exploración

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de Exploraciones funcionales (2) Consulta (2) OTO	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	/		
	Gavetas para material fungible	1	1	/		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			

OBSERVACIONES

- Camilla electrica

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HFC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	DULIOSKA MARTÍN	FECHA:	1/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 4 OTO	Negatoscopio de tres cuerpos Zaverp	1	1	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	/		
	Juego estándar de curas	2	1	/		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	/		
	Silla fija	2	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	11	//		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (6) OTO	Negatoscopio de tres cuerpos 2 uds	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1				
	Juego estándar de curas	8	X			
	Juego de bandejas	1	X			
ROTO	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla fija	2	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	1/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla fija	2	X	—		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	X	—		
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X	—		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

Consulta 25

FOTO

OTO

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (7) OTO	Negatoscopio de tres cuerpos 2 cuerpo	1	1	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	V			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	/		
	Juego estándar de curas	8	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla fija	2	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	/		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	8	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	/ /		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1 1	/ /		
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN		

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (8) OTO	Negatoscopio de tres cuerpos 2 cuerp.	1	1			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1			
	Juego estándar de curas	8	1			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1			
	Dispensador de toallas de papel	1	1			
	Silla fija	2	1			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1			
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1			

OBSERVACIONES

* Silla exploración

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

OTO

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 10 OTO	Negatoscopio de tres cuerpos 2 cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Oscilometro con brazal de pierna	1				
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1				
	Juego estándar de curas	~~3~~	1			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla fija	2				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	~~0~~	1			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC CONSULTAS (4) SALUD LABORAL

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

2ª Planta

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Consulta salud laboral (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	0	1	/		
	Reloj de pared con fecha	1	X			
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla fija	2	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	/	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	/		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	/		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			
Atención a domicilio (1) NO EXISTE ESTE SERVICIO	Negatoscopio de tres cuerpos					
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared					
	Báscula de pie con altímetro					
	Foco de exploración de pie					
	Juego de bandejas					
	Dispensador de jabón					
	Dispensador de toallas de papel					
	Silla fija					
	Silla giratoria con brazos y ruedas					
	Taburete giratorio con ruedas					
	Litera de exploración					
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera					
	Escabel					
	Cortinaje de exploración					
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas					
	Carro de curas con cajones					
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.					
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.					
	Cajonera colgante de dos cajones					
	Papelera					
	Cubo de basura con pedal 12L					
	Perchero mural múltiple (módulo)					
	Reloj de pared con fecha					
	Carro de historias clínicas					

OBSERVACIONES

- Consulta en planta 2.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

JMC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA CORDOBA / JOSE CARLOS G.	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

PRIMERA

PLANTA

PLAN DE EQUIPAMIENTOS - GABINETES TÉCNICOS

CARDIOLOGÍA (1)

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala monitorización Holter (1) Consulta C	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	4	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	3	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo) Gavetas para material fungible	1	X	X		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	GUA QUIROGA / DUNSKA MART	FECHA:	1/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala pruebas de esfuerzo + Test de tilt (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1		hay	móvil	
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	2	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	2	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	X			
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	tapa		oscilante
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
Ecocardiografía (2) consulta (2)	Negatoscopio de tres cuerpos 2 cuerp.	1	1	—		
	Esfigmomanómetro de merc urio de pared	1	1	—		
	Foco de exploración de pie	1	1	—		
	Dispensador de jabón	1	1	—		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	—		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	—		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	—		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	—		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	4	—		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	—		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	—		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	—		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	—		

OBSERVACIONES

→ Corresponde con la consulta 2

* → solo hay una sala de pruebas de esfuerzo

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

consulta 2, ecocardiografía
- 2 sillas fijas (Bueno)
- litera eléctrica

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala pruebas de esfuerzo + Test de tilt (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2				
	Reloj de pared con fecha	1				
	Carro de historias clínicas	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Ecocardiografía (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de merc urio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	BLANCA MARTÍN	**FECHA:**	1 / 12 / 2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
Sala pruebas de esfuerzo + Test de tilt (2) Consulta 7	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	3	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	3	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	X			
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X 1	✓		
Ecocardiografía (2) Consulta 3	Negatoscopio de tres cuerpos 2 cuerp.	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de merc urio de pared	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4?	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	✓		

OBSERVACIONES

Solo existe 1 sala de pruebas y 1 sala de Ecocardiograma.

(*) Consulta 7: camilla electrica.

- Cuba basura 12L. tapa oscilante (deteriorada)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala pruebas de esfuerzo + Test de tilt (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2				
	Reloj de pared con fecha	1				
	Carro de historias clínicas	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Ecocardiografía (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de merc urio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala electrocardiógrafo (3)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1				

OBSERVACIONES

Se realiza en consulta, habitualmente en la 1.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala electrocardiógrafo (3)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1				

OBSERVACIONES

NO HAY SALA ESPECÍFICA

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala electrocardiógrafo (3)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR		**RESPONSABLE INSTALACIÓN**	

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

01 CARDIOLOGIA

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	V		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	2	UNO	ROTO	1
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	1	V		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	V		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	V		
	Silla fija	2	1	V		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	V		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1	V		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	V		
	Escabel	1	1	V		
	Cortinaje de exploración	1	1	V		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	V		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	V		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	V		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.L.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) 07	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	2	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	2	✓		
	Escabel	1	2	✓		
	Cortinaje de exploración	1	3	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	3	✓		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) 02	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	1 2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1		Sin pedal		
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CARDIO

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) 03	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	√		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	√		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	1	√		
	Dispensador de jabón	1	1	√		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	√		
	Silla fija	2	2	√		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	√		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	√		
	Litera de exploración	1	1	√		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	√		
	Escabel	1	1	√		
	Cortinaje de exploración	1	1	√		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	√		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	√		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	√		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X	√		
	Papelera	1	1	√		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X	√		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

CARDIOLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 4	Negatoscopio de tres cuerpos	1	√ 1	√		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	√ 1	√		
	Oscilometro con brazal de pierna	1				
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3				
	Juego de bandejas	1	√ 1	√		
	Dispensador de jabón	1	√ 1	√		
	Dispensador de toallas de papel	1	√ 1	√		
	Silla fija	2	2 √	√		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1 √	√		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1 √	√		
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	√		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	√		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	√		
	Carro de curas con cajones	1	1	√		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	√		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	√		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	√		
	Papelera	1	1	√		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	√		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

CARDIOCOR

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consultas	Negatoscopio de tres cuerpos	1	✓ 1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	✓ 1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	✗ 1	✗		
	Báscula de pie con altímetro	1	✓ 1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	✗			
	Juego estándar de curas	3	✗			
	Juego de bandejas	1	✗			
	Dispensador de jabón	1	✓ 1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	✓ 1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	✗	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	✓ 1	✓		
	Papelera	1	✓ 1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	✗			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

CARDIOLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	3	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

CARDIOLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 8	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1		X (Puerta cristal)	
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR		**RESPONSABLE INSTALACIÓN**	

HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL. PLANTA 1ª A

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ANÚSKA MARTÍN	FECHA:	23/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A101

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
FOTO	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
FOTO	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	✓	✓		
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	X			
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Sofá-cama 2 m.	1	✓			
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	✓			
Habitación doble / uso individual (130)	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	X	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X	X		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	X		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR/A:	ANÚSKA MARTÍN	FECHA:	22/11/2014
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A 102

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	√	√		
foto	Juego de barandillas para cama clínica	1	√		√	
	Colchón de látex para cama clínica	1	√			
	Almohada para cama clínica	1	√			
	Portasueros rodado	1	x			
	Porta-sueros para cama clínica	1	x			
	Caudalímetro de oxígeno	1	x			
	Regulador de vacío	1	x			
	Esfigmomanómetro de pared	1	x			
	Soporte de termómetro	1	x			
	Mesita de noche clínica	1	x			
	Mesa cigüeña para comer	1	x			
	Sofá-cama 2 m.	1	x			
	Butaca paciente/acompañante	1	x			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	x			
	Silla fija	1	x			
	Cuadro decoración pared	1	√	√		
Habitación doble / uso individual (130)	Colgador para ropero	4	x			
	Papelera metálica	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	x			
	Sujeta toallas de ducha	1	√	√		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	x			
	Palangana de aseo metálica	1	x			
	Botella	1	x			
	Escobilla WC	1	√	√		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	√	√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	√	√		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	x			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	√	√		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	√	√		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	BALDSKA MARTÍN	FECHA:	23/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A 103

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓			
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓			
	Almohada para cama clínica	1	✓			
	Portasueros rodado	1	✓			
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓			
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓			
	Regulador de vacío	1	✓			
	Esfigmomanómetro de pared	1	✓			
	Soporte de termómetro	1	✓			
	Mesita de noche clínica	1	✓			
	Mesa cigüeña para comer	1	✓			
	Sofá-cama 2 m.	1	✓			
	Butaca paciente/acompañante	1	✓			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓			
	Silla fija	1	✓			
	Cuadro decoración pared	1	✓	✓		
	Colgador para ropero	4	✓			
	Papelera metálica	1	✓			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓			
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	✓			
	Palangana de aseo metálica	1	✓			
	Botella	1	✓			
	Escobilla WC	1	✓			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	✓			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ANDREA MARTÍN	FECHA:	23/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A 104

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (v / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓			
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓			
	Almohada para cama clínica	1	✓			
	Portasueros rodado	1	✓			
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓			
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓			
	Regulador de vacío	1	✓			
	Esfigmomanómetro de pared	1	✓			
	Soporte de termómetro	1	✓			
	Mesita de noche clínica	1	✓			
	Mesa cigüeña para comer	1	✓			
	Sofá-cama 2 m.	1	✓			
	Butaca paciente/acompañante	1	✓			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓			
	Silla fija	1	✓			
	Cuadro decoración pared	1	✓	✓		
	Colgador para ropero	4	✓			
	Papelera metálica	1	✓			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	✓			
	Palangana de aseo metálica	1	✓			
	Botella	1	✓			
	Escobilla WC	1	✓			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	23.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A 105

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A-106

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ANIUSKA MADZINI	FECHA:	23/11/2012
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A 107

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (v / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓			
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓			
	Almohada para cama clínica	1	✓			
	Portasueros rodado	1	✓			
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓			
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓			
	Regulador de vacío	1	✓			
	Esfigmomanómetro de pared	1	✓			
	Soporte de termómetro	1	✓			
	Mesita de noche clínica	1	✓			
	Mesa cigüeña para comer	1	✓			
	Sofá-cama 2 m.	1	✓			
	Butaca paciente/acompañante	1	✓			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓			
	Silla fija	1	✓			
	Cuadro decoración pared	1	✓	✓		
	Colgador para ropero	4	✓			
	Papelera metálica	1	✓			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓			
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	✓			
	Palangana de aseo metálica	1	✓			
	Botella	1	✓			
	Escobilla WC	1	✓			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	✓			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTORA:	DULCE MARTÍN	FECHA:	03/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A102

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	√			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	√			
	Colchón de látex para cama clínica	1	√			
	Almohada para cama clínica	1	√			
	Portasueros rodado	1	√			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	√			
	Regulador de vacío	1	√			
	Esfigmomanómetro de pared	1	√			
	Soporte de termómetro	1	√			
	Mesita de noche clínica	1	√			
	Mesa cigüeña para comer	1	√			
	Sofá-cama 2 m.	1	√			
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	√			
	Cuadro decoración pared	1	√	√		
	Colgador para ropero	4	√			
	Papelera metálica	1	√			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	√			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	X			
	Sujeta toallas de ducha	1	√	√		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	√	√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	√	√		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	√	√		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	√	√		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	[illegible]	FECHA:	[illegible]
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A. 109

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	X			
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Sofá-cama 2 m.	1	X			
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	1	√	√	
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	√		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	√		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	√		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	√		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	√		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A-110

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1	✓	✓		
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	X			
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A 111

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓			✓
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓			
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓			
	Almohada para cama clínica	1	✓			
	Portasueros rodado	1	✓			
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓			
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓			
	Regulador de vacío	1	✓			
	Esfigmomanómetro de pared	1	✓			
	Soporte de termómetro	1	✓			
	Mesita de noche clínica	1	✓			
	Mesa cigüeña para comer	1	✓			
	Sofá-cama 2 m.	1	✓			
	Butaca paciente/acompañante	1	✓			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓			
	Silla fija	1	✓			
	Cuadro decoración pared	1	✓	✓		
	Colgador para ropero	4	✓			
	Papelera metálica	1	✓			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	✓			
	Palangana de aseo metálica	1	✓			
	Botella	1	✓			
	Escobilla WC	1	✓			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	✓			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ANIUSKA MARTIN	**FECHA:**	23/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

A 112

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓			
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓			
	Almohada para cama clínica	1	✓			
	Portasueros rodado	1	✓			
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓			
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓			
	Regulador de vacío	1	✓			
	Esfigmomanómetro de pared	1	✓			
	Soporte de termómetro	1	✓			
	Mesita de noche clínica	1	✓			
	Mesa cigüeña para comer	1	✓			
	Sofá-cama 2 m.	1	✓			
	Butaca paciente/acompañante	1	✓			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓			
	Silla fija	1	✓			
	Cuadro decoración pared	1	✓	✓		
	Colgador para ropero	4	✓			
	Papelera metálica	1	✓			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	✓			
	Palangana de aseo metálica	1	✓			
	Botella	1	✓			
	Escobilla WC	1	✓			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓			
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	✓			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR/A	ANIUSKA MARTÍN	FECHA:	23/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A 1/3

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	V			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	V			
	Colchón de látex para cama clínica	1	V			
	Almohada para cama clínica	1	V			
	Portasueros rodado	1	V			
	Porta-sueros para cama clínica	1	V			
	Caudalímetro de oxígeno	1	V			
	Regulador de vacío	1	V			
	Esfigmomanómetro de pared	1	V			
	Soporte de termómetro	1	V			
	Mesita de noche clínica	1	V			
	Mesa cigüeña para comer	1	V			
	Sofá-cama 2 m.	1	V			
	Butaca paciente/acompañante	1	V			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	V			
	Silla fija	1	V	V		
	Cuadro decoración pared	1	V	V		
	Colgador para ropero	4	V			
	Papelera metálica	1	V			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	V			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	V	V		
	Sujeta toallas de ducha	1	V			
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	V			
	Palangana de aseo metálica	1	V			
	Botella	1	V			
	Escobilla WC	1	V			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	V	V		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	V	V		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	V			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	V	V		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	V	V		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A 114

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1				
	Soporte de termómetro	1				
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1				
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1				
	Colgador para ropero	4				
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	23.10.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	CECILIA	HORA:	

MAS; : [illegible] ALLS: FOTO A TODO

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	X			
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	2			✓
	Mesa cigüeña para comer	1	2			✓
	Sofá-cama 2 m.	1	X			
	Butaca paciente/acompañante	1	1			✓
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	1			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

- Camilla
- Cornito
- 2 acople cama
- Dispensador

- 1 Camilla
- 1 Cornito
- 2 acople cama
- Dispensador de material

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	22.10.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:	CECILIA	HORA:	

MABI: [illegible] A116 roto Mesa rota

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓			
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓			
	Almohada para cama clínica	1	✓			
	Portasueros rodado	1	✓			
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓			
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓			
	Regulador de vacío	1	✓			
	Esfigmomanómetro de pared	1	✓			
	Soporte de termómetro	1	✓			
	Mesita de noche clínica	1	1		ROTA	✓
	Mesa cigüeña para comer	1	1		✓	
	Sofá-cama 2 m.	1	✓			
	Butaca paciente/acompañante	1	✓			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓			
	Silla fija	1	✓			
	Cuadro decoración pared	1	1			
	Colgador para ropero	4	✓			
	Papelera metálica	1	✓			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1 4	√		√	
	Juego de barandillas para cama clínica	1 4	√		2 √	2 √
	Colchón de látex para cama clínica	1 4	√		2 √	2 √
	Almohada para cama clínica	1	√			
	Portasueros rodado	1	√			
	Porta-sueros para cama clínica	1	√			
	Caudalímetro de oxígeno	1	√			
	Regulador de vacío	1	√			
	Esfigmomanómetro de pared	1	√			
	Soporte de termómetro	1	√			
	Mesita de noche clínica	1	√			
	Mesa cigüeña para comer	1	√			
	Sofá-cama 2 m.	1	√			
	Butaca paciente/acompañante	1	√			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	√			
	Silla fija	1	√			
	Cuadro decoración pared	1	√			
	Colgador para ropero	4	√			
	Papelera metálica	1	√			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	√			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	√			
	Sujeta toallas de ducha	1	√			
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	√			
	Palangana de aseo metálica	1	√			
	Botella	1	√			
	Escobilla WC	1	√			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	√			
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	√			
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	√			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	√			
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	√			

OBSERVACIONES

4 camas rotas
4 colchones
Techo entrada desmontado

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

A-117

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	EVA QUIROGA	FECHA:	23.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A-118. Fotos cama.

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	4		✓	
	Juego de barandillas para cama clínica	1	4		✓	
	Colchón de látex para cama clínica	1	5			✓
	Almohada para cama clínica	1	0			
	Portasueros rodado	1	✓			
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓			
	Caudalímetro de oxígeno	1	X			
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Sofá-cama 2 m.	1	X			
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	1	✓		
	Colgador para ropero	4	0	✓		
	Papelera metálica	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parra	FECHA:	23-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A119

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	4			X
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1			X
	Colchón de látex para cama clínica	1	1			X
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	2			X
	Caudalímetro de oxígeno	1	X			
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Sofá-cama 2 m.	1	X			
	Butaca paciente/acompañante	1	2	✓		
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	1	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	X			
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Farais	FECHA:	23-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A120

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1			✓
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1			✓
	Colchón de látex para cama clínica	1	1			✓
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	1			✓
	Caudalímetro de oxígeno	1	X			
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Sofá-cama 2 m.	1	X			
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	1	✓		
	Colgador para ropero	4	4			
	Papelera metálica	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	X			
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso	FECHA:	23-11-19
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A12

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓			✓
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓			✓
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓			✓
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	X			
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Sofá-cama 2 m.	1	X			
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	✓	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso	FECHA:	23-1-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A122

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X Falta			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	X			
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Sofá-cama 2 m.	1	X			
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	✓	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parreño	FECHA:	23-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A123

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	* Foto			✓
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	X			
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Sofá-cama 2 m.	1	X			
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	1	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Fariña	FECHA:	23-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A124

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	X			
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Sofá-cama 2 m.	1	X			
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	1		X (3+1)	
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	X			
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Barajas	FECHA:	27-11-19
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A125

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	X			
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Sofá-cama 2 m.	1	X			
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	1	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	X			
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1			
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parreño	FECHA:	23-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A126

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	X			
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Sofá-cama 2 m.	1	X			
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	1	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	X			
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR		**RESPONSABLE INSTALACIÓN**	

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso	FECHA:	23-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A127

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	x			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	x			
	Colchón de látex para cama clínica	1	x			
	Almohada para cama clínica	1	x			
	Portasueros rodado	1	x			
	Porta-sueros para cama clínica	1	x			
	Caudalímetro de oxígeno	1	x			
	Regulador de vacío	1	x			
	Esfigmomanómetro de pared	1	x			
	Soporte de termómetro	1	x			
	Mesita de noche clínica	1	x			
	Mesa cigüeña para comer	1	x			
	Sofá-cama 2 m.	1	x			
	Butaca paciente/acompañante	1	x			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	x			
	Silla fija	1	x			
	Cuadro decoración pared	1	1	✓		
	Colgador para ropero	4	x			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	x			
	Palangana de aseo metálica	1	x			
	Botella	1	x			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	x			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Peraza	FECHA:	23-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A128

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	√			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	√			
	Colchón de látex para cama clínica	1	√			
	Almohada para cama clínica	1	√			
	Portasueros rodado	1	√			
	Porta-sueros para cama clínica	1	√			
	Caudalímetro de oxígeno	1	√			
	Regulador de vacío	1	√			
	Esfigmomanómetro de pared	1	√			
	Soporte de termómetro	1	√			
	Mesita de noche clínica	1	√			
	Mesa cigüeña para comer	1	√			
	Sofá-cama 2 m.	1	√			
	Butaca paciente/acompañante	1	√			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	√			
	Silla fija	1	√			
	Cuadro decoración pared	1	1	✓		
	Colgador para ropero	4	√			
	Papelera metálica	1	√			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	√			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	√			
	Palangana de aseo metálica	1	√			
	Botella	1	√			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	√			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parajo	FECHA:	23-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A129

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	x			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	x (falta 1 barandilla)			
	Colchón de látex para cama clínica	1	x			
	Almohada para cama clínica	1	x			
	Portasueros rodado	1	x			
	Porta-sueros para cama clínica	1	x			
	Caudalímetro de oxígeno	1	x			
	Regulador de vacío	1	x			
	Esfigmomanómetro de pared	1	x			
	Soporte de termómetro	1	x			
	Mesita de noche clínica	1	x			
	Mesa cigüeña para comer	1	x			
	Sofá-cama 2 m.	1	x			
	Butaca paciente/acompañante	1	x			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	x			
	Silla fija	1	x			
	Cuadro decoración pared	1	x			
	Colgador para ropero	4	x			
	Papelera metálica	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	x			
	Palangana de aseo metálica	1	x			
	Botella	1	x			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	x			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso Bandera	FECHA:	23-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

A130

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	1			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	1			
	Colchón de látex para cama clínica	1	1			
	Almohada para cama clínica	1	x			
	Portasueros rodado	1	x			
	Porta-sueros para cama clínica	1	x			
	Caudalímetro de oxígeno	1	x			
	Regulador de vacío	1	x			
	Esfigmomanómetro de pared	1	x			
	Soporte de termómetro	1	x			
	Mesita de noche clínica	1	x			
	Mesa cigüeña para comer	1	x			
	Sofá-cama 2 m.	1	x			
	Butaca paciente/acompañante	1	x			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	x			
	Silla fija	1	x			
	Cuadro decoración pared	1	x			
	Colgador para ropero	4	3 1	✓		
	Papelera metálica	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	x			
	Palangana de aseo metálica	1	x			
	Botella	1	x			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	x			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

H.I.

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:	ELIA DOLORES	COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	30.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	10:00

FOTO

UCI

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (20) Box 08 Aisla Cor	Cama especial UCI con accesorios	1	X			
	Colchón de cama especial UCI	1	X			
	Almohada	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete con ruedas	1	X			
	Reloj calendario	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cuña con soporte	1	X			
	Aseos de la habitación (SE SUPONE QUE LLEVAN LO MISMO QUE UNA CONVENCIONAL)					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	X			
	Sujeta toallas de ducha	1	X			
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1		V		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	X			
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	X			
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	V			

OBSERVACIONES

TOTAL Total 9 camas.
= 8 Gavetas xa fungibles con pegatas fijas
- 8 mesa + cigüeñal comida
- 8 camas cuna con cojones

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

→ Box. Vacío. Fono.

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

UCI

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (20)	Cama especial UCI con accesorios	1				
	Colchón de cama especial UCI	1				
	Almohada	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Taburete con ruedas	1				
	Reloj calendario	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cuña con soporte	1				
	Aseos de la habitación (SE SUPONE QUE LLEVAN LO MISMO QUE UNA CONVENCIONAL)					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

El Box 07 de aislados es actualmente la esclusa para familiares:

- 8 butacas para acompañantes
- microondas
- papelera
- mesa: 3m - 0'4 m
- 9 taquillas

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HJC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

UCI

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (20) Box 13	Cama especial UCI con accesorios	1				
	Colchón de cama especial UCI	1				
	Almohada	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Taburete con ruedas	1				
	Reloj calendario	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cuña con soporte	1				
	Aseos de la habitación (SE SUPONE QUE LLEVAN LO MISMO QUE UNA CONVENCIONAL)					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

VACÍO, UNA CAMILLA.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

UCI

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (20) BOX 14	Cama especial UCI con accesorios	1	X			
	Colchón de cama especial UCI	1				
	Almohada	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Taburete con ruedas	1				
	Reloj calendario	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cuña con soporte	1				
	Aseos de la habitación (SE SUPONE QUE LLEVAN LO MISMO QUE UNA CONVENCIONAL)					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	X			
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

SOLO TIENEN BAÑO LOS BOXES DE AISLAMIENTO.

BOX 1: VACÍO

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HFC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Elia Quiroga	FECHA:	30.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

UCI

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (20) BOX 10	Cama especial UCI con accesorios	1	1	✓		
	Colchón de cama especial UCI	1	1	✓		
	Almohada	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Taburete con ruedas	1	X			
	Reloj calendario	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cuña con soporte	1	X			
	Aseos de la habitación (SE SUPONE QUE LLEVAN LO MISMO QUE UNA CONVENCIONAL)					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1			NO BAÑO	
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

- Gaveta xa fungibles con poyetas (elemento fijo)
- carro de curas
- pizarra
- 2 cubos de basura 50l. con tapa
- Dispensador alcohol-Gel

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

UCI

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (20)	Cama especial UCI con accesorios	1				
	Colchón de cama especial UCI	1				
	Almohada	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Taburete con ruedas	1				
	Reloj calendario	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cuña con soporte	1				
	Aseos de la habitación (SE SUPONE QUE LLEVAN LO MISMO QUE UNA CONVENCIONAL)					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

Bot 11

OBSERVACIONES

VACÍO

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HSC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELVIRA QUIROGA / JUAN CARLOS	FECHA:	20.1.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	10'00

PRIMERA PLANTA

10/07

UCI

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (20)	Cama especial UCI con accesorios	1	1	✓		
	Colchón de cama especial UCI	1	1	✓		
	Almohada	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Taburete con ruedas	1	1	✓		
	Reloj calendario	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cuña con soporte	1	1	✓		
	Aseos de la habitación (SE SUPONE QUE LLEVAN LO MISMO QUE UNA CONVENCIONAL)					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

Bo x 07

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

UCI

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (20) Box 01 Aislado	Cama especial UCI con accesorios	1	X			
	Colchón de cama especial UCI	1	X			
	Almohada	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete con ruedas	1	X			
	Reloj calendario	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cuña con soporte	1	X			
	Aseos de la habitación (SE SUPONE QUE LLEVAN LO MISMO QUE UNA CONVENCIONAL)					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR	**RESPONSABLE INSTALACIÓN**		

Foto 1

HJC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

UCI

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (20) Box 07 Aislado	Cama especial UCI con accesorios	1	X			
	Colchón de cama especial UCI	1	X			
	Almohada	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete con ruedas	1	X			
	Reloj calendario	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cuña con soporte	1	X			
	Aseos de la habitación (SE SUPONE QUE LLEVAN LO MISMO QUE UNA CONVENCIONAL)					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR		**RESPONSABLE INSTALACIÓN**	

FOTO 2

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

UCI

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (20) Box 01	Cama especial UCI con accesorios	1	X			
	Colchón de cama especial UCI	1	X			
	Almohada	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete con ruedas	1	X			
	Reloj calendario	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cuña con soporte	1	X			
	Aseos de la habitación (SE SUPONE QUE LLEVAN LO MISMO QUE UNA CONVENCIONAL)					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR		**RESPONSABLE INSTALACIÓN**	

Foto

HJC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

UCI

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (20) Box 02	Cama especial UCI con accesorios	1	X			
	Colchón de cama especial UCI	1	X			
	Almohada	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete con ruedas	1	X			
	Reloj calendario	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cuña con soporte	1	X			
	Aseos de la habitación (SE SUPONE QUE LLEVAN LO MISMO QUE UNA CONVENCIONAL)					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR		**RESPONSABLE INSTALACIÓN**	

Foco

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

UCI

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (20) Box 12	Cama especial UCI con accesorios	1	X			
	Colchón de cama especial UCI	1	X			
	Almohada	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete con ruedas	1	X			
	Reloj calendario	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cuña con soporte	1	X			
	Aseos de la habitación (SE SUPONE QUE LLEVAN LO MISMO QUE UNA CONVENCIONAL)					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR		**RESPONSABLE INSTALACIÓN**	

Foto

H.5

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

UCI

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (20) Box 08	Cama especial UCI con accesorios	1	✓ 1	✓		
	Colchón de cama especial UCI	1	✓ 1	✓		
	Almohada	1	✓ 1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	✓ 1	✓		
	Taburete con ruedas	1	✓ 1	✓		
	Reloj calendario	1	✓ 1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cuña con soporte	1	✓ 1	✓		
	Aseos de la habitación (SE SUPONE QUE LLEVAN LO MISMO QUE UNA CONVENCIONAL)					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR	**RESPONSABLE INSTALACIÓN**		

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

UCI

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (20) Box 06	Cama especial UCI con accesorios	1	1	✓		
	Colchón de cama especial UCI	1	1	✓		
	Almohada	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Taburete con ruedas	1	1	✓		
	Reloj calendario	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cuña con soporte	1	1			
	Aseos de la habitación (SE SUPONE QUE LLEVAN LO MISMO QUE UNA CONVENCIONAL)					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR	**RESPONSABLE INSTALACIÓN**		

H.F.C

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

UCI

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (20) Box 03	Cama especial UCI con accesorios	1	1	✓		
	Colchón de cama especial UCI	1	1	✓		
	Almohada	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Taburete con ruedas	1	1	✓		
	Reloj calendario	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cuña con soporte	1	1	✓		
	Aseos de la habitación (SE SUPONE QUE LLEVAN LO MISMO QUE UNA CONVENCIONAL)					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR		**RESPONSABLE INSTALACIÓN**	

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

UCI

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (20) Box 05	Cama especial UCI con accesorios	1	1	✓		
	Colchón de cama especial UCI	1	1	✓		
	Almohada	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Taburete con ruedas	1	1	✓		
	Reloj calendario	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cuña con soporte	1	1	✓		
	Aseos de la habitación (SE SUPONE QUE LLEVAN LO MISMO QUE UNA CONVENCIONAL)					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR	**RESPONSABLE INSTALACIÓN**		

H5C

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

UCI

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (20) Box 03 Aislado	Cama especial UCI con accesorios	1	1	✓		
	Colchón de cama especial UCI	1	1	✓		
	Almohada	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete con ruedas	1	X			
	Reloj calendario	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cuña con soporte	1	X			
	Aseos de la habitación (SE SUPONE QUE LLEVAN LO MISMO QUE UNA CONVENCIONAL)					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES Habitación o Box 03 Aislado no es operativa. Almacenan material médico y no médico. Adjunto foto

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

FOTO

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

UCI

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (20) Box 04 Aislado	Cama especial UCI con accesorios	1	X			
	Colchón de cama especial UCI	1	X			
	Almohada	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete con ruedas	1	X			
	Reloj calendario	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cuña con soporte	1	X			
	Aseos de la habitación (SE SUPONE QUE LLEVAN LO MISMO QUE UNA CONVENCIONAL)					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES Box 04 Aislado no está operativo. ~~Mobi~~ Butacas ~~reclinables~~ reclinables (4) Adjunto foto.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HPC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

UCI

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (20) Box 05 Aislado	Cama especial UCI con accesorios	1	X			
	Colchón de cama especial UCI	1	X			✓
	Almohada	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete con ruedas	1	X			
	Reloj calendario	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cuña con soporte	1	X			
	Aseos de la habitación (SE SUPONE QUE LLEVAN LO MISMO QUE UNA CONVENCIONAL)					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES Box 05 Aislado no está operativo. Se utiliza como almacén de material clínico y no clínico. Adjunto foto (2 colchones cama especial UCI deteriorados)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

UCI

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (20) Box 06 Aislado	Cama especial UCI con accesorios	1	X			
	Colchón de cama especial UCI	1	X			
	Almohada	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Taburete con ruedas	1	X			
	Reloj calendario	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cuña con soporte	1	X			
	Aseos de la habitación (SE SUPONE QUE LLEVAN LO MISMO QUE UNA CONVENCIONAL)					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1				
	Palangana de aseo metálica	1				
	Botella	1				
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1				
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

Es utilizado como cuarto de oficio y cuenta con el siguiente material:

1 ARMARIO
4 SILLAS FIJAS
1 MESA NO de REUNIONES
1 PAPELERA
1 PIZARRA de ROTULADOR de PARED
2 NEVERAS
1 MICROONDAS

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

MJ C

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	10:20

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Puesto control enfermería (2)	Reloj de pared con fecha	1	~~X~~ 1	✓		(sin fecha)
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	2	X			
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	3	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Planning para tarjetas	1	X			
	Plafón de avisos	1	X			
	"Tablilla" de Historia Clínica	30	X			
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	X			
	Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	1	1	✓		
Zona limpia (2)	Dispensador de jabón	1	1		✓	
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Taburete fijo de 60 cm.	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Papelera con tapa basculante de 25L	1	X			
	Frigorífico 300L	1	X			
	Carro de curas con cajones Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
Zona Intermedia (2)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Taburete fijo de 60 cm.	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Papelera con tapa basculante de 25L Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Zona Sucia (2)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1				
	Carro de transporte de ropa sucia	2				
	Taburete fijo de 60 cm. Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Almacén de medicamentos (2)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	1				
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	5				
Zona de trabajo personal (2)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	8				
	Papelera	1				
	Planning para tarjetas	2				
	Plafón de avisos	1				
	"Tablilla" de Historia Clínica	1				
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1				

SIN LOCALIZAR

SOLO HAY 1

OBSERVACIONES

* 1º Puesto de control desde la entrada comercial, actualmente en desuso.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de procedimientos especiales (1) 30	Reloj de pared con fecha	1	X			
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	2	2	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	X 1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Planning para tarjetas	1	X			
	Plafón de avisos	1	X			
	"Tablilla" de Historia Clínica	30	X			
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	X			
	Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	1	X			
Aseos pacientes (2)	El descrito para aseos de público	1	X	X		
	Barra soporte lateral pared	1	X	X		
Habitación médico de guardia (2) 31	Cama individual 1	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Silla fija con brazos 1	1	1	✓		
	Mesita de noche 1	1	1	✓		
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm.	1	1	✓		
	Luz para mesita de noche 1	1	1	✓		
	Papelera 1	1	1	✓		
Zona polivalente de personal (1) 33	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Silla fija con brazos	8				
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1				
	Papelera	1				
	Perchero de pie	1				
	Pizarra para rotulador de pared	1				
	Nevera de 150 L.	1				
	Cafetera eléctrica	1				
	Horno microondas empotrado	1				

OBSERVACIONES

en la
* Sala de Procedimientos especiales, también hay { 2 carros de curas, Cajetas fungibles

* Aseos de pacientes no tienen

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HJE

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Elia Quiroga	FECHA:	30/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	11:15

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de procedimientos especiales (1)	Reloj de pared con fecha	1				
	Carro de historias clínicas	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	2				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Papelera	1				
	Planning para tarjetas	1				
	Plafón de avisos	1				
	"Tablilla" de Historia Clínica	30				
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1				
	Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	1				
Aseos pacientes (2)	El descrito para aseos de público	1	NO	HAY	EN	UCI
	Barra soporte lateral pared	1				
Habitación médico de guardia (2) 32	Cama individual 1	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Silla fija con brazos 1	1	3	✓		
	Mesita de noche 1	1	1	✓		
	Armario guardaropa 200 x 80 x 40 cm.	1	1	✓		
	Luz para mesita de noche 1	1	1	✓		
	Papelera 1	1	1	✓		
Zona polivalente de personal (1) 33	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Silla fija con brazos	8				
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1				
	Papelera	1				
	Perchero de pie	1				
	Pizarra para rotulador de pared	1				
	Nevera de 150 L.	1				
	Cafetera eléctrica	1				
	Horno microondas empotrado	1				

↳ actualmente es [illegible]

OBSERVACIONES

- 6 portadores de suero / goteo
- 11 estanterías con 8 estante

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COO. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Puesto control enfermería (2) 24	Reloj de pared con fecha	1	1			
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	2	5	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	3	✓		
	Papelera	1	3	✓		
	Planning para tarjetas	1	X			
	Plafón de avisos	1	1	✓		
	"Tablilla" de Historia Clínica	30	X			
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	X			
	Mostrador en obra (Equipamiento fijo)	1	2	✓		
Zona limpia (2) FOTO 26	Dispensador de jabón	1	1			
	Dispensador de toallas de papel	1	1			X
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	2	✓		
	Taburete fijo de 60 cm.	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Papelera con tapa basculante de 25L	1	1 Con tapa			
	Frigorífico 300L	1	1	✓		
	Carro de curas con cajones Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		
Zona Intermedia (2)	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Taburete fijo de 60 cm.	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Papelera con tapa basculante de 25L Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Zona Sucia (2) 28	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Cubo de basura con tapa basculante de 50L	1	X			
	Carro de transporte de ropa sucia	2	1	✓		
	Taburete fijo de 60 cm. Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X	✓		
Almacén de medicamentos (2) 27	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	1	8	✓		
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	5	20	✓		
Zona de trabajo personal (2) 29	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	3	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	8	3	✓		
	Papelera	1	3	✓		
	Planning para tarjetas	2	X			
	Plafón de avisos	1	2	✓		
	"Tablilla" de Historia Clínica	1	X			
	Torre de dispensación de documentos de 15 huecos	1	X			

OBSERVACIONES

Hay 2 taburetes giratorios

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HJC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Oficio (1) 34	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Armario oficio colgado 80 x 90 x 35 cm.	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Papelera con tapa basculante de 25L	1	X			
	Frigorífico 80L	1	X			
	Microondas de 20-25L Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
Almacén de material general (1) 3	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes *1	4	X			
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 mm.	20	X			
Almacén de lencería (1)	Carro de lencería	1	1	✓		
Almacén de equipamientos (1) *2	Portasuero doble con ruedas	5				
	Camilla de transporte	2				
	Escalera con cinco peldaños y pies aislantes	1				
	Estantería metálica 5/6 niveles ML	4				
Taller de Calibración (1)	Equipamiento técnico específico	1	1	✓		
Sala de reuniones (1) 36	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	X	X		
	Silla fija con brazos	8	13	✓		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Perchero de pie	1	X	✓		
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	✓		
Zona trabajo administrativo (1) SECRETARÍA 32	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	1	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Plafón de corcho	1	2	✓		
	Papelera	1	2	✓		
	Fotocopiadora *1	1	X	X		
Despacho de supervisión (1) 38	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Silla fija	2	3	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm. Con estantería y archivador	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		

OBSERVACIONES

*4 estanterías con 5 estantes y una con 4 estantes

*1 No tienen fotocopiadora sino IMPRESORA

*2 El Almacén de equipamientos es actualmente una consulta para pacientes crónicos complejos.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Actualmente esta sala se comunica con el despacho del facultativo, inventariado aquí.

VCT 19 junio

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	9:45
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho responsable facultativo (1) 39	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija	2				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Papelera	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Perchero de pie	1				
Zona de utensilios de limpieza (1)	Carro de limpieza	1				
	Estantería de pared de 3 estantes	1				
Esclusa de familiares (1) 40	Banco de vestidor	1				
	Papelera con tapa basculante de 50L	5				
	Colgador mural múltiple (módulo)	2				
Vestuarios personal (2) ♂	Carro de transporte de ropa sucia	2	X			
	Banco de vestidor	4	1	✓		
	Armario ropero modular	25	17	✓		
	Colgador para ropero	75	X			
	Papelera con tapa basculante de 50L	2	1	✓		
	Colgador mural múltiple	4	2	✓		
Aseos Personal (2) ♂ 41	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X	Secamanos		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Sala de espera familiares (2) 42	Sillas modulares	20	EP sillas	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm. 90x60	4	1	✓		
	Cuadro decoración pared	6	2	✓		
	Jardinera	1	X			
	Soporte para posters de campañas	1	1	✓		
	Expositor de folletos	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1	X			
Espacio privado familias (1)	Sillas modulares	15				
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	1				
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1				
	Cuadro decoración pared	2				
	Jardinera	1				
	Papelera	1				
Aseos ~~públicos~~ personal (2)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	✓		
	Secamanos eléctrico	1	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Despacho de información (1) 43	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	✓			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	3	✓		
	Silla fija con brazos	2	X			
	Papelera	1	1	✓		

OBSERVACIONES

→ hay dispensador de toallas papel

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELVA 00120651	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho responsable facultativo (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija	2				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Papelera	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Perchero de pie	1				
Zona de utensilios de limpieza (1)	Carro de limpieza	1				
	Estantería de pared de 3 estantes	1				
Esclusa de familiares (1)	Banco de vestidor	1				
	Papelera con tapa basculante de 50L	5				
	Colgador mural múltiple (módulo)	2				
Vestuarios personal (2) ♀	Carro de transporte de ropa sucia	2				
	Banco de vestidor	4				
	Armario ropero modular	25				
	Colgador para ropero	75				
	Papelera con tapa basculante de 50L	2				
	Colgador mural múltiple	4				
Aseos Personal (2) ♀ 41	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
Sala de espera familiares (2)	Sillas modulares	20				
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	4				
	Cuadro decoración pared	6				
	Jardinera	1				
	Soporte para posters de campañas	1				
	Expositor de folletos	1				
	Papelera	1				
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1				
Espacio privado familias (1)	Sillas modulares	15				
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	1				
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1				
	Cuadro decoración pared	2				
	Jardinera	1				
	Papelera	1				
Aseos públicos (2) Personal	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
Despacho de información (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija con brazos	2				
	Papelera	1				

OBSERVACIONES

→ No hay dispensador de toallas papel

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

ZONAS DE APOYO DENTRO DE CONSULTAS

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR: A	ELIA QUIROGA	FECHA:	1.12.2019
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	16:30

ZONA CONSULTAS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado Bueno	Estado Roto	Estado Deteriorado
Despacho de supervisión (2)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Silla fija	2	X 1 butaca			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1			
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm. Con estantería y archivador	1	X			
	Papelera	1	X			
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	X			
	Perchero de pie	1	X			
Zona polivalente de personal (2)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	8	X *			
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	X			
	Nevera de 150 L.	1	1	✓		
	Cafetera eléctrica	1	1	✓		
	Horno microondas empotrado	1	1	✓	no esta empotrado	
Sala de reuniones (2)	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	8	1 *	2 banco	de restuario	
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	X			
	Papelera	1	X			
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	✓		
Zona trabajo administrativo (2)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Silla fija	2				
	Plafón de corcho	1				
	Papelera	1				
	Fotocopiadora	1				

OBSERVACIONES

* 3 butacas
2 sillas fijas

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Elu	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA APOYO CONSULTAS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Almacén general (1)	Estantería metálica 5/6 niveles ML	5	5	✓		
	Escalera con tres peldaños y pies aislantes	1	X	X		
Aseos personal (2) ♀	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	2	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1		✓	fixador, jud ♂
	Dispensador de papel higiénic o rollo 200/300 m.	1	2	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
Aseos personal (2) ♂	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Dispensador de toallas de papel FOTO	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénic o rollo 200/300 m.	1	2		✓	
	Colgador mural individual	1	X			

OBSERVACIONES

Vestuario ♂
banco vestidor 2
armario ropero X
colgador 1
papelera 50l. X
colgador mural 3
taquillas 20

Vestuario ♀
banco vestidor 2
arma
taquillas 17
colgador múltiples 2

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	DULSKA MARTIN	FECHA:	1/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA DE APOYO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
Vestuarios personal (1) (2)	Carro de transporte de ropa sucia	1	X			
	Banco de vestidor	~~1~~ 2	2	—		
	Armario ropero modular	9	X			
	Colgador para ropero	~~27~~ 17	17	—		
	Papelera con tapa basculante de 50L	1	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	2	X			
Zona de utensilios de limpieza (1)	Carro de limpieza	1	1	—		
	Estantería de pared de 3 estantes	1	1	—		
Zona polivalente de personal (1)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	~~8~~ 3	3	—		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	X			
	Papelera	1	1	—		
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	X			
	Nevera de 150 L.	1	1	—		
	Cafetera eléctrica	1	1	—		
	Horno microondas empotrado (NO EMPOTRADO)	1	1	—		
Aseos Personal (2)	Dispensador de jabón	1	1			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	2	—		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	—		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	2	—		
	Colgador mural individual	~~2~~ 2	2	1	1	
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	—		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	—		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Aseos Personal (2)	Dispensador de jabón	1	1	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	—		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	—		
	Colgador mural individual	1	1	—		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	—		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	—		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

(2) Zona polivalente personal - 1 banco vestuario

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

ZONA: MÓDULO CONSULTAS.

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	BELÉN MARTÍN	FECHA:	1/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho de supervisión (2)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	—		
	Silla fija	2	3	—		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	—		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm. Con estantería y archivador	1	2	—		
	Papelera	1	1	—		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	—		
	Perchero de pie	1	X			
Zona polivalente de personal (2)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Silla fija con brazos	8				
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1				
	Papelera	1				
	Perchero de pie	1				
	Pizarra para rotulador de pared	1				
	Nevera de 150 L.	1				
	Cafetera eléctrica	1				
	Horno microondas empotrado	1				
Sala de reuniones (2)	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	8	X			
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	—		
	Papelera	1	1	—		
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	—		
Zona trabajo administrativo (2)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Silla fija	2				
	Plafón de corcho	1	NO EXISTE			
	Papelera	1				
	Fotocopiadora	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA 2º | Jose Manuel 649151753

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	JUAN CARLOS	FECHA:	30/11/2018
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	15:30 h

BLOQUE QUIRÚRGICO-CIRUGÍA CON INGRESO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Antequirófano (5)	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	1	X			
	Cubo de basura de 25L	2	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
Zonas de apoyo (5)	Lavado medical de 2 plazas	1	1	✓	(3 plazas)	
	Dispensador de cepillos	1	X			
	Dispensador de jabón para zona quirúrgica	1	1	✓		
Quirófanos (5) Quirófano 5	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	2	X			
	Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	1	X			
	Mesa auxiliar Mayo	1	1	✓		
	Mesa instrumental 120x60 cms.	1	1	✓		
	Mesa riñonera	1	1	✓		
	Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	1	1	✓		
	Carro alto portapalanganas rodado	1	X			
	Carro bajo portapalanganas	1	X	✓		
	Carro de suturas	1	1	✓		
	Carro medicación anestesia	1	X	✓		
	Lámpara de quirófano (elemento fijo)	1	2	✓		
	Escalera 1 peldaño inoxidable	1	1	✓		
	Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	1	1	✓		
	Pizarra blanca rotuladores	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	2	✓		
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	1	X			
	Taburete de acero inoxidable sin ruedas	1	X			
	Reloj	1	X	X		
	Cestas alámbricas	1	1	✓		
	Carro de fungible	1	X			
	Banquillos elevadores	1	X			
	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	1	X			
	Cubo alto con soporte giratorio	1	X			
	Reloj de pared con fecha	1	1	✓		
	Carro de historias clínicas	1	X			

OBSERVACIONES

~~1 Lavado medical Este de 3 plazas en vez de 2 plazas Zona de apoyo~~

~~2 Carro de fungibles, anestesia, suturas es el mismo carro~~

~~3 Taburetes giratorios con ruedas convencionales~~

2 Taburetes con ruedas en quirófanos

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

~~El lavado medico~~ Los lavados medicales son de 3 plazas en todas las zonas de apoyo de los quirófanos. Adjuntamos foto.

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

BLOQUE QUIRÚRGICO-CIRUGÍA CON INGRESO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Antequirófano (5)	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	1	X			
	Cubo de basura de 25L	2	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
Zonas de apoyo (5)	Lavado medical de 2 plazas	1	1	✓	(3 plazas)	
	Dispensador de cepillos	1	>			
	Dispensador de jabón para zona quirúrgica	1	1	✓		
Quirófanos (5) Quirófano 4	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	2	X			
	Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	1	X			
	Mesa auxiliar Mayo	1	X			
	Mesa instrumental 120x60 cms.	1	1	✓		
	Mesa riñonera	1	1	✓		
	Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	1	1	✓		
	Carro alto portapalanganas rodado	1	X			
	Carro bajo portapalanganas	1	1	✓		
	Carro de suturas	1	1	✓		
	Carro medicación anestesia	1	1	✓		
	Lámpara de quirófano (elemento fijo)	1	2	✓		
	Escalera 1 peldaño inoxidable	1	1	✓		
	Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	1	1	✓		
	Pizarra blanca rotuladores	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	1	X			
	Taburete de acero inoxidable sin ruedas	1	X			
	Reloj	1	X			
	Cestas alámbricas	1	1	✓		
	Carro de fungible	1	1	✓		
	Banquillos elevadores	1	X			
	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	1	X			
	Cubo alto con soporte giratorio	1	X			
	Reloj de pared con fecha	1	1	✓		
	Carro de historias clínicas	1	X			

OBSERVACIONES

* 4 taburetes con ruedas en el quirófano 4

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

BLOQUE QUIRÚRGICO-CIRUGÍA CON INGRESO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Antequirófano (5)	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	1	X			
	Cubo de basura de 25L	2	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
Zonas de apoyo (5)	Lavado medical de 2 plazas	1	1	✓ (3 plazas)		
	Dispensador de cepillos	1	X			
	Dispensador de jabón para zona quirúrgica	1	1	✓		
Quirófanos (5) Quirófano 3	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	2	X			
	Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	1	1	✓		
	Mesa auxiliar Mayo	1	X			
	Mesa instrumental 120x60 cms.	1	X			
	Mesa riñonera	1	1	✓		
	Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	1	1	✓		
	Carro alto portapalanganas rodado	1	X			
	Carro bajo portapalanganas	1	1	✓		
	Carro de suturas	1	1	✓		
	Carro medicación anestesia	1	1	✓		
	Lámpara de quirófano (elemento fijo)	1	2	✓		
	Escalera 1 peldaño inoxidable	1	1	✓		
	Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	1	1	✓		
	Pizarra blanca rotuladores	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	1	X			
	Taburete de acero inoxidable sin ruedas	1	X			
	Reloj	1	X			
	Cestas alámbricas	1	1	✓		
	Carro de fungible	1	1	✓		
	Banquillos elevadores	1	X			
	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	1	X			
	Cubo alto con soporte giratorio	1	X			
	Reloj de pared con fecha	1	1	✓		
	Carro de historias clínicas	1	X			

OBSERVACIONES

~~4 taburetes~~ + 4 taburetes con ruedas en el quirófano 3.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

BLOQUE QUIRÚRGICO-CIRUGÍA CON INGRESO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Antequirófano (5)	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	1	X			
	Cubo de basura de 25L	2	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
Zonas de apoyo (5)	Lavado medical de 2 plazas	1	1	✓ (3 plazas)		
	Dispensador de cepillos	1	X			
	Dispensador de jabón para zona quirúrgica	1	1	✓		
Quirófanos (5) Quirófano 2	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	2	X			
	Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	1	1	✓		
	Mesa auxiliar Mayo	1	X			
	Mesa instrumental 120x60 cms.	1	1	✓		
	Mesa riñonera	1	X			
	Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	1	1	✓		
	Carro alto portapalanganas rodado	1	X			
	Carro bajo portapalanganas	1	X	✓		
	Carro de suturas	1	1	✓		
	Carro medicación anestesia	1	1	✓		
	Lámpara de quirófano (elemento fijo)	1	2	✓		
	Escalera 1 peldaño inoxidable	1	1	✓		
	Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	1	X			
	Pizarra blanca rotuladores	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	1	X			
	Taburete de acero inoxidable sin ruedas	1	X			
	Reloj	1	X			
	Cestas alámbricas	1	1	✓		
	Carro de fungible	1	X	✓		
	Banquillos elevadores	1	X			
	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	1	X			
	Cubo alto con soporte giratorio	1	X			
	Reloj de pared con fecha	1	1	✓		
	Carro de historias clínicas	1	X			

OBSERVACIONES

4 Taburetes de ruedas convencionales en quirófano 2

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

BLOQUE QUIRÚRGICO-CIRUGÍA CON INGRESO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Antequirófano (5)	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	1	X			
	Cubo de basura de 25L	2	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
Zonas de apoyo (5)	Lavado medical de 2 plazas	1	1	✓	(ilegible)	
	Dispensador de cepillos	1	X			
	Dispensador de jabón para zona quirúrgica	1	1	✓		
Quirófanos (5) Quirófano 1	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	2	X			
	Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	1	1	✓		
	Mesa auxiliar Mayo	1	X			
	Mesa instrumental 120x60 cms.	1	X			
	Mesa riñonera	1	1	✓		
	Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	1	1	✓		
	Carro alto portapalanganas rodado	1	X			
	Carro bajo portapalanganas	1	1	✓		
	Carro de suturas	1	1	✓		
	Carro medicación anestesia	1	1	✓		
	Lámpara de quirófano (elemento fijo)	1	2	✓		
	Escalera 1 peldaño inoxidable	1	X			
	Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	1	X			
	Pizarra blanca rotuladores	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	1	X			
	Taburete de acero inoxidable sin ruedas	1	X			
	Reloj	1	X			
	Cestas alámbricas	1	1	✓		
	Carro de fungible	1	1	✓		
	Banquillos elevadores	1	X			
	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	1	X			
	Cubo alto con soporte giratorio	1	X			
	Reloj de pared con fecha	1	1	✓		
	Carro de historias clínicas	1	X	X		

OBSERVACIONES

* 5 taburetes de ruedas convencionales en quirófano 1

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Zonas de registro procesos clínicos (1)	Repisa de escritura de 70 x 35 cm.	8				
Aparcamiento camillas pre -transfer (1)	Equipamiento médico específico	2	✓	✓		
Recepción de carros de material (1)	Sin mobiliario clínico	1				
Recepción y transfer de pacientes (1)	Mostrador de recepción de 120-140 cm.	1	1	✓		
	Cajonera de mostrador	1	1	✓		
	Silla giratoria con ruedas alta	1	x			
	Cortinaje de separación	8	x			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
Aparcamiento camillas post transfer (1)	Equipamiento médic o específico	✓				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA 2

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR: A	ELIA QUIROGA	FECHA:	30.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	15:45

BLOQUE QUIRÚRGICO-CIRUGÍA SIN INGRESO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Zonas de registro procesos clínicos (1)	Repisa de escritura de 70 x 35 cm.	1	1	✓		
Recepción de carros de material (1)	Sin mobiliario clínico	1				
Recepción y transfer de pacientes (1) 1	Mostrador de recepción de 120-140 cm.	1	1	✓		
	Cajonera de mostrador	1	1	✓		
	Silla giratoria con ruedas alta	1	1	✓		
	Cortinaje de separación	8	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	✓		
	Sillón reclinable completo	5	1	✓		
Aparcamiento camillas post transfer (1)	Equipamiento médico específico					
UAM camas (Adaptación al medio) Equipamiento de cada espacio (1) 2	Cama clínica eléctrica	9	10	✓		
	Colchón de espuma para cama clínica	9	10	✓		
	Almohada para cama clínica	9	10	✓		
	Mesita de noche clínica	9	X			
	Portasueros rodado	9	2	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	9	7	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	9	~~4~~ 1 movil, 3 soporte)			
	Regulador de vacío	9	3	✓		
	Reloj calendario	2	X			
	Palangana de baño metálica	1	2	de plástico		
	Cuña con portacuñas	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
UAM sillones (Adaptación al medio) Equipamiento de cada espacio (1) 3	Sillón reclinable completo	5	7	✓		
	Mesita de noche clínica	5	X			
	Reloj de pared con fecha	5	2	sin fecha		
	Carro de historias clínicas	5	X			
	Esfigmomanómetro de pared	5	3			
	Regulador de vacío FOTO	5	4	Solo la toma		
	Reloj calendario	2	X			
	Palangana de baño metálica	5	5	de plástico		
	Cuña con portacuñas	5	2			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			

OBSERVACIONES

Hay 3 soportes del esfigmomanómetro y 1 movil: FOTO

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR/A	ELÍA QUIROGA	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
URPA (8)	Cama clínica con accesorios	16	4	✓		
	Colchón de cama clínica	16	4	✓		
	Almohada	16	4	✓		
	Portasueros para cama clínica	16	7	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	16	7	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	16	X (Soporte)			
	Presurizador de suero	1	X			
	Regulador de vacío	1	7	✓		
	Soporte de agua para lavado de sonda de aspiración	1	7	✓		
	Soporte para monitor	1	X			
	Cuña con portacuñas	1	X			
	Palangana de baño metálica	1	X			
	Reloj calendario	1	X			
	Contenedor de sondas de aspiración	1	7	✓		
	Carro para material de tres estantes inoxidable	1	1	✓		
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	8	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	8	6	✓		
	Carro de parada	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			

OBSERVACIONES

No hay soporte de monitor, utilizan la mesa cigüeñal.
Solo hay una unidad de reanimación, abarca todo el espacio indicado en el plano.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

SOLO HAY UNA URPA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
URPA (8)	Cama clínica con accesorios	16				
	Colchón de cama clínica	16				
	Almohada	16				
	Portasueros para cama clínica	16				
	Caudalímetro de oxígeno	16				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	16				
	Presurizador de suero	1				
	Regulador de vacío	1				
	Soporte de agua para lavado de sonda de aspiración	1				
	Soporte para monitor	1				
	Cuña con portacuñas	1				
	Palangana de baño metálica	1				
	Reloj calendario	1				
	Contenedor de sondas de aspiración	1				
	Carro para material de tres estantes inoxidable	1				
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	8				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Mesa cigüeña para comer	8				
	Carro de parada	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Negatoscopio de tres cuerpos	1				

OBSERVACIONES

SOLO HAY UNA SALA DE REA

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
URPA (8)	Cama clínica con accesorios	16				
	Colchón de cama clínica	16				
	Almohada	16				
	Portasueros para cama clínica	16				
	Caudalímetro de oxígeno	16				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	16				
	Presurizador de suero	1				
	Regulador de vacío	1				
	Soporte de agua para lavado de sonda de aspiración	1				
	Soporte para monitor	1				
	Cuña con portacuñas	1				
	Palangana de baño metálica	1				
	Reloj calendario	1				
	Contenedor de sondas de aspiración	1				
	Carro para material de tres estantes inoxidable	1				
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	8				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Mesa cigüeña para comer	8				
	Carro de parada	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Negatoscopio de tres cuerpos	1				

OBSERVACIONES

Solo UNA SALA

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
URPA (8)	Cama clínica con accesorios	16				
	Colchón de cama clínica	16				
	Almohada	16				
	Portasueros para cama clínica	16				
	Caudalímetro de oxígeno	16				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	16				
	Presurizador de suero	1				
	Regulador de vacío	1				
	Soporte de agua para lavado de sonda de aspiración	1				
	Soporte para monitor	1				
	Cuña con portacuñas	1				
	Palangana de baño metálica	1				
	Reloj calendario	1				
	Contenedor de sondas de aspiración	1				
	Carro para material de tres estantes inoxidable	1				
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	8				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Mesa cigüeña para comer	8				
	Carro de parada	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Negatoscopio de tres cuerpos	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
URPA (8)	Cama clínica con accesorios	16				
	Colchón de cama clínica	16				
	Almohada	16				
	Portasueros para cama clínica	16				
	Caudalímetro de oxígeno	16				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	16				
	Presurizador de suero	1				
	Regulador de vacío	1				
	Soporte de agua para lavado de sonda de aspiración	1				
	Soporte para monitor	1				
	Cuña con portacuñas	1				
	Palangana de baño metálica	1				
	Reloj calendario	1				
	Contenedor de sondas de aspiración	1				
	Carro para material de tres estantes inoxidable	1				
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	8				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Mesa cigüeña para comer	8				
	Carro de parada	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Negatoscopio de tres cuerpos	1				

OBSERVACIONES

SOLO HAY UNA.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:			
INSPECTOR:		**COD. PARTE:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**FECHA:**	
		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
URPA (8)	Cama clínica con accesorios	16				
	Colchón de cama clínica	16				
	Almohada	16				
	Portasueros para cama clínica	16				
	Caudalímetro de oxígeno	16				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	16				
	Presurizador de suero	1				
	Regulador de vacío	1				
	Soporte de agua para lavado de sonda de aspiración	1				
	Soporte para monitor	1				
	Cuña con portacuñas	1				
	Palangana de baño metálica	1				
	Reloj calendario	1				
	Contenedor de sondas de aspiración	1				
	Carro para material de tres estantes inoxidable	1				
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	8				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Mesa cigüeña para comer	8				
	Carro de parada	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Negatoscopio de tres cuerpos	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
URPA (8)	Cama clínica con accesorios	16				
	Colchón de cama clínica	16				
	Almohada	16				
	Portasueros para cama clínica	16				
	Caudalímetro de oxígeno	16				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	16				
	Presurizador de suero	1				
	Regulador de vacío	1				
	Soporte de agua para lavado de sonda de aspiración	1				
	Soporte para monitor	1				
	Cuña con portacuñas	1				
	Palangana de baño metálica	1				
	Reloj calendario	1				
	Contenedor de sondas de aspiración	1				
	Carro para material de tres estantes inoxidable	1				
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	8				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Mesa cigüeña para comer	8				
	Carro de parada	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Negatoscopio de tres cuerpos	1				

OBSERVACIONES

SOLO HAY UNA.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
URPA (8)	Cama clínica con accesorios	16				
	Colchón de cama clínica	16				
	Almohada	16				
	Portasueros para cama clínica	16				
	Caudalímetro de oxígeno	16				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	16				
	Presurizador de suero	1				
	Regulador de vacío	1				
	Soporte de agua para lavado de sonda de aspiración	1				
	Soporte para monitor	1				
	Cuña con portacuñas	1				
	Palangana de baño metálica	1				
	Reloj calendario	1				
	Contenedor de sondas de aspiración	1				
	Carro para material de tres estantes inoxidable	1				
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	8				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Mesa cigüeña para comer	8				
	Carro de parada	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	EVA ORTEGA	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Antequirófano (4)	Cubo de basura de 25L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	2	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
Quirófanos (4) 1	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	2	X			
	Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	1	1	✓		
	Mesa auxiliar Mayo	1	X			
	Mesa instrumental 120x60 cms.	1	1	✓		
	Mesa riñonera	1	1	✓		
	Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	1	1	✓		
	Carro alto portapalanganas rodado	1	X			
	Carro bajo portapalanganas	1	1	✓		
	Carro de suturas	1	1	✓		
	Carro medicación anestesia	1	1	✓		
	Lámpara de quirófano (elemento fijo)	1	2	✓		
	Escalera 1 peldaño inoxidable	1	X			
	Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	1	1	✓		
	Pizarra blanca rotuladores	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	1	4		Convencionales	
	Taburete de acero inoxidable sin ruedas	1	X			
	Reloj	1	1	✓		
	Cestas alámbricas	1	1	✓		
	Carro de fungible	5	1	✓		
	Banquillos elevadores	1	X			
	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	1	X			
	Cubo alto con soporte giratorio	1	1	✓		
	Portasuero doble con ruedas	1	1	✓		
	Negatoscopio de cuatro cuerpos	2	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Antequirófano (4)	Cubo de basura de 25L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	2	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
Quirófanos (4) 2	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	2	X			
	Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	1	1	✓		
	Mesa auxiliar Mayo	1	X			
	Mesa instrumental 120x60 cms.	1	1	✓		
	Mesa riñonera	1	1	✓		
	Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	1	1	✓		
	Carro alto portapalanganas rodado	1	X			
	Carro bajo portapalanganas	1	1	✓		
	Carro de suturas	1	1	✓		
	Carro medicación anestesia	1	1	✓		
	Lámpara de quirófano (elemento fijo)	1	2	✓		
	Escalera 1 peldaño inoxidable	1	1	✓		
	Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	1	1	✓		
	Pizarra blanca rotuladores	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	1	2	✓ CONVENCIONALES		
	Taburete de acero inoxidable sin ruedas	1	2			
	Reloj	1	1	✓		
	Cestas alámbricas	1	1	✓		
	Carro de fungible	5	1	✓		
	Banquillos elevadores	1	X			
	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	1	X			
	Cubo alto con soporte giratorio	1	1	✓		
	Portasuero doble con ruedas	1	2	✓		
	Negatoscopio de cuatro cuerpos	2	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Antequirófano (4)	Cubo de basura de 25L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	2	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
Quirófanos (4) 3	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	2	X			
	Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	1	3	✓		
	Mesa auxiliar Mayo	1	X			
	Mesa instrumental 120x60 cms.	1	1	✓		
	Mesa riñonera	1	1	✓		
	Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	1	1	✓		
	Carro alto portapalanganas rodado	1	X			
	Carro bajo portapalanganas	1	1	es	oxidado	
	Carro de suturas	1	1	✓		
	Carro medicación anestesia	1	1	✓		
	Lámpara de quirófano (elemento fijo)	1	2	✓		
	Escalera 1 peldaño inoxidable	1	X			
	Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	1	1	✓		
	Pizarra blanca rotuladores	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	1	2	✓		
	Taburete de acero inoxidable sin ruedas	1	1	✓		
	Reloj	1	1	✓		
	Cestas alámbricas	1	1	✓		
	Carro de fungible	5	1	✓		
	Banquillos elevadores	1	X			
	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	1	X			
	Cubo alto con soporte giratorio	1	1	✓		
	Portasuero doble con ruedas	1	X			
	Negatoscopio de cuatro cuerpos	2	X			

OBSERVACIONES

Son taburetes convencionales

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Antequirófano (4)	Cubo de basura de 25L	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
Quirófanos (4) 4	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	2	X			
	Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	1	1	✓		
	Mesa auxiliar Mayo	1	2	✓		
	Mesa instrumental 120x60 cms.	1	X	✓		
	Mesa riñonera	1	1	✓		
	Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	1	X			
	Carro alto portapalanganas rodado	1	X			
	Carro bajo portapalanganas	1	1	✓		
	Carro de suturas	1	1	✓		
	Carro medicación anestesia	1	1	✓		
	Lámpara de quirófano (elemento fijo)	1	1	✓		
	Escalera 1 peldaño inoxidable	1	X			
	Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	1	1	✓		
	Pizarra blanca rotuladores	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1			
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	1	3	conexiones		
	Taburete de acero inoxidable sin ruedas	1	1			
	Reloj	1	1	✓		
	Cestas alámbricas	1	1	✓		
	Carro de fungible	5	1	✓		
	Banquillos elevadores	1	1	✓		
	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	1	X			
	Cubo alto con soporte giratorio	1	X			
	Portasuero doble con ruedas	1	1	✓		
	Negatoscopio de cuatro cuerpos	2	X			

OBSERVACIONES

El carro de anestesia y fungible y cestas es el mismo

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

25

PLANTA

ZONA DE ESTERILIZACIÓN

ZONA DE ESTERILIZACIÓN						
	Equipamiento de cada espacio	**Unidades**	**Comprobación Existencia (V / x)**	**Estado**		
				Bueno	**Roto**	**Deteriorado**
Recepción y distribución del material estéril (1)	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	12	12	PO	TO	
	Racks almacenaje ML	10				
	Cesta de acero inoxidable 60 x 30 x 14	40	+80	V		
	Escalera con cinco peldaños y pies aislantes	1	X			
Recepción y clasificación del material sucio (1)	Papelera con tapa basculante de 50L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	9	2	V		
Lavado de carros de transporte (1)	Sin mobiliario clínico					
Almacén de carros de transporte (1)	Carro de distribución material esteril tipo quirófano	9	10	V		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	**FECHA:**	22.10.14
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	13.13.

ASCA A. PLANTA 2.ª

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (10)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	✗			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	✗			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✗	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	✗	✓		

OBSERVACIONES

No hay dispensador de toallas, hay secador de manos

~~No hay colgador mural individual, hay en todos los aseos de la planta.~~

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTORA:	ANIUSKA MARTÍN	**FECHA:**	23/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ASEO 1 → 1 Planta 2

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (10)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Dispensador de toallas de papel	1	x			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	x			

OBSERVACIONES

- Secador eléctrico de manos

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR: A	Elia Quiroga	COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	22.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ASEO 2 - PLANTA 2 ♀

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (10)	Dispensador de jabón	1	√	√		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	√	√		
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	√	√		
	Colgador mural individual	1	~~X~~ 1	√		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	√	√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	√	√		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	~~X~~	√		

OBSERVACIONES

Secador de manos

- ~~[illegible]~~

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	[illegible]	FECHA:	22.10.12
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ASEO 3. PLANTA 2. ♀

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (10)	Dispensador de jabón	1	V	V		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	V	V		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	V	V		
	Dispensador de toallas de papel	1	V	V		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	V	V		
	Colgador mural individual	1	X	V		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	V	V		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	V	V		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X	V		

OBSERVACIONES

- Cubo de 12 l. sin pedal
- [illegible]

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ANUSKA MARTÍN	**FECHA:**	23/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ASEO 3 → Planta 2

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (10)	Dispensador de jabón	1	√	√		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	√	√		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Dispensador de toallas de papel	1	√	√		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	√	√		
	Colgador mural individual	1	√	√		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	√	√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	√	√		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	x	x		

OBSERVACIONES

· Cubo basura 12L sin pedal (manual)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ASEO 4 0+ . Planta 2

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (10)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	✓	✓	X	
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓			
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	2	✓	✓		
	Colgador mural individual	2	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	2	✓			
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓			
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	✓			

OBSERVACIONES

2. WC

Cubo de basura de 25 l de tapa oscilante (roña)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	[illegible]	FECHA:	22.10.12
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ASEO 3. PLANTA 2. ♀

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (10)	Dispensador de jabón	1	V	V		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	V	V		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	V	V		
	Dispensador de toallas de papel	1	V	V		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	V	V		
	Colgador mural individual	1	X	V		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	V	V		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	V	V		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X	V		

OBSERVACIONES

- Cubo de 12 l. sin pedal
- [illegible]

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ANUSKA MARTÍN	**FECHA:**	23/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ASEO 3 → Planta 2

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (10)	Dispensador de jabón	1	√	√		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	√	√		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Dispensador de toallas de papel	1	√	√		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	√	√		
	Colgador mural individual	1	√	√		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	√	√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	√	√		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	x	x		

OBSERVACIONES

· Cubo basura 12L sin pedal (manual)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ASEO 4 Of. Planta 2

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (10)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	✓	✓	X	
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓			
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	2	✓	✓		
	Colgador mural individual	2	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	2	✓			
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓			
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	✓			

OBSERVACIONES

2. WC

Cubo de basura de 25 l de tapa oscilante (roña)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

Aseo 4 → Planta 2

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (10)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	✓		✓	
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓			
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	~~1~~ 2	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	~~1~~ 2	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

- 2 WC
- Cubo de basura de 25 L. sin tapa oscilante Rota

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HTC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	BÁRBARA MARTÍN	**FECHA:**	4/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA APOYO MÓDULO A-B-C PLANTA 2

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos pacientes (2)	Dispensador de jabón	2				
	Cubo de basura con pedal 12L	2				
	Cubo de basura con pedal 5L	2				
	Secamanos eléctrico	2				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	2				
	Colgador mural individual	2				
Zona polivalente de personal (2)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Silla fija con brazos	8				
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1				
	Papelera	1				
	Perchero de pie	1				
	Pizarra para rotulador de pared	1				
Almacén de material general (2)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	3				
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 m	~~15~~				
Almacén de lencería (2)	Carro de lencería	2				
Zona de utensilios de limpieza (2)	Estantería de pared de 3 estantes	1				
Aseos Personal (2)	Dispensador de jabón	1	1	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	2	—		
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	~~1~~	2	—		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	~~1~~	3	—		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	—		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Vestuarios personal (~~4~~ 2)	Carro de transporte de ropa sucia	~~2~~	X			
	Banco de vestidor	~~2~~	1	—		
	Armario ropero modular	~~18~~	X			
	Colgador para ropero	~~54~~	21	—		
	Papelera con tapa basculante de 50L	~~2~~	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	~~4~~	2	—		

OBSERVACIONES

1) Cubo basura 12L. T. oscilante (Deteriorado)
2) En Aseos de personal secamanos eléctrico (Bueno)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Inspección y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos pacientes (2)	Dispensador de jabón	2				
	Cubo de basura con pedal 12L	2				
	Cubo de basura con pedal 5L	2				
	Secamanos eléctrico	2				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	2				
	Colgador mural individual	2				
Zona polivalente de personal (2)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Silla fija con brazos	8				
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1				
	Papelera	1				
	Perchero de pie	1				
	Pizarra para rotulador de pared	1				
Almacén de material general (2)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	3	1	✓		
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 m	15	X			
Almacén de lencería (2)	Carro de lencería	2	X			
Zona de utensilios de limpieza (2)	Estantería de pared de 3 estantes	1	~~0~~ 1	✓		
Aseos Personal (2) ♀ ♂ 1	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	2	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	2	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	3	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Vestuarios personal ~~(1)~~ (2)	Carro de transporte de ropa sucia	2	X			
	Banco de vestidor	~~2~~	1	✓		
	Armario ropero modular	~~18~~	X			
	Colgador para ropero	54	16	✓		
	Papelera con tapa basculante de 50L	2	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	~~4~~	2	✓		

OBSERVACIONES

· Aseos de personal dentro de los vestuarios.
♂ 1 Secamanos eléctrico.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

BLOQUE OBSTÉTRICO 2ª PLANTA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	~~Alejandra Pantoja~~ J.C. GALEA.	FECHA:	29-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

OBSTETRICIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción y transfer de pacientes (1) (A)	Mostrador de recepción de 120-140 cm.	1	1	✓		
	Cajonera de mostrador	1	X			
	Silla giratoria con ruedas alta	1	X			
	Cortinaje de separación	8	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
Consultorio con aseo (2) 1	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X	X		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Silla fija con brazos	2	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X	✓		
	Camilla de exploración ginecológica	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	X			
	Carro de historias clínicas	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X	X		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		
	Aseo: el descrito para los aseos de habitaciones de pacientes	1	1	✓		
Sala de monitorización (2) ~~2~~ 3	Camillas	1	1	✓		
	Mueble para soporte de monitores	1	1	✓		
	Mueble clínico con doble pila encastrado (elemento fijo)	~~1~~	1	✓		

OBSERVACIONES

Aseo consultorio 1:
- 1 Dispensador jabón
- 1 Dispensador de toalla
- 1 Lavabo con tapisa
- 1 Espejo cristal
- 1 Cubo basculante 5 L

La sala de monitorización se encuentran en el área de consultas de ginecología

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

No se encuentra en este bloque del hospital, y sólo hay 1.

Actualmente, esta sala y una sala de dilatación es urgencias, inventariado al final.

- 1 Mural de apoyo
- 1 Escobilla
- 1 Apoyo de pared
- 1 Dispensador de papel

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

OBSTETRICIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción y transfer de pacientes (1)	Mostrador de recepción de 120-140 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	1				
	Cortinaje de separación	8				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
Consultorio con aseo (2) 2	Negatoscopio de tres cuerpos	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	✗	✗		
	Foco de exploración de pie	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	✓	✓		
	Silla fija con brazos	2	✗	✗		
	Taburete giratorio con ruedas	1	✗			
	Camilla de exploración ginecológica	1	✓	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	✓	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	✗			
	Carro de historias clínicas	1	✗			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	✗	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	✗	✗		
	Papelera	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	✗			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	✗	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)	1	✓ ✗	✓		
	Aseo: el descrito para los aseos de habitaciones de pacientes	1	1	✓		
Sala de monitorización (1) (2)	Camillas	1	1	✓		
	Mueble para soporte de monitores	1	1	✓		
	Mueble clínico con doble pila encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

Aseo del Consultorio 2:
- 1 Dispensada de jabón
- 1 Dispensada de Toallas
- 1 Lavabo con repisa
- 1 Cubo basculante de 5 L
- 1 Carro de lencería
- 1 Espejo encastrado
- 1 Escobilla
- 1 Dispensada de papel higiénico

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	~~Alejandro Parrilla~~ J.C. GARCÍA	FECHA:	29-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

02

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
Salas para dilatación, parto y recuperación (6) Box 03	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X	X		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X	X		
	Foco de exploración de pie	1	1	/		
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	/		
	Cama clínica eléctrica	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		✓ (x)	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Box 01 Urgencias

1 Cama eléctrica ~~completa~~ clínica
1 Silla de exploración ginecológica
1 Foco de exploración de pie
1 Dispensada de jabón
1 Dispensada de toallas
Poyata (Equipamiento fijo)

Box 02 Urgencias

1 Cama eléctrica clínica
1 Silla de exploración ginecológica
1 Dispensada de jabón
1 Dispensada de toallas
1 taburete giratorio con ruedas
1 Foco de exploración de pie
Poyatas de equipamiento fijo
1 Cuartos lavables

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas para dilatación, parto y recuperación (6) Box 02	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X	X		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X	-		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X	X		
	Cama clínica eléctrica	1	1	-		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Box 04

1 Foco de Exploración
1 Dispensador de jabón
1 Dispensador de toalla de papel
1 Cama clínica eléctrica
1 Poyata Equipamiento fija

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso . J.C. GARCÍA	**FECHA:** 29-11-A	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

05

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas para dilatación, parto y recuperación (6) Box 5	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	2	✓		
	Cama clínica eléctrica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X 1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

06

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas para dilatación, parto y recuperación (6) BOX 06	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X	/		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Cama clínica eléctrica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X 1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro X Paraiso JC GARCÍA	FECHA:	29-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

07

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (v / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas para dilatación, parto y recuperación (6) Box 07	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X	—		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X	—		
	Foco de exploración de pie	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X	—		
	Cama clínica eléctrica	1	1	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Pasaico	**FECHA:**	29-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

08

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas para dilatación, parto y recuperación (6) Box 08	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X	X		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Cama clínica eléctrica	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		✓ (3)	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA 2d

MANRIQUEZ (SUPERVISOR QUIRÓFANO)

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

REALIZA X 2º VEZ X JUAN CARLOS

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	~~Alejandro Paraíso~~ ANUSKA M.	FECHA:	29-11-19
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA DE ANESTESISTAS

dentro del BLOQUE OBSTÉTRICO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado Bueno	Estado Roto	Estado Deteriorado
Aseos Personal (2) 2	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X	X		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Despacho de supervisión (1) 1	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	3	✓		
	Silla fija	2	8 X	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	4 2	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	4 3	✓		
	Papelera	1	4 2	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1 2	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		
Sala de reuniones (1) 3	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	X	✓		
	Silla fija con brazos	8	1	✓		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	✓		
	Papelera	1	2	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA DE ANESTESISTAS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (2) 2	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
Despacho de supervisión (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija	2				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Papelera	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Perchero de pie	1				
Sala de reuniones (1)	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1				
	Silla fija con brazos	8				
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1				
	Papelera	1				
	Perchero de pie	1				
	Pizarra para rotulador de pared	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho anestesista (5) 4	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	3			
	Silla fija	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	2	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	2	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	2	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		

TALLER MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

Actualmente esta habitación
- Cama eléctrica completa
- foco exploración
- ~~silla fija~~.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

***Según documentación sería dicho equipamiento, pero se requiere comprobar in situ**

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

2

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho anestesista (5) 5	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	2	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

***Según documentación sería dicho equipamiento, pero se requiere comprobar in situ**

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

3

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho anestesista (5) 6	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Silla fija	2	3			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1			
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	X			
	Papelera	1	1			
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1			
	Perchero de pie	1	1			
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR	**RESPONSABLE INSTALACIÓN**		

***Según documentación sería dicho equipamiento, pero se requiere comprobar in situ**

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho anestesista (5) 8	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Silla fija	2	1	~		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	X			
	Papelera	1	1	~		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	~		
	Perchero de pie	1	X			
	OBSERVACIONES · Camilla litera con un solo somier y colchón.					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

***Según documentación sería dicho equipamiento, pero se requiere comprobar in situ**

Planta 2 Módulo B

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Elia Quiroga	FECHA:	23.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B-231

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X	X		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA DURÁN A	**FECHA:**	23.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

B232

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	V			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	V			
	Colchón de látex para cama clínica	1	V			
	Almohada para cama clínica	1	V			
	Portasueros rodado	1	V			
	Porta-sueros para cama clínica	1	V			
	Caudalímetro de oxígeno	1	V		V	
	Regulador de vacío	1	V		V	
	Esfigmomanómetro de pared	1	V			
	Soporte de termómetro	1	V			
	Mesita de noche clínica	1	V		V	
	Mesa cigüeña para comer	1	V		V	
	Sofá-cama 2 m.	1	V		V	
	Butaca paciente/acompañante	1	V			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	V			
	Silla fija	1	V		V	
	Cuadro decoración pared	1	V		V	
	Colgador para ropero	4	V			
	Papelera metálica	1	V		V	
	Cubo de basura con pedal 5L	1	V			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	V	V		
	Sujeta toallas de ducha	1	V	V		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	V			
	Palangana de aseo metálica	1	V			
	Botella	1	V			
	Escobilla WC	1	V	V		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	V	V		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	V	V		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	V			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	V	V		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	V	V		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:	ELIA 001206A	**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	23.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

B-233

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	V		
	Regulador de vacío	1	1	V		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	V		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	V		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	V		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	1	V		
	Cuadro decoración pared	1	1	V		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	V		
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	V		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	V		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	V		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	V		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	V		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	V		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	V		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Elia Ortega	**FECHA:**	23.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

B.234

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	V		
	Regulador de vacío	1	1	V		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	V		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	V		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	V		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	V		
	Silla fija	1	1	V		
	Cuadro decoración pared	1	1	V		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	V		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	V		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	V		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	V		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	V		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	V		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	V		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	V		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	EVA QUIROGA	FECHA:	23.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B-235

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	√			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	√			
	Colchón de látex para cama clínica	1	√			
	Almohada para cama clínica	1	√			
	Portasueros rodado	1	√			
	Porta-sueros para cama clínica	1	√			
	Caudalímetro de oxígeno	1		√		
	Regulador de vacío	1		√		
	Esfigmomanómetro de pared	1	√	√		
	Soporte de termómetro	1	√	√		
	Mesita de noche clínica	1	√	√		
	Mesa cigüeña para comer	1	√	√		
	Sofá-cama 2 m.	1		√		
	Butaca paciente/acompañante	1	√			
	Sillón ergonómico para pacientes	1		√		
	Silla fija	1		√		
	Cuadro decoración pared	1		√		
	Colgador para ropero	4	√			
	Papelera metálica	1		√		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	√			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1		√		
	Sujeta toallas de ducha	1		√		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	√			
	Palangana de aseo metálica	1	√			
	Botella	1	√			
	Escobilla WC	1		√		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1		√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1		√		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	√			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1		√		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1		√		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	23.11.12
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B.236 HP

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓			
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓			
	Almohada para cama clínica	1	✓			
	Portasueros rodado	1	✓			
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓			
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	✓	✓		
	Soporte de termómetro	1	✓			
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		DESPINTADA
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	✓			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	✓	✓		
	Colgador para ropero	4	✓	✓		
	Papelera metálica	1	✓			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	✓			
	Palangana de aseo metálica	1	✓			
	Botella	1	✓			
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	✓			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Eva Quiroga	**FECHA:**	23.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

B237

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	V	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	V	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	V	✓		
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	V	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	V	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	V	✓		
	Regulador de vacío	1	V	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	V	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	V	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	V	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	V	✓		
	Silla fija	1	V	✓		
	Cuadro decoración pared	1	V	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	V	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	V	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	V	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	V	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	V	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	V	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	V	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	V	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Elie Quiroga	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B.23A

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELÍA QUIROGA	FECHA:	23.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B.239 Pole mesa igual ~~[illegible]~~ 236

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	X			
	Regulador de vacío	1	/	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	/	✓		(DESPLAZADA)
	Mesa cigüeña para comer	1	/	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	/	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	/	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	/	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	/	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	/	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	/	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	/	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	/	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	/	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	/	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	**FECHA:**	23.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

B240

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1		✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	X			
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1		✓		
	Mesa cigüeña para comer	1		✓		
	Sofá-cama 2 m.	1		✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1		✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1		✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1		✓		
	Sujeta toallas de ducha	1		✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1		✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1		✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1		✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1		✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1		✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR/A	ELVA QUIROGA	FECHA:	23.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B294

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	1	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADORA	ELIA QUIRÓFA	**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	23.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

B 242 : todo

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	V		
	Regulador de vacío	1	1	V		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Sofá-cama 2 m.	1	1	V		
	Butaca paciente/acompañante	1	1	V		
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	-1	V		
	Papelera metálica	1	1	V		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	V		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	V		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	V		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1		V	(roto)
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	V		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	V		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	V		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parrilla	FECHA:	23-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B243

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	X 1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	✓		
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso	FECHA:	28-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B244

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	~~X~~ 1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	X			
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	1	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA 2ª

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	~~Alejandro~~ Paraíso	FECHA: 29-11-17	1.12.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA: 11:15	

↳ DEVIA QUIROGA

BANCO DE SANGRE

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado Bueno	Estado Roto	Estado Deteriorado
Sala de Espera (1)	Sillas modulares	15	6	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm. *	3	3	✓		
	Cuadro decoración pared	3	3	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	1	✓	sin fecha	
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Expositor de folletos	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
Depósito de sangre (1)	Equipamiento médico específico	1		/		
Sala de aferesis (1)	Taburete giratorio alto con respaldo	2		/		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			

OBSERVACIONES

Banco de sangre y laboratorio comparten sala de espera. ~~Depósito de sangre y sala de aferesis están solo en el banco de sangre, no hay en el laboratorio~~

* 3 mesas:
2 mesas de 90x60 cm
1 mesa de 65x65 cm

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

El laboratorio de coagulación syntron, está, dentro del banco de sangre.
La sala de espera del laboratorio esta dentro y también se usa como sala de recuperación.
En la 1º planta hay otra área de laboratorio coagulación Syntrón.

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

LABORATORIO

COAGULACIÓN (SYNTRON)

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de Espera (1)	Sillas modulares	15				
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	3				
	Cuadro decoración pared	3				
	Reloj de pared con fecha	1				
	Carro de historias clínicas	1				
	Expositor de folletos	1				
	Papelera	1				
Depósito de sangre (1)	Equipamiento médico específico	1				
Sala de aferesis (1)	Taburete giratorio alto con respaldo	2				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					

Planta 1

OBSERVACIONES

La sala de espera, actualmente se usa también como sala de recuperación, cuenta con:

- 6 butacas
- 3 sillas fijas
- 3 cuadros
- 1 papelera

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

- No hay sala de aferesis en laboratorio Syntron, está en la planta 1.

2º PLANTA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Ramírez	**FECHA:**	24-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de espera familiares (6) 2º C	Sillas modulares	20	19 sillas	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de ~~80 x 50 cm.~~ 90x60	4	1	✓		
	Cuadro decoración pared	6	X			
	Jardinera	1	X			
	Soporte para posters de campañas	1	X			
	Expositor de folletos	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1	X			
Aseos públicos (8) PLANTA 2 (C)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo) 1	1	X			
Despacho de información (6) 2ª [illegible]	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1			
	Silla fija con brazos	2	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parra 30	FECHA:	24-1-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de espera familiares (6) 2º B	Sillas modulares	20	1 descolocadas	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	4	x			
	Cuadro decoración pared	6	1	✓		
	Jardinera	1	x			
	Soporte para posters de campañas	1	1	✓		
	Expositor de folletos	1	x			
	Papelera	1	1	✓		
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1	x			
Aseos públicos (8) PLANTA 2 (A)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	x			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo) 1	1	x			
Despacho de información (6) 2ª G	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	x			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	x			
	Silla fija con brazos	2	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Parrales	**FECHA:**	24-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
2ª Planta Bloque A **Sala de espera familiares (6)** 2ª Planta Bloque Quir.	Sillas modulares	20	1 X	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	4	1 X	✓		
	Cuadro decoración pared	6	X 3			
	Jardinera	1	X X			
	Soporte para posters de campañas	1	1 X	✓		
	Expositor de folletos	1	X X			
	Papelera	1	1 X	✓		
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1	X X			
Aseos públicos (8) 2ª Planta A. Quirúrgica	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo) 1	1	X			
Despacho de información (6) 2º B	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Silla fija con brazos	2	X			
	Papelera	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA SEGUNDO

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR: DS	TODOS / TODAS	FECHA:	29.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	14:30

SOPORTE MÉDICO

DESPACHOS MÉDICOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Seniors con despachos compartidos (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	60	94	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	60	82	/		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	60	89	/		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	60	78	/		
	Silla fija	60	97	/		
	Papelera	60	73	/		
Salas de comisiones médicas (1)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	2	✓		
	Silla fija con brazos	4	2	✓		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	X			
	Papelera	1	2	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	✓		
Sala de reuniones (7) (1)	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	8	5	✓		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	✓		

OBSERVACIONES

- Inventariados todos los despachos sobre anexo 6; sobre plano faltan los despachos de dirección médica y enfermería (mismas características) x inventariar.
- Faltan despachos en la zona de gerencia (mismas características), q no están en Anexo 6.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

DESPACHOS MÉDICOS

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ANUSKA MARTIN	**FECHA:**	29/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
(1) Jefes de Servicio (8)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	2	/		
	Ala de 1 m. para mesa	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	3	/		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	2	/		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	X			
	Silla fija	2	X			
	Papelera	1	/	/		
(2) Sala de reuniones (7) Despachos	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	8	2	/		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	X			
	Papelera	1	2	/		
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	X			
(2) Jefes de Servicio (8)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Ala de 1 m. para mesa	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	1	/		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	/		
	Silla fija	2	/	/		
	Papelera	1	/	/		
(3) Sala de reuniones (7)	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	1	/		
	Silla fija con brazos	8	14			
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	/		
	Papelera	1	2	/		
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	/	/		
(3) Jefes de Servicio (8)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	/	/		
	Ala de 1 m. para mesa	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	/	/		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	/	/		
	Silla fija	2	3	/		
	Papelera	1	/	/		
(4) Sala de reuniones (7)	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	1	/		
	Silla fija con brazos	8	1	/		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	/		
	Papelera	1	1	/		
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	/		
(4) Jefes de Servicio (8) Urología.	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	3	/		
	Ala de 1 m. para mesa	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	/	/		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	4	/		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	/	/		
	Silla fija	2	4	/		
	Papelera	1	/	/		

OBSERVACIONES

S.R. (2) - 2 mesas (140 x 80
- Colgador multiple.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
(5) Jefes de Servicio (8)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	2	/		
	Ala de 1 m. para mesa	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	2	/		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	/		
	Silla fija	2	4	/		
	Papelera	1	1	/		
(5) Sala de reuniones (7) Concesionaria	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	8	1	/		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	X			
	Papelera	1	3	/		
	Perchero de pie	1	1	/		
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	/		
(6) Jefes de Servicio (8)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Ala de 1 m. para mesa	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2	/		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	2	/		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	/		
	Silla fija	2	X			
	Papelera	1	1	/		
(6) Sala de reuniones (7)	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	1	/		
	Silla fija con brazos	8	10	/		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	/		
	Papelera	1	1	/		
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	/		
(7) Jefes de Servicio (8)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Ala de 1 m. para mesa	1	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	1	/		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	/		
	Silla fija	2	1	/		
	Papelera	1	1	/		
(9 en plano) Sala de reuniones (7)	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	~~8~~	4	—		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	—	—		
	Papelera	1	—	—		
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	—	—		
(8) Jefes de Servicio (8)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	2	/		
	Ala de 1 m. para mesa	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	2	/		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	~~1~~	2	/		
	Silla fija	2	3	/		
	Papelera	1	1	/		

OBSERVACIONES

SR (5) → 4 armarios de 1'80
3. sillas gira. brazo
3. mesas. 1'40 x 80
2. estanterías de 2'00 mt.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

SEGUNDA PLANTA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	29.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	15:15

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

GERENCIA Y DIRECCIÓN DE GESTIÓN

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
1	Mesa de trabajo de 160 x 80 x 74 cm.	1	1	V		
	Ala de 1 m. para mesa	1	X 1	V		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	V		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	V		
	Mesa de trabajo redonda de 120 cm.	1	X			
	Silla fija	4	6	V		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	1	V		
Despachos tipo de Gerencia (1)	Sofá 2 plazas	1	1	V		
	Sofá 1 plaza	1	2	V		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	1	1	V		
	Perchero de pie	1	1	V		
	Cuadro decoración pared	2	3	V		
	Jardinera	1	X			
	Papelera	1	1			
2	Mesa de trabajo de 160 x 80 x 74 cm.	1	1	V		
	Ala de 1 m. para mesa	1	1	V		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	V		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	V		
	Mesa de trabajo redonda de 120 cm.	1	X			
Despacho tipo de Dirección de Gestión (1)	Silla fija	1	6	V		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	2	V		
	Perchero de pie	1	1	V		
	Cuadro decoración pared	1	4	V		
V	Jardinera	1	X			
	Papelera	1	1	V		
3	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	2	V		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	2	V		
	Ala de 1 m. para mesa	1	1	V		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
Despacho tipo de apoyo (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2	V		
	Reloj de pared con fecha	1	1	V		
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Papelera	1	2	V		
4 V	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	1	V		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	2	V		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	2	V		
Zona de trabajo administrativo (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	V		
	Silla fija	1	2	V		
	Papelera	1	1	V		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

- Inventariado todo el anexo 6. pero sobre plano faltan los despachos de dirección medica y enfermeria.

- Faltan tambien despachos de la zona de gerencia.

MEC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Secretarias médicas (4)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Silla fija	1				
	Plafón de corcho	1				
	Papelera	1				
Aseos Personal (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
Secretarias médicas (4)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Silla fija	1				
	Plafón de corcho	1				
	Papelera	1				
Aseos Personal (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				

VACÍO

VACÍO

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	BLANCA MARÍN	**FECHA:**	29/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Secretarias médicas (4) (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	VACÍO			
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Silla fija	1				
	Plafón de corcho	1				
	Papelera	1				
Aseos Personal (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
Secretarias médicas (4) (2)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	VACÍO			
	Silla fija	1				
	Plafón de corcho	1				
	Papelera	1				
Aseos Personal (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA SEGUNDA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Fariñas	**FECHA:**	29-11-12
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

INVESTIGACIÓN

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despachos (4)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	X			
	Silla fija	1				
	Papelera	1				
Despachos (4)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	X			
	Silla fija	1				
	Papelera	1				
Despachos (4)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	X			
	Silla fija	1				
	Papelera	1				
Despachos (4)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Silla fija	1				
	Papelera	1				
Salas de trabajo (1)	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1				
	Silla fija con brazos	12	10			
	Mesa reuniones 350 x 120 x 74 cm. (12 personas)	1				
	Papelera	1				
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1				
Secretaría (1)	Mostrador de información de 200-240 cm.	1	X			
	Cajonera de mostrador	2				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	2				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Almacén general (1)	Estantería metálica 5/6 niveles ML	10	✓	✓		
	Escalera con tres peldaños y pies aislantes	1	✓	✓		
Aseos personal (2)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Dispensador de papel higiénic o rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
Aseos personal (2)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Dispensador de papel higiénic o rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR		**RESPONSABLE INSTALACIÓN**	

PLANTA ~~PLANTA~~ SEGUNDA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Parrilla	**FECHA:**	29-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

FORMACIÓN Y DOCENCIA

ZONA DOCENCIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aulas pequeñas (2)	Mesa cabecera aula 250 x 90 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Silla fija con brazos	30	✓			
	Papelera	1	✓	✓		
	Perchero de pie	1	✓			
	Pizarra para rotulador de pared	1	✓			
Aulas pequeñas (2)	Mesa cabecera aula 250 x 90 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Silla fija con brazos	30	✓			
	Papelera	1	✓	✓		
	Perchero de pie	1	✓			
	Pizarra para rotulador de pared	1	✓	✓		
Aulas grandes (1)	Mesa cabecera aula 250 x 90 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Silla fija con brazos	60	✓			
	Papelera	1	✓	✓		
	Perchero de pie	1	✓			
	Pizarra para rotulador de pared	1	✓	✓		
	Pantalla proyección	1	✓	✓		
Aulas informática (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	✓			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	✓			
	Mesa de trabajo de 160 x 80 x 74 cm.	8	✓	✓		
	Silla fija	30	✓	✓		
	Pizarra para rotulador de pared	1	✓	✓		
	Papelera	1	✓	✓		
Aulas demonstraciones enfermería (1)	Mesa cabecera aula 250 x 90 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Silla fija con brazos	30	✓			
	Papelera	1	✓	✓		
	Perchero de pie	1	✓			
	Pizarra para rotulador de pared	1	✓			
(Aula multimedia) **Seminario (1)** ~~AULA~~	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	5	✓			
	Silla fija con brazos	40	✓	✓		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	5	✓	✓		
	Reloj de pared con fecha	5	✓	✓		
	Carro de historias clínicas	5	✓			
	Pizarra para rotulador de pared	5	✓			
Salón de actos y conferencias (1)	Instalación fija específica	1	✓			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTORA:	SILA QUIROGA	FECHA:	1-12-12
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	13'00

~~[illegible]~~ CIRUGIA CX

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Consulta	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2	cuerpos	
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	3	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
Salas de consulta con exploración (65) 04	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1		sin	pedal	tapa
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

OFTALMOLOGÍA

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Consulta 07 Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	2	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2			
	Taburete giratorio con ruedas	1	2	✓		
	Litera de exploración	1	0	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

CIRUGÍA CX

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consult. 08.	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CX

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 02	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	1	V		
	Foco de exploración de pie	1	1	V		
	Juego estándar de curas	3	3	V		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	V		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	V		
	Silla fija	2	2	V		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	V		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	V		
	Litera de exploración	1	1	V		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	V		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	V		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	V		
	Carro de curas con cajones	1	1	V		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	V		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	V		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X	V		
	Papelera	1	1	V		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	Sin	pedal	
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Elia Quiroga	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 07	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR: A	Elia QUIROGA	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ALUCA C4

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 06	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpo		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	V		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	V		
	Silla fija	2	2	V		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	V		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1	V		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	V		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	V		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	V		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	V		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	V		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR/A	ANIUSKA	**FECHA:**	5.12.2024
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 01 CX	Negatoscopio de tres cuerpos 2c	1	1	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	/		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	/		
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	/		
	Juego estándar de curas	2	1	/		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	/		
	Silla fija	2	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	/		
	Litera de exploración	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	/		
	Escabel	1	1	/		
	Cortinaje de exploración	1	1	/		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	/		
	Carro de curas con cajones	1	1	/		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	/		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Consultas CX.

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 3 CX	Negatoscopio de tres cuerpos 2.C	1	1	1		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	✓		
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	~~1~~	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	~~0~~	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	~~0~~	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1			
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ANIUSKA	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 9 CX	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla fija	2	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (5) CX	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR	**RESPONSABLE INSTALACIÓN**		

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CIRUGÍA VASCULAR

NO existe

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala dopler vascular periférico (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Armario endoscopia	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
	Gavetas para material fungible	1				

OBSERVACIONES

~~Ahor~~ En la actualidad corresponde con la consulta 9 del área de Traumatología

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

- CIRUGÍA VASCULAR NO EXISTE EN ESTE HOSPITAL.

HFC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	**FECHA:**	1.12.2021
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

OFTALMOLOGÍA (7)

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala campimetría (1) Corresponde con la consulta 8 1	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1		sin cristal	
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	✓		
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	2	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	✓		
Sala láser oftalmológico (1) 2 Corresponde con consulta 1	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	3			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	1		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			
Sala angiografía (1)	Equipamiento técnico específico					
Sala refractometría (2)	Equipamiento técnico específico					
Sala refractometría (2)	Equipamiento técnico específico					

OBSERVACIONES

No hay sala 2 refractometría, esta en consulta 8

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

OFTALMOLOGÍA

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 02	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	✓			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	✓			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

OFTALMOLOGÍA

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) 03	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 (1 cuerpo)		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	2	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR		**RESPONSABLE INSTALACIÓN**	

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

OFTALMOLOGIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Consulta 04	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1			
	Dispensador de toallas de papel	1	1			
Salas de consulta con exploración (65)	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

OFTALMOLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 05	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1			
	Dispensador de toallas de papel	1	1			
	Silla fija	2	2			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	**FECHA:**	5.12.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	12:00

ANATOMÍA PATOLÓGICA

2ª ~~PLANTA~~ (~~laboratorio banco sangre~~)

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
PAAF (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	3 1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1		✓	ROTO
	Escabel	1	1			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Papelera	1	1			
	Cubo de basura con pedal 12L SOL	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		

Punción aspiración con aguja fina.

OBSERVACIONES

→ Se encuentra en Hospital de día y se realizan en la Sala técnica

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HJC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	BRUSKA MARTÍN	FECHA:	1/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

OTORRINOLARINGOLOGÍA (12)

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
Salas audiometría (3) Consulta (3) 070	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	—		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	—		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	—		
	Gavetas para material fungible	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			

OBSERVACIONES

- Dispensador alcohol-gel
- Sala con maquinaria especifica para pruebas audiometria.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

- SOLO HAY UNA SALA ESPECIFICA DE AUDIOMETRIA.
- EN VARIAS CONSULTAS HAY FILMAS ESPECIFICAS DE EXPLORACIÓN

H 5C

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	BLUSKA MARTIN	**FECHA:** 1/12/2017	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

OTORRINOLARINGOLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas audiometría (3) Consulta 5	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Gavetas para material fungible	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

OTORRINOLARINGOLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
OTO Sala pruebas nasales. Consulta (9)	Negatoscopio de tres cuerpos 2 uds	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	2	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	~~Salas audiometría (3)~~ Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	✓		

OBSERVACIONES

- Silla de exploración eléctrica

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HJC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	DULUSKA MARTÍN	FECHA:	1/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de Exploraciones funcionales (2) Consulta 1 OTO	Negatoscopio de tres cuerpos Zoveno	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	✓		

OBSERVACIONES

- Silla exploración

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de Exploraciones funcionales (2) Consulta 2 OTO	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	/		
	Gavetas para material fungible	1	1	/		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			

OBSERVACIONES

- Camilla electrica

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HFC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELISABET MARTÍN	**FECHA:**	1/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 4 OTO	Negatoscopio de tres cuerpos Zuera	1	1	—		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	—		
	Juego estándar de curas	2	1	—		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	—		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	—		
	Silla fija	2	1	—		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X1	—		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	—		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	—		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	—		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos 2 uds	1	✓	—		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	✓	—		
	Juego estándar de curas	8	X			
	Juego de bandejas	1	X			
ROTO	Dispensador de jabón	1	✓		—	
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	—		
	Silla fija	2	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	✓	—		
	Litera de exploración	1	✓	—		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
Consulta 6 OTO	Escabel	1	✓	—		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	✓	—		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	—		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	✓	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	✓	—		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	1/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla fija	2	X	—		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	X	—		
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X	—		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

Consulta 05

FOTO

OTO

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (7) OTO	Negatoscopio de tres cuerpos 2 cuerpo	1	1	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	V			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	/		
	Juego estándar de curas	8	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla fija	2	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	/		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	8	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	/ /		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1 1	/ /		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (8) OTO	Negatoscopio de tres cuerpos 2 cuerp.	1	1			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1			
	Juego estándar de curas	8	1			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1			
	Dispensador de toallas de papel	1	1			
	Silla fija	2	1			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1			
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1			

OBSERVACIONES

* Silla exploración

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

OTO

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 10 OTO	Negatoscopio de tres cuerpos 2 cuerpos	1	1	1		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	1		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	1		
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	1		
	Juego estándar de curas	~~3~~	1	1		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	1		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	1		
	Silla fija	2	1	1		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	1		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	1		
	Litera de exploración	1	1	1		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	1		
	Escabel	1	1	1		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	1		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	~~0~~	1	1		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	1		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	11		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	1		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC CONSULTAS (4) SALUD LABORAL

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

2ª Pta

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Consulta salud laboral (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	0	1	—		
	Reloj de pared con fecha	1	X			
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla fija	2	1	—		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	/	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1	—		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	—		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	—		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	—		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			
Atención a domicilio (1)	Negatoscopio de tres cuerpos					
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared					
	Báscula de pie con altímetro					
	Foco de exploración de pie					
	Juego de bandejas					
	Dispensador de jabón					
	Dispensador de toallas de papel					
	Silla fija					
	Silla giratoria con brazos y ruedas					
	Taburete giratorio con ruedas					
	Litera de exploración					
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera					
	Escabel					
	Cortinaje de exploración					
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas					
	Carro de curas con cajones					
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.					
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.					
	Cajonera colgante de dos cajones					
	Papelera					
	Cubo de basura con pedal 12L					
	Perchero mural múltiple (módulo)					
	Reloj de pared con fecha					
	Carro de historias clínicas					

NO EXISTE ESTE SERVICIO

OBSERVACIONES

- Consulta en planta 2.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

JMC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA CORDOBA / JOSE CARLOS G.	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

PRIMERA

PLANTA

PLAN DE EQUIPAMIENTOS - GABINETES TÉCNICOS

CARDIOLOGÍA (1)

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala monitorización Holter (1) Consulta C	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	4	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	3	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo) Gavetas para material fungible	1	X	X		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	GUA QUIROGA / DUNSKA MART	FECHA:	1/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado Bueno	Estado Roto	Estado Deteriorado
Sala pruebas de esfuerzo + Test de tilt (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1		hay	hoquil	
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	2	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	2	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	X			
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	tapa		oscilante
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
Ecocardiografía (2) consulta (2)	Negatoscopio de tres cuerpos 2 cuerp.	1	1	—		
	Esfigmomanómetro de merc urio de pared	1	1	—		
	Foco de exploración de pie	1	1	—		
	Dispensador de jabón	1	1	—		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	—		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	—		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	—		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	—		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	4	—		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	—		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	—		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	—		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	—		

OBSERVACIONES

→ Corresponde con la consulta 2

* → solo hay una sala de pruebas de esfuerzo

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

consulta 2, ecocardiografía
- 2 sillas fijas (Bueno)
- litera eléctrica

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala pruebas de esfuerzo + Test de tilt (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2				
	Reloj de pared con fecha	1				
	Carro de historias clínicas	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Ecocardiografía (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de merc urio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	DAVINCA MARTÍN	**FECHA:**	1 / 12 / 2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
Sala pruebas de esfuerzo + Test de tilt (2) Consulta 7	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	3	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	3	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	X			
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X 1	✓		
Ecocardiografía (2) Consulta 3	Negatoscopio de tres cuerpos 2 cuerp.	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de merc urio de pared	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4?	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	✓		

OBSERVACIONES

Solo existe 1 sala de pruebas y 1 sala de Ecocardiograma.

(*) Consulta 7: camilla electrica.

- Cuba basura 12L. tapa oscilante (deteriorada)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala pruebas de esfuerzo + Test de tilt (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2				
	Reloj de pared con fecha	1				
	Carro de historias clínicas	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Ecocardiografía (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de merc urio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala electrocardiógrafo (3)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1				

OBSERVACIONES

Se realiza en consulta, habitualmente en la 1.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala electrocardiógrafo (3)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1				

OBSERVACIONES

NO HAY SALA ESPECÍFICA

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala electrocardiógrafo (3)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR		**RESPONSABLE INSTALACIÓN**	

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

01 CARDIOLOGIA — CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	V		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	2	UNO	UNO	1
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	1	V		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	V		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	V		
	Silla fija	2	1	V		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	V		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1	V		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	V		
	Escabel	1	1	V		
	Cortinaje de exploración	1	1	V		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	V		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	V		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	V		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) 07	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	2	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	2	✓		
	Escabel	1	2	✓		
	Cortinaje de exploración	1	3	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	3	✓		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) 02	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1		Sin pedal		
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CARDIO

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) 03	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	√		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	√		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	1	√		
	Dispensador de jabón	1	1	√		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	√		
	Silla fija	2	2	√		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	√		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	√		
	Litera de exploración	1	1	√		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	√		
	Escabel	1	1	√		
	Cortinaje de exploración	1	1	√		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	√		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	√		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	√		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X	√		
	Papelera	1	1	√		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X	√		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

CARDIOLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 4	Negatoscopio de tres cuerpos	1	√ 1	√		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	√ 1	√		
	Oscilometro con brazal de pierna	1				
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3				
	Juego de bandejas	1	√ 1	√		
	Dispensador de jabón	1	√ 1	√		
	Dispensador de toallas de papel	1	√ 1	√		
	Silla fija	2	2 √	√		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1 √	√		
	Taburete giratorio con ruedas	1	~~1~~ √	√		
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	√		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	√		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	√		
	Carro de curas con cajones	1	1	√		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	√		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	√		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	√		
	Papelera	1	1	√		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	√		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA 2º | Jose Manuel 649151753

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	JUAN CARLOS	FECHA:	30/11/2018
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	15:30 h

BLOQUE QUIRÚRGICO-CIRUGÍA CON INGRESO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Antequirófano (5)	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	1	X			
	Cubo de basura de 25L	2	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
Zonas de apoyo (5)	Lavado medical de 2 plazas	1	1	✓	(3 plazas)	
	Dispensador de cepillos	1	X			
	Dispensador de jabón para zona quirúrgica	1	1	✓		
Quirófanos (5) Quirófano 5	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	2	X			
	Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	1	X			
	Mesa auxiliar Mayo	1	1	✓		
	Mesa instrumental 120x60 cms.	1	1	✓		
	Mesa riñonera	1	1	✓		
	Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	1	1	✓		
	Carro alto portapalanganas rodado	1	X			
	Carro bajo portapalanganas	1	X	✓		
	Carro de suturas	1	1	✓		
	Carro medicación anestesia	1	X	✓		
	Lámpara de quirófano (elemento fijo)	1	2	✓		
	Escalera 1 peldaño inoxidable	1	1	✓		
	Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	1	1	✓		
	Pizarra blanca rotuladores	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	2	✓		
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	1	X			
	Taburete de acero inoxidable sin ruedas	1	X			
	Reloj	1	X	X		
	Cestas alámbricas	1	1	✓		
	Carro de fungible	1	X			
	Banquillos elevadores	1	X			
	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	1	X			
	Cubo alto con soporte giratorio	1	X			
	Reloj de pared con fecha	1	1	✓		
	Carro de historias clínicas	1	X			

OBSERVACIONES

~~1 Lavado medical Este de 3 plazas en vez de 2 plazas Zona de apoyo~~

~~2 Carro de fungibles, anestesia, suturas es el mismo carro~~

~~3 Taburetes giratorios con ruedas convencionales~~

2 Taburetes con ruedas en quirófanos

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

~~El lavado medico~~ Los lavados medicales son de 3 plazas en todas las zonas de apoyo de los quirófanos. Adjuntamos foto.

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

BLOQUE QUIRÚRGICO-CIRUGÍA CON INGRESO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Antequirófano (5)	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	1	X			
	Cubo de basura de 25L	2	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
Zonas de apoyo (5)	Lavado medical de 2 plazas	1	1	✓	(3 plazas)	
	Dispensador de cepillos	1	>			
	Dispensador de jabón para zona quirúrgica	1	1	✓		
Quirófanos (5) Quirófano 4	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	2	X			
	Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	1	X			
	Mesa auxiliar Mayo	1	X			
	Mesa instrumental 120x60 cms.	1	1	✓		
	Mesa riñonera	1	1	✓		
	Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	1	1	✓		
	Carro alto portapalanganas rodado	1	X			
	Carro bajo portapalanganas	1	1	✓		
	Carro de suturas	1	1	✓		
	Carro medicación anestesia	1	1	✓		
	Lámpara de quirófano (elemento fijo)	1	2	✓		
	Escalera 1 peldaño inoxidable	1	1	✓		
	Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	1	1	✓		
	Pizarra blanca rotuladores	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	1	X			
	Taburete de acero inoxidable sin ruedas	1	X			
	Reloj	1	X			
	Cestas alámbricas	1	1	✓		
	Carro de fungible	1	1	✓		
	Banquillos elevadores	1	X			
	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	1	X			
	Cubo alto con soporte giratorio	1	X			
	Reloj de pared con fecha	1	1	✓		
	Carro de historias clínicas	1	X			

OBSERVACIONES

* 4 taburetes con ruedas en el quirófano 4

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

BLOQUE QUIRÚRGICO-CIRUGÍA CON INGRESO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Antequirófano (5)	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	1	X			
	Cubo de basura de 25L	2	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
Zonas de apoyo (5)	Lavado medical de 2 plazas	1	1	✓ (3 plazas)		
	Dispensador de cepillos	1	X			
	Dispensador de jabón para zona quirúrgica	1	1	✓		
Quirófanos (5) Quirófano 3	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	2	X			
	Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	1	1	✓		
	Mesa auxiliar Mayo	1	X			
	Mesa instrumental 120x60 cms.	1	X			
	Mesa riñonera	1	1	✓		
	Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	1	1	✓		
	Carro alto portapalanganas rodado	1	X			
	Carro bajo portapalanganas	1	1	✓		
	Carro de suturas	1	1	✓		
	Carro medicación anestesia	1	1	✓		
	Lámpara de quirófano (elemento fijo)	1	2	✓		
	Escalera 1 peldaño inoxidable	1	1	✓		
	Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	1	1	✓		
	Pizarra blanca rotuladores	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	1	X			
	Taburete de acero inoxidable sin ruedas	1	X			
	Reloj	1	X			
	Cestas alámbricas	1	1	✓		
	Carro de fungible	1	1	✓		
	Banquillos elevadores	1	X			
	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	1	X			
	Cubo alto con soporte giratorio	1	X			
	Reloj de pared con fecha	1	1	✓		
	Carro de historias clínicas	1	X			

OBSERVACIONES

~~4 taburetes~~ + 4 taburetes con ruedas en el quirófano 3.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

BLOQUE QUIRÚRGICO-CIRUGÍA CON INGRESO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Antequirófano (5)	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	1	X			
	Cubo de basura de 25L	2	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
Zonas de apoyo (5)	Lavado medical de 2 plazas	1	1	✓ (3 plazas)		
	Dispensador de cepillos	1	X			
	Dispensador de jabón para zona quirúrgica	1	1	✓		
Quirófanos (5) Quirófano 2	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	2	X			
	Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	1	1	✓		
	Mesa auxiliar Mayo	1	X			
	Mesa instrumental 120x60 cms.	1	1	✓		
	Mesa riñonera	1	X			
	Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	1	1	✓		
	Carro alto portapalanganas rodado	1	X			
	Carro bajo portapalanganas	1	X	✓		
	Carro de suturas	1	1	✓		
	Carro medicación anestesia	1	1	✓		
	Lámpara de quirófano (elemento fijo)	1	2	✓		
	Escalera 1 peldaño inoxidable	1	1	✓		
	Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	1	X			
	Pizarra blanca rotuladores	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	1	X			
	Taburete de acero inoxidable sin ruedas	1	X			
	Reloj	1	X			
	Cestas alámbricas	1	1	✓		
	Carro de fungible	1	X	✓		
	Banquillos elevadores	1	X			
	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	1	X			
	Cubo alto con soporte giratorio	1	X			
	Reloj de pared con fecha	1	1	✓		
	Carro de historias clínicas	1	X			

OBSERVACIONES

4 Taburetes de ruedas convencionales en quirófano 2

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

BLOQUE QUIRÚRGICO-CIRUGÍA CON INGRESO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Antequirófano (5)	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	1	X			
	Cubo de basura de 25L	2	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
Zonas de apoyo (5)	Lavado medical de 2 plazas	1	1	✓	(ilegible)	
	Dispensador de cepillos	1	X			
	Dispensador de jabón para zona quirúrgica	1	1	✓		
Quirófanos (5) Quirófano 1	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	2	X			
	Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	1	1	✓		
	Mesa auxiliar Mayo	1	X			
	Mesa instrumental 120x60 cms.	1	X			
	Mesa riñonera	1	1	✓		
	Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	1	1	✓		
	Carro alto portapalanganas rodado	1	X			
	Carro bajo portapalanganas	1	1	✓		
	Carro de suturas	1	1	✓		
	Carro medicación anestesia	1	1	✓		
	Lámpara de quirófano (elemento fijo)	1	2	✓		
	Escalera 1 peldaño inoxidable	1	X			
	Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	1	X			
	Pizarra blanca rotuladores	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	1	X			
	Taburete de acero inoxidable sin ruedas	1	X			
	Reloj	1	X			
	Cestas alámbricas	1	1	✓		
	Carro de fungible	1	1	✓		
	Banquillos elevadores	1	X			
	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	1	X			
	Cubo alto con soporte giratorio	1	X			
	Reloj de pared con fecha	1	1	✓		
	Carro de historias clínicas	1	X	X		

OBSERVACIONES

* 5 taburetes de ruedas convencionales en quirófano 1

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Zonas de registro procesos clínicos (1)	Repisa de escritura de 70 x 35 cm.	8				
Aparcamiento camillas pre -transfer (1)	Equipamiento médico específico	2	✓	✓		
Recepción de carros de material (1)	Sin mobiliario clínico	1				
Recepción y transfer de pacientes (1)	Mostrador de recepción de 120-140 cm.	1	1	✓		
	Cajonera de mostrador	1	1	✓		
	Silla giratoria con ruedas alta	1	x			
	Cortinaje de separación	8	x			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
Aparcamiento camillas post transfer (1)	Equipamiento médic o específico	✓				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA 2

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR: A	ELIA QUIROGA	FECHA:	30.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	15:45

BLOQUE QUIRÚRGICO-CIRUGÍA SIN INGRESO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Zonas de registro procesos clínicos (1)	Repisa de escritura de 70 x 35 cm.	1	1	✓		
Recepción de carros de material (1)	Sin mobiliario clínico	1				
Recepción y transfer de pacientes (1) 1	Mostrador de recepción de 120-140 cm.	1	1	✓		
	Cajonera de mostrador	1	1	✓		
	Silla giratoria con ruedas alta	1	1	✓		
	Cortinaje de separación	8	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	✓		
	Sillón reclinable completo	5	1	✓		
Aparcamiento camillas post transfer (1)	Equipamiento médico específico					
UAM camas (Adaptación al medio) Equipamiento de cada espacio (1) 2	Cama clínica eléctrica	9	10	✓		
	Colchón de espuma para cama clínica	9	10	✓		
	Almohada para cama clínica	9	10	✓		
	Mesita de noche clínica	9	X			
	Portasueros rodado	9	2	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	9	7	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	9	~~4~~ 1 movil, 3 soporte)			
	Regulador de vacío	9	3	✓		
	Reloj calendario	2	X			
	Palangana de baño metálica	1	2	de plástico		
	Cuña con portacuñas	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
UAM sillones (Adaptación al medio) Equipamiento de cada espacio (1) 3	Sillón reclinable completo	5	7	✓		
	Mesita de noche clínica	5	X			
	Reloj de pared con fecha	5	2	sin fecha		
	Carro de historias clínicas	5	X			
	Esfigmomanómetro de pared	5	3			
	Regulador de vacío FOTO	5	4	Solo la toma		
	Reloj calendario	2	X			
	Palangana de baño metálica	5	5	de plástico		
	Cuña con portacuñas	5	2			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			

OBSERVACIONES

Hay 3 soportes del esfigmomanómetro y 1 movil: FOTO

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR/A	ELÍA QUIROGA	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
URPA (8)	Cama clínica con accesorios	16	4	✓		
	Colchón de cama clínica	16	4	✓		
	Almohada	16	4	✓		
	Portasueros para cama clínica	16	7	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	16	7	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	16	X (Soporte)			
	Presurizador de suero	1	X			
	Regulador de vacío	1	7	✓		
	Soporte de agua para lavado de sonda de aspiración	1	7	✓		
	Soporte para monitor	1	X			
	Cuña con portacuñas	1	X			
	Palangana de baño metálica	1	X			
	Reloj calendario	1	X			
	Contenedor de sondas de aspiración	1	7	✓		
	Carro para material de tres estantes inoxidable	1	1	✓		
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	8	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	8	6	✓		
	Carro de parada	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			

OBSERVACIONES

No hay soporte de monitor, utilizan la mesa cigüeñal.
Solo hay una unidad de reanimación, abarca todo el espacio indicado en el plano.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

SOLO HAY UNA URPA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
URPA (8)	Cama clínica con accesorios	16				
	Colchón de cama clínica	16				
	Almohada	16				
	Portasueros para cama clínica	16				
	Caudalímetro de oxígeno	16				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	16				
	Presurizador de suero	1				
	Regulador de vacío	1				
	Soporte de agua para lavado de sonda de aspiración	1				
	Soporte para monitor	1				
	Cuña con portacuñas	1				
	Palangana de baño metálica	1				
	Reloj calendario	1				
	Contenedor de sondas de aspiración	1				
	Carro para material de tres estantes inoxidable	1				
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	8				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Mesa cigüeña para comer	8				
	Carro de parada	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Negatoscopio de tres cuerpos	1				

OBSERVACIONES

SOLO HAY UNA SALA DE REA

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
URPA (8)	Cama clínica con accesorios	16				
	Colchón de cama clínica	16				
	Almohada	16				
	Portasueros para cama clínica	16				
	Caudalímetro de oxígeno	16				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	16				
	Presurizador de suero	1				
	Regulador de vacío	1				
	Soporte de agua para lavado de sonda de aspiración	1				
	Soporte para monitor	1				
	Cuña con portacuñas	1				
	Palangana de baño metálica	1				
	Reloj calendario	1				
	Contenedor de sondas de aspiración	1				
	Carro para material de tres estantes inoxidable	1				
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	8				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Mesa cigüeña para comer	8				
	Carro de parada	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Negatoscopio de tres cuerpos	1				

OBSERVACIONES

Solo UNA SALA

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
URPA (8)	Cama clínica con accesorios	16				
	Colchón de cama clínica	16				
	Almohada	16				
	Portasueros para cama clínica	16				
	Caudalímetro de oxígeno	16				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	16				
	Presurizador de suero	1				
	Regulador de vacío	1				
	Soporte de agua para lavado de sonda de aspiración	1				
	Soporte para monitor	1				
	Cuña con portacuñas	1				
	Palangana de baño metálica	1				
	Reloj calendario	1				
	Contenedor de sondas de aspiración	1				
	Carro para material de tres estantes inoxidable	1				
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	8				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Mesa cigüeña para comer	8				
	Carro de parada	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Negatoscopio de tres cuerpos	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
URPA (8)	Cama clínica con accesorios	16				
	Colchón de cama clínica	16				
	Almohada	16				
	Portasueros para cama clínica	16				
	Caudalímetro de oxígeno	16				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	16				
	Presurizador de suero	1				
	Regulador de vacío	1				
	Soporte de agua para lavado de sonda de aspiración	1				
	Soporte para monitor	1				
	Cuña con portacuñas	1				
	Palangana de baño metálica	1				
	Reloj calendario	1				
	Contenedor de sondas de aspiración	1				
	Carro para material de tres estantes inoxidable	1				
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	8				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Mesa cigüeña para comer	8				
	Carro de parada	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Negatoscopio de tres cuerpos	1				

OBSERVACIONES

SOLO HAY UNA.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:			
INSPECTOR:		**COD. PARTE:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**FECHA:**	
		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
URPA (8)	Cama clínica con accesorios	16				
	Colchón de cama clínica	16				
	Almohada	16				
	Portasueros para cama clínica	16				
	Caudalímetro de oxígeno	16				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	16				
	Presurizador de suero	1				
	Regulador de vacío	1				
	Soporte de agua para lavado de sonda de aspiración	1				
	Soporte para monitor	1				
	Cuña con portacuñas	1				
	Palangana de baño metálica	1				
	Reloj calendario	1				
	Contenedor de sondas de aspiración	1				
	Carro para material de tres estantes inoxidable	1				
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	8				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Mesa cigüeña para comer	8				
	Carro de parada	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Negatoscopio de tres cuerpos	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
URPA (8)	Cama clínica con accesorios	16				
	Colchón de cama clínica	16				
	Almohada	16				
	Portasueros para cama clínica	16				
	Caudalímetro de oxígeno	16				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	16				
	Presurizador de suero	1				
	Regulador de vacío	1				
	Soporte de agua para lavado de sonda de aspiración	1				
	Soporte para monitor	1				
	Cuña con portacuñas	1				
	Palangana de baño metálica	1				
	Reloj calendario	1				
	Contenedor de sondas de aspiración	1				
	Carro para material de tres estantes inoxidable	1				
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	8				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Mesa cigüeña para comer	8				
	Carro de parada	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Negatoscopio de tres cuerpos	1				

OBSERVACIONES

SOLO HAY UNA.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
URPA (8)	Cama clínica con accesorios	16				
	Colchón de cama clínica	16				
	Almohada	16				
	Portasueros para cama clínica	16				
	Caudalímetro de oxígeno	16				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	16				
	Presurizador de suero	1				
	Regulador de vacío	1				
	Soporte de agua para lavado de sonda de aspiración	1				
	Soporte para monitor	1				
	Cuña con portacuñas	1				
	Palangana de baño metálica	1				
	Reloj calendario	1				
	Contenedor de sondas de aspiración	1				
	Carro para material de tres estantes inoxidable	1				
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	8				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Mesa cigüeña para comer	8				
	Carro de parada	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	EVA ORTEGA	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Antequirófano (4)	Cubo de basura de 25L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	2	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
Quirófanos (4) 1	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	2	X			
	Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	1	1	✓		
	Mesa auxiliar Mayo	1	X			
	Mesa instrumental 120x60 cms.	1	1	✓		
	Mesa riñonera	1	1	✓		
	Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	1	1	✓		
	Carro alto portapalanganas rodado	1	X			
	Carro bajo portapalanganas	1	1	✓		
	Carro de suturas	1	1	✓		
	Carro medicación anestesia	1	1	✓		
	Lámpara de quirófano (elemento fijo)	1	2	✓		
	Escalera 1 peldaño inoxidable	1	X			
	Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	1	1	✓		
	Pizarra blanca rotuladores	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	1	4		Convencionales	
	Taburete de acero inoxidable sin ruedas	1	X			
	Reloj	1	1	✓		
	Cestas alámbricas	1	1	✓		
	Carro de fungible	5	1	✓		
	Banquillos elevadores	1	X			
	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	1	X			
	Cubo alto con soporte giratorio	1	1	✓		
	Portasuero doble con ruedas	1	1	✓		
	Negatoscopio de cuatro cuerpos	2	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Antequirófano (4)	Cubo de basura de 25L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	2	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
Quirófanos (4) 2	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	2	X			
	Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	1	1	✓		
	Mesa auxiliar Mayo	1	X			
	Mesa instrumental 120x60 cms.	1	1	✓		
	Mesa riñonera	1	1	✓		
	Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	1	1	✓		
	Carro alto portapalanganas rodado	1	X			
	Carro bajo portapalanganas	1	1	✓		
	Carro de suturas	1	1	✓		
	Carro medicación anestesia	1	1	✓		
	Lámpara de quirófano (elemento fijo)	1	2	✓		
	Escalera 1 peldaño inoxidable	1	1	✓		
	Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	1	1	✓		
	Pizarra blanca rotuladores	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	1	2	✓ CONVENCIONALES		
	Taburete de acero inoxidable sin ruedas	1	2			
	Reloj	1	1	✓		
	Cestas alámbricas	1	1	✓		
	Carro de fungible	5	1	✓		
	Banquillos elevadores	1	X			
	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	1	X			
	Cubo alto con soporte giratorio	1	1	✓		
	Portasuero doble con ruedas	1	2	✓		
	Negatoscopio de cuatro cuerpos	2	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Antequirófano (4)	Cubo de basura de 25L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	2	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
Quirófanos (4) 3	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	2	X			
	Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	1	3	✓		
	Mesa auxiliar Mayo	1	X			
	Mesa instrumental 120x60 cms.	1	1	✓		
	Mesa riñonera	1	1	✓		
	Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	1	1	✓		
	Carro alto portapalanganas rodado	1	X			
	Carro bajo portapalanganas	1	1	es	oxidado	
	Carro de suturas	1	1	✓		
	Carro medicación anestesia	1	1	✓		
	Lámpara de quirófano (elemento fijo)	1	2	✓		
	Escalera 1 peldaño inoxidable	1	X			
	Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	1	1	✓		
	Pizarra blanca rotuladores	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	1	2	✓		
	Taburete de acero inoxidable sin ruedas	1	1	✓		
	Reloj	1	1	✓		
	Cestas alámbricas	1	1	✓		
	Carro de fungible	5	1	✓		
	Banquillos elevadores	1	X			
	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	1	X			
	Cubo alto con soporte giratorio	1	1	✓		
	Portasuero doble con ruedas	1	X			
	Negatoscopio de cuatro cuerpos	2	X			

OBSERVACIONES

Son taburetes convencionales

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Antequirófano (4)	Cubo de basura de 25L	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
Quirófanos (4) 4	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	2	X			
	Taburete giratorio regulable con respaldo y ruedas. Quirúrgico	1	1	✓		
	Mesa auxiliar Mayo	1	2	✓		
	Mesa instrumental 120x60 cms.	1	X	✓		
	Mesa riñonera	1	1	✓		
	Mesa mayo hidraúlica inoxidable con freno	1	X			
	Carro alto portapalanganas rodado	1	X			
	Carro bajo portapalanganas	1	1	✓		
	Carro de suturas	1	1	✓		
	Carro medicación anestesia	1	1	✓		
	Lámpara de quirófano (elemento fijo)	1	1	✓		
	Escalera 1 peldaño inoxidable	1	X			
	Mesa auxiliar con ruedas 60x40 cms de dos estantes	1	1	✓		
	Pizarra blanca rotuladores	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1			
	Taburete de acero inoxidable con ruedas	1	3	conexiones		
	Taburete de acero inoxidable sin ruedas	1	1			
	Reloj	1	1	✓		
	Cestas alámbricas	1	1	✓		
	Carro de fungible	5	1	✓		
	Banquillos elevadores	1	1	✓		
	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	1	X			
	Cubo alto con soporte giratorio	1	X			
	Portasuero doble con ruedas	1	1	✓		
	Negatoscopio de cuatro cuerpos	2	X			

OBSERVACIONES

El carro de anestesia y fungible y cestas es el mismo

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

25

PLANTA

ZONA DE ESTERILIZACIÓN

ZONA DE ESTERILIZACIÓN						
	Equipamiento de cada espacio	**Unidades**	**Comprobación Existencia (V / x)**	**Estado**		
				Bueno	**Roto**	**Deteriorado**
Recepción y distribución del material estéril (1)	Armario colgado tipo quirófano de 180 x 60 x 60 cm.	12	12	PO	TO	
	Racks almacenaje ML	10				
	Cesta de acero inoxidable 60 x 30 x 14	40	+80	V		
	Escalera con cinco peldaños y pies aislantes	1	X			
Recepción y clasificación del material sucio (1)	Papelera con tapa basculante de 50L	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Carro hermético para recogida de instrumental sucio	9	2	V		
Lavado de carros de transporte (1)	Sin mobiliario clínico					
Almacén de carros de transporte (1)	Carro de distribución material esteril tipo quirófano	9	10	V		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	**FECHA:**	22.10.14
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	13.13.

ASCA A. PLANTA 2.ª

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (10)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	✗			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	✗			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✗	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	✗	✓		

OBSERVACIONES

No hay dispensador de toallas, hay secador de manos

~~No hay colgador mural individual, hay en todos los aseos de la planta.~~

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTORA:	ANIUSKA MARTÍN	**FECHA:**	23/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ASEO 1 → 1 Planta 2

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (10)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Dispensador de toallas de papel	1	x			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	x			

OBSERVACIONES

- Secador eléctrico de manos

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADORA	Elia Quiroga	COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	22.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ASEO 2 - PLANTA 2 ♀

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (10)	Dispensador de jabón	1	√	√		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	√	√		
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	√	√		
	Colgador mural individual	1	~~X~~ 1	√		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	√	√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	√	√		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	~~X~~	√		

OBSERVACIONES

Secador de manos

- ~~[illegible]~~

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	[illegible]	FECHA:	22.10.12
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ASEO 3. PLANTA 2. ♀

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (10)	Dispensador de jabón	1	V	V		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	V	V		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	V	V		
	Dispensador de toallas de papel	1	V	V		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	V	V		
	Colgador mural individual	1	X	V		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	V	V		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	V	V		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X	V		

OBSERVACIONES

- Cubo de 12 l. sin pedal
- [illegible]

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ANUSKA MARTÍN	**FECHA:**	23/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ASEO 3 → Planta 2

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (10)	Dispensador de jabón	1	√	√		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	√	√		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Dispensador de toallas de papel	1	√	√		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	√	√		
	Colgador mural individual	1	√	√		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	√	√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	√	√		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	x	x		

OBSERVACIONES

· Cubo basura 12L sin pedal (manual)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ASEO 4 0+ . Planta 2

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (10)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	✓	✓	X	
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓			
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	2	✓	✓		
	Colgador mural individual	2	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	2	✓			
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓			
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	✓			

OBSERVACIONES

2. WC

Cubo de basura de 25 l de tapa oscilante (roña)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	[illegible]	FECHA:	22.10.12
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ASEO 3. PLANTA 2. ♀

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (10)	Dispensador de jabón	1	V	V		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	V	V		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	V	V		
	Dispensador de toallas de papel	1	V	V		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	V	V		
	Colgador mural individual	1	X	V		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	V	V		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	V	V		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X	V		

OBSERVACIONES

- Cubo de 12 l. sin pedal
- [illegible]

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ANUSKA MARTÍN	**FECHA:**	23/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ASEO 3 → Planta 2

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (10)	Dispensador de jabón	1	√	√		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	√	√		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Dispensador de toallas de papel	1	√	√		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	√	√		
	Colgador mural individual	1	√	√		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	√	√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	√	√		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	x	x		

OBSERVACIONES

· Cubo basura 12L sin pedal (manual)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ASEO 4 Of. Planta 2

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (10)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	✓	✓	X	
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓			
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	2	✓	✓		
	Colgador mural individual	2	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	2	✓			
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓			
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	✓			

OBSERVACIONES

2. WC

Cubo de basura de 25 l de tapa oscilante (roña)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

Aseo 4 → Planta 2

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (10)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	✓		✓	
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓			
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	~~1~~ 2	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	~~1~~ 2	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	✓	✓		

OBSERVACIONES

- 2 WC
- Cubo de basura de 25 L. sin tapa oscilante Rota

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HTC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	BÁRBARA MARTÍN	**FECHA:**	4/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA APOYO MÓDULO A-B-C PLANTA 2

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos pacientes (2)	Dispensador de jabón	2				
	Cubo de basura con pedal 12L	2				
	Cubo de basura con pedal 5L	2				
	Secamanos eléctrico	2				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	2				
	Colgador mural individual	2				
Zona polivalente de personal (2)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Silla fija con brazos	8				
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1				
	Papelera	1				
	Perchero de pie	1				
	Pizarra para rotulador de pared	1				
Almacén de material general (2)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	3				
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 m	~~15~~				
Almacén de lencería (2)	Carro de lencería	2				
Zona de utensilios de limpieza (2)	Estantería de pared de 3 estantes	1				
Aseos Personal (2)	Dispensador de jabón	1	1	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	2	—		
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	~~1~~	2	—		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	~~1~~	3	—		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	—		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Vestuarios personal (~~4~~ 2)	Carro de transporte de ropa sucia	~~2~~	X			
	Banco de vestidor	~~2~~	1	—		
	Armario ropero modular	~~18~~	X			
	Colgador para ropero	~~54~~	21	—		
	Papelera con tapa basculante de 50L	~~2~~	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	~~4~~	2	—		

OBSERVACIONES

1) Cubo basura 12L. T. oscilante (Deteriorado)
2) En Aseos de personal secamanos eléctrico (Bueno)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Inspección y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos pacientes (2)	Dispensador de jabón	2				
	Cubo de basura con pedal 12L	2				
	Cubo de basura con pedal 5L	2				
	Secamanos eléctrico	2				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	2				
	Colgador mural individual	2				
Zona polivalente de personal (2)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Silla fija con brazos	8				
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1				
	Papelera	1				
	Perchero de pie	1				
	Pizarra para rotulador de pared	1				
Almacén de material general (2)	Estantería de 180 x 100 cm. y 8 estantes	3	1	✓		
	Contenedor de almacén apilable 240/200x105x75 m	15	X			
Almacén de lencería (2)	Carro de lencería	2	X			
Zona de utensilios de limpieza (2)	Estantería de pared de 3 estantes	1	~~0~~ 1	✓		
Aseos Personal (2) ♀ ♂ 1	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	2	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	2	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	3	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Vestuarios personal ~~(1)~~ (2)	Carro de transporte de ropa sucia	2	X			
	Banco de vestidor	~~2~~	1	✓		
	Armario ropero modular	~~18~~	X			
	Colgador para ropero	54	16	✓		
	Papelera con tapa basculante de 50L	2	X			
	Colgador mural múltiple (módulo)	~~4~~	2	✓		

OBSERVACIONES

· Aseos de personal dentro de los vestuarios.
♂ 1 Secamanos eléctrico.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

BLOQUE OBSTÉTRICO 2ª PLANTA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	~~Alejandra Pantoja~~ J.C. GALEA.	FECHA:	29-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

OBSTETRICIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción y transfer de pacientes (1) (A)	Mostrador de recepción de 120-140 cm.	1	1	✓		
	Cajonera de mostrador	1	X			
	Silla giratoria con ruedas alta	1	X			
	Cortinaje de separación	8	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
Consultorio con aseo (2) 1	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X	X		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Silla fija con brazos	2	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X	✓		
	Camilla de exploración ginecológica	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	X			
	Carro de historias clínicas	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X	X		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		
	Aseo: el descrito para los aseos de habitaciones de pacientes	1	1	✓		
Sala de monitorización (2) ~~2~~ 3	Camillas	1	1	✓		
	Mueble para soporte de monitores	1	1	✓		
	Mueble clínico con doble pila encastrado (elemento fijo)	~~1~~	1	✓		

OBSERVACIONES

Aseo consultorio 1:
- 1 Dispensador jabón
- 1 Dispensador de toalla
- 1 Lavabo con tapisa
- 1 Espejo cristal
- 1 Cubo basculante 5 L

La sala de monitorización se encuentran en el área de consultas de ginecología

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

No se encuentra en este bloque del hospital, y sólo hay 1.

Actualmente, esta sala y una sala de dilatación es urgencias, inventariado al final.

- 1 Mural de apoyo
- 1 Escobilla
- 1 Apoyo de pared
- 1 Dispensador de papel

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

OBSTETRICIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Recepción y transfer de pacientes (1)	Mostrador de recepción de 120-140 cm.	1				
	Cajonera de mostrador	1				
	Silla giratoria con ruedas alta	1				
	Cortinaje de separación	8				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
Consultorio con aseo (2) 2	Negatoscopio de tres cuerpos	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	✗	✗		
	Foco de exploración de pie	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	✓	✓		
	Silla fija con brazos	2	✗	✗		
	Taburete giratorio con ruedas	1	✗			
	Camilla de exploración ginecológica	1	✓	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	✓	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	✗			
	Carro de historias clínicas	1	✗			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	✗	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	✓	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	✗	✗		
	Papelera	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	✗			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	✗	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)	1	✓ ✗	✓		
	Aseo: el descrito para los aseos de habitaciones de pacientes	1	1	✓		
Sala de monitorización (1) (2)	Camillas	1	1	✓		
	Mueble para soporte de monitores	1	1	✓		
	Mueble clínico con doble pila encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

Aseo del Consultorio 2:
- 1 Dispensada de jabón
- 1 Dispensada de Toallas
- 1 Lavabo con repisa
- 1 Cubo basculante de 5 L
- 1 Carro de lencería
- 1 Espejo encastrado
- 1 Escobilla
- 1 Dispensada de papel higiénico

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	~~Alejandro Parrilla~~ J.C. GARCÍA	FECHA:	29-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

02

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
Salas para dilatación, parto y recuperación (6) Box 03	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X	X		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X	X		
	Foco de exploración de pie	1	1	/		
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	/		
	Cama clínica eléctrica	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		✓ (x)	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Box 01 Urgencias

1 Cama eléctrica ~~completa~~ clínica
1 Silla de exploración ginecológica
1 Foco de exploración de pie
1 Dispensada de jabón
1 Dispensada de toallas
Poyata (Equipamiento fijo)

Box 02 Urgencias

1 Cama eléctrica clínica
1 Silla de exploración ginecológica
1 Dispensada de jabón
1 Dispensada de toallas
1 taburete giratorio con ruedas
1 Foco de exploración de pie
Poyatas de equipamiento fijo
1 Cuartos lavables

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas para dilatación, parto y recuperación (6) Box 02	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X	X		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X	-		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X	X		
	Cama clínica eléctrica	1	1	-		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Box 04

1 Foco de Exploración
1 Dispensador de jabón
1 Dispensador de toalla de papel
1 Cama clínica eléctrica
1 Poyata Equipamiento fija

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso . J.C. GARCÍA	**FECHA:** 29-11-A	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

05

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas para dilatación, parto y recuperación (6) Box 5	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	2	✓		
	Cama clínica eléctrica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X 1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

06

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas para dilatación, parto y recuperación (6) BOX 06	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X	/		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Cama clínica eléctrica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X 1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro X Paraiso JC GARCÍA	FECHA:	29-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

07

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (v / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas para dilatación, parto y recuperación (6) Box 07	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X	—		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X	—		
	Foco de exploración de pie	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X	—		
	Cama clínica eléctrica	1	1	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Pasaico	**FECHA:**	29-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

08

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas para dilatación, parto y recuperación (6) Box 08	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X	X		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	✓	✓		
	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Cama clínica eléctrica	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		✓ (3)	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA 2d

MANRIQUEZ (SUPERVISOR QUIRÓFANO)

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

REALIZA X 2º VEZ X JUAN CARLOS

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	~~Alejandro Paraíso~~ ANUSKA M.	FECHA:	29-11-19
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ZONA DE ANESTESISTAS

dentro del BLOQUE OBSTÉTRICO

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado Bueno	Estado Roto	Estado Deteriorado
Aseos Personal (2) 2	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X	X		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Despacho de supervisión (1) 1	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	3	✓		
	Silla fija	2	8 X	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	4 2	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	4 3	✓		
	Papelera	1	4 2	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1 2	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		
Sala de reuniones (1) 3	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	X	✓		
	Silla fija con brazos	8	1	✓		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	✓		
	Papelera	1	2	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

ZONA DE ANESTESISTAS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos Personal (2) 2	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
Despacho de supervisión (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Silla fija	2				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Papelera	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Perchero de pie	1				
Sala de reuniones (1)	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1				
	Silla fija con brazos	8				
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1				
	Papelera	1				
	Perchero de pie	1				
	Pizarra para rotulador de pared	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho anestesista (5) 4	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	3			
	Silla fija	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	2	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	2	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	2	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		

TALLER MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

Actualmente esta habitación
- Cama eléctrica completa
- foco exploración
- ~~silla fija~~.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

***Según documentación sería dicho equipamiento, pero se requiere comprobar in situ**

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

2

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho anestesista (5) 5	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	2	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

***Según documentación sería dicho equipamiento, pero se requiere comprobar in situ**

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

3

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho anestesista (5) 6	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Silla fija	2	3			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1			
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	X			
	Papelera	1	1			
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1			
	Perchero de pie	1	1			
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR	**RESPONSABLE INSTALACIÓN**		

***Según documentación sería dicho equipamiento, pero se requiere comprobar in situ**

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despacho anestesista (5) 8	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Silla fija	2	1	~		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	X			
	Papelera	1	1	~		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	~		
	Perchero de pie	1	X			
	OBSERVACIONES · Camilla litera con un solo somier y colchón.					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

***Según documentación sería dicho equipamiento, pero se requiere comprobar in situ**

Planta 2 Módulo B

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Elia Quiroga	FECHA:	23.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B-231

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X	X		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA DURÁN A	**FECHA:**	23.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

B232

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / X)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	V			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	V			
	Colchón de látex para cama clínica	1	V			
	Almohada para cama clínica	1	V			
	Portasueros rodado	1	V			
	Porta-sueros para cama clínica	1	V			
	Caudalímetro de oxígeno	1	V		V	
	Regulador de vacío	1	V		V	
	Esfigmomanómetro de pared	1	V			
	Soporte de termómetro	1	V			
	Mesita de noche clínica	1	V		V	
	Mesa cigüeña para comer	1	V		V	
	Sofá-cama 2 m.	1	V		V	
	Butaca paciente/acompañante	1	V			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	V			
	Silla fija	1	V		V	
	Cuadro decoración pared	1	V		V	
	Colgador para ropero	4	V			
	Papelera metálica	1	V		V	
	Cubo de basura con pedal 5L	1	V			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	V	V		
	Sujeta toallas de ducha	1	V	V		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	V			
	Palangana de aseo metálica	1	V			
	Botella	1	V			
	Escobilla WC	1	V	V		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	V	V		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	V	V		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	V			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	V	V		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	V	V		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:	ELIA 001206A	**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	23.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

B-233

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	V		
	Regulador de vacío	1	1	V		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	V		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	V		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	V		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	1	V		
	Cuadro decoración pared	1	1	V		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	V		
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	V		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	V		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	V		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	V		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	V		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	V		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	V		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Elia Ortega	**FECHA:**	23.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

B.234

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	V		
	Regulador de vacío	1	1	V		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	V		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	V		
	Sofá-cama 2 m.	1	1	V		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	V		
	Silla fija	1	1	V		
	Cuadro decoración pared	1	1	V		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	V		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	V		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	V		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	V		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	V		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	V		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	V		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	V		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	EVA QUIROGA	FECHA:	23.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B-235

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	√			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	√			
	Colchón de látex para cama clínica	1	√			
	Almohada para cama clínica	1	√			
	Portasueros rodado	1	√			
	Porta-sueros para cama clínica	1	√			
	Caudalímetro de oxígeno	1		√		
	Regulador de vacío	1		√		
	Esfigmomanómetro de pared	1	√	√		
	Soporte de termómetro	1	√	√		
	Mesita de noche clínica	1	√	√		
	Mesa cigüeña para comer	1	√	√		
	Sofá-cama 2 m.	1		√		
	Butaca paciente/acompañante	1	√			
	Sillón ergonómico para pacientes	1		√		
	Silla fija	1		√		
	Cuadro decoración pared	1		√		
	Colgador para ropero	4	√			
	Papelera metálica	1		√		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	√			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1		√		
	Sujeta toallas de ducha	1		√		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	√			
	Palangana de aseo metálica	1	√			
	Botella	1	√			
	Escobilla WC	1		√		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1		√		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1		√		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	√			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1		√		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1		√		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	23.11.12
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B.236 HP

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	✓			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	✓			
	Colchón de látex para cama clínica	1	✓			
	Almohada para cama clínica	1	✓			
	Portasueros rodado	1	✓			
	Porta-sueros para cama clínica	1	✓			
	Caudalímetro de oxígeno	1	✓	✓		
	Regulador de vacío	1	✓	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	✓	✓		
	Soporte de termómetro	1	✓			
	Mesita de noche clínica	1	✓	✓		DESPINTADA
	Mesa cigüeña para comer	1	✓	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	✓	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	✓			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	✓	✓		
	Silla fija	1	✓	✓		
	Cuadro decoración pared	1	✓	✓		
	Colgador para ropero	4	✓	✓		
	Papelera metálica	1	✓			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	✓	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	✓			
	Palangana de aseo metálica	1	✓			
	Botella	1	✓			
	Escobilla WC	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	✓			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	✓	✓		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Eva Quiroga	**FECHA:**	23.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

B237

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	V	✓		
	Juego de barandillas para cama clínica	1	V	✓		
	Colchón de látex para cama clínica	1	V	✓		
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	V	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	V	✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	V	✓		
	Regulador de vacío	1	V	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	V	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	V	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	V	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	V	✓		
	Silla fija	1	V	✓		
	Cuadro decoración pared	1	V	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	V	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	V	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	V	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	V	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	V	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	V	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	V	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	V	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Elie Quiroga	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B.23A

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1				
	Juego de barandillas para cama clínica	1				
	Colchón de látex para cama clínica	1				
	Almohada para cama clínica	1				
	Portasueros rodado	1				
	Porta-sueros para cama clínica	1				
	Caudalímetro de oxígeno	1				
	Regulador de vacío	1				
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1				
	Mesa cigüeña para comer	1				
	Sofá-cama 2 m.	1				
	Butaca paciente/acompañante	1				
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1				
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Sujeta toallas de ducha	1				
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1				
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELÍA QUIROGA	FECHA:	23.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B.239 Pole mesa igual ~~[illegible]~~ 236

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	X			
	Regulador de vacío	1	/	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	/	✓		(DESPLAZADA)
	Mesa cigüeña para comer	1	/	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	/	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	/	✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	/	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	/	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	/	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	/	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	/	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	/	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	/	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	/	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	**FECHA:**	23.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

B240

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1		✓		
	Caudalímetro de oxígeno	1	X			
	Regulador de vacío	1	X			
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1		✓		
	Mesa cigüeña para comer	1		✓		
	Sofá-cama 2 m.	1		✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1		✓		
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1		✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1		✓		
	Sujeta toallas de ducha	1		✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1		✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1		✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1		✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1		✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1		✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR/A	ELVA QUIROGA	FECHA:	23.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B294

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	1	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADORA	ELIA QUIRÓFA	**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	23.11.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

B 242 : todo

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	X			
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	V		
	Regulador de vacío	1	1	V		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Sofá-cama 2 m.	1	1	V		
	Butaca paciente/acompañante	1	1	V		
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	-1	V		
	Papelera metálica	1	1	V		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	V		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	V		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	V		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1		V	(roto)
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	V		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	V		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	V		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parrilla	FECHA:	23-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B243

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	X 1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	X			
	Mesa cigüeña para comer	1	X			
	Sofá-cama 2 m.	1	1	✓		
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	1	✓		
	Silla fija	1	X			
	Cuadro decoración pared	1	X			
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso	FECHA:	28-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

B244

	Equipamiento	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Habitación doble / uso individual (130)	Cama clínica eléctrica con accesorios	1	X			
	Juego de barandillas para cama clínica	1	X			
	Colchón de látex para cama clínica	1	X			
	Almohada para cama clínica	1	X			
	Portasueros rodado	1	~~X~~ 1	✓		
	Porta-sueros para cama clínica	1	X			
	Caudalímetro de oxígeno	1	1	✓		
	Regulador de vacío	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de pared	1	X			
	Soporte de termómetro	1	X			
	Mesita de noche clínica	1	1	✓		
	Mesa cigüeña para comer	1	1	✓		
	Sofá-cama 2 m.	1	X			
	Butaca paciente/acompañante	1	X			
	Sillón ergonómico para pacientes	1	X			
	Silla fija	1	1	✓		
	Cuadro decoración pared	1	1	✓		
	Colgador para ropero	4	X			
	Papelera metálica	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Aseos de la habitación					
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Sujeta toallas de ducha	1	1	✓		
	Cuña de acero inoxidable con soporte	1	X			
	Palangana de aseo metálica	1	X			
	Botella	1	X			
	Escobilla WC	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para objetos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Accesorios de ducha (elemento fijo)	1	1	✓		
	Abrazadera en pared (elemento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA 2ª

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	~~Alejandro~~ Paraíso	FECHA: 29-11-17	1.12.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA: 11:15	

↳ DEVIA QUIROGA

BANCO DE SANGRE

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado Bueno	Estado Roto	Estado Deteriorado
Sala de Espera (1)	Sillas modulares	15	6	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm. *	3	3	✓		
	Cuadro decoración pared	3	3	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	1	✓	sin fecha	
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Expositor de folletos	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
Depósito de sangre (1)	Equipamiento médico específico	1		/		
Sala de aferesis (1)	Taburete giratorio alto con respaldo	2		/		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			

OBSERVACIONES

Banco de sangre y laboratorio comparten sala de espera. ~~Depósito de sangre y sala de aferesis están solo en el banco de sangre, no hay en el laboratorio~~

* 3 mesas:
2 mesas de 90x60 cm
1 mesa de 65x65 cm

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

El laboratorio de coagulación syntron, está, dentro del banco de sangre.
La sala de espera del laboratorio esta dentro y también se usa como sala de recuperación.
En la 1º planta hay otra área de laboratorio coagulación Syntrón.

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

LABORATORIO

COAGULACIÓN (SYNTRON)

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de Espera (1)	Sillas modulares	15				
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	3				
	Cuadro decoración pared	3				
	Reloj de pared con fecha	1				
	Carro de historias clínicas	1				
	Expositor de folletos	1				
	Papelera	1				
Depósito de sangre (1)	Equipamiento médico específico	1				
Sala de aferesis (1)	Taburete giratorio alto con respaldo	2				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					

Planta 1

OBSERVACIONES

La sala de espera, actualmente se usa también como sala de recuperación, cuenta con:

- 6 butacas
- 3 sillas fijas
- 3 cuadros
- 1 papelera

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

- No hay sala de aferesis en laboratorio Syntron, está en la planta 1.

2º PLANTA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Ramírez	**FECHA:**	24-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de espera familiares (6) 2º C	Sillas modulares	20	19 sillas	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de ~~80 x 50 cm.~~ 90x60	4	1	✓		
	Cuadro decoración pared	6	X			
	Jardinera	1	X			
	Soporte para posters de campañas	1	X			
	Expositor de folletos	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1	X			
Aseos públicos (8) PLANTA 2 (C)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo) 1	1	X			
Despacho de información (6) 2ª [illegible]	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1			
	Silla fija con brazos	2	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parra 30	FECHA:	24-1-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de espera familiares (6) 2º B	Sillas modulares	20	1 descolocadas	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	4	x			
	Cuadro decoración pared	6	1	✓		
	Jardinera	1	x			
	Soporte para posters de campañas	1	1	✓		
	Expositor de folletos	1	x			
	Papelera	1	1	✓		
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1	x			
Aseos públicos (8) PLANTA 2 (A)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	x			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo) 1	1	x			
Despacho de información (6) 2ª G	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	x			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	x			
	Silla fija con brazos	2	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Parrales	**FECHA:**	24-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
2ª Planta Bloque A **Sala de espera familiares (6)** 2ª Planta Bloque Quir.	Sillas modulares	20	1 X	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	4	1 X	✓		
	Cuadro decoración pared	6	X 3			
	Jardinera	1	X X			
	Soporte para posters de campañas	1	1 X	✓		
	Expositor de folletos	1	X X			
	Papelera	1	1 X	✓		
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1	X X			
Aseos públicos (8) 2ª Planta A. Quirúrgica	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo) 1	1	X			
Despacho de información (6) 2º B	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Silla fija con brazos	2	X			
	Papelera	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA SEGUNDO

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR: DS	TODOS / TODAS	FECHA:	29.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	14:30

SOPORTE MÉDICO

DESPACHOS MÉDICOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Seniors con despachos compartidos (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	60	94	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	60	82	/		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	60	89	/		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	60	78	/		
	Silla fija	60	97	/		
	Papelera	60	73	/		
Salas de comisiones médicas (1)	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	2	✓		
	Silla fija con brazos	4	2	✓		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	X			
	Papelera	1	2	✓		
	Perchero de pie	1	1	✓		
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	✓		
Sala de reuniones (7) (1)	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	8	5	✓		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	✓		

OBSERVACIONES

- Inventariados todos los despachos sobre anexo 6; sobre plano faltan los despachos de dirección médica y enfermería (mismas características) x inventariar.
- Faltan despachos en la zona de gerencia (mismas características), q no están en Anexo 6.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

DESPACHOS MÉDICOS

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ANUSKA MARTIN	**FECHA:**	29/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
(1) Jefes de Servicio (8)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	2	/		
	Ala de 1 m. para mesa	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	3	/		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	2	/		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	X			
	Silla fija	2	X			
	Papelera	1	/	/		
(2) Sala de reuniones (7) Despachos	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	8	2	/		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	X			
	Papelera	1	2	/		
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	X			
(2) Jefes de Servicio (8)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Ala de 1 m. para mesa	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	1	/		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	/		
	Silla fija	2	/	/		
	Papelera	1	/	/		
(3) Sala de reuniones (7)	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	1	/		
	Silla fija con brazos	8	14			
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	/		
	Papelera	1	2	/		
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	/	/		
(3) Jefes de Servicio (8)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	/	/		
	Ala de 1 m. para mesa	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	/	/		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	/	/		
	Silla fija	2	3	/		
	Papelera	1	/	/		
(4) Sala de reuniones (7)	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	1	/		
	Silla fija con brazos	8	1	/		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	/		
	Papelera	1	1	/		
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	/		
(4) Jefes de Servicio (8) Urología.	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	3	/		
	Ala de 1 m. para mesa	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	/	/		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	4	/		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	/	/		
	Silla fija	2	4	/		
	Papelera	1	/	/		

OBSERVACIONES

S.R. (2) - 2 mesas (140 x 80
- Colgador multiple.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
(5) Jefes de Servicio (8)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	2	/		
	Ala de 1 m. para mesa	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	2	/		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	/		
	Silla fija	2	4	/		
	Papelera	1	1	/		
(5) Sala de reuniones (7) Concesionaria	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	8	1	/		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	X			
	Papelera	1	3	/		
	Perchero de pie	1	1	/		
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	/		
(6) Jefes de Servicio (8)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Ala de 1 m. para mesa	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2	/		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	2	/		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	/		
	Silla fija	2	X			
	Papelera	1	1	/		
(6) Sala de reuniones (7)	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	1	/		
	Silla fija con brazos	8	10	/		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	1	/		
	Papelera	1	1	/		
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	1	/		
(7) Jefes de Servicio (8)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Ala de 1 m. para mesa	1	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	1	/		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	/		
	Silla fija	2	1	/		
	Papelera	1	1	/		
(9 en plano) Sala de reuniones (7)	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1	X			
	Silla fija con brazos	~~8~~	4	—		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	1	—	—		
	Papelera	1	—	—		
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1	—	—		
(8) Jefes de Servicio (8)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	2	/		
	Ala de 1 m. para mesa	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	2	/		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	~~1~~	2	/		
	Silla fija	2	3	/		
	Papelera	1	1	/		

OBSERVACIONES

SR (5) → 4 armarios de 1'80
3. sillas gira. brazo
3. mesas. 1'40 x 80
2. estanterías de 2'00 mt.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

SEGUNDA PLANTA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	29.11.17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	15:15

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

GERENCIA Y DIRECCIÓN DE GESTIÓN

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
1	Mesa de trabajo de 160 x 80 x 74 cm.	1	1	V		
	Ala de 1 m. para mesa	1	X 1	V		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	V		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	V		
	Mesa de trabajo redonda de 120 cm.	1	X			
	Silla fija	4	6	V		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	2	1	V		
Despachos tipo de Gerencia (1)	Sofá 2 plazas	1	1	V		
	Sofá 1 plaza	1	2	V		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	1	1	V		
	Perchero de pie	1	1	V		
	Cuadro decoración pared	2	3	V		
	Jardinera	1	X			
	Papelera	1	1			
2	Mesa de trabajo de 160 x 80 x 74 cm.	1	1	V		
	Ala de 1 m. para mesa	1	1	V		
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	1	V		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	V		
	Mesa de trabajo redonda de 120 cm.	1	X			
Despacho tipo de Dirección de Gestión (1)	Silla fija	1	6	V		
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	2	V		
	Perchero de pie	1	1	V		
	Cuadro decoración pared	1	4	V		
V	Jardinera	1	X			
	Papelera	1	1	V		
3	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	2	V		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	2	V		
	Ala de 1 m. para mesa	1	1	V		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
Despacho tipo de apoyo (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2	V		
	Reloj de pared con fecha	1	1	V		
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Papelera	1	2	V		
4 V	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	1	V		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	2	V		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	2	V		
Zona de trabajo administrativo (1)	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	V		
	Silla fija	1	2	V		
	Papelera	1	1	V		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

- Inventariado todo el anexo 6. pero sobre plano faltan los despachos de dirección medica y enfermeria.

- Faltan tambien despachos de la zona de gerencia.

MEC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Secretarias médicas (4)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Silla fija	1				
	Plafón de corcho	1				
	Papelera	1				
Aseos Personal (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
Secretarias médicas (4)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Silla fija	1				
	Plafón de corcho	1				
	Papelera	1				
Aseos Personal (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				

VACÍO

VACÍO

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	BLANCA MARÍN	**FECHA:**	29/11/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Secretarias médicas (4) (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1	VACÍO			
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Silla fija	1				
	Plafón de corcho	1				
	Papelera	1				
Aseos Personal (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
Secretarias médicas (4) (2)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	VACÍO			
	Silla fija	1				
	Plafón de corcho	1				
	Papelera	1				
Aseos Personal (4)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

PLANTA SEGUNDA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Fariñas	**FECHA:**	29-11-12
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

INVESTIGACIÓN

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Despachos (4)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	X			
	Silla fija	1				
	Papelera	1				
Despachos (4)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	X			
	Silla fija	1				
	Papelera	1				
Despachos (4)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1	X			
	Silla fija	1				
	Papelera	1				
Despachos (4)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Armario altura 200 X 80 x 40 cm.	1				
	Cajonera de tres cajones con ruedas	1				
	Silla fija	1				
	Papelera	1				
Salas de trabajo (1)	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	1				
	Silla fija con brazos	12	10			
	Mesa reuniones 350 x 120 x 74 cm. (12 personas)	1				
	Papelera	1				
	Perchero de pie	1	X			
	Pizarra para rotulador de pared	1				
Secretaría (1)	Mostrador de información de 200-240 cm.	1	X			
	Cajonera de mostrador	2				
	Silla giratoria con ruedas alta	2				
	Armario 125 x 80 x 40 cm. con puertas completas	2				
	Papelera	1				
	Reloj de pared con fecha	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Almacén general (1)	Estantería metálica 5/6 niveles ML	10	✓	✓		
	Escalera con tres peldaños y pies aislantes	1	✓	✓		
Aseos personal (2)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Dispensador de papel higiénic o rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
Aseos personal (2)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Dispensador de papel higiénic o rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR		**RESPONSABLE INSTALACIÓN**	

PLANTA ~~PLANTA~~ SEGUNDA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Alejandro Parrilla	**FECHA:**	29-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

FORMACIÓN Y DOCENCIA

ZONA DOCENCIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aulas pequeñas (2)	Mesa cabecera aula 250 x 90 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Silla fija con brazos	30	✓			
	Papelera	1	✓	✓		
	Perchero de pie	1	✓			
	Pizarra para rotulador de pared	1	✓			
Aulas pequeñas (2)	Mesa cabecera aula 250 x 90 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Silla fija con brazos	30	✓			
	Papelera	1	✓	✓		
	Perchero de pie	1	✓			
	Pizarra para rotulador de pared	1	✓	✓		
Aulas grandes (1)	Mesa cabecera aula 250 x 90 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Silla fija con brazos	60	✓			
	Papelera	1	✓	✓		
	Perchero de pie	1	✓			
	Pizarra para rotulador de pared	1	✓	✓		
	Pantalla proyección	1	✓	✓		
Aulas informática (1)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	✓			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	✓			
	Mesa de trabajo de 160 x 80 x 74 cm.	8	✓	✓		
	Silla fija	30	✓	✓		
	Pizarra para rotulador de pared	1	✓	✓		
	Papelera	1	✓	✓		
Aulas demonstraciones enfermería (1)	Mesa cabecera aula 250 x 90 x 74 cm.	1	✓	✓		
	Silla fija con brazos	30	✓			
	Papelera	1	✓	✓		
	Perchero de pie	1	✓			
	Pizarra para rotulador de pared	1	✓			
(Aula multimedia) **Seminario (1)** ~~AULA~~	Armario altura 74 x 80 x 40 cm.	5	✓			
	Silla fija con brazos	40	✓	✓		
	Mesa reuniones 250 x 120 x 74 cm. (8 personas)	5	✓	✓		
	Reloj de pared con fecha	5	✓	✓		
	Carro de historias clínicas	5	✓			
	Pizarra para rotulador de pared	5	✓			
Salón de actos y conferencias (1)	Instalación fija específica	1	✓			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTORA:	SILA QUIROGA	FECHA:	1-12-12
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	13'00

~~[illegible]~~ CIRUGIA CX

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Consulta	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2	cuerpos	
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	3	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
Salas de consulta con exploración (65) 04	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1		sin	pedal	tapa
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

OFTALMOLOGÍA

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Consulta 07 Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	2	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2			
	Taburete giratorio con ruedas	1	2	✓		
	Litera de exploración	1	0	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

CIRUGÍA CX

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consult. 08.	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CX

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 02	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	1	V		
	Foco de exploración de pie	1	1	V		
	Juego estándar de curas	3	3	V		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	V		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	V		
	Silla fija	2	2	V		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	V		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	V		
	Litera de exploración	1	1	V		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	V		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	V		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	V		
	Carro de curas con cajones	1	1	V		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	V		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	V		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X	V		
	Papelera	1	1	V		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	Sin	pedal	
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Elia Quiroga	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 07	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR: A	Elia QUIROGA	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

ALUCA C4

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 06	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpo		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	V		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	V		
	Silla fija	2	2	V		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	V		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1	V		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	V		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	V		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	V		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	V		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	V		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR/A	ANIUSKA	**FECHA:**	5.12.2024
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 01 CX	Negatoscopio de tres cuerpos 2c	1	1	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	/		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	/		
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	/		
	Juego estándar de curas	2	1	/		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	/		
	Silla fija	2	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	/		
	Litera de exploración	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	/		
	Escabel	1	1	/		
	Cortinaje de exploración	1	1	/		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	/		
	Carro de curas con cajones	1	1	/		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	/		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

Consultas CX.

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 3 CX	Negatoscopio de tres cuerpos 2.C	1	1	1		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	✓		
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	~~1~~	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	~~0~~	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	~~0~~	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1			
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ANIUSKA	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 9 CX	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla fija	2	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (5) CX	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR	**RESPONSABLE INSTALACIÓN**		

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CIRUGÍA VASCULAR

NO existe

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala dopler vascular periférico (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	1				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Armario endoscopia	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
	Gavetas para material fungible	1				

OBSERVACIONES

~~Ahor~~ En la actualidad corresponde con la consulta 9 del área de Traumatología

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

- CIRUGÍA VASCULAR NO EXISTE EN ESTE HOSPITAL.

HFC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	**FECHA:**	1.12.2021
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

OFTALMOLOGÍA (7)

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala campimetría (1) Corresponde con la consulta 8 1	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1		sin cristal	
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	✓		
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	2	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	✓		
Sala láser oftalmológico (1) 2 Corresponde con consulta 1	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	3			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	1		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			
Sala angiografía (1)	Equipamiento técnico específico					
Sala refractometría (2)	Equipamiento técnico específico					
Sala refractometría (2)	Equipamiento técnico específico					

OBSERVACIONES

No hay sala 2 refractometría, esta en consulta 8

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

OFTALMOLOGÍA

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 02	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	✓			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	✓			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

OFTALMOLOGÍA

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) 03	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 (1 cuerpo)		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	2	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR		**RESPONSABLE INSTALACIÓN**	

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

OFTALMOLOGIA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Consulta 04	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1			
	Dispensador de toallas de papel	1	1			
Salas de consulta con exploración (65)	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	X	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

OFTALMOLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 05	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	2 cuerpos		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1			
	Dispensador de toallas de papel	1	1			
	Silla fija	2	2			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	**FECHA:**	5.12.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	12:00

ANATOMÍA PATOLÓGICA

2ª ~~PLANTA~~ (~~laboratorio banco sangre~~)

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
PAAF (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	3 1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1		✓	ROTO
	Escabel	1	1			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Papelera	1	1			
	Cubo de basura con pedal 12L SOL	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	X			
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		

Punción aspiración con aguja fina.

OBSERVACIONES

→ Se encuentra en Hospital de día y se realizan en la Sala técnica

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HJC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	BRUSKA MARTÍN	FECHA:	1/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

OTORRINOLARINGOLOGÍA (12)

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
Salas audiometría (3) Consulta (3) 070	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	—		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	—		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	—		
	Gavetas para material fungible	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			

OBSERVACIONES

- Dispensador alcohol-gel
- Sala con maquinaria especifica para pruebas audiometria.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

- SOLO HAY UNA SALA ESPECIFICA DE AUDIOMETRIA.
- EN VARIAS CONSULTAS HAY FILMAS ESPECIFICAS DE EXPLORACIÓN

H 5C

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	BLUSKA MARTIN	**FECHA:** 1/12/2017	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

OTORRINOLARINGOLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas audiometría (3) Consulta 5	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Gavetas para material fungible	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

OTORRINOLARINGOLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
OTO Sala pruebas nasales. Consulta (9)	Negatoscopio de tres cuerpos 2 uds	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	2	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	~~Salas audiometría (3)~~ Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	1	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	✓		

OBSERVACIONES

- Silla de exploración eléctrica

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HJC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	DULUSKA MARTÍN	FECHA:	1/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de Exploraciones funcionales (2) Consulta 1 OTO	Negatoscopio de tres cuerpos Zoveno	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Gavetas para material fungible	1	X			
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	✓		

OBSERVACIONES

- Silla exploración

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de Exploraciones funcionales (2) Consulta 2 OTO	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	/		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	/		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	/		
	Gavetas para material fungible	1	1	/		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			

OBSERVACIONES

- Camilla electrica

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HFC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELISABET MARTÍN	**FECHA:**	1/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 4 OTO	Negatoscopio de tres cuerpos Zuera	1	1	—		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	—		
	Juego estándar de curas	2	1	—		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	—		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	—		
	Silla fija	2	1	—		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X1	—		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	—		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	—		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	—		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos 2 uds	1	✓	—		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	✓	—		
	Juego estándar de curas	8	X			
	Juego de bandejas	1	X			
ROTO	Dispensador de jabón	1	✓		—	
	Dispensador de toallas de papel	1	✓	—		
	Silla fija	2	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	✓	—		
	Litera de exploración	1	✓	—		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
Consulta 6 OTO	Escabel	1	✓	—		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	✓	—		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	✓	—		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	✓	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	✓	—		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	FECHA:	1/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla fija	2	X	—		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Taburete giratorio con ruedas	1	X	—		
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X	—		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	X			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

Consulta 05

FOTO

OTO

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (7) OTO	Negatoscopio de tres cuerpos 2 cuerpo	1	1	/		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	V			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	/		
	Juego estándar de curas	8	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	/		
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla fija	2	1	/		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	/		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	8	1	/		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	/		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	/ /		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1 1	/ /		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta (8) OTO	Negatoscopio de tres cuerpos 2 cuerp.	1	1			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1			
	Juego estándar de curas	8	1			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1			
	Dispensador de toallas de papel	1	1			
	Silla fija	2	1			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1			
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1			

OBSERVACIONES

* Silla exploración

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

OTO

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 10 OTO	Negatoscopio de tres cuerpos 2 cuerpos	1	1	1		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	1		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	1	1		
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	1		
	Juego estándar de curas	~~3~~	1	1		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	1		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	1		
	Silla fija	2	1	1		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	1		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	1		
	Litera de exploración	1	1	1		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	1		
	Escabel	1	1	1		
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	1		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	~~0~~	1	1		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	1		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	11		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	1		
	OBSERVACIONES					

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

HIC CONSULTAS (4) SALUD LABORAL

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

2ª Pta

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Consulta salud laboral (1)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	X			
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	0	1	—		
	Reloj de pared con fecha	1	X			
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	X			
	Silla fija	2	1	—		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	/	/		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1	—		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	X			
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	X			
	Carro de curas con cajones	1	1	—		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	X			
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	—		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	—		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		X			
Atención a domicilio (1)	Negatoscopio de tres cuerpos					
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared					
	Báscula de pie con altímetro					
	Foco de exploración de pie					
	Juego de bandejas					
	Dispensador de jabón					
	Dispensador de toallas de papel					
	Silla fija					
	Silla giratoria con brazos y ruedas					
	Taburete giratorio con ruedas					
	Litera de exploración					
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera					
	Escabel					
	Cortinaje de exploración					
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas					
	Carro de curas con cajones					
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.					
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.					
	Cajonera colgante de dos cajones					
	Papelera					
	Cubo de basura con pedal 12L					
	Perchero mural múltiple (módulo)					
	Reloj de pared con fecha					
	Carro de historias clínicas					

NO EXISTE ESTE SERVICIO

OBSERVACIONES

- Consulta en planta 2.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

JMC

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	ELIA CORDOBA / JOSE CARLOS G.	FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

PRIMERA

PLANTA

PLAN DE EQUIPAMIENTOS - GABINETES TÉCNICOS

CARDIOLOGÍA (1)

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala monitorización Holter (1) Consulta C	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	4	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	3	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo) Gavetas para material fungible	1	X	X		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	GUA QUIROGA / DUNSKA MART	FECHA:	1/12/2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado Bueno	Estado Roto	Estado Deteriorado
Sala pruebas de esfuerzo + Test de tilt (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1		hay	movil	
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	2	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	2	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	2	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	X			
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Papelera	1	2	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	1	tapa		oscilante
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			
Ecocardiografía (2) consulta (2)	Negatoscopio de tres cuerpos 2 cuerp.	1	1	—		
	Esfigmomanómetro de merc urio de pared	1	1	—		
	Foco de exploración de pie	1	1	—		
	Dispensador de jabón	1	1	—		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	—		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	—		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	—		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	X			
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	—		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	4	—		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	—		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	—		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	—		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	—		

OBSERVACIONES

→ Corresponde con la consulta 2

* → solo hay una sala de pruebas de esfuerzo

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

consulta 2, ecocardiografía
- 2 sillas fijas (Bueno)
- litera eléctrica

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala pruebas de esfuerzo + Test de tilt (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2				
	Reloj de pared con fecha	1				
	Carro de historias clínicas	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Ecocardiografía (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de merc urio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	DAVINCA MARTÍN	**FECHA:**	1 / 12 / 2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
Sala pruebas de esfuerzo + Test de tilt (2) Consulta 7	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	3	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	3	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Reloj de pared con fecha	1	X			
	Carro de historias clínicas	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X 1	✓		
Ecocardiografía (2) Consulta 3	Negatoscopio de tres cuerpos 2 cuerp.	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de merc urio de pared	1	1	✓		
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1	X			
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración de tres cuerpos	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4?	1	✓		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo)	1	1	✓		
	Poyatas (Equipamiento fijo)		1	✓		

OBSERVACIONES

Solo existe 1 sala de pruebas y 1 sala de Ecocardiograma.

(*) Consulta 7: camilla electrica.

- Cuba basura 12L. tapa oscilante (deteriorada)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala pruebas de esfuerzo + Test de tilt (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2				
	Reloj de pared con fecha	1				
	Carro de historias clínicas	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
Ecocardiografía (2)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de merc urio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo)	1				
	Poyatas (Equipamiento fijo)					

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala electrocardiógrafo (3)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1				

OBSERVACIONES

Se realiza en consulta, habitualmente en la 1.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala electrocardiógrafo (3)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1				

OBSERVACIONES

NO HAY SALA ESPECÍFICA

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala electrocardiógrafo (3)	Negatoscopio de tres cuerpos	1				
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1				
	Foco de exploración de pie	1				
	Dispensador de jabón	1				
	Dispensador de toallas de papel	1				
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1				
	Taburete giratorio con ruedas	1				
	Litera de exploración de tres cuerpos	1				
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1				
	Escabel	1				
	Cortinaje de exploración	1				
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4				
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	1				
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1				
	Cajonera colgante de dos cajones	1				
	Papelera	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1				
	OBSERVACIONES					
			AUDITOR		**RESPONSABLE INSTALACIÓN**	

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

01 CARDIOLOGIA — CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65)	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	V		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	2	UNO	UNO	1
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	1	V		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	V		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	V		
	Silla fija	2	1	V		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	V		
	Taburete giratorio con ruedas	1	X			
	Litera de exploración	1	1	V		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	V		
	Escabel	1	1	V		
	Cortinaje de exploración	1	1	V		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	V		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	V		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	X			
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	2	V		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) 07	Negatoscopio de tres cuerpos	1	X			
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	1	✓		
	Juego estándar de curas	3	1	✓		
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	2	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	2	✓		
	Escabel	1	2	✓		
	Cortinaje de exploración	1	3	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	3	✓		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:		FECHA:	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) 02	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	✓		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	✓		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	X			
	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	✓		
	Silla fija	2	2	✓		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	✓		
	Litera de exploración	1	1	✓		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	✓		
	Escabel	1	1	✓		
	Cortinaje de exploración	1	1	✓		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	✓		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	✓		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1		Sin pedal		
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	✓		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CARDIO

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) 03	Negatoscopio de tres cuerpos	1	1	√		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	1	√		
	Oscilometro con brazal de pierna	1	X			
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3	X			
	Juego de bandejas	1	1	√		
	Dispensador de jabón	1	1	√		
	Dispensador de toallas de papel	1	1	√		
	Silla fija	2	2	√		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	√		
	Taburete giratorio con ruedas	1	1	√		
	Litera de exploración	1	1	√		
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	√		
	Escabel	1	1	√		
	Cortinaje de exploración	1	1	√		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	√		
	Carro de curas con cajones	1	X			
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	√		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	√		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X	√		
	Papelera	1	1	√		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	X	√		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

CONSULTAS Y GABINETES A DISTRIBUIR ENTRE LOS MÓDULOS

CARDIOLOGÍA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Salas de consulta con exploración (65) Consulta 4	Negatoscopio de tres cuerpos	1	√ 1	√		
	Esfigmomanómetro de mercurio de pared	1	√ 1	√		
	Oscilometro con brazal de pierna	1				
	Báscula de pie con altímetro	1	X			
	Foco de exploración de pie	1	X			
	Juego estándar de curas	3				
	Juego de bandejas	1	√ 1	√		
	Dispensador de jabón	1	√ 1	√		
	Dispensador de toallas de papel	1	√ 1	√		
	Silla fija	2	2 √	√		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1 √	√		
	Taburete giratorio con ruedas	1	~~1~~ √	√		
	Litera de exploración	1	X			
	Conjunto dispensador-cortador de papel para litera	1	1	√		
	Escabel	1	X			
	Cortinaje de exploración	1	1	√		
	ML de guia para cortinas de zonas clínicas	4	1	√		
	Carro de curas con cajones	1	1	√		
	Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm.	2	1	√		
	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	√		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	√		
	Papelera	1	1	√		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Perchero mural múltiple (módulo) Poyatas (Equipamiento fijo)	1	1	√		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos públicos (20) trauma ♂♀	Dispensador de jabón	1	1			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	X			
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1			
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1			
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Aseos públicos (20) ♂ trauma	Dispensador de jabón	1	1			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1			
	Secamanos eléctrico	1	1			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1			
	Colgador mural individual	1	1			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1			
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1			
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Aseos públicos (20) ♀ ♂	Dispensador de jabón	1	1			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1			
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1			
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1			
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Aseos públicos (20) obstet ♂ ~~Cardio~~	Dispensador de jabón	1	1			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1			
	Secamanos eléctrico	1	1			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	X			
	Colgador mural individual	1	1			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1			
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1			
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Aseos públicos (20) ♂ Cardio	Dispensador de jabón	1	1	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	—		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	—		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	2	—		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	—		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR: A	ANDALUCIA	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos públicos (20) ♂	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	✓		
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Aseos públicos (20) ♂ Med. Int ⊛	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	✓		
	Secamanos eléctrico	1	1			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1			
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Aseos públicos (20) ♂ P M. Día	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	2	✓		
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	2	✓		
	Colgador mural individual	1	2	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	2	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Aseos públicos (20) ♂	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	✓		
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	2	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Aseos públicos (20) ♂	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	✓		
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	2	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

⊛ 4 taquillas en baño público Medicina Int. y el baño vestuario.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

Planta Baja

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Hospital de Día **Aseos públicos (20)** ♂	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	2	✓		
	Colgador mural individual	1	2	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	2	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Planta Baja **Aseos públicos (20)** ♀ biblioteca	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	4	✓		
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	4	✓		
	Colgador mural individual	1	4	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	4	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	2	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Planta Baja **Aseos públicos (20)** ♂ biblioteca	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	3	✓		
	Colgador mural individual	1	3	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	3	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Planta 2 Bloque A **Aseos públicos (20)** ♂	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	2	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	2	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Aseos públicos (20)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	2	✓		
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	2	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	Elisa Quiroga	**FECHA:**	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Planta baja **Aseos públicos (20)** Pediatría ♀	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	✓		
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Planta baja **Aseos públicos (20)** Obstetricia ♂	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Planta baja **Aseos públicos (20)** Obstetricia ♀	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	✓		
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Planta baja **Aseos públicos (20)** Cardio ♀	Dispensador de jabón	1	1	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	2	✓		
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	2	✓		
	Colgador mural individual	1	2	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	2	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
Planta baja **Aseos públicos (20)** Medicina Interna ♀	Dispensador de jabón	1	1			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1			
	Secamanos eléctrico	1	1			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1			
	Colgador mural individual	1	1			✓
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1			
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1			
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			

OBSERVACIONES

Las hay 4 taquillas y un baño aunq es baño público

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:	ANDSERA	**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	5.12.2017
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos públicos adaptados (10) (1 trauma) (1)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓	✓		
	Secamanos eléctrico	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	x			
	Barra soporte lateral pared	1	✓	✓		
Aseos públicos adaptados (10) Cafet. M. D	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
	Barra soporte lateral pared	1				
Aseos públicos adaptados (10) M. Interna (2)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Secamanos eléctrico	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	x			
	Barra soporte lateral pared	1	✓	✓		
Aseos públicos adaptados (10) N. Comercial (3)	Dispensador de jabón	1	✓	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	✓	✓		
	Secamanos eléctrico	1	✓	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓	✓		
	Colgador mural individual	1	✓	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	✓	✓		
	Barra soporte lateral pared	1	x			
Aseos públicos adaptados (10) Cafetería Planta Baja	Dispensador de jabón	1	✓			
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Secamanos eléctrico	1	✓			
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	✓			
	Colgador mural individual	1	✓			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	✓			
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	✓			
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	x			
	Barra soporte lateral pared	1	✓			

OBSERVACIONES

→ Cubo basura 12L tapa oscilante (Deteriorado)

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:	ELIA QUIROGA	**FECHA:**	1.12.2014
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	17:00

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
2º PLANTA	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	✓		
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
Aseos públicos adaptados (10)	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Barra soporte lateral pared	1	1	✓		
1º PLANTA	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
Aseos públicos adaptados (10)	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
	Barra soporte lateral pared	1				
CARDIO, no hay aseos adaptados 1º PLANTA	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	✓		
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
Aseos públicos adaptados (10)	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Barra soporte lateral pared	1	1	✓		
Hospital de día 2º PLANTA	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	✓		
Área Quirúrgica	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
Aseos públicos adaptados (10)	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X 1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	X			
	Barra soporte lateral pared	1	1	✓		
	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
Aseos públicos adaptados (10)	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
	Barra soporte lateral pared	1				

OBSERVACIONES

En el área de Cardio cuando no hay aseo adaptado, han hecho un baño unisex.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa
Investigación y Control de Calidad S.A.

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		**COD. PARTE:**	
INSPECTOR:		**FECHA:**	04-12-2022
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		**HORA:**	16:00 h

PLANTA BAJA

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado Bueno	Roto	Deteriorado
Aseos públicos adaptados (10) (1)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	x			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	x			
	Barra soporte lateral pared	1	1	✓		
Aseos públicos adaptados (10) (2)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	x			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	x			
	Barra soporte lateral pared	1	1	✓		
Aseos públicos adaptados (10) (3)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	✓		
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	x			
	Barra soporte lateral pared	1	1	✓		
Aseos públicos adaptados (10) (4)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	x			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	1	✓		
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	1	✓		
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1	x			
	Barra soporte lateral pared	1	1	✓		
Aseos públicos adaptados (10)	Dispensador de jabón	1				
	Cubo de basura con pedal 12L	1				
	Cubo de basura con pedal 5L	1				
	Secamanos eléctrico	1				
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1				
	Colgador mural individual	1				
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1				
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1				
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo)	1				
	Barra soporte lateral pared	1				

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

1ª PLANTA Y BAJA

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Parras	FECHA:	24-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (V / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de espera familiares (6) Planta (A)	Sillas modulares	20	1 3 ✓	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	4	1 2 ✓	✓		
	Cuadro decoración pared	6	1 2	✓		
	Jardinera	1	X			
	Soporte para posters de campañas	1	X			
	Expositor de folletos	1	X			
	Papelera	1	X			
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1	X			
Aseos públicos (8) Planta Baja Psiquiatría	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	✓			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo) 1	1	X			
Despacho de información (6) 2 CMA	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	1	✓		
	Silla fija con brazos	2	1	✓		
	Papelera	1	X			

OBSERVACIONES

* 2 mesas:
65 x 65
90 x 60

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso	FECHA:	24-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de espera familiares (6) 1º planta (B)	Sillas modulares	20	1 Gallos	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm.	4	X			
	Cuadro decoración pared	6	1 2	✓		
	Jardinera	1	X			
	Soporte para posters de campañas	1	1 1	✓		
	Expositor de folletos	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1	X			
Aseos públicos (8) Planta Baja (Pediátrica)	Dispensador de jabón	1	1		X	
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo) 1	1	X			
Despacho de información (6)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	[illegible]	[illegible]		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	[illegible]	[illegible]		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	[illegible]	[illegible]		
	Silla fija con brazos	2	[illegible]	[illegible]		
	Papelera	1	[illegible]	[illegible]		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

1º PLANTA.

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso	FECHA:	24-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de espera familiares (6) 1ª planta hospital de día	Sillas modulares *	20	30	✓		POR
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm. 65x65	4	6			
	Cuadro decoración pared	6	5	✓		
	Jardinera	1	X			
	Soporte para posters de campañas	1	X			
	Expositor de folletos	1	X			
	Papelera	1	2	✓		
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1	X			
Aseos públicos (8) 1ª planta H. de Día	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo) 1	1	X			
Despacho de información (6) 1ª C	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Silla fija con brazos	2	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		

OBSERVACIONES

* no son sillas, son butacas.

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL

incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Arroyo	FECHA: 24-11-17	
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado		
				Bueno	Roto	Deteriorado
Sala de espera familiares (6) 1ª planta (C)	Sillas modulares	20	19 sillas			
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm. 90x60	4	1	✓		
	Cuadro decoración pared	6	1	—		
	Jardinera	1	X			
	Soporte para posters de campañas	1	X			
	Expositor de folletos	1	X			
	Papelera	1	1	—		
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1	X			
Aseos públicos (8) 1ª planta (A)	Dispensador de jabón	1	1	—		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	~~✓~~		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	X			
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	—		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo) 1	1	X			
Despacho de información (6)	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	—		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	1	—		
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Silla fija con brazos	2	1	—		
	Papelera	1	1	—		

OBSERVACIONES

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL	incosa

EDIFICIO:			
EXPLOTADOR:		COD. PARTE:	
INSPECTOR:	Alejandro Paraíso	FECHA:	24-11-17
ACOMPAÑA AL INSPECTOR:		HORA:	

	Equipamiento de cada espacio	Unidades	Comprobación Existencia (√ / x)	Estado Bueno	Estado Roto	Estado Deteriorado
Planta Baja Pediatría **Sala de espera familiares (6)** 1ª planta (C)	Sillas modulares	20	6	✓		
	Mesita auxiliar rectangular de 80 x 50 cm. 90x60cm	4	2	✓		
	Cuadro decoración pared	6	2	✓		
	Jardinera	1	X			
	Soporte para posters de campañas	1	1	✓		
	Expositor de folletos	1	X			
	Papelera	1	1	✓		
	Sofá con mesa de esquina y central baja	1	X			
Aseos públicos (8) 1ª planta (C)	Dispensador de jabón	1	1	✓		
	Cubo de basura con pedal 12L	1	X			
	Cubo de basura con pedal 5L	1	X			
	Secamanos eléctrico	1	1	✓		
	Dispensador de papel higiénico rollo 200/300 m.	1	1	✓		
	Colgador mural individual	1	X			
	Lavabo con repisa (elemento fijo)	1	1	✓		
	Espejo encastrado (elemento fijo)	1	1	✓		
	Repisa para elementos de aseo (elemento fijo) 1	1	X			
Despacho de información (6) 1ª B	Mesa de trabajo de 140 x 80 x 74 cm.	1	1	✓		
	Cajonera colgante de dos cajones	1	X			
	Silla giratoria con brazos y ruedas	1	X			
	Silla fija con brazos	2	1	✓		
	Papelera	1	1	✓		

OBSERVACIONES

mesa auxiliar rectangular de 90 x 60 cm

AUDITOR	RESPONSABLE INSTALACIÓN

I. ANEXOS A LA AUDITORÍA A LAS MEDIDAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

2 MEDIDAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES (MMEE).

2.1 INTRODUCCIÓN.

A continuación se describirán las medidas de mejora de la eficiencia energética, MMEE, del sistema energético del HIC. En ellas se detallarán las propuestas y la valoración de las actuaciones necesarias para la reforma, la adecuación a la normativa y la mejora de la explotación de las instalaciones consumidoras de energía existentes en el edificio del Hospital Infanta Cristina de Parla.

El desarrollo de estas medidas irá a cargo de la CONCESIONARIA HOSPITAL DE PARLA, que también asumirá su coste. Estas medidas se irán ejecutando a lo largo del tiempo atendiendo a criterios técnicos, operativos y financieros definidos por la CONCESIONARIA HOSPITAL DE PARLA.

2.1.1 MMEE1: RECUPERADOR HUMOS-AGUA.

Asociado a una caldera tradicional de combustibles gaseosos, un recuperador de calor de humos permite recuperar la mayor parte de la energía perdida en los productos de combustión en forma de calor sensible y latente.

2.1.1.1 Balance energético

La utilización de la recuperación de humos en el circuito mixto de calefacción y ACS supone ahorros de combustible (gas natural) debido a la mejora del rendimiento del sistema, al aprovechar el calor latente y/o sensible del calor de los humos resultado de la combustión en una caldera.

Aplicando esta medida se obtienen consumos de **10.943.578 kWh** de gas natural (s/PCS), que supone un ahorro energético de **171.893 kWh/año.**

La siguiente gráfica muestra la comparativa de la evolución anual de los consumos actuales de la energía necesaria para satisfacer la demanda de ACS y calefacción del HIC frente a los consumos y costes que se generarían después de realizar la medida propuesta.

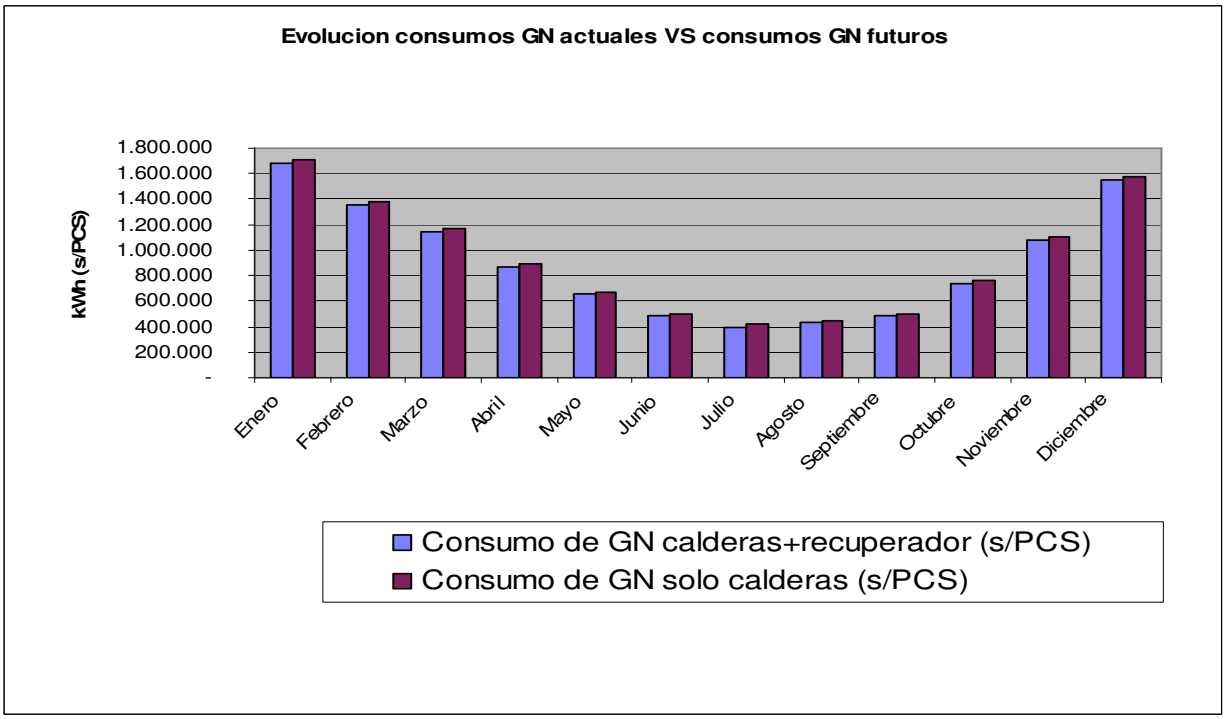
Evolucion consumos GN actuales VS consumos GN futuros
kWh (s/PCS)
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
-
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Consumo de GN calderas+recuperador (s/PCS)
Consumo de GN solo calderas (s/PCS)

2.1.2 MMEE 2: RECUPERACIÓN TÉRMICA EN CLIMATIZADORES

Una de las formas de reducir consumo energético es el empleo del sistema economizador de aire de extracción para aprovechar su baja entalpía cuando las condiciones exteriores son desfavorables en verano, o para aprovechar la alta entalpía en invierno. Se disminuye, en estos casos, el uso de equipos de aire acondicionado y calefacción.

Los climatizadores a los que se les porpone añadir el modulo de recuperación de calor son los siguientes:

CASETON	Nº UTA	MARCA	MODELO	POT. FRIO	POT.CALOR	CAUDAL	Tº CONSIGNA IMPULSION INVIERNO	Tº RETORNO INVIERNO
4	UTA 9	AIRVENT	PB-8,5-E	92	52	7700	28	23,8
4	UTA 49	AIRVENT	PB-15	99	124	14600	22	22,2
5	UTA 51	AIRVENT	PB-8,5	55	70	8100	22	
5	UTA 50	AIRVENT	PB-7,5-E	49	61	7200	30	
8	UTA 5	AIRVENT	PB-17	204	143	16800	22	23,5
8	UTA 6	AIRVENT	PB-7,5-E	151	85	12300	26	26,2
9	UTA 43	AIRVENT	PB-7,5	63	44	6300	24	23,9
9	UTA 45	AIRVENT	PB-3	24	26	3000	20	
11	UTA 11	AIRVENT	PB-7,5-E	71	43	6400	24	22,5
11	UTA 7	AIRVENT	PB-10-E	111	62	9100	20	22,7
13	UTA 20	AIRVENT	PB-5	64	32	4680	23	24,1
14	UTA 18	AIRVENT	PB- 7,5 E	62	42	6100	24	25,2
14	UTA 21	AIRVENT	PB- 7,5 E	58	41			
15	HTA 37	AIRVENT	PB-10-E	67	84	8750	26	25,1

2.1.2.1 Balance energético

Se evitarán consumir 1.444.355,28 KWh/año térmicos y 59.757,48 kWh/año frigoríficos. Teniendo en cuenta los rendimientos de los equipos productores, se ahorrará anualmente **1.765.323,12 kWh** (s/PCS) de gas natural y **19.919,16 kWh** eléctricos.

2.1.3 MMEE 3: SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN ENERGÉTICA

2.1.3.1 Sistemas de control para la optimización energética en el alumbrado exterior

Entre la multitud de medidas posibles para la optimización energética en la iluminación interior, se han seleccionado, en función de la actual instalación tres sistemas de optimización energética:

- Regulación del nivel lumínico en función del aporte de luz natural
- Regulación del nivel lumínico en horarios nocturnos
- Encendidos por control de presencia

2.1.3.2 Sistemas de control para la gestión energética y de agua

El sistema de control permite que los equipos y elementos de las instalaciones se regulen automáticamente por sí solos en función de unas condiciones establecidas y la actuación sobre estas condiciones y sobre el funcionamiento de los propios equipos. Las instalaciones objeto del Contrato dispone de un sistema de control centralizado (BMS) con tecnología Schneider.

Si bien existe un sistema de control centralizado, no existe un módulo asociado de control del sistema de gestión energética y agua. Dentro de las medidas de ahorro energético propuestas se desarrollará un módulo adicional de gestión energética dentro del programa centralizado, así como la instalación de los contadores de energía y agua necesarios.

Por todo lo comentado, el alcance de las actuaciones a llevar a cabo en el control será:

- Integración de las nuevas instalaciones y renovación del sistema de control.
- Instalación de contadores para el registro y control del consumo de energía eléctrica, agua y gas, y contadores entálpicos para verificar la producción de energía útil de refrigeración, calefacción y ACS.
- Implantación de un módulo capaz de registrar todos los parámetros relacionados con el sistema de gestión energética: consumo de electricidad por parte de las instalaciones, consumo de combustible, producción de energía de calor y frío útil por parte de cada uno de los sistemas, generación de electricidad, consumo de agua y ACS…

2.1.3.3 Integración de los nuevos sistemas y MMEE en el actual sistema do control del Hospital

Las propuestas de mejora energética anteriormente expuestas, deberán integrarse en el actual sistema de control Schneider TAC del HIC, por lo que se tendrá que instalar el correspondiente equipo hardware (controladores, sondas, cableado, etc…) y programar dichos equipos en el mencionado sistema de control

2.1.3.4 Balance energético

Las propuestas realizadas para la optimización energética en la iluminación interior del HIC, basan la reducción energética del sistema actual en dos parámetros fundamentales:

- Reducción de flujo lumínico: En el caso que nos aplica, es decir, fluorescencia lineal, son fácilmente regulables en su flujo con una reducción significativa en el uso de la energía asociada, ya que una menor intensidad de flujo implica una menor demanda de potencia de la lámpara. Esto aplicará en las situaciones de regulación del nivel lumínico de luz artificial en función del la luz natural y en las situaciones en las que se regula el nivel lumínico en función de horarios (pasillos en horario nocturno).

  Reducción de horas de funcionamiento: La regulación de encendidos por presencia provocará una disminución de las horas de encendido de las zonas propuestas.

Además, se estima que la adecuada gestión energética, consistente en controlar las instalaciones, eliminar los consumos innecesarios y optimizar los consumos necesarios, emplear las tecnologías más eficientes y mantener de manera óptima las instalaciones, con la ayuda del sistema de monitorización y medida de consumos energéticos del Hospital propuesto se obtendrán ahorros adicionales derivados de esta mejora en la gestión energética del Hospital.

En resumen, derivados de la instalación de los sistemas de control para la optimización energética de la iluminación interior y la mejora en la gestión energética del Hospital gracias a la ayuda de un sistema informático de gestión energética, se generarán **ahorros en energía eléctrica de 1.106.898,02 kWh al año y ahorros de agua de 2.572 m3 de agua.**

2.1.4 MMEE 4: OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN EXTERIOR

2.1.4.1 Descripción general del sistema propuesto

Se propone la instalación de balastos electrónicos de potencia regulable, con doble nivel de potencia y controlados mediante un sistema de control luminaria a luminaria.

2.1.4.2 Balance energético

La instalación de los sistemas de regulación punto a punto propuestos mediante balastos electrónicos regulables a dos niveles de flujo controlados via LON, generaría ahorros por la reducción de la potencia de consumo en el segundo nivel o régimen reducido, por la estabilización de la tensión (5% de la potencia).

El consumo de energía eléctrica de los sistemas de alumbrado exterior que cuelgan del cuadro de mando en situación de funcionamiento sin reducción de flujo lumínico sería de 68.664,75kWh/año.

El balance energético derivado de la situación propuesta para la reducción de flujo lumínico en la situación anteriormente expuesta es la siguiente

	Flujo lumínico al 100%	Flujo lumínico al 50%
Horas de funcionamiento	1.319	2.958
Tensión en punto de luz (V)	230	230
Potencia consumida (W)	14.740	8.844
Consumo energético anual (kWh)	19.442.06	26.160,55
Consumo energético anual TOTAL (kWh)	**45.602,61**	

De esta forma, se podrá conseguir un ahorro energético en el alumbrado exterior del HIC de **23.062,14 kWh** al año.

2.1.1 MMEE 5: RENOVACIÓN DE RÓTULO DE CUBIERTA POR UNO DE TECNOLOGÍA LED

Se propone la renovación del actual rótulo de neón situado en la cubierta del HIC por uno de tecnología led.

2.1.1.1 Balance energético

La utilización de rótulos led en lugar de rótulos de neón, debido al menor consumo de los mismos, significará un ahorro energético de **12.446 kWh eléctricos al año**.

2.1.2 OTRAS MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Como complemento al Sistema de Gestión Energética planteado, se incluirán las siguientes medidas encaminadas igualmente a maximizar el ahorro energético y agua en las instalaciones objeto de la presente propuesta.

2.1.2.1 Gestión y prácticas energéticas.

Dentro del plan de ahorros energéticos a conseguir en base a mejoras de la eficiencia energética, la CONCESIONARIA HOSPITAL DE PARLA propone la implantación de un **Sistema de Gestión y Optimización Energética**, con objeto de potenciar y desarrollar las soluciones necesarias para reducir y optimizar los consumos energéticos y de agua, mejorando los niveles de confort establecidos y controlando las instalaciones.

Este servicio se adapta a las necesidades del usuario, abarcando la gestión energética integral del conjunto de dependencias del cliente, incluyendo el mantenimiento de las instalaciones.

- **FASE I: Análisis energético detallado de los edificios e implantación de un sistema de monitorización y control de consumos energéticos**

- **FASE II: Aplicación de las medidas de eficiencia energética**

Una vez detectadas las medidas de eficiencia energética más interesantes, se procederá a la aplicación de las mismas. Para ello, se diferenciará en dos categorías:

- **Medidas derivadas de una adecuada gestión energética del Hospital.**

Se estima que la adecuada gestión energética y de agua, consistente en controlar las instalaciones, eliminar los consumos innecesarios y optimizar los consumos necesarios, emplear las tecnologías más eficientes y mantener de manera óptima las instalaciones, con la ayuda un sistema de monitorización y medida de consumos energéticos del Hospital se obtendrán unos ahorros energéticos importantes, ya incluidos en el ahorro presentado en el apartado de sistema de gestión energética.

- **Medidas de aplicación derivadas de una inversión por cuenta de la CONCESIONARIA HOSPITAL DE PARLA.**

Estas medidas son las que se proponen en los apartados anteriores.

2.1.2.2 Charlas de concienciación en materia de ahorro energético.

Como mejora adicional se propone la realización con carácter anual de una charla informativa a los trabajadores del los centros, de divulgación de buenas prácticas en ahorro y eficiencia energética y de agua, nuevas tecnologías y equipos, domótica, etc. Estas charlas estarán impartidas por especialistas en ahorro energético de la CONCESIONARIA HOSPITAL DE PARLA, así como con colaboraciones externas de profesionales y empresas del sector de la energía.

De igual forma, se propone impartir una vez al año una ponencia de servicios energéticos al alumnado interesado

2.1.2.3 Carteles explicativos sobre medidas de ahorro energético en el trabajo.

Como mejora adicional al contrato de servicios energéticos se propone la distribución de carteles explicativos sobre medidas de ahorro energético en el puesto de trabajo. Esta medida se realizará durante la fase II del proyecto.
