Id	Nombre de tarea	Comienzo
1	**SUBESTACIÓN GUADARRAMA**	**mié 30/11/22**
2	**Operaciones previas**	**mié 30/11/22**
3	Suministro Ejecución	mié 30/11/22
4	**Obra civil Plataforma y Edificio**	**mié 28/12/22**
5	Ejecución Plataforma y Malla Red Tierras	mié 28/12/22
6	Excavación y Hormigonado Cimentaciones y Drenajes de la Plataforma	mié 18/01/23
7	Cimentaciones, estructura y Cubierta Edificio	mié 18/01/23
8	Canales de cables, viales y vallado pataforma	jue 16/02/23
9	Cerramientos e instalaciones del Edificio	mié 08/02/23
10	Remates y Acabado Plataforma	mar 14/03/23
11	Remates y Acabado Edificio	mar 14/03/23
12	**Montaje Electrico**	**jue 16/02/23**
13	Montaje de la estructura Plataforma	jue 16/02/23
14	Montaje Trafo de Potencia y Aparamenta Plataforma	mar 14/03/23
15	Montaje Celdas MT Edificio	mar 14/03/23
16	Tendido y conexionado cableado Plataforma	mié 19/04/23
17	Montaje armarios de control Edificio	mar 14/03/23
18	Tentido y conexionado cableado de control	mar 11/04/23
19	Remates y Acabado	mié 10/05/23
20	Pruebas en frío	mar 25/04/23
21	Energizado y puesta en marcha	mar 27/06/23

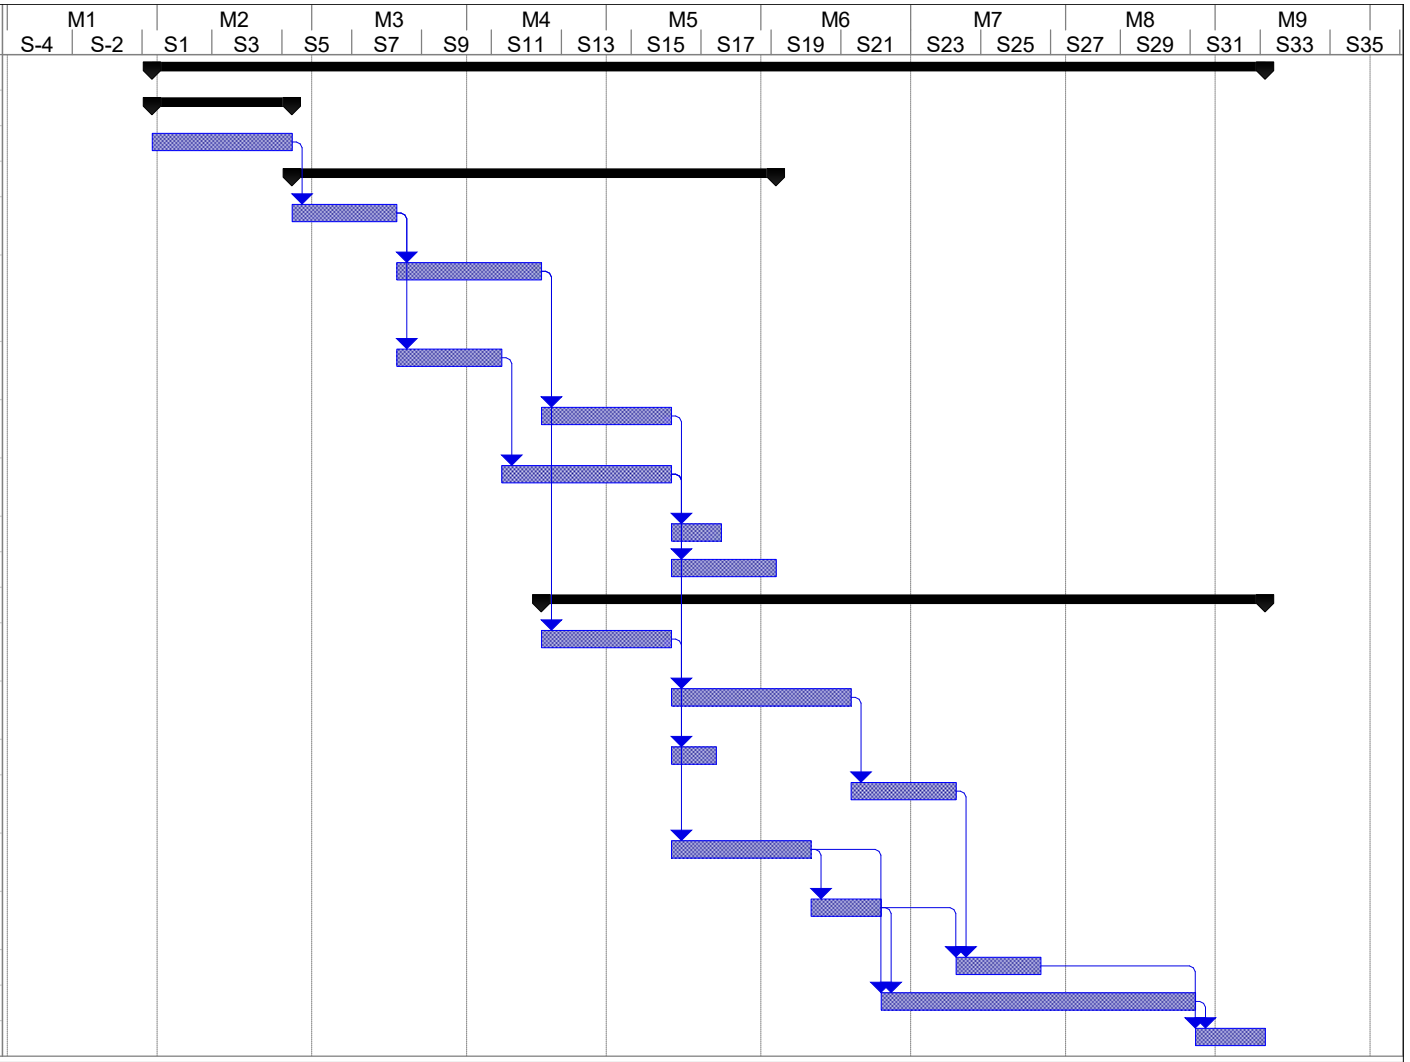

CEPSA

Tarea		Tarea inactiva		Resumen manual	
División		Hito inactivo		solo el comienzo	
Hito		Hito inactivo		solo fin	
Resumen		Resumen inactivo		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Hito externo	
Tareas externas		solo duración		Progreso	
Hito externo		Informe de resumen manual		Fecha límite	

*Planing ejecución de obra (Sin tener en cuenta el plazo de entrega de los equipos principales)
